

# Prestação de Contas 2017 Parcial – SMSO

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Novembro/17



## Prestação de Contas Parcial 2017 – SMSO

---

Obras, Projetos, Serviços e Gerenciamento	Vlr. Autorizado 2017	Liquidado até 11/Nov
Corredores - Mobilidade	23.478.828,87	46.015,07
Terminais - Mobilidade	6.052.215,95	2.202.007,78
Gerenciamento	3.284.870,99	2.466.694,72
Drenagem	4.500.000,00	901.339,50
Projeto Redenção - Saúde e Educação	8.408.851,60	-
<b>TOTAL</b>	<b>45.724.767,41</b>	<b>5.616.057,07</b>

Obs.: Como temos um pedido de movimentação orçamentária em tramitação, devemos promover adequações em nossos empenhos. Diante disto, estamos informando apenas os valores liquidados até o dia 11/Novembro/17.

# CORREDOR LESTE ITAQUERA I [30% mobilidade]

NOME	VALOR (R\$)
Corredor Leste Itaquera 1	13.301.686,45


  

ESTÁGIO	AÇÃO
Em andamento	- Continuidade e finalização das obras do Corredor

CONTRATO 045/SIURB/2013  
Valor do Contrato: R\$ 150.406.618,68  
Processo: 2013-0.136.235-9  
Empresa Contratada: CARIOCA/HELENO & FONSECA

**Liquidado até**  
**11/Nov**  
R\$ 46.015,07

## Projeção

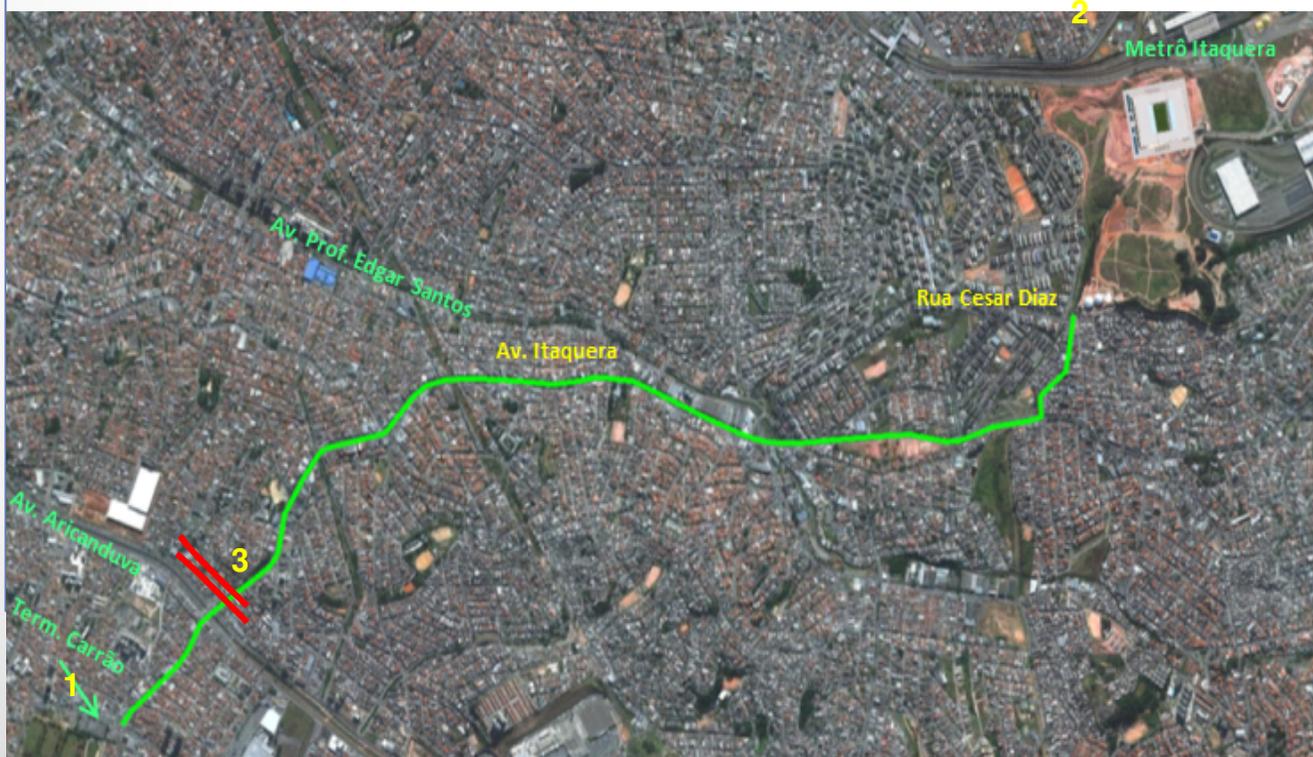

### Integração:

1. Terminal de Ônibus Vila Carrão
2. Terminal / Estação Itaquera (Linha 3 Metrô / Linha 11 CPTM)

### Composição da Obra:

3. Obra de arte: Viaduto Eixos 1 e 2 Av. Aricanduva sobre Av. Itaquera.

# CORREDOR LESTE ITAQUERA I [30% mobilidade]



# TERMINAL E CORREDOR LESTE ITAQUERA II [30% mobilidade]

NOME	VALOR (R\$)
Terminal Itaquera Corredor Leste Itaquera 2	8.254.800,95

CONTRATO 051/SIURB/2013  
Valor do Contrato: R\$ 456.360.434,19  
Processo: 2013-0.136.203-0  
Empresa Contratada: Camargo Córrea / Constran

ESTÁGIO	AÇÃO
Em andamento	<ul style="list-style-type: none"><li>- Continuidade das obras do Terminal</li><li>- Continuidade nas obras do Corredor denominado Leste Itaquera 2</li></ul>

**Liquidado até**  
**11/Nov**  
**R\$ 2.202.007,78**

## Projeção



# TERMINAL E CORREDOR LESTE ITAQUERA II [30% mobilidade]



# CORREDOR CAPÃO REDONDO [30% mobilidade]

NOME	VALOR (R\$)
Corredor Capão Redondo	1.278.283,42


  

ESTÁGIO	AÇÃO
Em andamento	- Elaboração de projetos

CONTRATO 046/SMSO/2013  
Valor do Contrato: R\$ R\$ 213.175.405,41  
Processo: 2013-0.136.122-0  
Empresa Contratada: Consórcio S.A. Paulista / Construbase

<b>Liquidado até</b>
<b>11/Nov</b>
R\$ 0,00

## Projeção

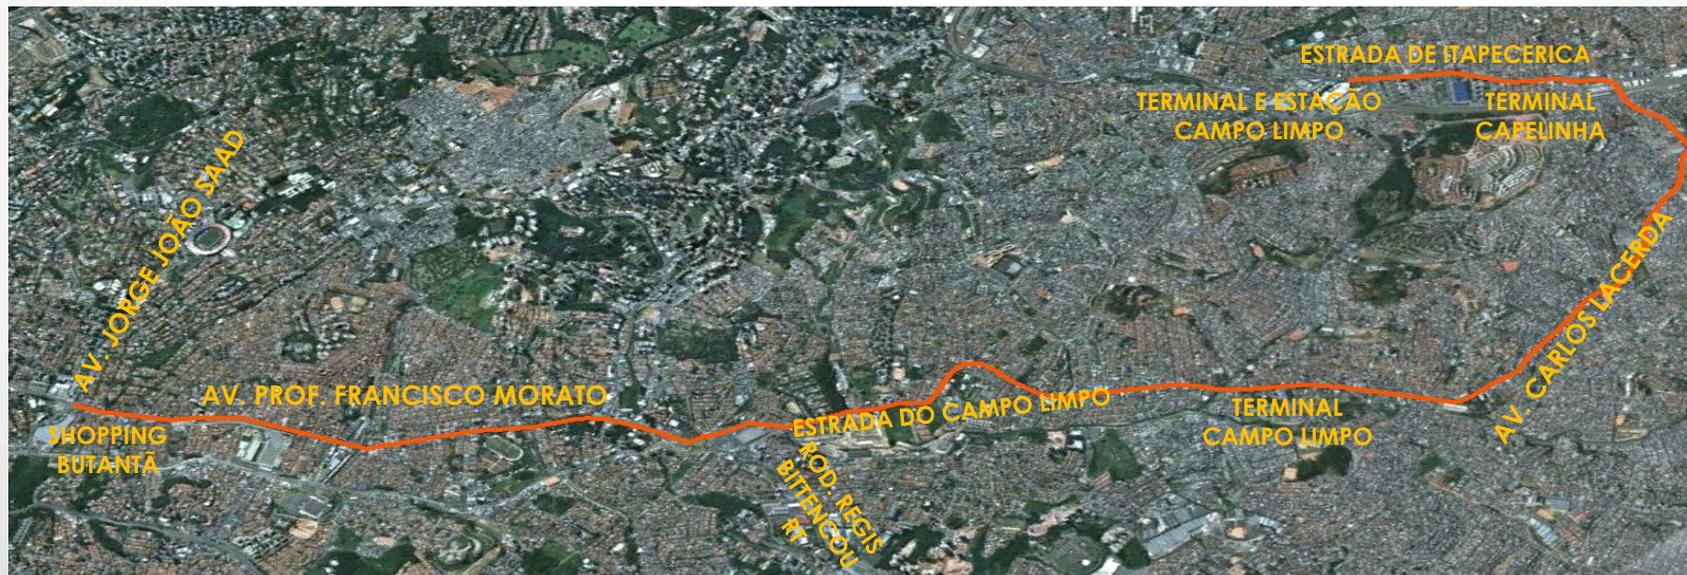

# CORREDOR M'BOI MIRIM [30% mobilidade]

NOME	VALOR (R\$)
Corredor M'Boi Mirim	6.696.274


ESTÁGIO	AÇÃO
---------	------

CONTRATO 047/SIURB/2013  
Valor do Contrato: R\$ 116.661.203,46  
Processo: 2013-0.136.129-8  
Empresa Contratada: Consórcio Arvek / DPBarros

Adequações e retomada do projeto e obras em outubro/17

Elaboração de projetos executivos, execução das obras do Empreendimento 6 – Corredor M'boi Mirim, integrante do programa de mobilidade urbana

**Liquidado até 11/Nov**  
R\$ 0,00

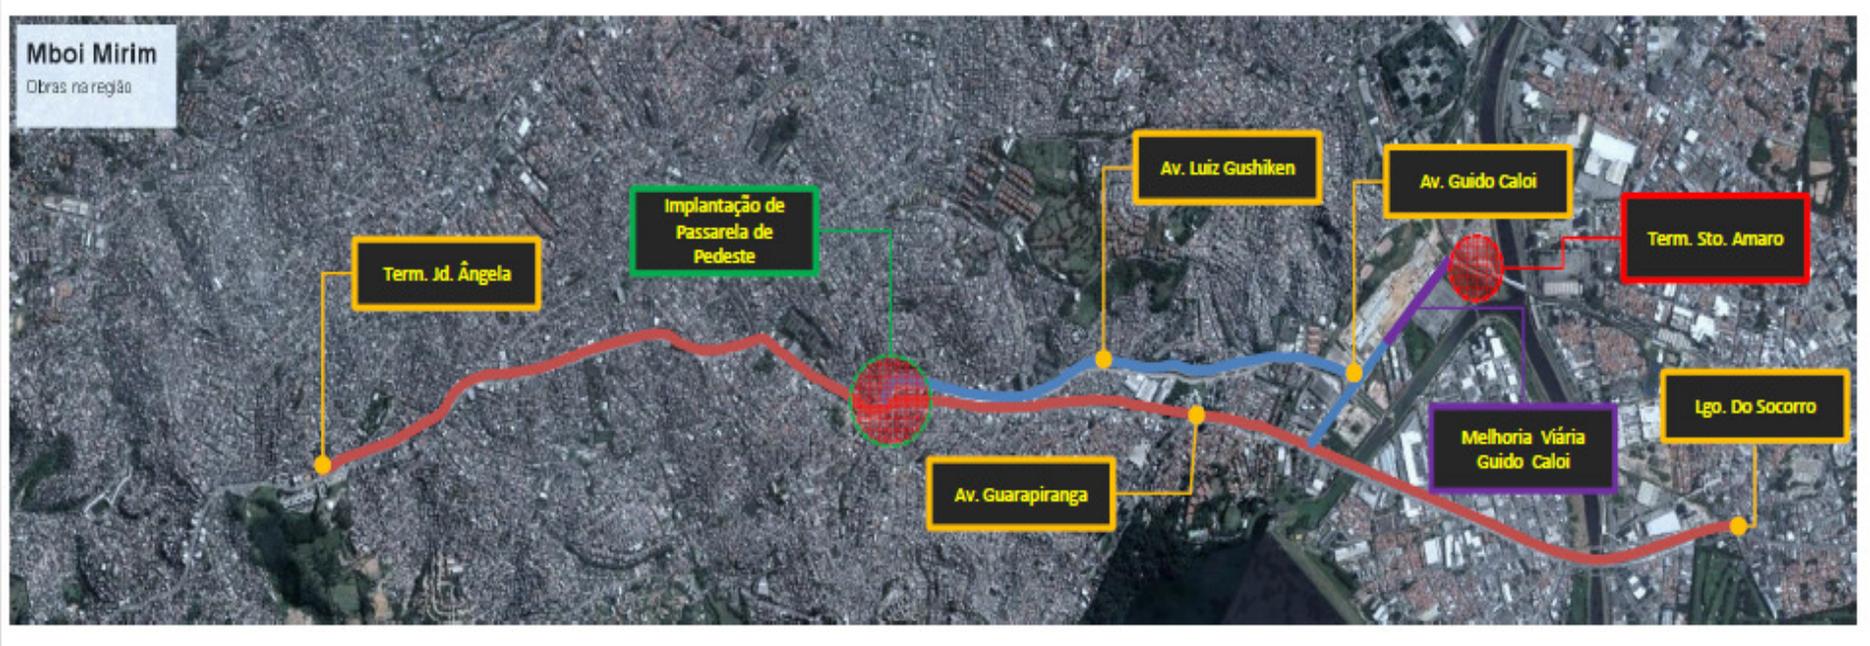

# CORREDOR M'BOI MIRIM [30% mobilidade]



Situação Inicial:



# Gerenciamento e Drenagem

---

## Gerenciamento:

- Gerenciamento SP Obras – Mobilidade Urbana : **R\$ 3.284.870,99**

<b>Liquidado até 11/Nov</b>
R\$ 2.466.694,72

## Drenagem Urbana:


- Aplicação em intervenções diversas do Programa de Drenagem Urbana **R\$ 4.000.000,00** ( PRA lote 5).

<b>Liquidado até 11/Nov</b>
R\$ 901.339,50

# REQUALIFICAÇÃO DO VALE DO ANHANGABAÚ

---

NOME	VALOR (R\$)
Vale do Anhangabaú	500.000,00
ESTÁGIO	AÇÃO
Em fase de contratação	- Elaboração de projetos e obras

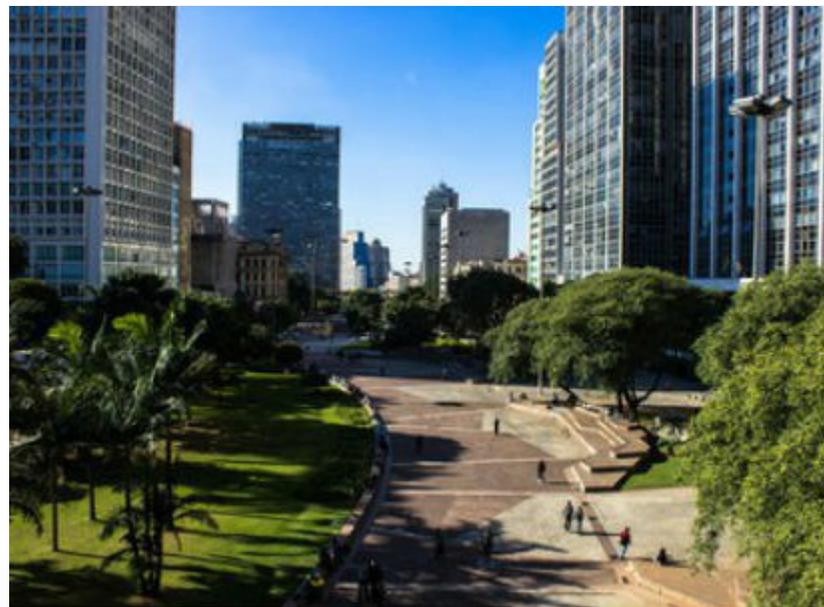

Valor total estimado da obra R\$ 79.934.920,45

## Projeto Redenção

---

### Desapropriações Saúde:

<b>Desapropriações</b>	<b>Vlr. Autorizado 2017</b>	<b>Liquidado até 11/Nov</b>
<b>Projeto Redenção - Saúde</b>	R\$ 1.754.842,25	R\$ 0,00

### Desapropriações Educação:

<b>Desapropriações</b>	<b>Vlr. Autorizado 2017</b>	<b>Liquidado até 11/Nov</b>
<b>Projeto Redenção - Educação</b>	R\$ 6.654.009,35	R\$ 0,00



**PREFEITURA DE**  
**SÃO PAULO**

Secretaria Municipal de Serviços e Obras

