

PLANO ANUAL DE APLICAÇÃO 2025
SIURB x FUNDURB
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL
(Setembro/2026)

PLANO ANUAL DE APLICAÇÃO 2025 – SIURB x FUNDURB

PLANO ANUAL DE APLICAÇÃO 2025 - AÇÕES	Valor Aprovado 2025 (Res 002/2026)	Valor Aprovado 2023 (Res 002/2026)	Total Aprovado	Total Empenhado	Pago Até 31/12/2025	Saldo Inscrito em Restos a Pagar	Valor pago até 29/04/2026 (Restos a Pagar)	Total Pago (R\$)
Implantação de Estrutura Turística no Triângulo e Quadrilátero Histórico do Centro	22.709.323,49	-	22.709.323,49	31.469.930,40	26.741.568,73	4.728.361,67	3.820.631,38	30.562.200,11
Projeto executivo e obras (MOB)	20.644.839,54	-	20.644.839,54	30.590.503,29	26.451.776,88	4.138.726,41	3.612.106,60	30.063.883,48
Gerenciamento (Ger)	2.064.483,95	-	2.064.483,95	879.427,11	289.791,85	589.635,26	208.524,78	498.316,63
Implantação de Corredores de Ônibus Novos	15.200.000,00	52.200.000,00	67.400.000,00	60.818.084,30	44.852.950,90	15.965.133,40	10.961.122,93	55.814.073,83
Corredor Radial Leste - Trechos 1 e 2 (MOB)	10.000.000,00	52.200.000,00	62.200.000,00	56.908.529,58	41.878.855,69	15.029.673,89	10.787.146,51	52.666.002,20
Corredor Itaim - São Matheus (MOB)								
Corredor Aricanduva (MOB)								
Corredor Capão (MOB)								
Corredor Chucri Zaidan (MOB)								
Gerenciamento (Ger)	5.200.000,00	-	5.200.000,00	3.909.554,72	2.974.095,21	935.459,51	173.976,42	3.148.071,63
Construção de Terminais de Ônibus	11.000.000,00	-	11.000.000,00	11.339.404,03	8.387.419,24	2.951.984,79	1.726.210,43	10.113.629,67
Terminal Itaquera (MOB)	10.000.000,00	-	10.000.000,00	11.284.245,95	8.387.419,24	2.896.826,71	1.675.637,31	10.063.056,55
Terminal Itaim (MOB)								
Gerenciamento (Ger)								
Intervenções no Sistema Viário	1.000.000,00	-	1.000.000,00	55.158,08	-	55.158,08	50.573,12	50.573,12
Intervenções no Sistema Viário	109.000.000,00	25.000.000,00	134.000.000,00	135.999.939,36	97.022.270,68	38.977.668,68	33.772.596,17	130.794.866,85
Ligação Pirituba-Lapa; (MOB)	100.000.000,00	25.000.000,00	125.000.000,00	128.634.054,65	90.935.345,87	37.698.708,78	32.517.367,42	123.452.713,29
Ponte Graúna-Gaivotas; (MOB)								
Marginal Pinheiros; (MOB)								
Av. Senador Teotônio Vilela; (MOB)								
Pontilhão João Beçola; (MOB)								
Complexo Viário Raquel Chohfi (MOB)								
Viaduto (Ligação Viária Rua Jequirituba e Rua Prof. Roldão de Barros sob Linha 9 CPTM) (MOB)								
Nova Ponte Jurubatuba (MOB)	9.000.000,00	-	9.000.000,00	7.365.884,71	6.086.924,81	1.278.959,90	1.255.228,75	7.342.153,56
Gerenciamento [GER] (MOB)								

PLANO ANUAL DE APLICAÇÃO 2025 – SIURB x FUNDURB


PLANO ANUAL DE APLICAÇÃO 2025 - AÇÕES	Valor Aprovado 2025 (Res 002/2026)	Valor Aprovado 2023 (Res 002/2026)	Total Aprovado	Total Empenhado	Pago Até 31/12/2025	Saldo Inscrito em Restos a Pagar	Valor pago até 29/04/2026 (Restos a Pagar)	Total Pago (R\$)
Intervenções no Sistema Viário	37.114.697,73	-	37.114.697,73	40.234.131,10	40.019.006,91	215.124,19	126.645,61	40.145.652,52
<i>Prolongar a Cruzeiro da Sul até Eng. Caetano Alvares; Prolongar Engº Caetano Alvares até a Maria Amália Azevedo; Prolongamento da Av Luis dumont Villares; Duplicação da Rua Darzan; Viário de acesso do Hospital Parelheiros; Av. N. Sra. do Ó, Rua Papoterra Limongi, Rua José Fiúza Guimarães; Av. do Imperador até a Av. Nordestina; Itaquera / Itaqueruna; Av. Rio das Pedras Túnel da Senna Madureira Av. Presidente Wilson Av. Santos Dumont; Prolongamento da Av. Auro Soares de Moura Andrade Viário fábrica do Samba Jardim Lapena - Caminhabilidade Outras intervenções a definir (Rua Afeganistão, Rua Carneiro Leão, Rua Canuto Borelli (Estrada da Servidão), Rua José Ferreira Paz, nº 250, Av. Tiradentes, Av. Rubem Berto, Ruas João Dias da Silva e Rua Oscar de Moura Lacerda) Gerenciamento (Ger)</i>	34.132.697,73	-	34.132.697,73	40.234.131,10	40.019.006,91	215.124,19	126.645,61	40.145.652,52
	2.982.000,00	-	2.982.000,00	-	-	-	-	-
Intervenções na Área de Mobilidade Urbana	113.872.610,00	-	113.872.610,00	90.060.309,59	70.461.918,52	19.598.391,07	18.971.276,80	89.433.195,32
Avenida Amador Bueno (MOB)								
Avenida Imirim (MOB)								
Corredor Santo Amaro / João Dias (MOB)								
Corredor Estrada de Itapeçerica (MOB)	104.372.610,00	-	104.372.610,00	83.449.377,10	64.732.559,51	18.716.817,59	18.131.305,13	82.863.864,64
Avenida Interlagos (MOB)								
Outras intervenções a definir								
Gerenciamento (Ger)	9.500.000,00	-	9.500.000,00	6.610.932,49	5.729.359,01	881.573,48	839.971,67	6.569.330,68

PLANO ANUAL DE APLICAÇÃO 2025 – SIURB x FUNDURB

PLANO ANUAL DE APLICAÇÃO 2025 - AÇÕES	Valor Aprovado 2025 (Res 002/2026)	Valor Aprovado 2023 (Res 002/2026)	Total Aprovado	Total Empenhado	Pago Até 31/12/2025	Saldo Inscrito em Restos a Pagar	Valor pago até 29/04/2026 (Restos a Pagar)	Total Pago (R\$)
Recuperação e Reforço de Obras de Arte Especiais - OAE	100.581.003,94	60.000.000,00	160.581.003,94	172.956.897,67	69.964.046,71	102.992.850,96	85.894.428,02	155.858.474,73
<i>Intervenções para obras de recuperação estrutural e funcional. (MOB)</i>	97.511.185,62	60.000.000,00	157.511.185,62	170.109.414,64	68.325.741,40	101.783.673,24	84.815.296,45	153.141.037,85
<i>Emergencial OAE's (MOB)</i>								
<i>Gerenciamento (Ger)</i>	3.069.818,32	-	3.069.818,32	2.847.483,03	1.638.305,31	1.209.177,72	1.079.131,57	2.717.436,88
Inspeção de Obras de Artes Especiais - OAE	1.000.000,00	-	1.000.000,00	526.854,01	-	526.854,01	526.854,01	526.854,01
<i>Inspeções visuais e especiais a definir</i>	910.000,00	-	910.000,00	526.854,01	-	526.854,01	526.854,01	526.854,01
<i>Gerenciamento (Ger)</i>	90.000,00	-	90.000,00	-	-	-	-	-
Construção e Implantação de Equipamentos Públicos	1.000,00	-	1.000,00		-		-	-
<i>Projeto executivo e obras a definir</i>	910,00	-	910,00	-	-	-	-	-
<i>Gerenciamento (Ger)</i>	90,00	-	90,00	-	-	-	-	-
Construção e Implantação do Parque Minhocão	2.000,00	-	2.000,00		-		-	-
<i>Projeto executivo e obras</i>	1.820,00	-	1.820,00	-	-	-	-	-
<i>Gerenciamento (Ger)</i>	180,00	-	180,00	-	-	-	-	-
Intervenções no Sistema de Drenagem	1.000,00	-	1.000,00		-		-	-
<i>Intervenções a definir</i>	910,00	-	910,00	-	-	-	-	-
<i>Gerenciamento (Ger)</i>	90,00	-	90,00	-	-	-	-	-
Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos - Preventivas	2.000,00	-	2.000,00		-		-	-
<i>Intervenções a definir</i>	1.820,00	-	1.820,00	-	-	-	-	-
<i>Gerenciamento (Ger)</i>	180,00	-	180,00	-	-	-	-	-
TOTAL	410.483.635,16	137.200.000,00	547.683.635,16	543.405.550,46	357.449.181,69	185.956.368,77	155.799.765,35	513.248.947,04


PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL 2025 – SIURB x FUNDURB

Objeto	Implantação de Estrutura Turística no Triângulo Histórico e Quadrilátero Histórico no Centro
Processo SEI	7910.2021/0001245-6 7910.2022/0001652-6 7910.2022/0001240-7 6022.2023/0004371-1 6022.2025/0005909-3 6022.2025/0004007-4 6022.2023/0004372-0
Endereço	Sé, República
Situação	Em execução
Valor Pago até 29/04/2026 [MOB]:	R\$ 3.612.106,60
Valor Pago até 29/04/2026 [GER]:	R\$ 208.524,78

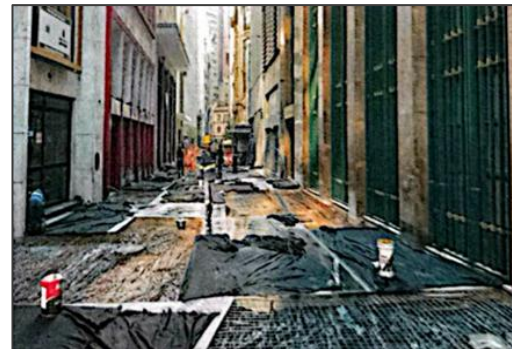


PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL 2025 – SIURB x FUNDURB

Objeto	Implantação e Construção de Corredores de Ônibus
Processo SEI	6022.2023/0007634-2 6022.2024/0000043-7 7910.2021/0001247-2 6022.2024/0007147-4
Endereço	Avenida Radial Leste – Terminal Parque Dom Pedro II até Rua Prof. Miguel Russiano
Situação	Em execução
Valor Pago até 29/04/2026 [MOB]:	R\$ 10.787.146,51
Valor Pago até 29/04/2026 [GER]:	R\$ 173.976,42

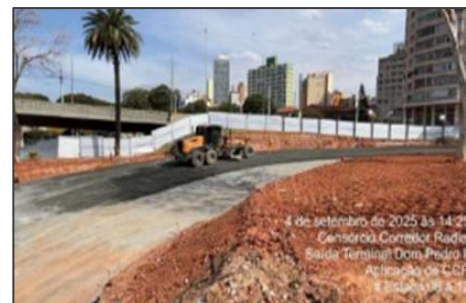

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL 2025 – SIURB x FUNDURB

Objeto	Implantação e Construção de Terminais de Ônibus
Processo SEI	7910.2022/0000592-3 6022.2023/0002443-1 6022.2024/0000197-2
Endereço	Rua Dr. Luis Aires – Av. Radial Leste
Situação	Em execução
Valor Pago até 29/04/2026 [MOB]:	R\$ 1.675.637,31
Valor Pago até 29/04/2026 [GER]:	R\$ 50.573,12

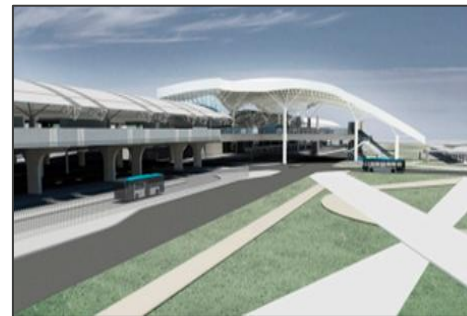

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL 2025 – SIURB x FUNDURB

Objeto	Intervenções no Sistema Viário [MOB]
Processo SEI	7910.2017/0000431-6 7910.2024/0001716-0 6022.2024/0009876-3 6022.2025/0008321-0 6022.2023/0005694-5 6022.2023/0006708-4 7910.2020/0000614-4 6022.2025/0003770-7 7910.2019/0000053-5
Endereço	Diversos
Situação	Em execução
Valor Pago até 29/04/2026 [MOB]:	R\$ 32.517.367,42
Valor Pago até 29/04/2026 [GER]:	R\$ 1.255.228,75



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL 2025 – SIURB x FUNDURB

Objeto	Intervenções no Sistema Viário
Processo SEI	6022.2025/0004003-1 6022.2024/0009875-5
Endereço	Diversos
Situação	Em execução
Valor Pago até 29/04/2026:	R\$ 126.645,61
Valor Pago até 29/04/2026 [GER]:	R\$ 0,00



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL 2025 – SIURB x FUNDURB

Objeto	Intervenções na Área de Mobilidade Urbana
Processo SEI	7910.2022/0001454-0 7910.2022/0001455-8 7910.2019/0000179-5 7910.2022/0001457-4 7910.2022/0001456-6 6022.2025/0003610-7 6022.2025/0003276-4 6022.2023/0000199-7 6022.2023/0000205-5
Endereço	Diversos
Situação	Em execução
Valor Pago até 29/04/2026 [MOB]:	R\$ 18.131.305,13
Valor Pago até 29/04/2026 [GER]:	R\$ 839.971,67



PRESTAÇÃO DE CONTAS FNAL 2025 – SIURB x FUNDURB

Objeto	Recuperação e Reforço de Obras de Arte Especiais – OAE / Inspeção de Obras de Artes Especiais - OAE
Processo SEI	6022.2025/0006143-8 6022.2025/0004258-1 6022.2025/0004260-3 6022.2025/0004890-3 7910.2024/0002430-1 7910.2022/0000470-6 6022.2025/0006019-9 6022.2025/0006235-3 6022.2025/0006239-6 6022.2025/0006405-4 6022.2025/0006477-1 6022.2025/0006499-2 7910.2022/0000469-2 6022.2025/0005659-0 7910.2024/0002439-5 6022.2023/0006380-1 7910.2022/0000976-7 7910.2022/0000477-3 7910.2022/0000605-9 7910.2022/0000970-8 6022.2023/0000512-7 7910.2024/0002429-8 7910.2024/0002433-6 7910.2022/0000680-6 6022.2025/0004979-9 6022.2024/0008346-4 6022.2024/0005770-6 6022.2025/0002252-1 6022.2025/0006198-5 6022.2022/0005639-0 7910.2022/0001189-3 7910.2022/0000977-5 7910.2022/0000978-3 7910.2022/0000979-1 7910.2022/0001185-0 7910.2022/0001187-7 7910.2023/0000336-1 7910.2022/0000674-1 7910.2022/0000681-4 6022.2024/0000368-1 6022.2025/0006178-0 6022.2024/0005622-0 7910.2023/0001623-4 6022.2024/0000106-9
Endereço	Diversos
Situação	Em execução
Valor Pago até 29/04/2026 [MOB]:	R\$ 84.815.296,45
Valor Pago até 29/04/2026 [GER]:	R\$ 1.605.985,58





**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

