

FUNDURB | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL | SVMA 2025

FUNDURB – PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL SVMA - 2025


AÇÃO	META PdM	PROJETO	PROCESSO	TOTAL	SOLICITADO FUNDURB (APROVADO)	EMPENHADO	PAGO ATÉ 31/12/2025	INSCRITO RESTOS A PAGAR	PAGO RESTOS A PAGAR	PAGO TOTAL
Obras, serviços e projetos para ações de requalificação e conservação da Marquise José Ermírio de Moraes do Parque Ibirapuera	Meta 2	Ampliação, Reforma e Requalificação de Parques Urbanos e Lineares	6027.2024/0004766-0	R\$ 88.056.385,06	R\$ 45.478.924,25	R\$ 45.478.924,25	R\$ 38.602.722,94	R\$ 7.899.329,41	R\$ 6.802.204,99	R\$ 45.404.927,93
Obras de requalificação para o Parque Municipal do Carmo - Olavo Egydio Setúbal	Meta 2	Ampliação, Reforma e Requalificação de Parques Urbanos e Lineares	6027.2023/0017123-7	R\$ 98.214.624,53	R\$ 25.000.000,00	R\$ 25.000.000,00	R\$ 17.100.670,59	R\$ 6.876.201,31	R\$ 6.929.328,83	R\$ 24.029.999,42
Construção de Parques	n/a	Construção de Parques	Não há	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Construção e implantação de Unidades de Conservação	n/a	Construção e implantação de Unidades de Conservação	Não há	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidades de Conservação	n/a	Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidades de Conservação	Não há	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL FUNDURB					R\$ 70.481.924,25	R\$ 70.478.924,25	R\$ 55.703.393,53	R\$ 14.775.530,72	R\$ 13.731.533,82	R\$ 69.434.927,35

Parque Ibirapuera | Marquise José Ermírio de Moraes

Ação: Obras, serviços e projetos para ações de requalificação e conservação da Marquise José Ermírio de Moraes

Processo: 6027.2024/0004766-0 | Situação: concluído (Ordem de Início em 03/03/2024)

Valor Reajustado: R\$ 88.056.385,06 / Empenhado: R\$ 45.478.924,25 / Liquidado: R\$ 45.404.927,93 (99%)

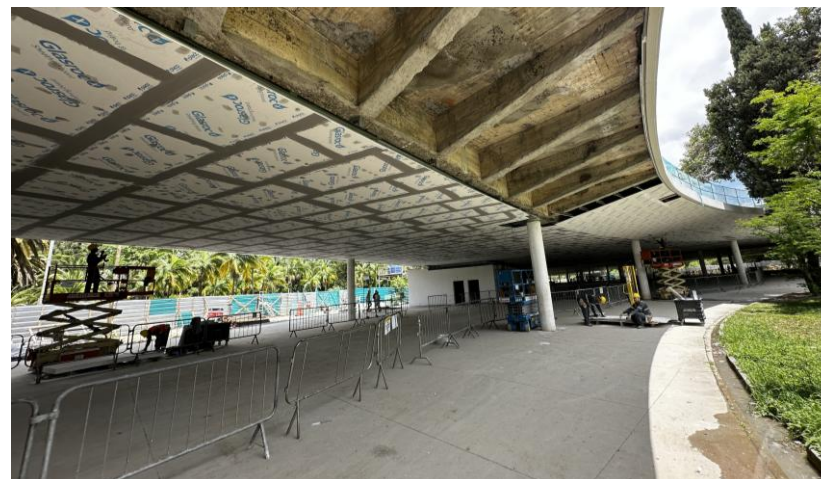

Parque do Carmo - Olavo Egydio Setúbal

Ação: Obras de requalificação para o Parque Municipal do Carmo - Olavo Egydio Setúbal

Processo: 6027.2023/0017123-7 | Situação: em andamento (Ordem de Início em 31/03/2024)

Valor Reajustado: R\$ 101.853.710,67 / Valor empenhado: R\$ 25.000.000,00 / Liquidado: R\$ 24.029.999,42 (96%)



Imagens novembro/2025 e janeiro/2026



OBRIGADA!!
