

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2025 NOVEMBRO

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FUNDURB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEME

PROCESSO SEI: 6019.2024/0003320-7



**CIDADE DE
SÃO PAULO
ESPORTES E LAZER**

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL NOVEMBRO DE 2025

RESOLUÇÃO SMUL.ATECC.FUNDURB/044/2025 -

em R\$

VALORES RELATIVOS AO SISTEMA SOF EM 17/11/2025



CIDADE DE
SÃO PAULO
ESPORTES E LAZER

Nº	OBJETO	APROVADO RES. SMUL.ATECC.FUNDUR B/044/2025	EMPENHADO	% EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% PAGO EM RELAÇÃO AO EMPENHADO
1	Requalificação do CE Jardim Celeste (Balneário Mário Moraes)	R\$ 2.896.617,96	R\$ 2.896.617,96	100,00%	R\$ 2.896.605,48	R\$ 2.896.605,48	100,00%
2	Requalificação do CE Jaguaré (Mini Balneário Marechal Espiridião Rosas)	R\$ 1.737.818,35	R\$ 1.737.818,35	100,00%	R\$ 1.724.013,55	R\$ 1.724.013,55	99,21%
3	Requalificação do CE Casa Verde (Mini Balneário Comandante Garcia D'ávila)	R\$ 4.227.208,56	R\$ 4.227.208,56	100,00%	R\$ 4.227.100,01	R\$ 4.227.100,01	100,00%
4	Requalificação do CE Vila Guarani (Ryuso Ogawa)	R\$ 2.235.642,11	R\$ 2.235.642,11	100,00%	R\$ 2.235.642,11	R\$ 2.235.642,11	100,00%
5	Requalificação do CE Santo Amaro (Joerg Bruder)	R\$ 2.749.858,53	R\$ 2.749.858,53	100,00%	R\$ 2.749.841,45	R\$ 2.749.841,45	100,00%
6	Requalificação do CDC Parque Veredas II	R\$ 1.268.947,37	R\$ 1.268.947,37	100,00%	R\$ 1.040.132,58	R\$ 269.359,19	21,23%
7	Requalificação do CDC Boni 4	R\$ 1.094.962,31	R\$ 1.094.962,31	100,00%	R\$ 856.015,30	R\$ 241.947,68	22,10%
8	Requalificação do CDC Batti Fácil	R\$ 500.000,32	R\$ 500.000,32	100,00%	R\$ -	R\$ -	0,00%
9	Requalificação do CDC Jd Lapenna	R\$ 646.000,00	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -	0,00%
10	Requalificação do Centro Esportivo Aclimação	R\$ 1.722.213,96	R\$ 1.610.259,66	93,50%	R\$ 1.610.259,66	R\$ 1.423.185,65	88,38%
11	Requalificação do CE Tatuapé (Brigadeiro Eduardo Gomes)	R\$ 5.972.963,00	R\$ 5.972.963,00	100,00%	R\$ 4.654.736,99	R\$ 4.654.736,99	89,98%
12	Requalificação de CDC Campo do Parque Conquista	R\$ 745.114,48	R\$ 745.114,48	100,00%	R\$ 745.114,48	R\$ 745.114,48	100,00%
13	Requalificação do CE Teotônio Vilela	R\$ 606.000,00	R\$ 606.000,00	100,00%	R\$ -	R\$ -	0,00%
14	Requalificação de CDC Parque Santa Madalena	R\$ 300.000,00	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -	0,00%
15	Requalificação CE Raul Tabajara	R\$ 3.383.213,98	R\$ 621.615,40	18,37%	R\$ 621.615,40	R\$ -	0,00%
	TOTAL	R\$ 30.086.560,93	R\$ 25.467.350,79	87,30%	R\$ 23.361.077,01	R\$ 21.167.546,59	80,59%

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL NOVEMBRO DE 2025 MAPA DAS INTERVENÇÕES



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL NOVEMBRO
DE 2025

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO 1. Requalificação do Centro Esportivo Jardim Celeste (Balneário Mário Moraes)

DESCRIÇÃO	
Ação	Ampliação, reforma e requalificação de equipamentos esportivos
Endereço/Distrito/Subprefeitura	Rua Edward Carmilo, Nº 840 – Jardim Celeste – São Paulo – SP
Situação	Reforma em andamento
Processo Administrativo	6019.2023/0001553-3
Início da Obra	12/2023
Previsão de Término	07/2025
Unidade de Medida	Usuários / metros quadrados construídos
Possui mais de uma Fonte de Recurso	Sim, Tesouro Municipal

INVESTIMENTO 2025	
Valor Aprovado	R\$ 2.896.617,96
Valor Empenhado	R\$ 2.896.617,96
Valor Pago	R\$ 2.896.605,48
Percentual Pago/Aprovado	100



FINALIZADO

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL NOVEMBRO DE 2025



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
ESPORTES E LAZER

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO 1. Requalificação do Centro Esportivo Jardim Celeste (Balneário Mário Moraes)



FINALIAZAÇÃO



FINALIAZAÇÃO



PINTURA ÁREA EXTERNA



FINALIAZAÇÃO



FINALIAZAÇÃO



INSTALAÇÃO ELÉTRICA ILUMINAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL NOVEMBRO
DE 2025

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO 2. Requalificação do Centro Esportivo Jaguaré (Mini Balneário Marechal Espiridião Rosas)

DESCRIÇÃO	
Ação	Ampliação, reforma e requalificação de equipamentos esportivos
Endereço/Distrito/Subprefeitura	Rua General Mac Arthur, Nº 1304 – Jaguaré - São Paulo – SP
Situação	Reforma em andamento
Processo Administrativo	6019.2023/0001554-1
Início da Obra	12/2023
Término	03/2025
Unidade de Medida	Usuários / metros quadrados construídos
Possui mais de uma Fonte de Recurso	Sim, Tesouro Municipal

INVESTIMENTO 2025	
Valor Aprovado	R\$ 1.737.818,35
Valor Empenhado	R\$ 1.737.818,35
Valor Pago	R\$ 1.724.013,55
Percentual Pago/Aprovado	99,21



FINALIZADO

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL NOVEMBRO DE 2025

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
ESPORTES E LAZER

OBJETO 2. Requalificação do Centro Esportivo Jaguaré (Mini Balneário Marechal Espiridião Rosas)



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL NOVEMBRO
DE 2025

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO 3. Requalificação do Centro Esportivo Casa Verde (Mini Balneário Comandante Garcia D’ávila)

DESCRIÇÃO	
Ação	Ampliação, reforma e requalificação de equipamentos esportivos
Endereço/Distrito/Subprefeitura	Rua Armando Coelho e Silva, Nº 775 – Parque Peruche - São Paulo – SP.
Situação	Reforma em andamento
Processo Administrativo	6019.2023/0001556-8
Início da Obra	11/2023
Término	04/2025
Unidade de Medida	Usuários / metros quadrados construídos
Possui mais de uma Fonte de Recurso	Sim, Tesouro Municipal

INVESTIMENTO 2025	
Valor Aprovado	R\$ 4.227.208,56
Valor Empenhado	R\$ 4.227.208,56
Valor Pago	R\$ 4.227.100,01
Percentual Pago/Aprovado	100,00



FINALIZADO

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL NOVEMBRO DE 2025

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
ESPORTES E LAZER

OBJETO 3. Requalificação do Centro Esportivo Casa Verde (Mini Balneário Comandante Garcia D'ávila)



ALAMBRADO GINÁSIO




INTALAÇÃO AQUECEDORES A GÁS - CHAMINÉS



PINTURA ESTRUTURA METÁLICA PISCINA



QUADRA COBERTA

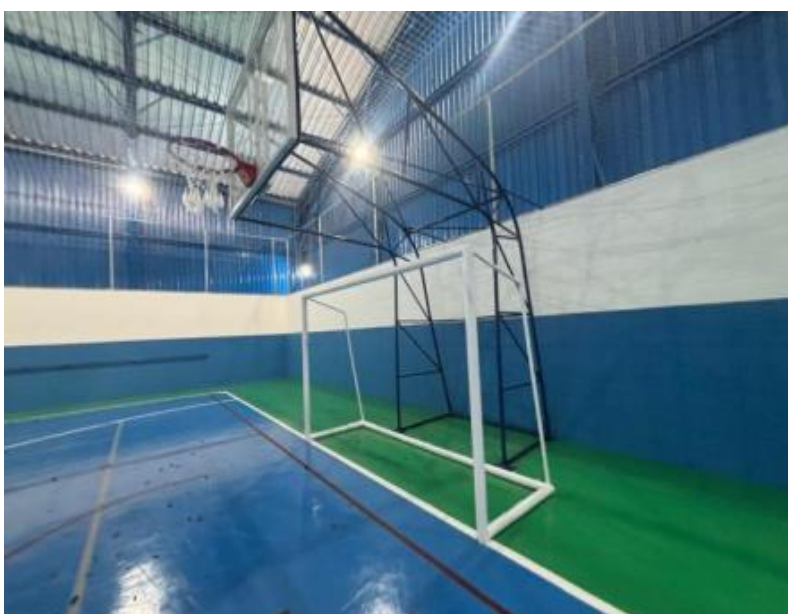

PINTURA INTERNA GINÁSIO



CILINDROS GÁS GLP



RAIAS FLUTUANTES - PISCINA



ÁREA EXTERNA

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL NOVEMBRO DE 2025

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO 4. Requalificação do Centro Esportivo Vila Guarani (Ryuso Ogawa)

DESCRIÇÃO	
Ação	Ampliação, reforma e requalificação de equipamentos esportivos
Endereço/Distrito/Subprefeitura	Rua Lussanvira, 178 - Vila Guarani - São Paulo - SP / CEP: 04316-000
Situação	Reforma em andamento
Processo Administrativo	6019.2023/0003453-8
Início da Obra	12/2023
Término	03/2025
Unidade de Medida	Usuários / metros quadrados construídos
Possui mais de uma Fonte de Recurso	Sim, Tesouro Municipal



INVESTIMENTO 2025	
Valor Aprovado	R\$ 2.235.642,11
Valor Empenhado	R\$ 2.235.642,11
Valor Pago	R\$ 2.235.642,11
Percentual Pago/Aprovado	100

FINALIZADO

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL NOVEMBRO DE 2025

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
ESPORTES E LAZER

OBJETO 4. Requalificação do Centro Esportivo Vila Guarani (Ryuso Ogawa)



FOTO 49 – QUADRA HOQUEI XVI



FOTO 68 – ILUMINAÇÃO EXTERNA I



FOTO 62 - BANCO DE RESERVAS VIII
(PINTURA, SERRALHERIA, COBERTURA E PISO)



FOTO 136 – PLACAR FINAL II



FOTO 86 – VESTIÁRIO MASCULINO
PISCINA FINAL II



FOTO 88 – VESTIÁRIO PCD I



FOTO 121 – QUADRA E BANCO DE
RESERVAS E RAMPA FINAL VI



FOTO 123 – QUADRA E BANCO DE
RESERVAS E RAMPA FINAL VIII

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL NOVEMBRO DE 2025

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO 5. Requalificação do Centro Esportivo Santo Amaro (Joerg Bruder)

DESCRIÇÃO	
Ação	Ampliação, reforma e requalificação de equipamentos esportivos
Endereço/Distrito/Subprefeitura	Av. Padre José Maria, 555 – Santo Amaro – São Paulo – SP CEP: 04753-060
Situação	Reforma em andamento
Processo Administrativo	6019.2023/0003454-6
Início da Obra	12/2023
Previsão de Término	03/2025
Unidade de Medida	Usuários / metros quadrados construídos
Possui mais de uma Fonte de Recurso	Sim, Tesouro Municipal

INVESTIMENTO 2025	
Valor Aprovado	R\$ 2.749.858,53
Valor Empenhado	R\$ 2.749.858,53
Valor Pago	R\$ 2.749.841,45
Percentual Pago/Aprovado	100%



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Objeto: CENTRO ESPORTIVO JOERG BRUDER.
Local: AV. PADRE JOSÉ MARIA, 555 - SANTO AMARO / SP - CEP 04753-060



FINALIZADO

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL NOVEMBRO DE 2025

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
ESPORTES E LAZER

OBJETO 5. Requalificação do Centro Esportivo Santo Amaro (Joerg Bruder)



SP, São Paulo, Santo Amaro, Rua Humboldt

ESPAÇO - PLAYGROUND



PISCINA OLÍMPICA



SP, São Paulo, Santo Amaro, Rua Humboldt

PISCINA SEMI OLÍMPICA – AQUECIMENTO



PISCINA SEMI OLÍMPICA - FECHAMENTO



SP, São Paulo, Santo Amaro

QUADRAS DE ESPORTES - DEPOIS



SP, São Paulo, Santo Amaro, Rua Humboldt

BEACH TENIS - DEPOIS



SP, São Paulo, Santo Amaro, Avenida Padre José Maria

QUADRA DE TENIS – DEPOIS



SP, São Paulo, Santo Amaro, Rua Humboldt

COBERTURA SALA DE GINÁSTICA E BOXE -

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL NOVEMBRO DE 2025

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO 6. Requalificação do CDC Parque Veredas II

DESCRIÇÃO	
Ação	Requalificação de Equipamento Esportivo (CDC)
Endereço/Distrito/Subprefeitura	R. Magnólia Azul, 94 - Jardim Camargo Novo, São Paulo - SP, 08141-640
Situação	Dada ordem de início
Processo Administrativo	6019.2023/0004148-8
Início da Obra	07/2025
Previsão de Término	01/2026
Unidade de Medida	Usuários / metros quadrados construídos
Possui mais de uma Fonte de Recurso	Não

INVESTIMENTO 2025	
Valor Aprovado	R\$ 1.268.947,37
Valor Empenhado	R\$ 1.268.947,37
Valor Pago	R\$ 269.359,19
Percentual Pago/Aprovado	21,23%



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL NOVEMBRO DE 2025

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
ESPORTES E LAZER

OBJETO 6. Requalificação do CDC Parque Veredas II



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL NOVEMBRO DE 2025

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO 7. Requalificação do CDC Boni 4

DESCRIÇÃO	
Ação	Requalificação de Equipamento Esportivo (CDC)
Endereço/Distrito/Subprefeitura	Conj. Res. José Bonifácio, São Paulo - SP, 08255-130
Situação	Dada ordem de início
Processo Administrativo	6019.2023/0004195-0
Início da Obra	08/2025
Previsão de Término	01/2026
Unidade de Medida	Usuários / metros quadrados construídos
Possui mais de uma Fonte de Recurso	Não

INVESTIMENTO 2025	
Valor Aprovado	R\$ 1.094.962,31
Valor Empenhado	R\$ 1.094.962,31
Valor Pago	R\$ 241.947,68
Percentual Pago/Aprovado	22,10%



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL NOVEMBRO DE 2025

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO 7. Requalificação do CDC Boni 4



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
ESPORTES E LAZER



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL NOVEMBRO DE 2025

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO 8. Requalificação do CDC Batti Fácil

DESCRIÇÃO	
Ação	Implantação de Equipamento Esportivo (CDC)
Endereço/Distrito/Subprefeitura	R. Prof. Thiré, 125 - Vila Nhocuné, São Paulo - SP, 03561-010
Situação	Dada ordem de início
Processo Administrativo	6019.2023/0003547-0
Início da Obra	08/2025
Previsão de Término	01/2026
Unidade de Medida	Usuários / metros quadrados construídos
Possui mais de uma Fonte de Recurso	Não

INVESTIMENTO 2025	
Valor Aprovado	R\$ 1.243.344,32
Valor Empenhado	R\$ 1.243.344,32
Valor Pago	0
Percentual Pago/Aprovado	0%



DESCRIÇÃO INDIVIDUAL
OBJETO 8. Requalificação do CDC Batti Fácil



FOTO 03 – LATERAL DIREITA



FOTO 04 – ESCADA LATERAL DIR.



FOTO 01 – LATERAL DIREITA



FOTO 02 – LATERAL DIREITA



FOTO 05 – ACESSO LATERAL ESQ.



FOTO 06 – ACESSO LATERAL ESQ.



FOTO 07 – MURO DE ARRIMO



FOTO 08 – MURO DE ARRIMO

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL NOVEMBRO DE 2025

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO 9. Requalificação do CDC Jd. Lapenna

DESCRIÇÃO	
Ação	Implantação de Equipamento Esportivo (CDC)
Endereço/Distrito/Subprefeitura	R. Serra da Juruoca, s/n - Jardim Lapena, São Paulo - SP, 08071-180
Situação	Objeto em licitação
Processo Administrativo	6019.2024/0003905-1
Início da Obra	09/2025
Previsão de Término	03/2026
Unidade de Medida	Usuários / metros quadrados construídos
Possui mais de uma Fonte de Recurso	Não



INVESTIMENTO 2025	
Valor Aprovado	R\$ 3.090.139,31
Valor Empenhado	0
Valor Pago	0
Percentual Pago/Aprovado	0%

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL NOVEMBRO DE 2025

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO 9. Requalificação do CDC Jd. Lapenna

FOTO 01 - ALAMBRADO	FOTO 02 - ALAMBRADO
	
	
FOTO 09 – ALAMBRADO	FOTO 10 – ALAMBRADO

	
FOTO 05 – CAMPO	FOTO 06 – CAMPO
	
FOTO 07 – CAMPO	FOTO 08 – ALAMBRADO


PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL NOVEMBRO DE 2025

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO 10. Requalificação do Centro Esportivo Aclimação (Estádio Jack Marin)

DESCRIÇÃO	
Ação	Requalificação de Equipamento Esportivo (Centro Esportivo)
Endereço/Distrito/Subprefeitura	Rua Muniz de Sousa, 1119 - Aclimação, São Paulo - SP, 01534-001
Situação	Dada a ordem de início
Processo Administrativo	6019.2023/0004028-7
Início da Obra	08/2025
Previsão de Término	03/2026
Unidade de Medida	Usuários / metros quadrados construídos
Possui mais de uma Fonte de Recurso	Tesouro

INVESTIMENTO 2025	
Valor Aprovado	R\$ 1.722.231,96
Valor Empenhado	R\$ 1.610.259,66
Valor Pago	R\$ 1.423.186,65
Percentual Pago/Aprovado	88,38%

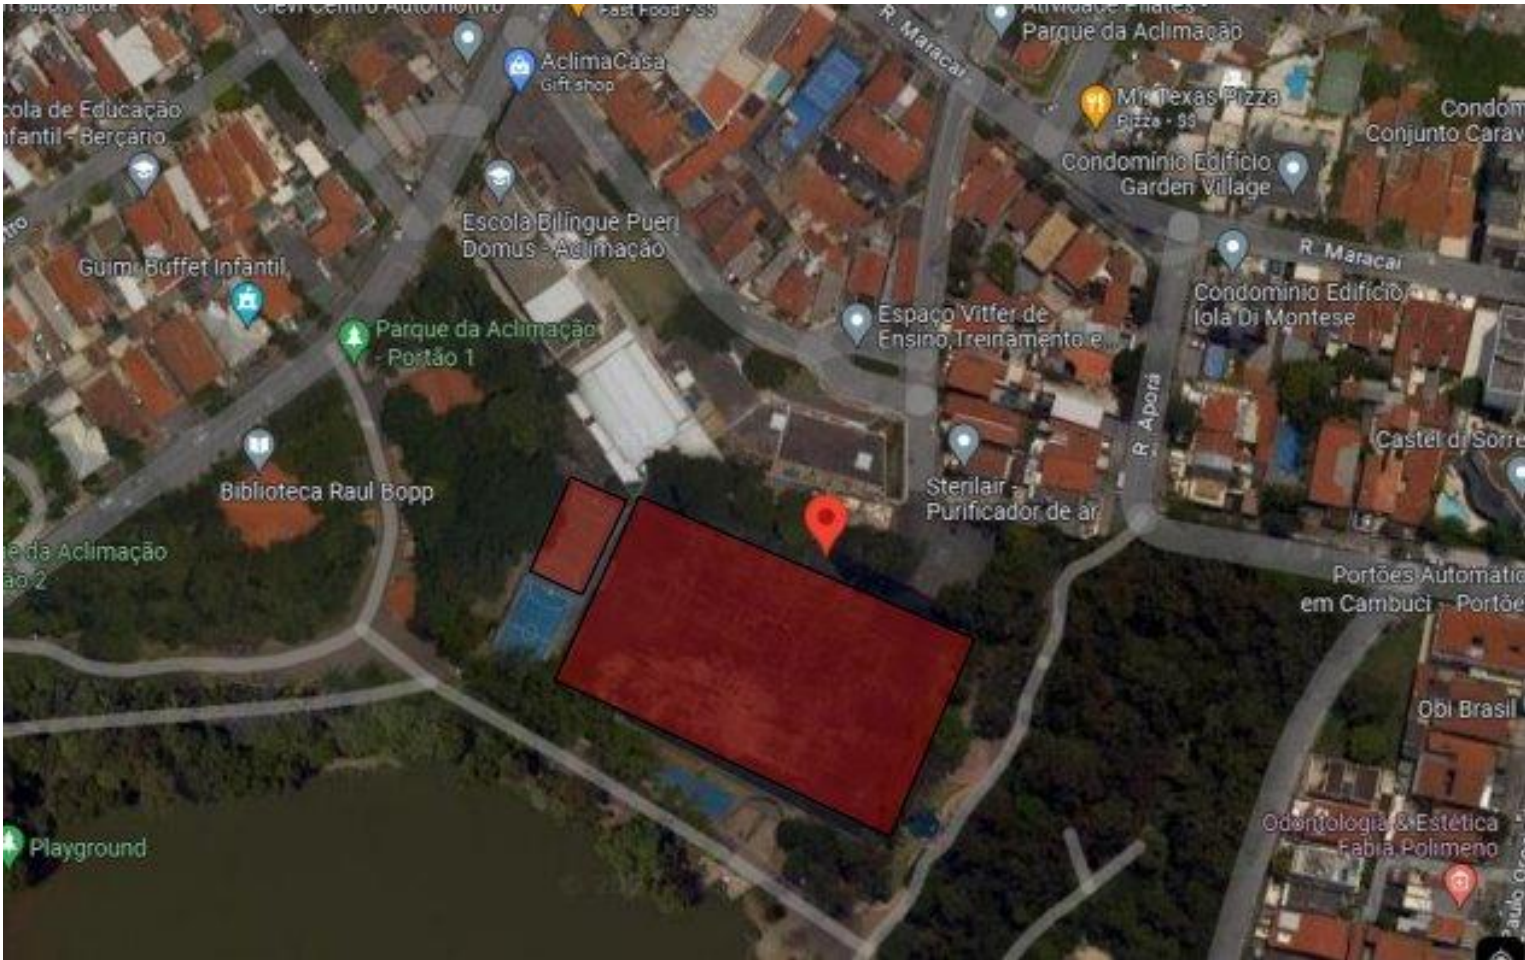

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL NOVEMBRO DE 2025

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
ESPORTES E LAZER

OBJETO 10. Requalificação do Centro Esportivo Aclimação (Estádio Jack Marin)



FOTO 3: INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA



FOTO 5: PINTURA EM LÁTEX



FOTO 4: INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA



FOTO 6: PINTURA EM LÁTEX



FOTO 9: INSTALAÇÃO DE TRAVE



FOTO 10: INSTALAÇÃO DE TRAVE



FOTO 11: FINALIZAÇÃO GRAMA SINTÉTICA



FOTO 21: FINALIZAÇÃO GRAMA SINTÉTICA



FOTO 22: FINALIZAÇÃO GRAMA SINTÉTICA

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL NOVEMBRO DE
2025

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO 11. Requalificação do Centro Esportivo Tatuapé (Brig. Eduardo Gomes)

DESCRIÇÃO	
Ação	Requalificação de Equipamento Esportivo (Centro Esportivo)
Endereço/Distrito/Subprefeitura	R. Apucarana, 233 - Tatuapé, São Paulo - SP, 03311-000
Situação	Em execução
Processo Administrativo	6019.2023/0003966-1
Início da Obra	06/2025
Previsão de Término	02/2026
Unidade de Medida	Usuários / metros quadrados construídos
Possui mais de uma Fonte de Recurso	Tesouro

INVESTIMENTO 2025	
Valor Aprovado	R\$ 5.972.963,00
Valor Empenhado	R\$ 5.972.963,00
Valor Pago	R\$ 4.654.736,99
Percentual Pago/Aprovado	89,98%



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL NOVEMBRO DE 2025

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
ESPORTES E LAZER

OBJETO 11. Requalificação do Centro Esportivo Tatuapé (Brig. Eduardo Gomes)



TRAVES



ESTRUTURA METÁLICA DE DIVISA



ESTRUTURA METÁLICA




ESTRUTURA METÁLICA



ESTRUTURA METÁLICA DE DIVISA



PISO EPDM E PLAYGROUND

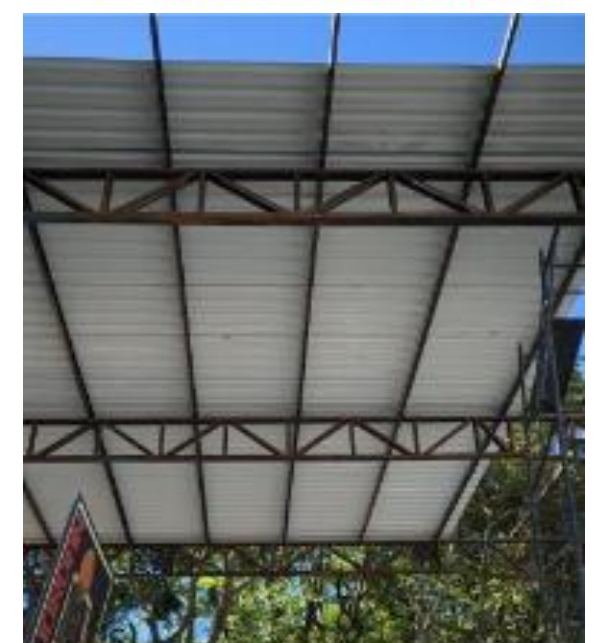

COBERTURA METÁLICA

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL NOVEMBRO DE 2025

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO 12. Requalificação de CDC Campo do Parque Conquista

DESCRIÇÃO	
Ação	Requalificação de Equipamento Esportivo (CDC)
Endereço/Distrito/Subprefeitura	Rua Oscarito, 48 - CEP. 08342-140 - São Paulo - SP
Situação	Em execução
Processo Administrativo	6019.2023/0003160-1
Início da Obra	05/2025
Previsão de Término	12/2025
Unidade de Medida	Usuários / metros quadrados construídos
Possui mais de uma Fonte de Recurso	Tesouro



INVESTIMENTO 2025	
Valor Aprovado	R\$ 745.114,48
Valor Empenhado	R\$ 745.114,48
Valor Pago	R\$ 745.114,48
Percentual Pago/Aprovado	100%

FINALIZADO

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL NOVEMBRO DE 2025

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
ESPORTES E LAZER

OBJETO 12. Requalificação de CDC Campo do Parque Conquista



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL NOVEMBRO DE
2025

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO 13. Requalificação do Centro Esportivo Teotônio Vilela

DESCRIÇÃO	
Ação	Requalificação de Equipamento Esportivo (Centro Esportivo)
Endereço/Distrito/Subprefeitura	RUA CARLO CLAUSETTI, 19 - VILA SAPOPEMBA - SÃO PAULO - SP, 03928-220
Situação	Ordem de início
Processo Administrativo	6019.2023/0003902-5
Início da Obra	outubro/2025
Previsão de Término	março/2025
Unidade de Medida	Usuários / metros quadrados construídos
Possui mais de uma Fonte de Recurso	Não



INVESTIMENTO 2025	
Valor Aprovado	R\$ 606.000,00
Valor Empenhado	R\$ 606.000,00
Valor Pago	R\$ 0
Percentual Pago/Aprovado	0%

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL NOVEMBRO DE 2025

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
ESPORTES E LAZER

OBJETO 13. Requalificação do Centro Esportivo Teotônio Vilela



FOTO 37 – ÁREA EXTERNA CAMPO



FOTO 33 - TRAVE



FOTO 05 – GRAMADO E ALAMBRADO



FOTO 06 - VESTIÁRIO



FOTO 39 - GRAMADO



FOTO 35 - TRAVE



FOTO 07 - GRAMADO



FOTO 08 – ALAMBRADO E MURETA

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL NOVEMBRO DE 2025

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO 14. Requalificação do CDC Parque Santa Madalena

DESCRIÇÃO	
Ação	Requalificação de Equipamento Esportivo (CDC)
Endereço/Distrito/Subprefeitura	Av. Dr. Paulo Colombo Pereira de Queiroz, 470, CEP 03982-130
Situação	Em elaboração do pacote técnico de engenharia para licitação
Processo Administrativo	6019.2025/0003865-0
Início da Obra	Dezembro/2025
Previsão de Término	Abril/2026
Unidade de Medida	Usuários / metros quadrados construídos
Possui mais de uma Fonte de Recurso	Não

INVESTIMENTO 2025	
Valor Aprovado	R\$ 300.000,00
Valor Empenhado	R\$ 0
Valor Pago	R\$ 0
Percentual Pago/Aprovado	0%



OBJETO 14. Requalificação do CDC Parque Santa Madalena



FOTO 01 – ÁREA EXTERNA CAMPO



FOTO 36 – ÁREA EXTERNA CAMPO



FOTO 35 - TRAVE



FOTO 07 - GRAMADO

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL NOVEMBRO DE
2025

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO 15. Requalificação do Centro Esportivo Raul Tabajara (Barra Funda)

DESCRIÇÃO	
Ação	Requalificação de Equipamento Esportivo (Centro Esportivo)
Endereço/Distrito/Subprefeitura	R. Anhanguera, 484 - Barra Funda, São Paulo - SP, 01135-000
Situação	Em fase de instrução para publicação do edital
Processo Administrativo	6019.2023/0001560-6
Início da Obra	11/2025
Previsão de Término	11/2026
Unidade de Medida	Usuários / metros quadrados construídos
Possui mais de uma Fonte de Recurso	Não



INVESTIMENTO 2025	
Valor Aprovado	R\$ 3.383.213,98
Valor Empenhado	R\$ 621.615,40
Valor Pago	R\$ 0
Percentual Pago/Aprovado	0%

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL NOVEMBRO DE 2025

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
ESPORTES E LAZER

OBJETO 15. Requalificação do Centro Esportivo Raul Tabajara (Barra Funda)



ADM - COBERTURA VESTI. NOVO



ADM - TELA DE AÇO - POÇO PLATAFORMA



PLAY GROUND - BALANÇO FRONTAL DUPLO



PISTA SKATE - BLOCOS DE CONCRETO



ADM - COBERTURA VESTI. NOVO



ADM - TELA DE AÇO - VESTIÁRIOS



PLAY GROUND - GANGORRA



PISTA SKATE - BLOCOS DE CONCRETO
