

PLANO DE INVESTIMENTO – 2025
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
SIURB X FUNDURB



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2025

PLANO 2025 - AÇÕES	Remanescente 2023	Aprovado 2025	TOTAL Res. 042/2025	Liquidado até 31/10/2025
Implantação de Estrutura Turística no Triângulo e Quadrilátero Histórico do Centro	-	22.709.323,49	22.709.323,49	17.591.430,52
Projeto executivo, obras, etc. (MOB)		20.644.839,54	20.644.839,54	16.737.367,73
Gerenciamento (Ger)		2.064.483,95	2.064.483,95	854.062,79
Implantação de Corredores de Ônibus Novos	52.200.000,00	15.200.000,00	67.400.000,00	7.662.018,32
Corredor Radial Leste - Trechos 1 e 2 (MOB)				
Corredor Itaim - São Matheus (MOB)				
Corredor Aricanduva (MOB)	52.200.000,00	10.000.000,00	62.200.000,00	7.620.822,35
Corredor Capão (MOB)				
Corredor Chucri Zaidan (MOB)				
Gerenciamento (Ger)		5.200.000,00	5.200.000,00	41.195,97
Construção de Terminais de Ônibus	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	4.729.892,57
Terminal Itaquera (MOB)		10.000.000,00	10.000.000,00	4.729.892,57
Terminal Itaim (MOB)		1.000.000,00	1.000.000,00	
Gerenciamento (Ger)				
Intervenções no Sistema Viário	-	104.000.000,00	104.000.000,00	34.118.621,26
Ligação Pirituba-Lapa; (MOB)				
Ponte Graúna-Gaivotas; (MOB)				
Marginal Pinheiros; (MOB)				
Av. Senador Teotônio Vilela; (MOB)				
Pontilhão João Beçola. (MOB)		95.000.000,00	95.000.000,00	31.911.007,54
Complexo Viário Ragueb Chohfi (MOB)				
Viaduto (ligação Viária Rua Jequirituba e Rua Prof. Roldão de Barros sob Linha 9 CPTM) (MOB)				
Nova Ponte Jurubatuba (MOB)				
Gerenciamento [GER] (MOB)		9.000.000,00	9.000.000,00	2.207.613,72

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2025

PLANO 2025 - AÇÕES	Remanescente 2023	Aprovado 2025	TOTAL Res. 042/2025	Liquidado até 31/10/2025
Intervenções no Sistema Viário		37.114.697,73	37.114.697,73	8.030.230,87
<i>Prolongar a Cruzeiro do Sul até Eng. Caetano alvares; Prolongar Engº Caetano Álvares até a Maria Amália Azevedo; Prolongamento da Av Luis dumont Villares; Duplicação da Rua Darzan; Viário de acesso do Hospital Parelheiros; Av. N. Sra, do Ó, Rua Papaterra Limongi, Rua José Fiúza Guimarães; Av. do Imperador até a Av. Nordestina; Itaquera / Itaqueruna; Av. Rio das Pedras Av. Presidente Wilson Túnel da Senna Madureira Av. Santos Dumont; Prolongamento da Av. Auro Soares de Moura Andrade Viário fábrica do Samba Jardim Lapena - Caminhabilidade Outras intervenções a definir (Rua Afeganistão, Rua Cameiro Leão, Rua Canuto Borelli (Estrada da Servidão), Rua José Ferreira Paz, nº 250, Av. Tiradentes, Av. Rubem Berta, Ruas João Dias da Silva, Av. do Estado e Rua Oscar de Moura Lacerda). Gerenciamento (Ger)</i>		34.132.697,73	34.132.697,73	8.000.094,28
		2.982.000,00	2.982.000,00	30.136,59
Intervenções na Área de Mobilidade Urbana	0,00	113.872.610,00	113.872.610,00	57.636.172,45
<i>Avenida Amador Bueno (MOB) Avenida Imirim (MOB) Corredor Santo Amaro / João Dias (MOB) Corredor Estrada de Itapecerica (MOB) Avenida Interlagos (MOB) Outras intervenções a definir Gerenciamento (Ger)</i>		104.372.610,00	104.372.610,00	52.510.018,71
		9.500.000,00	9.500.000,00	5.126.153,74

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2025

PLANO 2025 - AÇÕES	Remanescente 2023	Aprovado 2025	TOTAL Res. 042/2025	Liquidado até 31/10/2025
Recuperação e Reforço de Obras de Arte Especiais - OAE	10.000.000,00	25.369.978,78	35.369.978,78	12.256.219,53
Intervenções para obras de recuperação estrutural e funcional. (MOB)	10.000.000,00	22.300.160,46	32.300.160,46	12.256.219,53
Emergencial OAE's (MOB)		3.069.818,32	3.069.818,32	-
Gerenciamento (Ger)				
Inspeção de Obras de Artes Especiais - OAE		1.000.000,00	1.000.000,00	-
Inspeções visuais e especiais a definir		910.000,00	-	
Gerenciamento (Ger)		90.000,00	-	
Construção e Implantação de Equipamentos Públicos		1.000,00	1.000,00	-
Projeto executivo e obras a definir		910,00	-	
Gerenciamento (Ger)		90,00	-	
Construção e Implantação do Parque Minhocão		2.000,00	2.000,00	-
Projeto executivo e obras		1.820,00	-	
Gerenciamento (Ger)		180,00	-	
Intervenções no Sistema de Drenagem		1.000,00	1.000,00	-
Intervenções a definir		910,00	-	
Gerenciamento (Ger)		90,00	-	
Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos - Preventivas		2.000,00	2.000,00	-
Intervenções a definir		1.820,00	-	
Gerenciamento (Ger)		180,00	-	
TOTAL	62.200.000,00	330.272.610,00	392.472.610,00	142.024.585,52

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2025

PLANO 2025 - AÇÕES	Remanescente 2023	Aprovado 2025	TOTAL Res. 042/2025	Liquidado até 31/10/2025
Recuperação e Reforço de Obras de Arte Especiais - OAE	10.000.000,00	25.369.978,78	35.369.978,78	12.256.219,53
Intervenções para obras de recuperação estrutural e funcional. (MOB)	10.000.000,00	22.300.160,46	32.300.160,46	12.256.219,53
Emergencial OAE's (MOB)		3.069.818,32	3.069.818,32	-
Gerenciamento (Ger)				
Inspeção de Obras de Artes Especiais - OAE		1.000.000,00	1.000.000,00	-
Inspeções visuais e especiais a definir		910.000,00	-	
Gerenciamento (Ger)		90.000,00	-	
Construção e Implantação de Equipamentos Públicos		1.000,00	1.000,00	-
Projeto executivo e obras a definir		910,00	-	
Gerenciamento (Ger)		90,00	-	
Construção e Implantação do Parque Minhocão		2.000,00	2.000,00	-
Projeto executivo e obras		1.820,00	-	
Gerenciamento (Ger)		180,00	-	
Intervenções no Sistema de Drenagem		1.000,00	1.000,00	-
Intervenções a definir		910,00	-	
Gerenciamento (Ger)		90,00	-	
Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos - Preventivas		2.000,00	2.000,00	-
Intervenções a definir		1.820,00	-	
Gerenciamento (Ger)		180,00	-	
TOTAL	62.200.000,00	270.272.610,00	392.472.610,00	142.024.585,52

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2025

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO: Apoio técnico para fiscalização de obra - Corredor Amador Bueno da Veiga



	DESCRIÇÃO
AÇÃO	Apoio técnico para fiscalização de obra - Amador Bueno da Veiga
ENDEREÇO	Av. Amador Bueno da Veiga
SITUAÇÃO	Em execução
PROCESSO ADM	6022.2023/0000199-7
INICIO DA OBRA	19/06/2024
PREVISAO DE TÉRMINO	30/06/2026
POSSUI MAIS DE UMA	Não



Jul/2025

	INVESTIMENTO 2025	
VALOR EMPENHADO	1.654.061,85	042/25
VALOR LIQUIDADO	1.506.071,28	96,20%

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2025

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO: Apoio técnico para fiscalização de obra - Corredor de ônibus Imirim



DESCRIÇÃO	
AÇÃO	Apoio técnico para fiscalização de obra - Corredor de ônibus Imirim
ENDEREÇO	Avenida Imirim
SITUAÇÃO	Em execução
PROCESSO ADM	6022.2023/0000203-9
INICIO DA OBRA	27/07/2023
PREVISAO DE TÉRMINO	30/06/2026
POSSUI MAIS DE UMA	Não



Set/2025

INVESTIMENTO 2025		
VALOR EMPENHADO	722.764,80	042/25
VALOR LIQUIDADO	722.403,25	99,95%

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2025

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO: SISTEMA DE DRENAGEM E RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO R. DR. LUÍS AIRES ALT, 2030 ATÉ AV. PE SENA FREITAS



DESCRIÇÃO	
AÇÃO	SISTEMA DE DRENAGEM E RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO R. DR. LUÍS AIRES ALT, 2030 ATÉ AV. PE SENA FREITAS
ENDEREÇO	R. DR. LUÍS AIRES ALT, 2030 ATÉ AV. PE SENA
SITUAÇÃO	Em execução
PROCESSO ADM	6022.2023/0004539-0
INICIO DA OBRA	08/07/2024
PREVISAO DE TÉRMINO	08/01/2025
POSSUI MAIS DE UMA	Não



RECUPERAÇÃO DE TUBULAÇÃO



mai/25

INVESTIMENTO 2025		
VALOR EMPENHADO	986.807,31	042/25
VALOR LIQUIDADO	986.807,31	100,00%

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2025

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO: projetos executivos das obras da Ligação Pirituba-Lapa



DESCRIÇÃO	
AÇÃO	Projetos executivos das obras da Ligação Pirituba-Lapa.
ENDEREÇO	Lapa
SITUAÇÃO	Em execução
PROCESSO ADM	6022.2023/0005694-5
INICIO DA OBRA	01/05/2023
PREVISAO DE TÉRMINO	01/08/2028
POSSUI MAIS DE UMA	Não



mai/25

INVESTIMENTO 2025		
VALOR EMPENHADO	1.449.357,65	042/25
VALOR LIQUIDADO	670.323,20	46%

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2025

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO: Avenida Senador Teotônio Vilela, no trecho com início próximo a rua José Nicolau de Lima



DESCRIÇÃO	
AÇÃO	Avenida Senador Teotônio Vilela, no trecho com início próximo a rua José Nicolau de Lima
ENDEREÇO	Rua José Nicolau de Lima
SITUAÇÃO	Em execução
PROCESSO ADM	6022.2023/0006708-4
INICIO DA OBRA	09/05/2024
PREVISAO DE TÉRMINO	30/06/2026
POSSUI MAIS DE UMA	Não

INVESTIMENTO 2025		
VALOR EMPENHADO	10.689.769,49	042/25
VALOR LIQUIDADO	1.537.290,52	14,38%



mai/25

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2025


PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2025

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO: Projeto básico e executivo visando a implantação do Corredor de Ônibus BRT Radial Leste II



DESCRIÇÃO	
AÇÃO	Implantação do Corredor de Ônibus BRT Radial Leste II
ENDEREÇO	Radial Leste
SITUAÇÃO	Em execução
PROCESSO ADM	6022.2023/0007634-2
INICIO DA OBRA	05/09/2024
PREVISAO DE TÉRMINO	31/12/2025
POSSUI MAIS DE UMA	Não

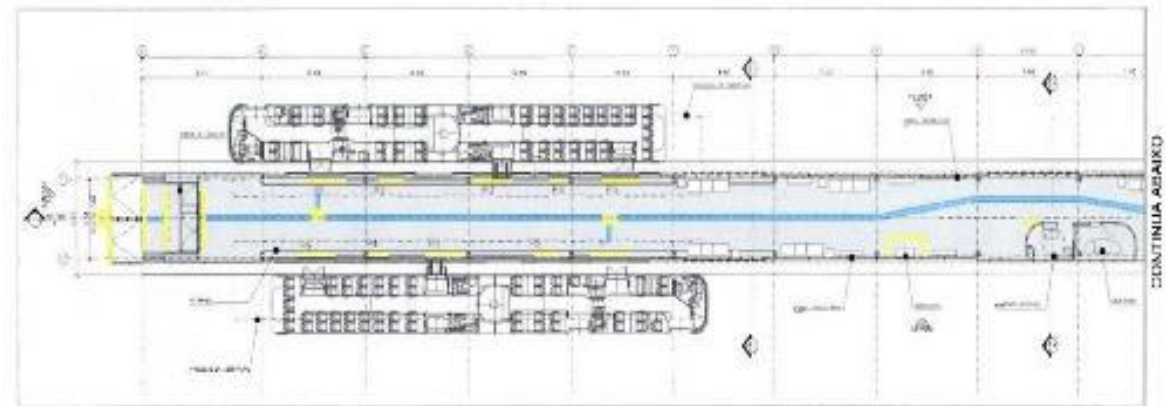

INVESTIMENTO 2025		
VALOR EMPENHADO	8.957.115,70	042/25
VALOR LIQUIDADO	7.620.822,35	85,08%

mai/25

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2025

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO: Calçadas do Quadrilátero na Região Central de São Paulo



DESCRIÇÃO	
AÇÃO	Calçadas do Quadrilátero na Região Central de São Paulo
ENDEREÇO	República
SITUAÇÃO	Em execução
PROCESSO ADM	6022.2024/0000119-0
INICIO DA OBRA	05/06/2024
REVISAO DE TÉRMIN	31/12/2025
POSSUI MAIS DE	Não

INVESTIMENTO 2025		
VALOR EMPENHADO	44.839,54	042/25
VALOR LIQUIDADO	44.839,54	100%



mai/25

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2025

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO: Projeto para execução das obras de implantação da ligação viária Graúna Gaivotas



DESCRIÇÃO	
AÇÃO	Implantação da ligação viária Graúna Gaivotas
ENDEREÇO	Av. das Nações Unidas
SITUAÇÃO	Em execução
PROCESSO ADM	6022.2024/0000199-9
INICIO DA OBRA	26/07/2024
PREVISAO DE TÉRMINO	30/06/2025
POSSUI MAIS DE UMA	Não

INVESTIMENTO 2025		
VALOR EMPENHADO	44.839,54	042/25
VALOR LIQUIDADO	44.839,54	100%



mai/25

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2025

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO: Recuperação de redes de infra e recuperação do viário na Avenida do Estado, na altura do nº 812, no cruzamento com a Avenida Mercúrio



DESCRIÇÃO	
AÇÃO	Recuperação do viário na Avenida do Estado
ENDEREÇO	Avenida do Estado, na altura do nº 812
SITUAÇÃO	Em execução
PROCESSO ADM	6022.2024/0005585-1
INICIO DA OBRA	28/11/2024
PREVISAO DE TÉRMINO	28/11/2025
POSSUI MAIS DE UMA	Não



mai/25

INVESTIMENTO 2025		
VALOR EMPENHADO	34.929.653,05	042/25
VALOR LIQUIDADO	8.000.000,00	22,90%

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2025

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO: Execução de obras do Corredor de Ônibus - BRT Radial Leste I



DESCRIÇÃO	
AÇÃO	BRT Radial Leste I
ENDEREÇO	Rua Professor Miguel Russiano
SITUAÇÃO	Em execução
PROCESSO ADM	6022.2024/0007147-4
INICIO DA OBRA	22/08/2024
REVISAO DE TÉRMIN	21/02/2026
POSSUI MAIS DE	Não



INVESTIMENTO 2025		
VALOR EMPENHADO	48.100.374,76	042/25
VALOR LIQUIDADO	18.677.503,44	38,83%



mai/25

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2025

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO: Recuperação estrutural, recomposição do pavimento e serviços complementares na Marginal do Rio Tietê, sentido Rodovia Presidente Castelo Branco,



	DESCRIÇÃO
AÇÃO	recomposição do pavimento e serviços complementares na Marginal do Rio Tietê, sentido Rodovia Presidente Castelo Branco, próximo à Ponte do Tatuapé.
ENDEREÇO	altura do nº 5.319 da Avenida Morvan Dias de Figueiredo
SITUAÇÃO	Em execução
PROCESSO ADM	6022.2024/0008346-4
INICIO DA OBRA	07/10/2024
PREVISAO DE TÉRMINO	28/12/2025
POSSUI MAIS DE UMA	Não



mai/25

	INVESTIMENTO 2025	
VALOR EMPENHADO	9.993.422,51	042/25
VALOR LIQUIDADO	9.993.422,51	100%

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2025

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO: Elaboração de material técnico para a implantação do Melhoramento Viário Cocaia – Ponte Graúna Gaivotas.



DESCRIÇÃO	
AÇÃO	Ponte Graúna Gaivotas
ENDEREÇO	Rua Carmo Fernandes, nº 205
SITUAÇÃO	Em execução
PROCESSO ADM	6022.2024/0008641-2
INICIO DA OBRA	05/12/2024
PREVISAO DE TÉRMINO	05/06/2025
POSSUI MAIS DE UMA	Não



mai/25

INVESTIMENTO 2025		
VALOR EMPENHADO	490.724,87	042/25
VALOR LIQUIDADO	490.724,87	100%

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2025

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO: Serviços especializados de engenharia consultiva para apoio técnico, topografia, controle tecnológico e ensaios de materiais



DESCRIÇÃO	
AÇÃO	Investigações geotécnicas
ENDEREÇO	Rua Barão de Jaceguai
SITUAÇÃO	Em execução
PROCESSO ADM	6022.2025/0001004-3
INICIO DA OBRA	30/04/2025
PREVISAO DE TÉRMINO	30/05/2025
POSSUI MAIS DE UMA	Não

INVESTIMENTO 2025		
VALOR EMPENHADO	8.705,82	042/25
VALOR LIQUIDADO	8.705,82	100%



mai/25

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2025

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO: Execução das obras de ligação Pirituba-Lapa, implantação das pontes sobre o Rio Tietê e passagem sob a linha 8 – Diamante da CPTM.



DESCRIÇÃO	
AÇÃO	Requalificação da ligação viária Pirituba-Lapa
ENDEREÇO	Av. Raimundo Pereira de
SITUAÇÃO	Em execução
PROCESSO ADM	7910.2017/0000431-6
INICIO DA OBRA	29/06/2016
PREVISAO DE TÉRMINO	22/12/2026
POSSUI MAIS DE UMA	Não



INVESTIMENTO 2025		
VALOR EMPENHADO	25.601.151,60	042/25
VALOR LIQUIDADO	17.687.156,75	69,09%



mai/25

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2025

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO: Projeto adequação dos espaços de interesse turístico no Centro Histórico do Município de São Paulo - República.



mai/25

DESCRIÇÃO	
AÇÃO	Espaços de interesse turístico no Centro Histórico
ENDEREÇO	República
SITUAÇÃO	Em execução
PROCESSO ADM	7910.2020/0000649-7
INICIO DA OBRA	24/05/2021
PREVISAO DE TÉRMINO	26/05/2025
POSSUI MAIS DE UMA	Não

INVESTIMENTO 2025		
VALOR EMPENHADO	331.180,73	042/25
VALOR LIQUIDADO	269.514,75	81%

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2025

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO: Execução das obras de requalificação urbana e reforma das calçadas e calçadões do Centro Velho do Município de São Paulo – Lote 2.



DESCRIÇÃO	
AÇÃO	Calçadas e Calçadões
ENDEREÇO	Centro Velho
SITUAÇÃO	Em execução
PROCESSO ADM	7910.2021/0001245-6
INICIO DA OBRA	01/12/2022
PREVISAO DE TÉRMINO	07/07/2026
POSSUI MAIS DE UMA	Não



mai/25

INVESTIMENTO 2025		
VALOR EMPENHADO	13.068.963,33	042/25
VALOR LIQUIDADO	9.123.272,15	69,81%

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2025


PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2025

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO: Implantação do Corredor de Ônibus Radial Leste Trecho I entre o Terminal Dom Pedro II e Avenida Aricanduva.



DESCRIÇÃO	
AÇÃO	Corredor de ônibus Radial Leste - Trecho I
ENDEREÇO	Av. Aricanduva
SITUAÇÃO	Em execução
PROCESSO ADM	7910.2021/0001247-2
INICIO DA OBRA	27/09/2022
PREVISAO DE TÉRMINO	25/10/2025
POSSUI MAIS DE UMA	Não

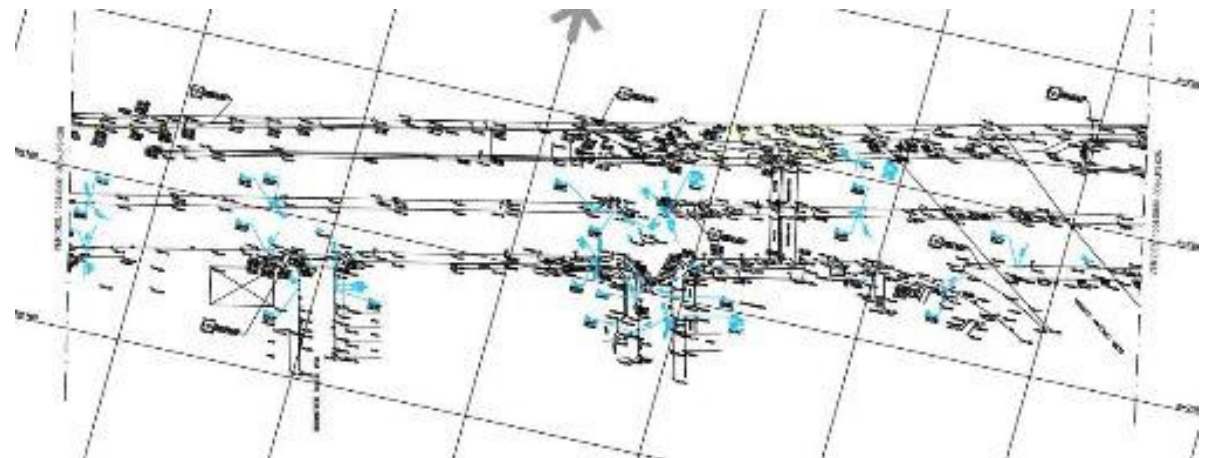

mai/25

INVESTIMENTO 2025		
VALOR EMPENHADO	3.077.256,05	042/25
VALOR LIQUIDADO	991.886,37	32%

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2025

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO: Recuperação Estrutural do Viaduto Antonio Nakashima - Lote 23



DESCRIÇÃO	
AÇÃO	Recuperação Estrutural do Viaduto Antonio Nakashima - Lote 23
ENDEREÇO	Pq. Dom Pedro II
SITUAÇÃO	Em execução
PROCESSO ADM	7910.2022/0000474-9
INICIO DA OBRA	17/07/2023
PREVISAO DE TÉRMINO	16/09/2024
POSSUI MAIS DE UMA	Não



mai/25

INVESTIMENTO 2025		
VALOR EMPENHADO	392.965,85	042/25
VALOR LIQUIDADO	150.717,52	38%

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2025

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO: RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO COMPLEXO VIÁRIO JOÃO JORGE SAAD (CEBOLINHA) E VIADUTO IMIGRANTES - LOTE 13.



DESCRIÇÃO	
AÇÃO	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO COMPLEXO VIÁRIO JOÃO JORGE SAAD (CEBOLINHA) E VIADUTO IMIGRANTES - LOTE 13.
ENDEREÇO	Vila Mariana / Moema
SITUAÇÃO	Concluída
PROCESSO ADM	7910.2022/0000508-7
INICIO DA OBRA	10/10/2023
PREVISAO DE TÉRMINO	09/06/2025
POSSUI MAIS DE UMA	Não



INVESTIMENTO 2025		
VALOR EMPENHADO	214.306,37	042/25
VALOR LIQUIDADO	214.306,37	100%

mai/25

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2025

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO TERMINAL SATÉLITE ITAQUERA



DESCRIÇÃO	
AÇÃO	EXECUÇÃO DE OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO TERMINAL SATÉLITE ITAQUERA
ENDEREÇO	Avenida Prof. Engº Ardevan Machado, Rua Dr. Luiz Aires e Rua Salim Jorge Id
SITUAÇÃO	Em execução
PROCESSO ADM	7910.2022/0000592-3
INICIO DA OBRA	26/07/2023
PREVISAO DE TÉRMINO	23/01/2026
POSSUI MAIS DE UMA	Não



INVESTIMENTO 2025		
VALOR EMPENHADO	9.000.000,00	042/25
VALOR LIQUIDADO	4.729.892,57	52,55%



mai/25

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2025

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO URBANA E REFORMA DAS CALÇADAS E CALÇADÕES DO CENTRO VELHO



DESCRIÇÃO	
AÇÃO	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO URBANA E REFORMA DAS CALÇADAS E CALÇADÕES DO CENTRO VELHO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - LOTE 1.
ENDEREÇO	Centro Histórico
SITUAÇÃO	Em execução
PROCESSO ADM	7910.2022/0001240-7
INICIO DA OBRA	21/10/2022
PREVISAO DE TÉRMINO	20/05/2026
POSSUI MAIS DE UMA	Não



INVESTIMENTO 2025		
VALOR EMPENHADO	10.120.235,30	042/25
VALOR LIQUIDADO	7.299.741,29	72,13%



mai/25

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2025

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO: Reforma do corredor de ônibus da Avenida Amador Bueno da Veiga



DESCRIÇÃO	
AÇÃO	Reforma do corredor de ônibus da Avenida Amador Bueno da Veiga
ENDEREÇO	Micaela Vieira e R. Embira
SITUAÇÃO	Em execução
PROCESSO ADM	7910.2022/0001454-0
INICIO DA OBRA	18/12/2023
PREVISAO DE TÉRMINO	17/08/2026
POSSUI MAIS DE UMA	Não



mai/25

INVESTIMENTO 2025		
VALOR EMPENHADO	18.241.621,93	042/25
VALOR LIQUIDADO	17.122.057,01	93,86%

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2025

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO: Requalificação das intersecções e plataforma de ônibus avenida Imirim.



DESCRIÇÃO	
AÇÃO	Corredor Imirim
ENDEREÇO	Av. Imirim
SITUAÇÃO	Em execução
PROCESSO ADM	7910.2022/0001455-8
INICIO DA OBRA	20/06/2023
PREVISAO DE TÉRMINO	17/02/2026
POSSUI MAIS DE UMA	Não



mai/25

INVESTIMENTO 2025		
VALOR EMPENHADO	31.547.248,56	042/25
VALOR LIQUIDADO	25.762.672,81	81,66%

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2025

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO: Execução das obras e serviços de recuperação estrutural existentes e a duplicação da Ponte Jurubatuba.



DESCRIÇÃO	
AÇÃO	Duplicação da Ponte Jurubatuba.
ENDEREÇO	Av. Interlagos
SITUAÇÃO	Em execução
PROCESSO ADM	7910.2023/0001786-9
INICIO DA OBRA	01/08/2024
PREVISAO DE TÉRMINO	23/01/2026
POSSUI MAIS DE UMA	Não



INVESTIMENTO 2025		
VALOR EMPENHADO	17.829.295,89	042/25
VALOR LIQUIDADO	2.299.778,45	12,90%

mai/25

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2025

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO, URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO - VIADUTO JOÃO BEIÇOLA



DESCRIÇÃO	
AÇÃO	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO, URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO - VIADUTO JOÃO BEIÇOLA
ENDEREÇO	Av. Pedro Roche Gottsfritz, praça do Condestável, Av. Rubens Montanaro de Borba, Praça Joao Beição da Silva, Rua Miguel de Barros, Rua Cristóvão Cabral e Av. Lourenço Cabreira
SITUAÇÃO	Em execução
PROCESSO ADM	7910.2022/0001453-1
INICIO DA OBRA	28/03/2023
PREVISAO DE TÉRMINO	27/06/2025
POSSUI MAIS DE UMA	Não



mai/25

INVESTIMENTO 2025		
VALOR EMPENHADO	1.431.733,23	042/25
VALOR LIQUIDADO	1.431.733,23	100%

