



**FUNDURB | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL | SVMA 2025**

## FUNDURB - PLANO ANUAL DE APLICAÇÃO - SVMA - 2025 - PLANILHA DESCRIPTIVA REVISADA

AÇÃO	META PdM	PROJETO	PROCESSO	TOTAL	SOLICITADO FUNDURB (APROVADO)	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
Obras, serviços e projetos para ações de requalificação e conservação da Marquise José Ermírio de Moraes do Parque Ibirapuera	Meta 2	Ampliação, Reforma e Requalificação de Parques Urbanos e Lineares	6027.2024/00047	R\$ 88.056.385,06	R\$ 45.478.924,25	R\$ 45.478.924,25	R\$ 30.684.944,74	R\$ 22.764.096,27
Obras de requalificação para o Parque Municipal do Carmo - Olavo Egydio Setúbal	Meta 2	Ampliação, Reforma e Requalificação de Parques Urbanos e Lineares	6027.2023/00171	R\$ 98.214.624,53	R\$ 25.000.000,00	R\$ 25.000.000,00	R\$ 10.632.595,49	R\$ 10.632.595,49
Construção de Parques	n/a	Construção de Parques	Não há	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Construção e implantação de Unidades de Conservação	n/a	Construção e implantação de Unidades de Conservação	Não há	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidades de Conservação	n/a	Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidades de Conservação	Não há	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL FUNDURB</b>				<b>R\$ 70.481.924,25</b>	<b>R\$ 70.478.924,25</b>	<b>R\$ 41.317.540,23</b>	<b>R\$ 33.396.691,76</b>	

# Parque Ibirapuera | Marquise José Ermírio de Moraes

Ação: Obras, serviços e projetos para ações de requalificação e conservação da Marquise José Ermírio de Moraes do Parque Ibirapuera  
Processo: 6027.2024/0004766-0 | Situação: em andamento (Ordem de Início em 03/03/2024)




**Valor Reajustado: R\$ 88.056.385,06**

**Solicitado 2025: R\$ 45.478.924,25**

Liquidado (2024): R\$ 33.374.538,04

Liquidado (2025): R\$ R\$ 30.684.944,74

**Total Executado: R\$ 64.059.482,78 (73%)**

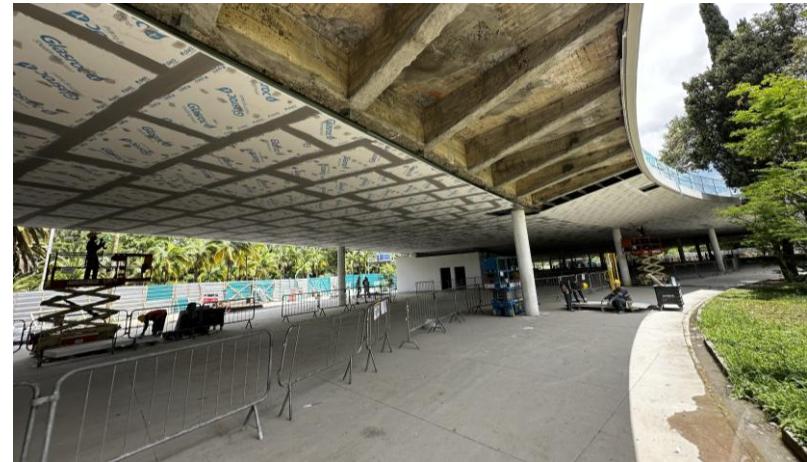

Imagens novembro/2025

# Parque do Carmo - Olavo Egydio Setúbal

Ação: Obras de requalificação para o Parque Municipal do Carmo - Olavo Egydio Setúbal

Processo: 6027.2023/0017123-7 | Situação: em andamento (Ordem de Início em 31/03/2024)



**Valor Reajustado: R\$ 98.214.624,53**

**Solicitado 2025: R\$ 25.000.000,00**

Liquidado (2024): R\$ 3.904.676,84

Liquidado (2025): R\$ 16.786.641,79 (enviado)

**Total Executado: R\$ 20.691.318,63 (21%)**



Imagens novembro/2025



**OBRIGADA!!**
