

Prestação de Contas Final do Plano de Aplicação 2025

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E TRANSPORTE

Processo SEI 6020.2024/0058722-4
09/2026



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
SECRETARIA
DE MOBILIDADE
URBANA E TRANSPORTE

OBJETO DO GASTO	APROVADO	EMPENHADO	PAGO ATÉ 2025	INSCRITO EM RESTOS A PAGAR	PAGO RESTOS A PAGAR	REALIZADO	FONTES DOS RECURSOS
Obras de redesenho urbano para segurança viária (3757)	R\$ 10.534.979,19	R\$ 807.203,78	R\$ 0	R\$ 807.203,78	R\$ 103.540,04	1%	MOB 2025
Construção de Ciclovias (1097)	R\$ 20.000.000,00	R\$ 19.920.161,76	R\$ 19.719.682,98	R\$ 200.478,78	R\$ 0	98,60%	MOB 2025
Despesas de Exercícios Anteriores – Ciclovias (1097)	R\$ 135.254,40	R\$ 135.254,40	R\$ 135.254,40	R\$ 0	R\$ 0	100%	MOB 2025 (DEA)
Implantação de Corredores de Ônibus (1099)	R\$ 16.236.000,00	R\$ 12.002.000,00	R\$ 10.821.867,18	R\$ 1.180.132,82	R\$ 19.559,56	66,77%	MOB 2025
Implantação de Transporte Público Hidroviário (5362)	R\$ 10.987.156,50	R\$ 6.572.000,50	R\$ 5.982.000,50	R\$ 590.000,00	R\$ 0	54,45%	MOB 2025
Construção de Terminais de Ônibus (1095)	R\$ 26.017.148,50	R\$ 22.234.191,94	R\$ 13.356.829,94	R\$ 8.877.362,00	R\$ 1.577.759,25	57,40%	MOB 2025
Requalificação do Pavimento de Paradas de Ônibus (5394)	R\$ 6.892.000,00	R\$ 6.255.196,11	R\$ 5.489.196,11	R\$ 766.000,00	R\$ 675.771,97	89,45%	MOB 2025
Dotações a manter	R\$ 4.000,00	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	0 %	MOB 2025
TOTAL	R\$ 90.806.538,59	R\$ 67.926.008,49	R\$ 55.504.831,11	R\$ 12.421.177,38	R\$ 2.376.630,82		





PREFEITURA DE
SÃO PAULO
SECRETARIA
DE MOBILIDADE
URBANA E TRANSPORTE

OBRAS DE REDESENHO URBANO PARA SEGURANÇA VIÁRIA

OBJETO DO GASTO	APROVADO	EMPENHADO	PAGO ATÉ 2025	INSCRITO EM RESTOS A PAGAR	PAGO RESTOS A PAGAR	REA LIZA DO	FONTES DOS RECURSOS
Obras de redesenho urbano para segurança viária (3757)	R\$ 10.534.979,19	R\$ 807.203,78	R\$ 0	R\$ 807.203,78	R\$ 103.540,04	1%	MOB 2025

OBRAS DE REDESENHO URBANO PARA SEGURANÇA VIÁRIA

VALORES	NOME DA INFRAESTRUTURA	ENDEREÇO(S)	SUBPREFEITURA	ZONA
Valor aprovado: R\$ 298.015,81 Valor pago restos: R\$ 103.540,04	Obras de redesenho urbano para moderação de tráfego - São Miguel Paulista (Obras)	Área contida entre as seguintes vias: Praça Padre Aleixo Monteiro Mafra; Av. Nordestina; Av. Guilherme Eiras; Av. Marechal Tito; R. Arlindo Colaço; Rua Salvador de Medeiros	SÃO MIGUEL	L


Obras em andamento



Rua Dr. José Guilherme Eiras – Dez/2024




Rua Serra Dourada – Jan/2025

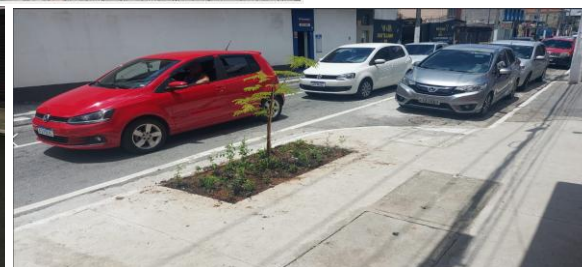

IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES DE ÔNIBUS

OBJETO DO GASTO	APROVADO	EMPENHADO	PAGO ATÉ 2025	INSCRITO EM RESTOS A PAGAR	PAGO RESTOS A PAGAR	REA LIZA DO	FONTES DOS RECURSOS
Implantação de Corredores de Ônibus (1099)	R\$ 16.236.000,00	R\$ 12.002.000,00	R\$ 10.821.867,18	R\$ 1.180.132,82	R\$ 19.559,56	66,77%	MOB 2025

REQUALIFICAÇÃO CELSO GARCIA

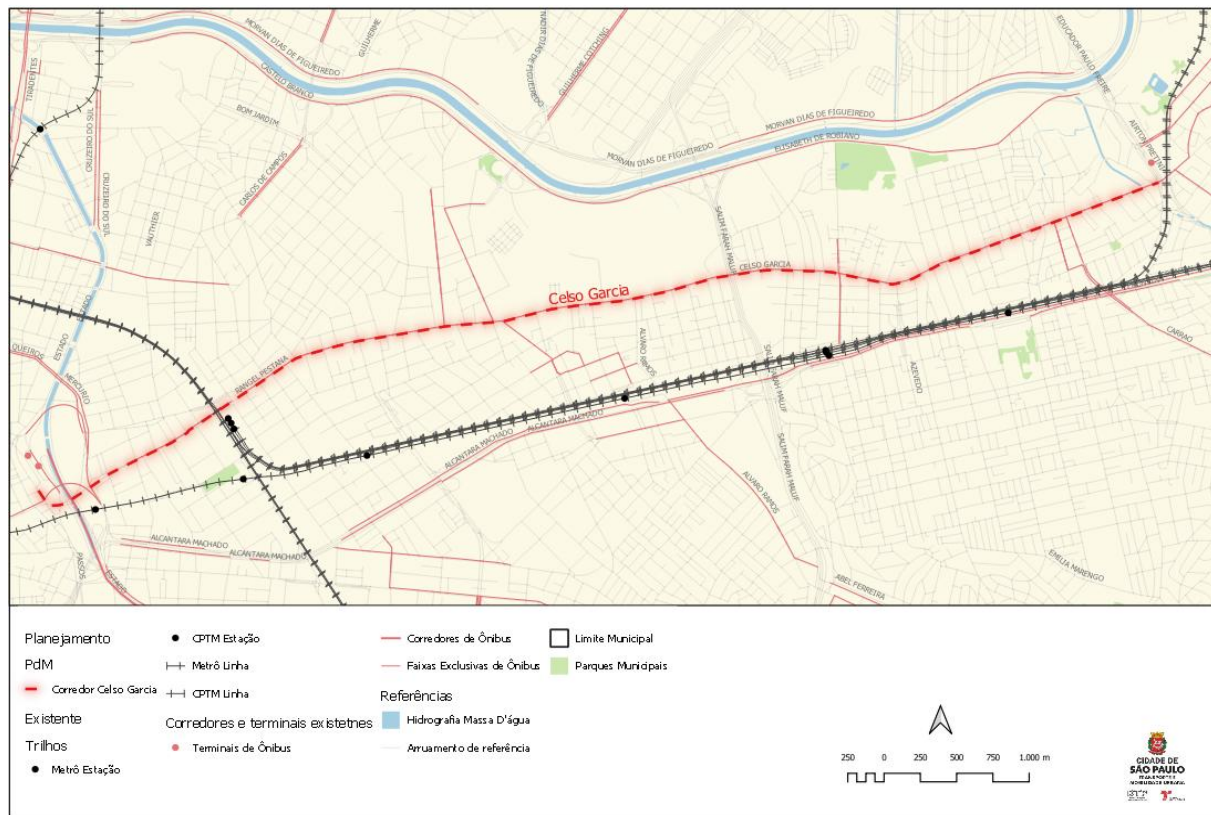

Número de beneficiados:

Aproximadamente 130.000 pessoas/dia

Situação atual:

Projeto básico e executivo:

- Contrato: 2021/0551-01-00 - 12/04/2022
- Processo: 5010.2021/0006795-3
- Concluído: 01/2024

Estudo e licenciamento ambiental:

- Contrato: 2025/0413-01-00 - 08/12/2025
- Processo: 5010.2025/0023645-0
- Previsão de finalização: Prazo aditado para dez/2026. Em análise por SVMA

Obras:

- Contrato: 2023/0461-01-00 (suspensão).
Aplicação de penalidade - fase de análise de recursos
- Obra paralisada: 24,83% (Total medido/valor do contrato)
- Nova contratação: Edital 001/2026 publicado para consulta pública em 30/07/2026

Valor aprovado: R\$ 4.600.000,00

Valor pago até 2025: R\$ 3.294.640,01

Valor pago restos: R\$ 19.559,56

REQUALIFICAÇÃO CELSO GARCIA




Requalificação Celso Garcia - Fotos - Situação Atual

CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS DE ÔNIBUS

OBJETO DO GASTO	APROVADO	EMPENHADO	PAGO ATÉ 2025	INSCRITO EM RESTOS A PAGAR	PAGO RESTOS A PAGAR	REALIZADO	FONTES DOS RECURSOS
Construção de Terminais de Ônibus (1095)	R\$ 26.017.148,50	R\$ 22.234.191,94	R\$ 13.356.829,94	R\$ 8.877.362,00	R\$ 1.577.759,25	57,40%	MOB 2025

TERMINAL SÃO MATEUS

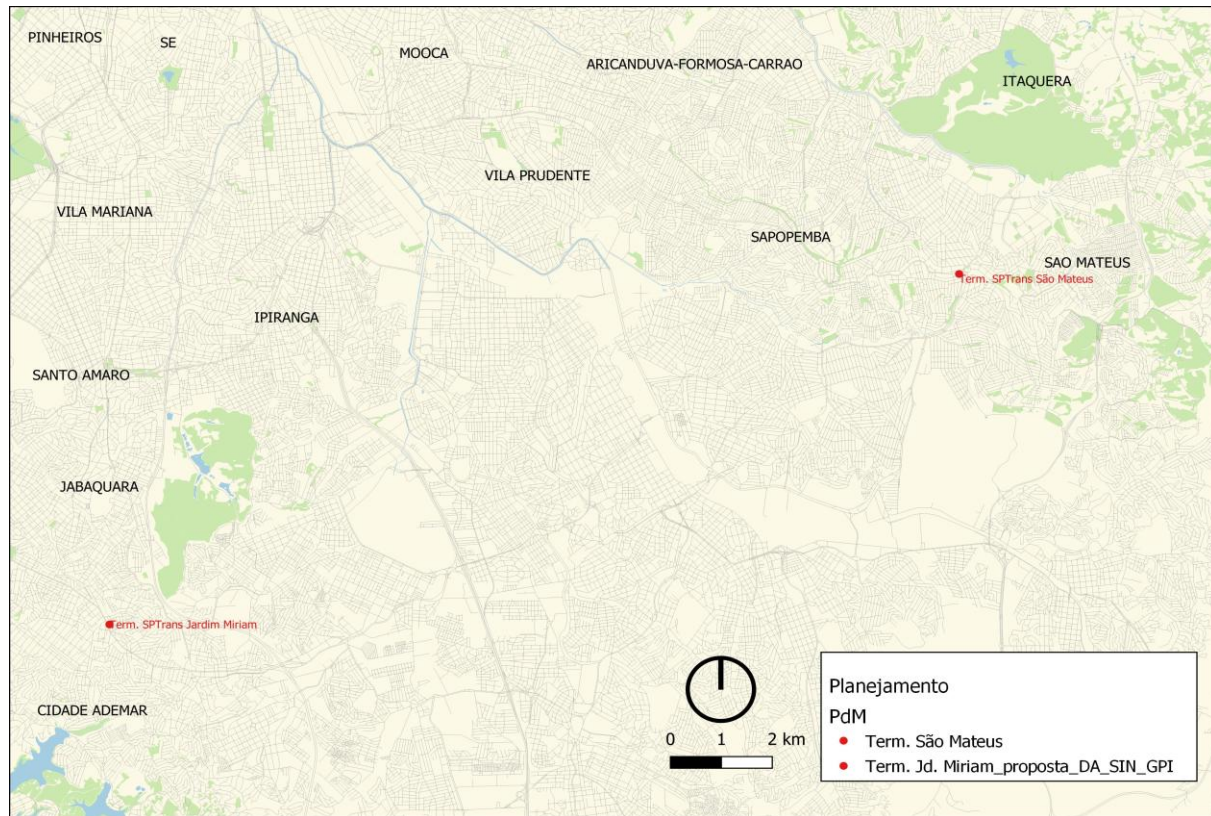

Situação atual:

Projetos básico, executivo e elaboração de estudos ambientais e territoriais:

- Contrato: 2022/0329-01-00 - 06/10/2022
- Processo: 5010.2022/0016359-8
- Concluído: 02/2024

Imissão na posse dos imóveis expropriados finalizada.

Demolição das áreas desapropriadas:


- Contrato: 2024/0402-01-00 - 10/01/2025
- Processo: 5010.2024/0023816-8
- Concluído: 06/2026

Valor aprovado: R\$ 25.413.465,50

Valor pago até 2025: R\$ 13.356.829,94

Valor pago restos: R\$ 19.559,56

TERMINAL SÃO MATEUS

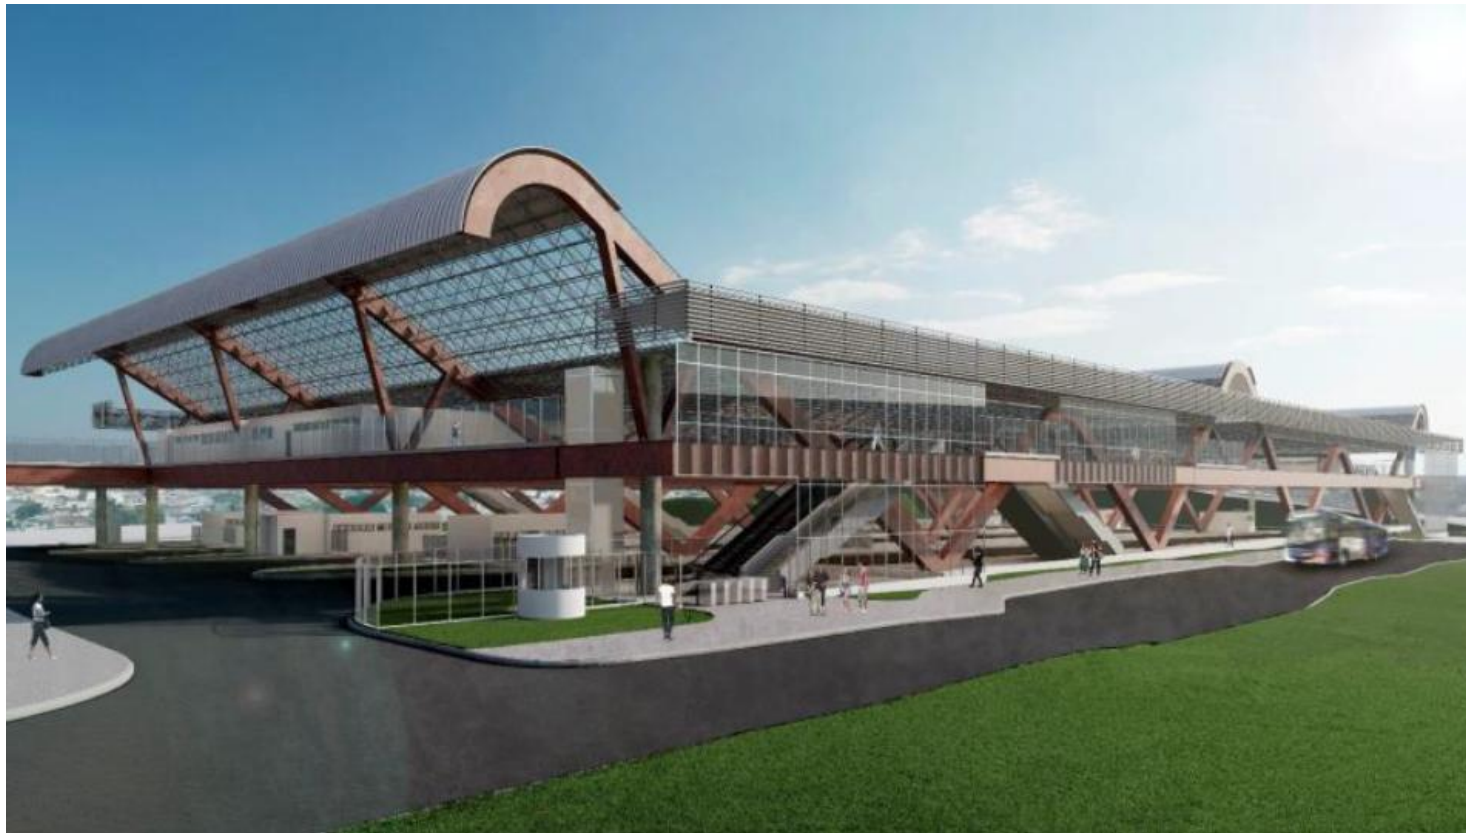


Terminal São Mateus - Perspectiva Eletrônica - 2024

TERMINAL SÃO MATEUS



Terminal São Mateus - Serviços de demolição - Abril/2026

TERMINAL SÃO MATEUS

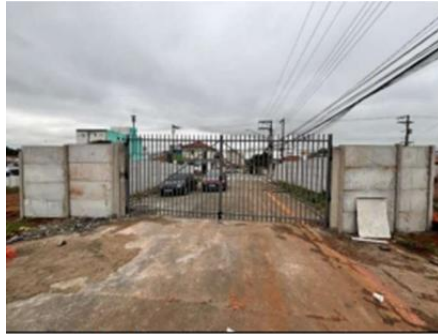

Item: NOVO 1.14
PORTÃO DE FECHAMENTO



Item: NOVO 1.14
PORTÃO DE FECHAMENTO



Item: NOVO 1.11
MURO DE FECHAMENTO




Terminal São Mateus - Serviços de demolição - Abril/2026

REQUALIFICAÇÃO DO PAVIMENTO DE PARADAS DE ÔNIBUS

OBJETO DO GASTO	APROVADO	EMPENHADO	PAGO ATÉ 2025	INSCRITO EM RESTOS A PAGAR	PAGO RESTOS A PAGAR	REALIZADO	FONTES DOS RECURSOS
Requalificação do Pavimento de Paradas de Ônibus (5394)	R\$ 6.892.000,00	R\$ 6.255.196,11	R\$ 5.489.196,11	R\$ 766.000,00	R\$ 675.771,97	89,45%	MOB 2025

REQUALIFICAÇÃO DO PAVIMENTO DE PARADAS DE ÔNIBUS

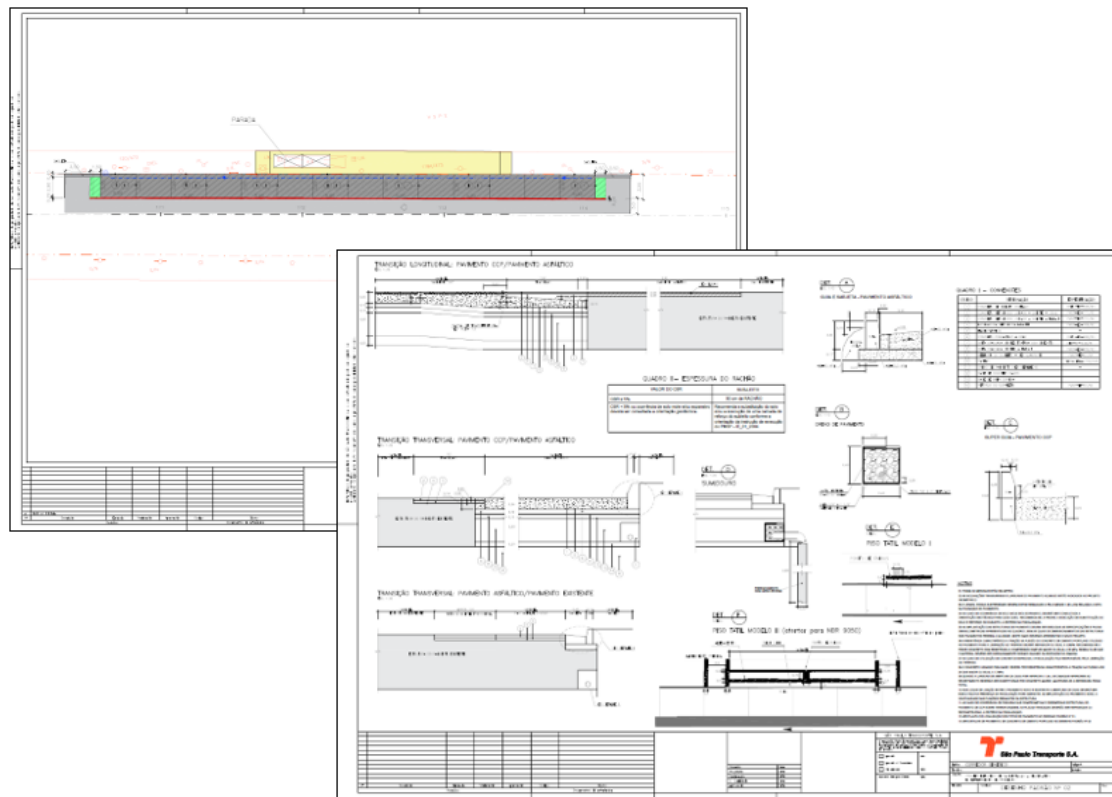

REQUALIFICAÇÃO DO PAVIMENTO DE PARADAS DE ÔNIBUS

Situação atual:

Paradas - Projetos e obras:

- Contrato nº 2022/0350-01-00
- Processo: 5010.2022/0017023-3
- Concluído: 2025

Paradas - Av. Nossa Senhora do Sabará:

- Contrato nº 2023/0432-01-00
- Processo: 5010.2023/0019807-5
- Concluído: 2025

Adequação - Parada 14 Bis

- Contrato nº 2024/0255-01-00
- Processo: 5010.2024/0014189-0

Situação: Fase de montagem do elevador concluída.

Aguarda liberação para início da operação.

- % Execução: 77,59%

Medição final em avaliação - Entrega de projeto (As Built)

Valor aprovado:

R\$ 6.892.000,00

Valor pago até 2025:

R\$ 5.489.196,11

Valor pago restos:

R\$ 675.771,97



REQUALIFICAÇÃO DO PAVIMENTO DE PARADAS DE ÔNIBUS

NOME DA INFRAESTRUTURA	VALOR PAGO
Requalificação de corredores e viários de ônibus. Requalificação do Pavimento de Paradas de Ônibus: Av. Rio das Pedras [MOB]	R\$ 106.356,16
Requalificação de corredores e viários de ônibus. Requalificação do Pavimento de Paradas de Ônibus: Av. Mateo Bei [MOB]	R\$ 204.271,86
Requalificação de corredores e viários de ônibus. Requalificação do Pavimento de Paradas de Ônibus: Av. Marechal Tito [MOB]	R\$ 429.906,61
Requalificação de corredores e viários de ônibus. Requalificação do Pavimento de Paradas de Ônibus: Av. Corifeu de Azevedo Marques [MOB]	R\$ 3.062.309,85
Requalificação de corredores e viários de ônibus. Requalificação do Pavimento de Paradas de Ônibus: Av. Vital Brasil [MOB]	R\$ 0,00
Requalificação de corredores e viários de ônibus. Requalificação do Pavimento de Paradas de Ônibus: Av. Dep. Emílio Carlos [MOB]	R\$ 139.081,11
Requalificação de corredores e viários de ônibus. Requalificação do Pavimento de Paradas de Ônibus: Av. Nossa Sra. Do Sabará [MOB]	R\$ 123.007,82
Requalificação de corredores e viários de ônibus. Requalificação do Pavimento de Paradas de Ônibus: Parada 14 Bis [MOB]	R\$ 1.424.262,70 + R\$ 675.771,97 (RESTOS)
TOTAL	R\$ 6.164.968,08

REQUALIFICAÇÃO DO PAVIMENTO DE PARADAS DE ÔNIBUS

Parada 14 Bis – Em execução



Foto 01 - Caixa de Medição tipo H



Foto 02 - Caixa de Medição tipo H



Chave seccionadora - 2025



Foto 03 - Caixa de Medição tipo H



Foto 04 - Caixa de Medição tipo H



Disjuntor caixa moldada tripolar
200A - 2025



Foto 05 - Caixa de Medição tipo H



Foto 06 - Caixa de Medição tipo H

Instalação de quadros de distribuição - 2025



Foto 01 - Sinalização



Foto 02 - Sinalização



Foto 03 - Sinalização



Foto 04 - Sinalização



Foto 05 - Sinalização



Foto 06 - Sinalização

Elevador elétrico sem casa de máquinas - 2025



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**

**SECRETARIA
DE MOBILIDADE
URBANA E TRANSPORTE**
