

Prestação de Contas Parcial do Plano de Aplicação 2025

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E TRANSPORTE

Processo SEI 6020.2024/0058722-4
12/2025



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
SECRETARIA
DE MOBILIDADE
URBANA E TRANSPORTE

OBJETO DO GASTO	APROVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	INSCRITO EM RESTOS A PAGAR	REALIZADO	FONTES DOS RECURSOS
Obras de redesenho urbano para segurança viária (3757)	R\$ 10.534.979,19	R\$ 807.203,78	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 807.203,78	0%	MOB 2025
Construção de Ciclovias (1097)	R\$ 20.000.000,00	R\$ 19.920.161,76	R\$ 19.719.682,98	R\$ 19.719.682,98	R\$ 200.478,78	98,59%	MOB 2023 e MOB 2025
Despesas de Exercícios Anteriores – Ciclovias (1097)	R\$ 135.254,40	R\$ 135.254,40	R\$ 135.254,40	R\$ 135.254,40	R\$ 0	100%	MOB 2025 (DEA)
Implantação de Corredores de Ônibus (1099)	R\$ 16.236.000,00	R\$ 12.002.000,00	R\$ 10.821.867,18	R\$ 10.821.867,18	R\$ 1.180.132,82	66,65%	MOB 2023 e MOB 2025
Implantação de Transporte Público Hidroviário (5362)	R\$ 10.987.156,50	R\$ 6.572.000,50	R\$ 5.982.000,50	R\$ 5.982.000,50	R\$ 590.000,00	54,45%	MOB 2025
Construção de Terminais de Ônibus (1095)	R\$ 26.017.148,50	R\$ 22.234.191,94	R\$ 13.356.829,94	R\$ 13.356.829,94	R\$ 8.877.362,00	51,33%	MOB 2025
Requalificação do Pavimento de Paradas de Ônibus (5394)	R\$ 6.892.000,00	R\$ 6.255.196,11	R\$ 5.489.196,11	R\$ 5.489.196,11	R\$ 766.000,00	79,64%	MOB 2025
Dotações a manter	R\$ 4.000,00	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	0 %	MOB 2025
TOTAL	R\$ 90.806.538,59	R\$ 67.926.008,49	R\$ 55.709.818,82	R\$ 55.504.831,11	R\$ 12.421.177,38		

OBRAS DE REDESENHO URBANO PARA SEGURANÇA VIÁRIA

VALORES	NOME DA INFRAESTRUTURA	ENDEREÇO(S)	SUBPREFEITURA	ZONA
---------	------------------------	-------------	---------------	------

VALOR APROVADO
R\$ 298.015,81
VALOR LIQUIDADO
R\$ 0
INSCRITO EM RESTOS
R\$ 807.203,78

Obras de redesenho urbano para moderação de tráfego - São Miguel Paulista (Obras)

Área contida entre as seguintes vias: Praça Padre Aleixo Monteiro Mafra; Av. Nordestina; Av. Guilherme Eiras; Av. Marechal Tito; R. Arlindo Colaço; Rua Salvador de Medeiros

SÃO MIGUEL

L


Obras em andamento



Rua Dr. José Guilherme Eiras – Dez/2024



Rua Serra Dourada – Jan/2025

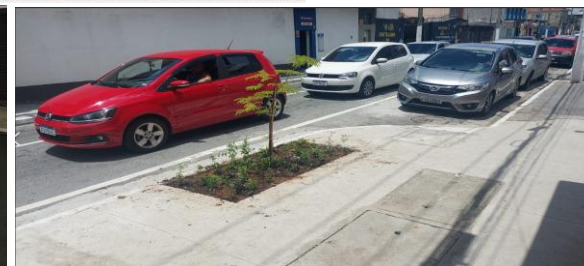

CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS



Adherbal Stresser



Adherbal Stresser



Asdrubal da Cunha

PPP COHAB



6020.2022/0038385-4;
6020.2022/0038488-5;

6020.2022/0038490-7;
6020.2022/0038491-5;

6020.2022/0038566-0;
6020.2022/0038571-7



CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS



Asdrubal da Cunha



Capitão Pacheco Chaves



Capitão Pacheco Chaves

PPP COHAB



6020.2022/0038385-4;
6020.2022/0038488-5;

6020.2022/0038490-7;
6020.2022/0038491-5;

6020.2022/0038566-0;
6020.2022/0038571-7



CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS



Maria Amalia



Queiroz Filho



Queiroz Filho

PPP COHAB



6020.2022/0038385-4;
6020.2022/0038488-5;

6020.2022/0038490-7;
6020.2022/0038491-5;

6020.2022/0038566-0;
6020.2022/0038571-7



CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS



Salim Farah Maluf



Salim Farah Maluf

PPP COHAB



6020.2022/0038385-4;
6020.2022/0038488-5;

6020.2022/0038490-7;
6020.2022/0038491-5;

6020.2022/0038566-0;
6020.2022/0038571-7



CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS


CONCORRÊNCIAS
002 E 003
(DEA)



Ponte da Freguesia do Ó

Alvarenga

CORREDOR CELSO GARCIA

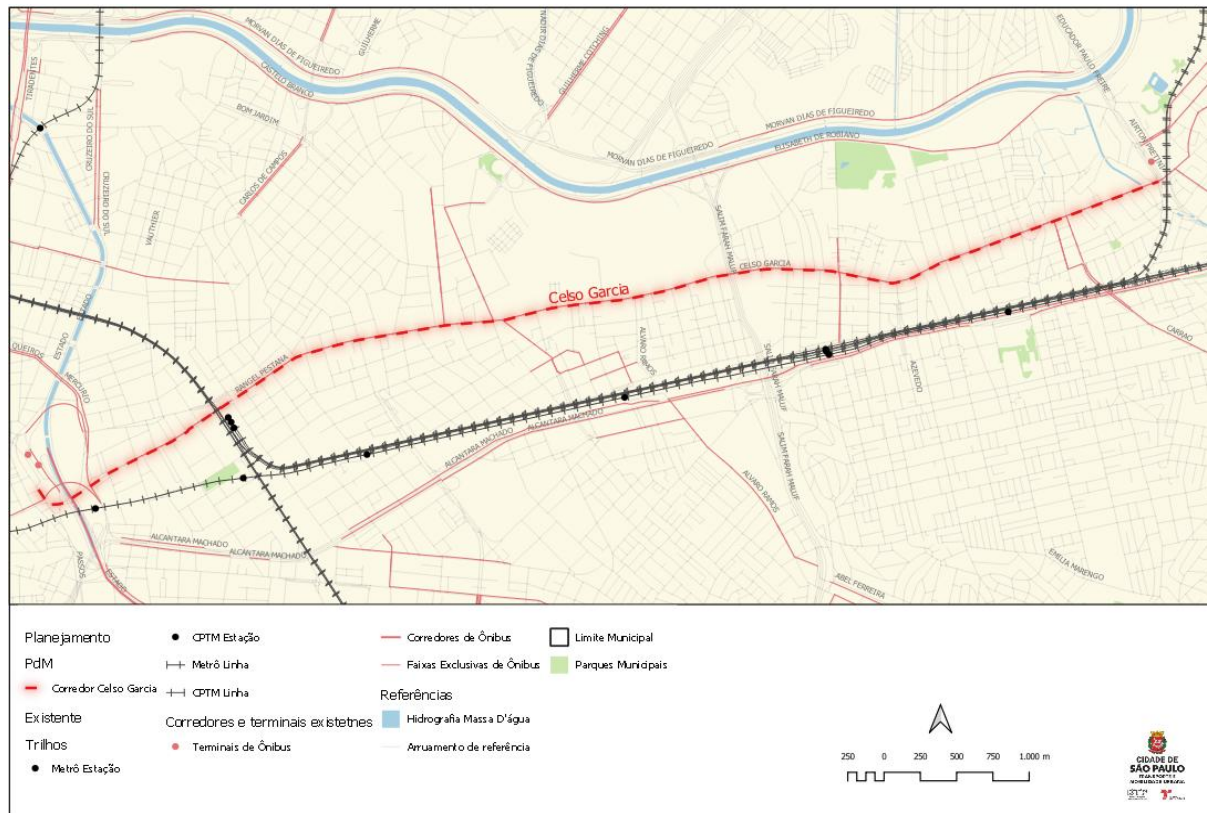

CORREDOR CELSO GARCIA:

Situação atual:

Projetos básico e executivo:

- Contrato nº 2021/0551-01-00 - 12/04/2022
- Processo: 5010.2021/0006795-3
- Concluído: 12/2023

Obras - Trecho 1:

- Contrato nº 2023/0461-01-00 - 06/11/2023
- Processo: 2023/0018742-1
- Obra paralisada para adequações contratuais conforme plano de trabalho IPHAN. Fase de análise de recursos.
- % Execução: 24,83%

Supervisão Obras - Trecho 1:

- Contrato nº 2023/0484-01-00
- Processo: 5010.2023/0013653-3

Estudos e Licenciamento Ambiental:

- Contrato nº 2025/0413-01-00 - 08/12/2025
- Processo: 5010.2025/0021894-0
- Prazo conclusão: 06/2026

Número de beneficiados: 131.101 passageiros por dia

Valor aprovado:

R\$ 4.600.000,00

Valor liquidado:

R\$ 3.294.640,01

CORREDOR MIGUEL YUNES



CORREDOR MIGUEL YUNES:

Situação atual:

Elementos técnicos expropriatórios:

- Contrato nº 2022/0238-01-00 - 04/05/2022
- Processo: 5010.2022/0003734-7
- Concluído: 06/2024

Projetos básico e executivo:

- Contrato nº 2022/0384-01-00 - 17/11/2022
- Processo: 5010.2022/0018820-5
- Concluído: 09/2024

Estudos ambientais e licenciamento:

- Contrato nº 2022/0639-01-00 - 29/03/2023
- Processo: 5010.2022/0016037-8
- Contrato suspenso - necessário readequações projetuais
- % Execução: 26,58%

Obras:

- Contrato nº 2024/0206-01-00. Sem ordem de serviço.
- Processo: 5010.2025/0001225-0
- Previsão de início: 1º semestre de 2026.

Número de beneficiados: 60.211 passageiros por dia

Valor aprovado:

R\$ 4.366.388,24

Valor liquidado:


R\$ 135.388,24

CORREDOR MIGUEL YUNES



Corredor Miguel Yunes - Projeto e Ortofoto - 1º Semestre/2024

CORREDOR NORTE-SUL

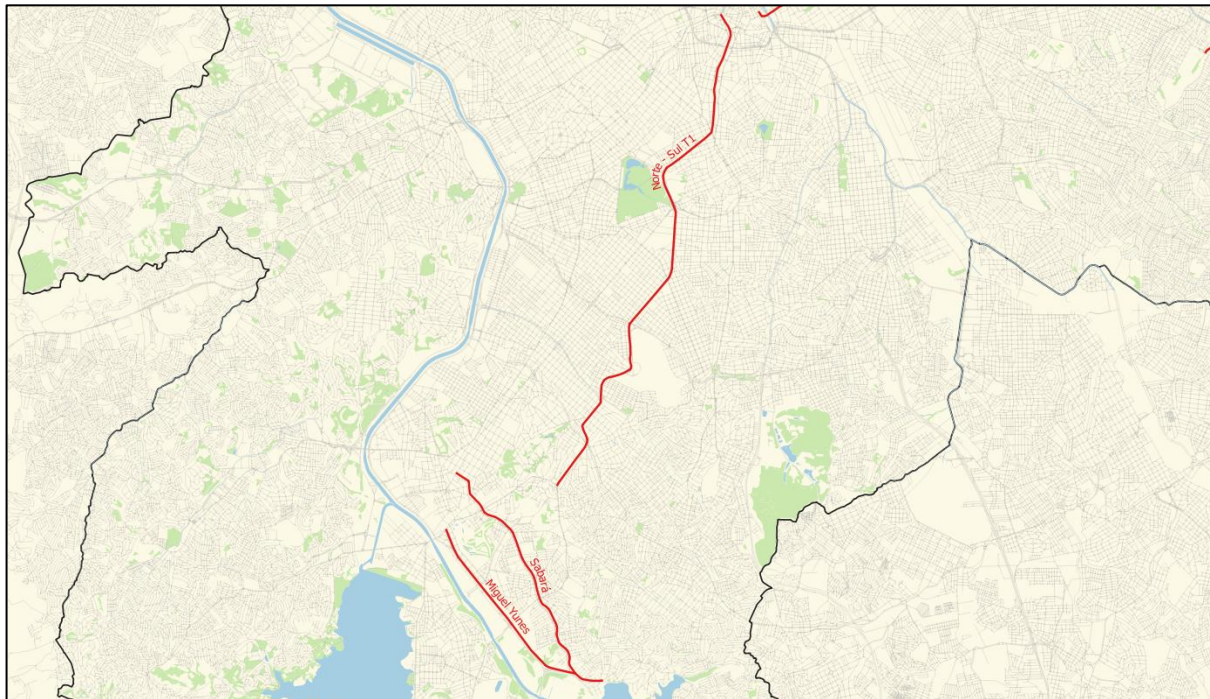

CORREDOR NORTE-SUL:

Situação atual:

Estudos ambientais e licenciamento:

- Contrato nº 2022/0639-01-00 – 29/03/2023
- Processo: 5010.2022/0016037-8
- Contrato suspenso - necessário readequações projetuais.
- % Execução: 26,58%

Projeto básico:

- Concluído: 2024

Projeto executivo e obras:

- Contrato Lote 1: nº 2023/0675-01-00 – 03/06/2024
- Processo: 5010.2024/0009168-0
- Contrato Lote 2: nº 2023/0675-02-00 – 25/06/2024
- Processo: 5010.2024/0009141-8

Supervisão de obras:

- Contrato Lote 1: nº 2024/0204-01-00 – 24/09/2024
- Processo: 5010.2024/0016927-1
- Contrato Lote 2: nº 2024/0204-02-00 – 24/09/2024
- Processo: 5010.2024/0016934-4

Número de beneficiados: 338.069 passageiros por dia.


Valor aprovado:

R\$ 6.919.669,56

Valor liquidado:

R\$ 7.391.838,93

CORREDOR NORTE-SUL

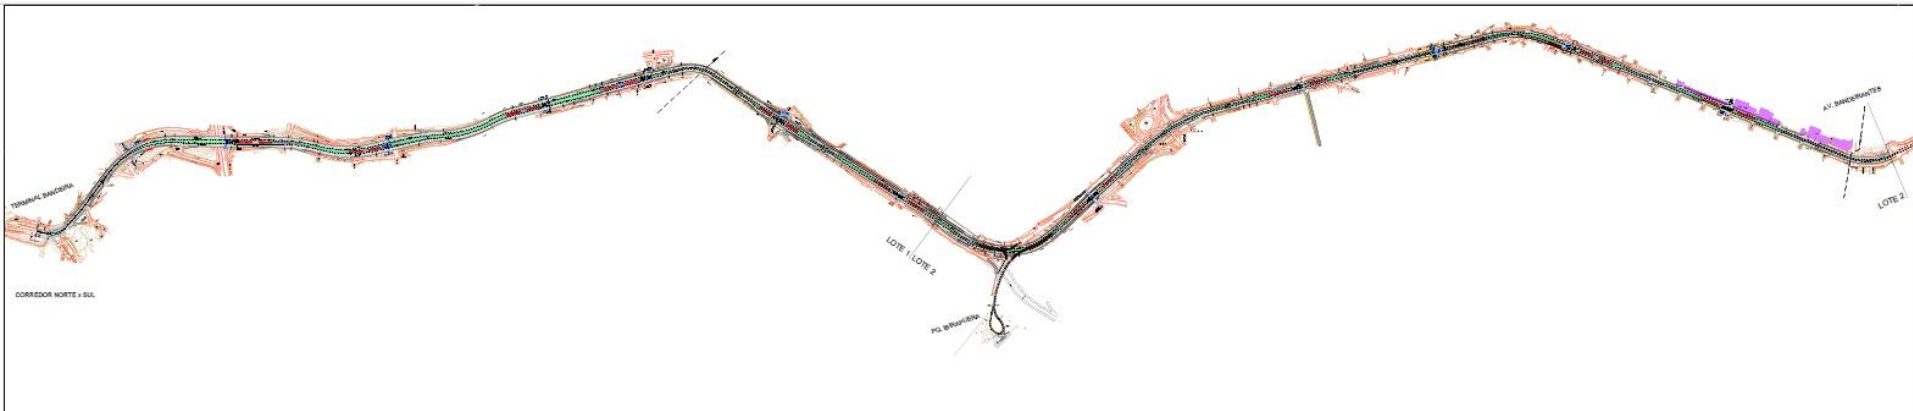

Corredor Norte-Sul - Lotes 1 e 2 - Projeto - 1º semestre/2024

IMPLANTAÇÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO HIDROVIÁRIO



TRANSPORTE PÚBLICO HIDROVIÁRIO

Elementos Técnicos Expropriatórios - Terminal / Atacadouro Cocaia:

- Contrato nº 2022/0438-01-00 - 12/08/2022
- Processo: 5010.2022/0010925-9
- Concluído: 07/2023

Elementos Técnicos Expropriatórios – Terminal / Atacadouro Pedreira:

- Contrato nº 2022/0515-01-00 - 28/09/2022
- Processo: 5010.2022/0012715-0
- Concluído: 07/2023

Estudos ambientais, projeto funcional e básico dos terminais, atracadouros e viários de acessos:

- Contrato nº 2022/0502-01-00 - 11/01/2023
- Processo: 5010.2022/0013125-4
- Concluído: 08/2025

Levantamento Batimétrico:

- Contrato nº 2023/0009-01-00 - 29/03/2023
- Processo: 5010.2022/0019046-3
- Concluído: 10/2023

Desapropriações - Terminal / Atacadouro Pedreira:
% Execução: Imissão na posse – 81,82%

Número de beneficiados: 2,5 mil passageiros por dia

Valor aprovado:


R\$ 10.987.156,50

Valor liquidado:

R\$ 5.982.000,50



IMPLANTAÇÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO HIDROVIÁRIO

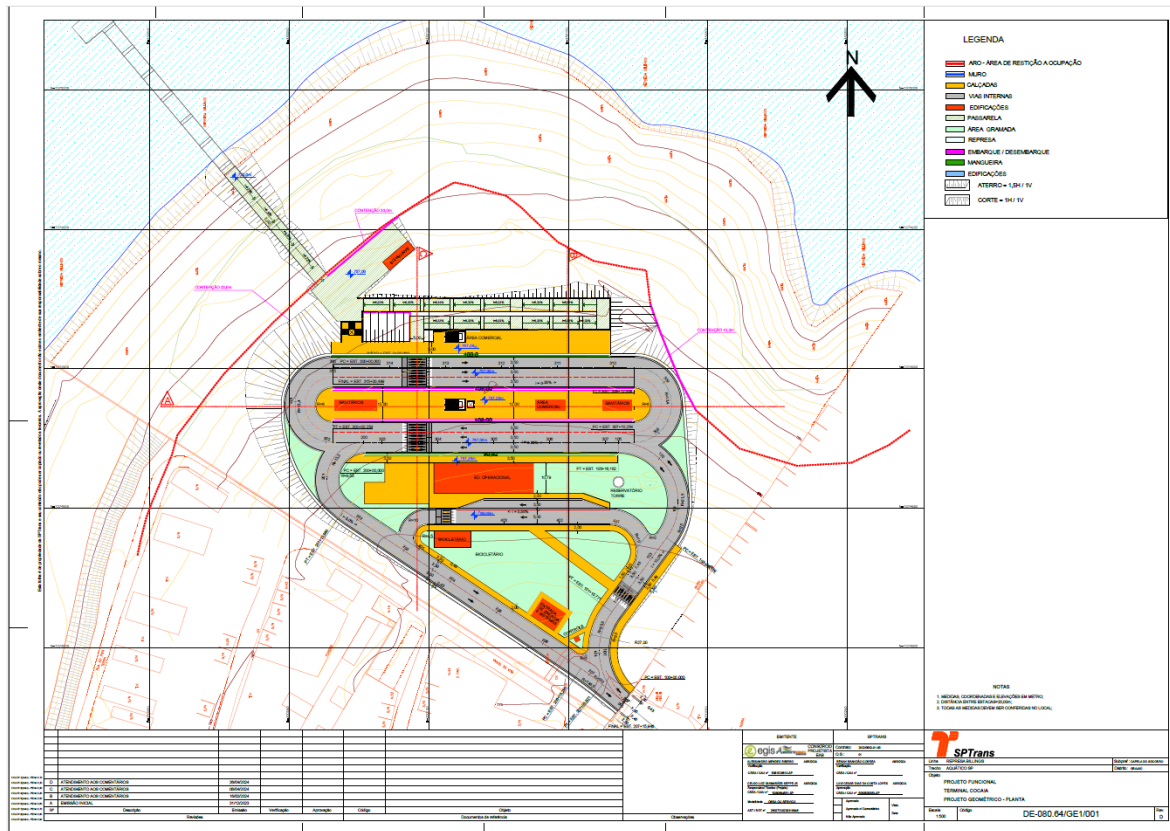

Terminal Cocaia - Projeto Funcional - 1º semestre 2024




IMPLANTAÇÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO HIDROVIÁRIO



Diligências de imissão na posse dos imóveis - Rua do Mar Paulista - Terminal Pedreira

TERMINAIS JARDIM MIRIAM E SÃO MATEUS

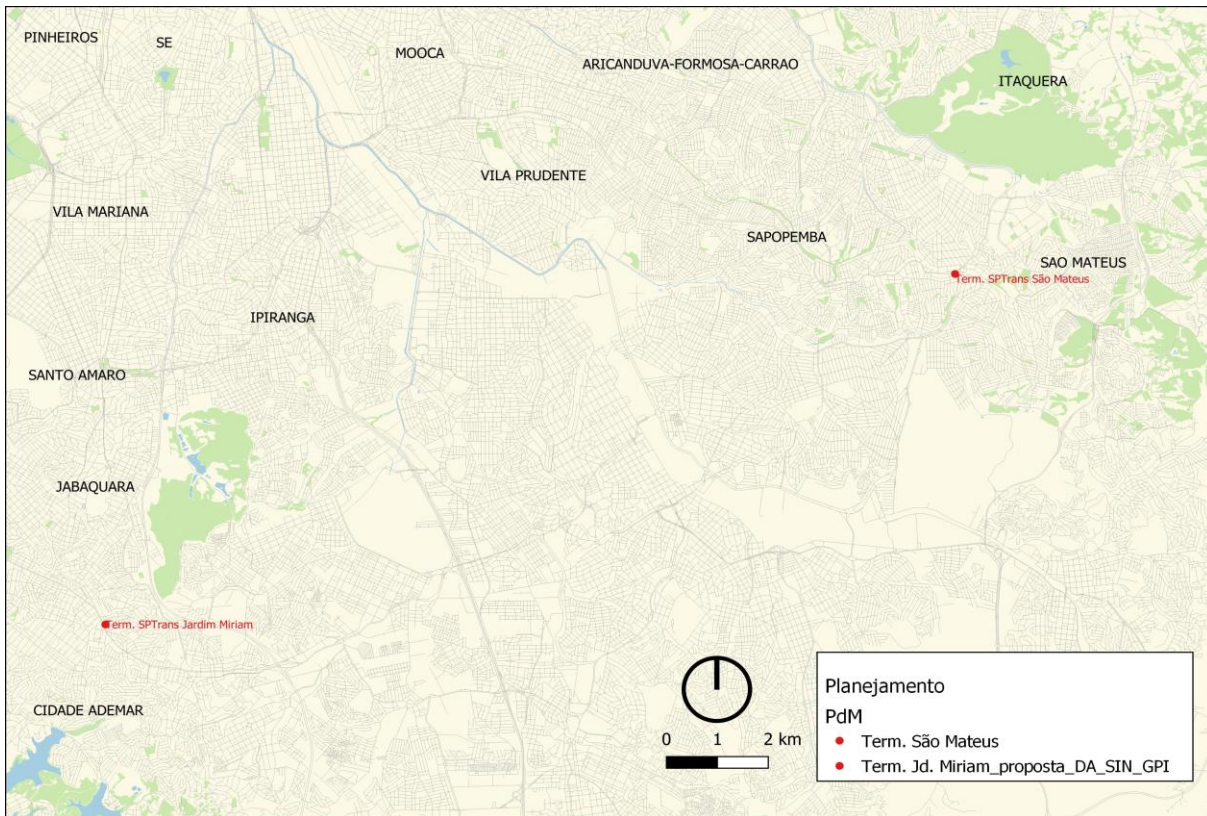

TERMINAL JARDIM MIRIAM:

Situação atual:

Procedimento licitatório para contratação do projeto funcional, projeto básico e elaboração de estudos ambientais e territoriais:

- Edital Licitação nº 023/2022 - 01/09/2022
- Cancelado – alteração da DUP

Estudos e projetos de realocação, contrato geral de gerenciamento e compatibilização de projetos:

- Contrato nº 2022/0156-01-00 – 17/09/2022
- Processo: 5010.2021/0012778-6
- Tratativas para definição do local da implantação / avaliação de necessidade.

Valor aprovado:

R\$ 603.683,00

Valor liquidado:

R\$ 0

TERMINAL SÃO MATEUS:

Situação atual:

Projetos básico, executivo e elaboração de estudos ambientais e territoriais:

- Contrato nº 2022/0329-01-00 - 06/10/2022
- Processo: 5010.2022/0016359-8
- Concluído: 02/2024

Demolição das áreas desapropriadas:

- Contrato nº 2024/0402-01-00 - 10/01/2025
- Processo: 5010.2024/0023816-8
- % Execução: Imóveis Expropriados - 98,90%
- Serviços de demolição: 73,54%

Valor aprovado:

R\$ 25.413.465,50

Valor liquidado:

R\$ 13.356.829,94

TERMINAL SÃO MATEUS



Item: 2.3 – Local: Av. Sapopemba, Nº - 21414
SQL - 152.125.0056-6



Item: 2.4 – Local: Av. Sapopemba, Nº - 21414
SQL - 152.125.0056-6



Item: 2.5 – Local: Av. Sapopemba, Nº - 21414
SQL - 152.125.0056-6



Item: 2.6 – Local: Av. Sapopemba, Nº - 21414
SQL - 152.125.0056-6



Item: 2.17 – Local: Av. Sapopemba, Nº - 21414
SQL - 152.125.0056-6



Item: 2.17 – Local: Av. Sapopemba, Nº - 21414
SQL - 152.125.0056-6



Item: 2.5 – Local: Av. Sapopemba, Nº - 21414
SQL - 152.125.0056-6



Item: 2.5 – Local: Av. Sapopemba, Nº - 21414
SQL - 152.125.0056-6




Item: 2.7 – Local: Av. Sapopemba, Nº - 21414
SQL - 152.125.0056-6



Item: 2.7 – Local: Av. Sapopemba, Nº - 21414
SQL - 152.125.0056-6



Item: 2.19 – Local: Av. Sapopemba, Nº - 21414
SQL - 152.125.0056-6



Item: 2.19 – Local: Av. Sapopemba, Nº - 21414
SQL - 152.125.0056-6



Item: 2.5 – Local: Av. Sapopemba, Nº - 21414
SQL - 152.125.0056-6



Item: 2.5 – Local: Av. Sapopemba, Nº - 21414
SQL - 152.125.0056-6



Item: 2.7 – Local: Av. Sapopemba, Nº - 21414
SQL - 152.125.0056-6



Item: 2.7 – Local: Av. Sapopemba, Nº - 21414
SQL - 152.125.0056-6



Item: 2.20 – Local: Av. Sapopemba, Nº - 21414
SQL - 152.125.0056-6



Item: 2.21 – Local: Av. Sapopemba, Nº - 21414
SQL - 152.125.0056-6

Serviços de demolição - Dezembro/2025




TERMINAL SÃO MATEUS



Diligências de imissão na posse dos imóveis - Rua Cônego Macário de Almeida - Dezembro/2025

REQUALIFICAÇÃO DO PAVIMENTO DE PARADAS DE ÔNIBUS

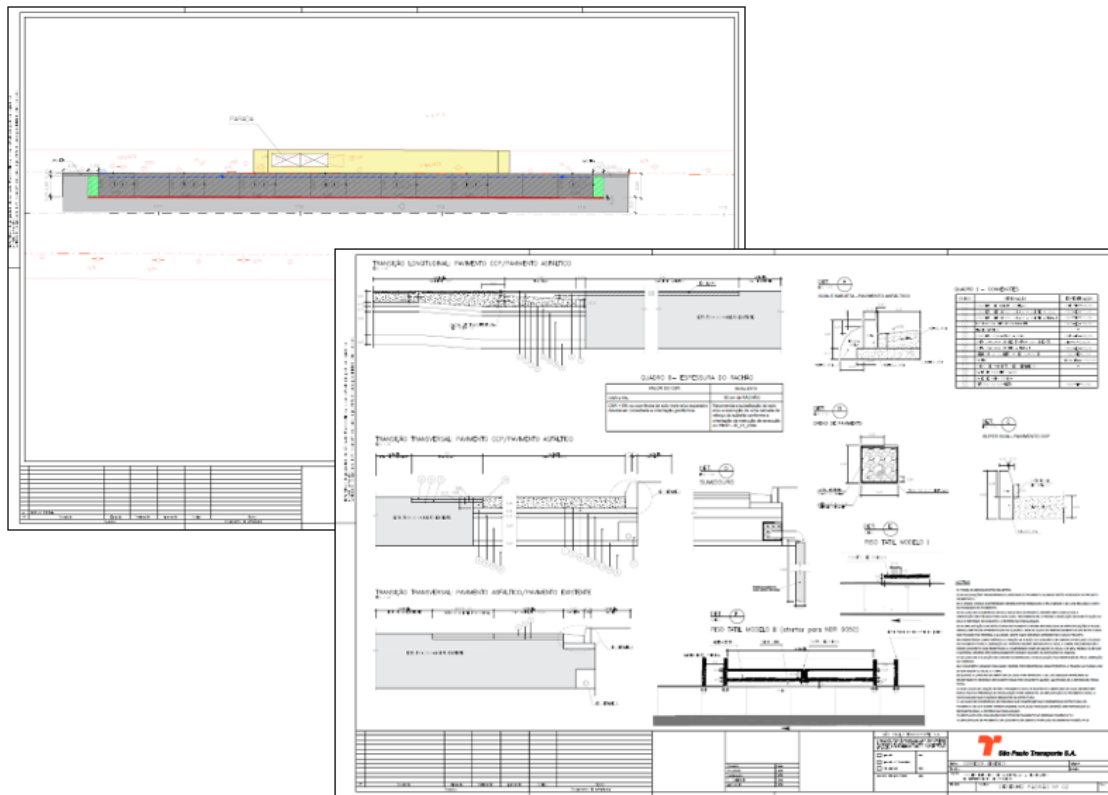

REQUALIFICAÇÃO DO PAVIMENTO DE PARADAS DE ÔNIBUS

Situação atual:

Paradas - Projetos e obras:

- Contrato nº 2022/0350-01-00
- Processo: 5010.2022/0017023-3
- Concluído: 2025

Paradas - Av. Nossa Senhora do Sabará:

- Contrato nº 2023/0432-01-00
- Processo: 5010.2023/0019807-5
- Concluído: 2025

Adequação - Parada 14 Bis

- Contrato nº 2024/0255-01-00
- Processo: 5010.2024/0014189-0

Situação: Fase de montagem do elevador concluída.

Aguarda liberação para início da operação.

- % Execução: 77,59%

Medição final em avaliação - Entrega de projeto (As Built)

Valor aprovado:

R\$ 6.892.000,00



Valor liquidado:

R\$ 5.489.196,11

REQUALIFICAÇÃO DO PAVIMENTO DE PARADAS DE ÔNIBUS



Av. Rio das Pedras - 2025. Em operação

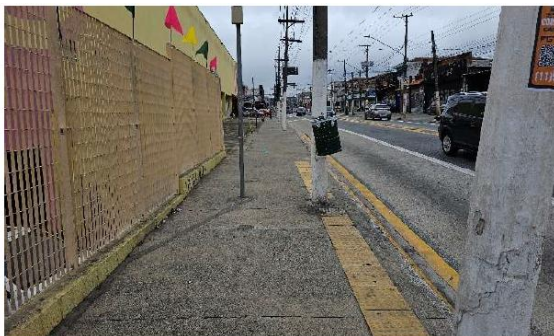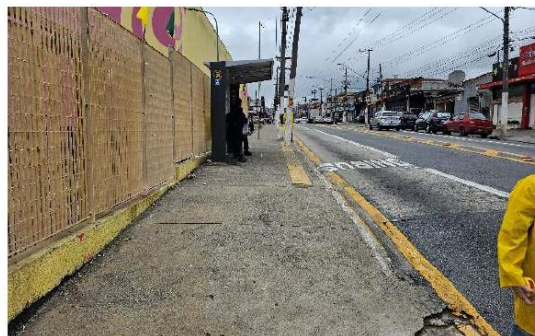

Av. Mateo Bei - 2025. Em operação



Av. Marechal Tito - 2025. Em operação

REQUALIFICAÇÃO DO PAVIMENTO DE PARADAS DE ÔNIBUS



Av. Vital Brasil - 2025. Em operação



Av. Corifeu de Azevedo Marques - 2025. Em operação



REQUALIFICAÇÃO DO PAVIMENTO DE PARADAS DE ÔNIBUS



Av. Dep. Emílio Carlos - 2025. Em operação



Av. Nossa Senhora do Sabará - 2025. Em operação

REQUALIFICAÇÃO DO PAVIMENTO DE PARADAS DE ÔNIBUS

Parada 14 Bis – Em execução



Foto 01 - Caixa de Medição tipo H



Foto 02 - Caixa de Medição tipo H



Chave seccionadora - 2025



Foto 03 - Caixa de Medição tipo H



Foto 04 - Caixa de Medição tipo H



Disjuntor caixa moldada tripolar 200A - 2025



Foto 05 - Caixa de Medição tipo H



Foto 06 - Caixa de Medição tipo H

Instalação de quadros de distribuição - 2025



Foto 01 - Sinalização



Foto 02 - Sinalização



Foto 03 - Sinalização



Foto 04 - Sinalização



Foto 05 - Sinalização



Foto 06 - Sinalização

Elevador elétrico sem casa de máquinas - 2025



DOTAÇÕES A MANTER

OBJETO DO GASTO	APROVADO	EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO	INSCRITO EM RESTOS A PAGAR	REALIZADO	FONTES DOS RECURSOS
Ampliação, Reforma e Requalificação de Corredores de Ônibus 98.20.26.453.3009.1.100.44905100.08	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	MOB 2025
Implantação de Faixas Exclusivas de Ônibus 98.20.26.453.3009.5.391.44905100.08	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	MOB 2025
Ampliação, Reforma e Requalificação de Ciclovias, Ciclofaixas e Ciclorrotas 98.20.26.453.3009.1.098.44905100.08	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	MOB 2025
Intervenções no Sistema Viário 98.20.15.451.3009.5.100.44905100.08	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	MOB 2025
TOTAL	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
**SECRETARIA
DE MOBILIDADE
URBANA E TRANSPORTE**
