

# PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL 2024

## SMSUB / FUNDURB



PREFEITURA DE  
**SÃO PAULO**  
SECRETARIA DAS  
SUBPREFEITURAS

**ATOS**

## RESUMO GERAL

OBJETO	VALOR APROVADO 2024	VALOR PAGO ATÉ 31/12/2024	PAGO RESTOS A PAGAR
REFORMA E ACESSIBILIDADE EM PASSEIOS PÚBLICOS	R\$ 80.000.000,00	R\$ 38.995.503,43	R\$ 170.303,09
PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS	R\$ 359.317.164,78	R\$ 350.584.653,84	R\$ 434.339,50
MELHORIAS DE BAIRRO	R\$ 15.328.675,22	R\$ 12.047.098,39	R\$ 1.258.413,00
EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM - PREVENTIVA	R\$ 15.000.000,00	R\$ 2.827.972,69	R\$ 0,00
EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM - EMERGENCIAL	R\$ 10.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 479.645.840,00</b>	<b>R\$ 404.455.228,35</b>	<b>R\$ 1.863.055,59</b>

**REFORMA E ACESSIBILIDADE EM PASSEIOS PÚBLICOS [MOB]:  
META 40 DO PDM 2021/2024**

## REFORMA E ACESSIBILIDADE EM PASSEIOS PÚBLICOS [MOB]:

Objeto	Calçadas contempladas no Plano Emergência de Calçadas [MOB]
Subprefeitura	Lapa - Contrato 3
Endereço	Rua Coriolano/ Rua Monteiro de Melo/ Rua Catão/ Rua Faustolo
Nº do Termo de Contrato	023/SMSUB/COGEL/2024
Nº do SEI	6012.2024/0000766-6
Data da OIS	26/02/2024
Data de término	30/06/2024
% de Execução	Concluída

Valor do Contrato	R\$ 1.988.645,57
Valor Aprovado	R\$ 1.988.645,57
Valor Pago	R\$ 170.303,09

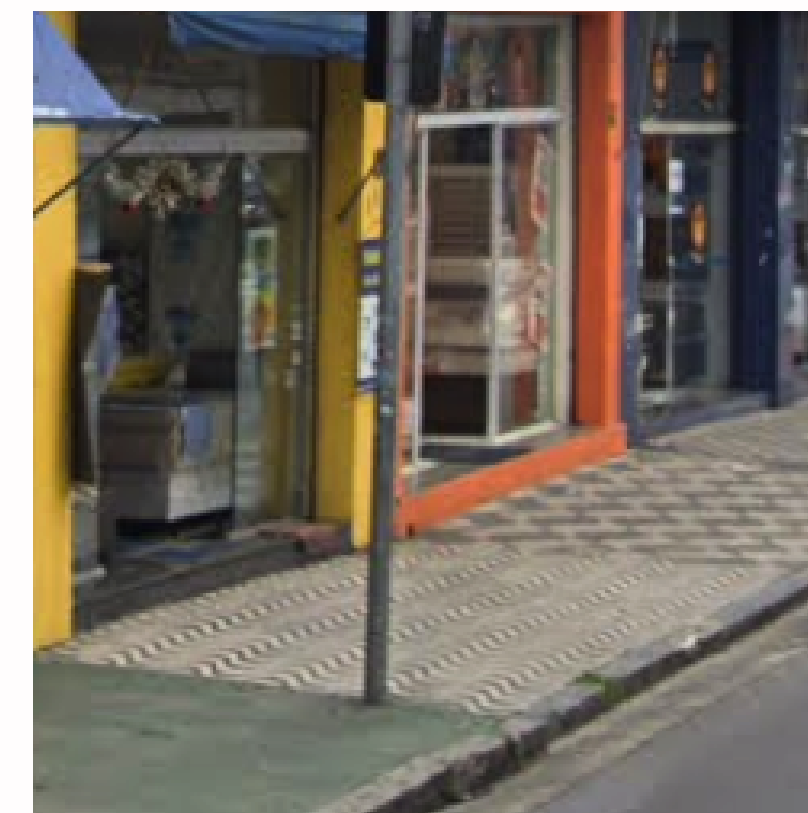


Foto antes



Foto depois

**PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS [MOB]:  
META 34 DO PDM 2021/2024**

## PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPE) [MOB]

<b>Objeto</b>	Pavimentação e Recapeamento de Vias (Recape) [MOB]
<b>Subprefeitura</b>	Aricanduva/ Formosa / Carrão
<b>Endereço</b>	Rua Cel. Amaro Sobrinho
<b>Nº do Termo de Contrato</b>	095/SMSUB/COGEL/2024
<b>Nº do SEI</b>	6012.2024/0012822-6
<b>Data da OIS</b>	21/06/2024
<b>Data de término</b>	21/11/2024
<b>% de Execução</b>	Concluída

<b>Valor do Contrato</b>	R\$ 14.354.451,11
<b>Valor Aprovado</b>	R\$ 19.001.893,97
<b>Valor Pago</b>	R\$ 669.036,84

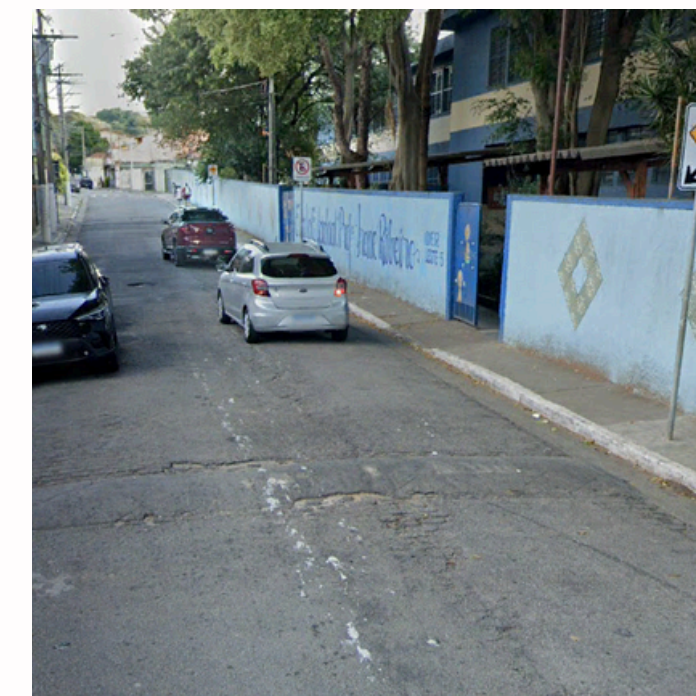


Foto antes



Foto depois

# PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS [LIVRE]: META 34 DO PDM 2021/2024

## PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPE) [LIVRE]

<b>Objeto</b>	Pavimentação e Recapeamento de Vias (Recape) [Livre]
<b>Subprefeitura</b>	Pirituba/Jaraguá
<b>Endereço</b>	Rua Francisco Chaves Pinheiro
<b>Nº do Termo de Contrato</b>	096/SMSUB/COGEL/2024
<b>Nº do SEI</b>	6012.2024/0012819-6
<b>Data da OIS</b>	01/07/2024
<b>Data de término</b>	31/08/2024
<b>% de Execução</b>	Concluída

<b>Valor do Contrato</b>	R\$ 8.818.575,86
<b>Valor Aprovado</b>	R\$ 36.360.665,16
<b>Valor Pago</b>	R\$ 414.469,69



Foto antes

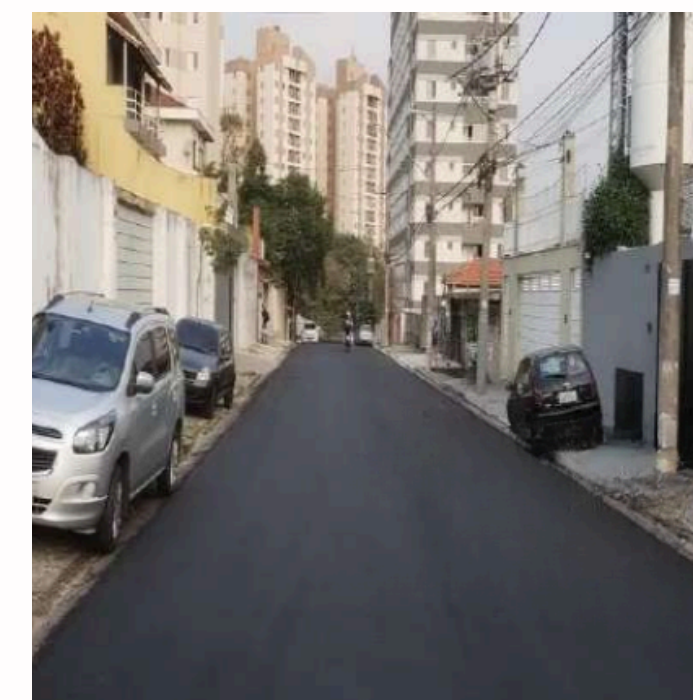


Foto depois

## PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPE) [LIVRE]

<b>Objeto</b>	Pavimentação e Recapeamento de Vias (Recape) [Livre]
<b>Subprefeitura</b>	Pirituba/Jaraguá
<b>Endereço</b>	Rua Itapixe/Francisco Neri
<b>Nº do Termo de Contrato</b>	096/SMSUB/COGEL/2024
<b>Nº do SEI</b>	6012.2024/0012819-6
<b>Data da OIS</b>	01/07/2024
<b>Data de término</b>	31/08/2024
<b>% de Execução</b>	Concluída

<b>Valor do Contrato</b>	R\$ 8.818.575,86
<b>Valor Aprovado</b>	R\$ 36.360.665,16
<b>Valor Pago</b>	R\$ 324.113,25



Foto antes

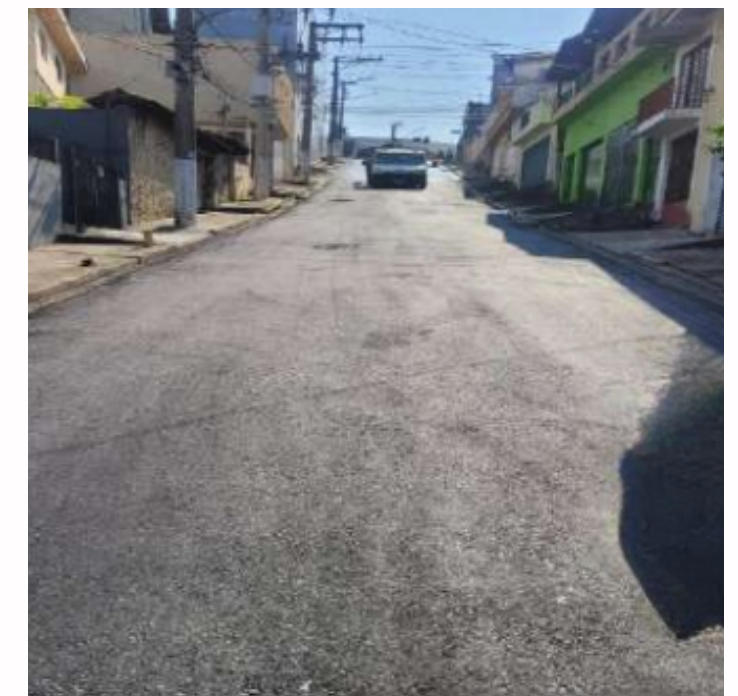


Foto depois

## PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPE) [LIVRE]

<b>Objeto</b>	Pavimentação e Recapeamento de Vias (Recape) [Livre]
<b>Subprefeitura</b>	Casa Verde/Cachoeirinha
<b>Endereço</b>	Rua Padre Moura
<b>Nº do Termo de Contrato</b>	096/SMSUB/COGEL/2024
<b>Nº do SEI</b>	6012.2024/0012819-6
<b>Data da OIS</b>	01/07/2024
<b>Data de término</b>	31/08/2024
<b>% de Execução</b>	Concluída

<b>Valor do Contrato</b>	R\$ 8.818.575,86
<b>Valor Aprovado</b>	R\$ 36.360.665,16
<b>Valor Pago</b>	R\$ 298.816,61



Foto antes

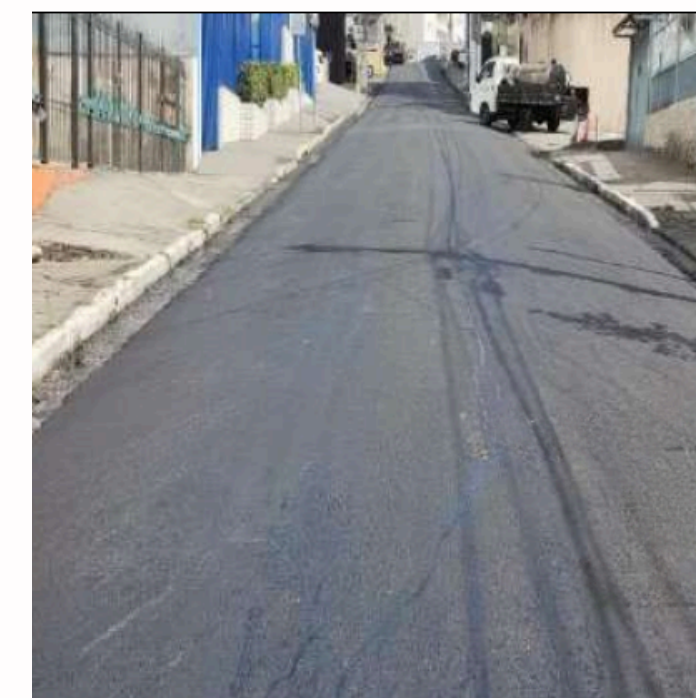


Foto depois

## PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPE) [LIVRE]

<b>Objeto</b>	Pavimentação e Recapeamento de Vias (Recape) [Livre]
<b>Subprefeitura</b>	Casa Verde/Cachoeirinha
<b>Endereço</b>	Rua Maria Elisa Siqueira
<b>Nº do Termo de Contrato</b>	096/SMSUB/COGEL/2024
<b>Nº do SEI</b>	6012.2024/0012819-6
<b>Data da OIS</b>	01/07/2024
<b>Data de término</b>	31/08/2024
<b>% de Execução</b>	Concluída

<b>Valor do Contrato</b>	R\$ 8.818.575,86
<b>Valor Aprovado</b>	R\$ 36.360.665,16
<b>Valor Pago</b>	R\$ 633.206,61



Foto antes



Foto depois

## PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPE) [LIVRE]

<b>Objeto</b>	Pavimentação e Recapeamento de Vias (Recape) [Livre]
<b>Subprefeitura</b>	Aricanduva/ Formosa / Carrão
<b>Endereço</b>	Rua Dr. Paulo de Andrade Arantes
<b>Nº do Termo de Contrato</b>	095/SMSUB/COGEL/2024
<b>Nº do SEI</b>	6012.2024/0012822-6
<b>Data da OIS</b>	21/06/2024
<b>Data de término</b>	21/11/2024
<b>% de Execução</b>	Concluída

<b>Valor do Contrato</b>	R\$ 14.354.451,11
<b>Valor Aprovado</b>	R\$ 36.360.665,16
<b>Valor Pago</b>	R\$ 443.529,32

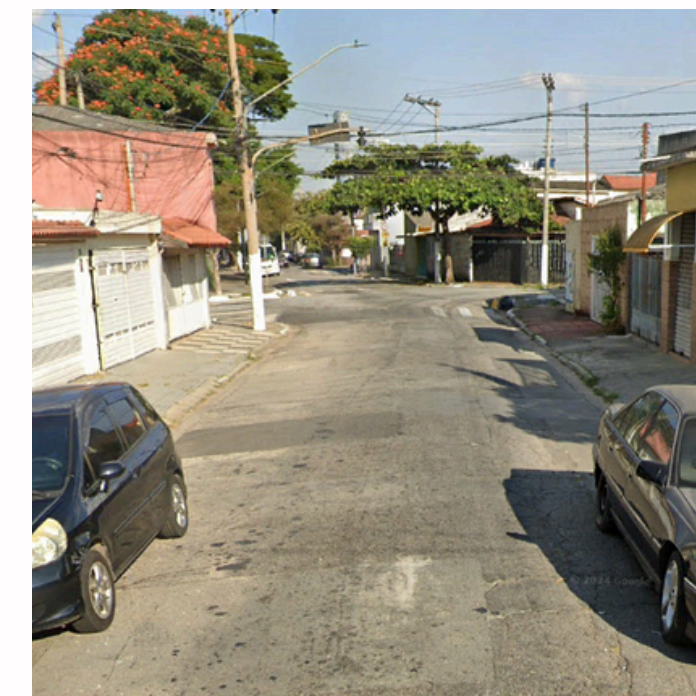


Foto antes



Foto depois

## PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPE) [LIVRE]

<b>Objeto</b>	Pavimentação e Recapeamento de Vias (Recape) [Livre]
<b>Subprefeitura</b>	Aricanduva/ Formosa / Carrão
<b>Endereço</b>	Rua Castro Teixeira
<b>Nº do Termo de Contrato</b>	095/SMSUB/COGEL/2024
<b>Nº do SEI</b>	6012.2024/0012822-6
<b>Data da OIS</b>	21/06/2024
<b>Data de término</b>	21/11/2024
<b>% de Execução</b>	Concluída

<b>Valor do Contrato</b>	R\$ 14.354.451,11
<b>Valor Aprovado</b>	R\$ 36.360.665,16
<b>Valor Pago</b>	R\$ 340.600,57



Foto antes



Foto depois

## PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPE) [LIVRE]

<b>Objeto</b>	Pavimentação e Recapeamento de Vias (Recape) [Livre]
<b>Subprefeitura</b>	Vila Prudente
<b>Endereço</b>	Rua Fabiano Alves
<b>Nº do Termo de Contrato</b>	095/SMSUB/COGEL/2024
<b>Nº do SEI</b>	6012.2024/0012822-6
<b>Data da OIS</b>	21/06/2024
<b>Data de término</b>	21/11/2024
<b>% de Execução</b>	Concluída

<b>Valor do Contrato</b>	R\$ 14.354.451,11
<b>Valor Aprovado</b>	R\$ 36.360.665,16
<b>Valor Pago</b>	R\$ 607.650,14



Foto antes



Foto depois

## PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPE) [LIVRE]

Objeto	Pavimentação e Recapeamento de Vias (Recape) [Livre]
Subprefeitura	Penha
Endereço	Praça Ademar Tavares
Nº do Termo de Contrato	095/SMSUB/COGEL/2024
Nº do SEI	6012.2024/0012822-6
Data da OIS	21/06/2024
Data de término	21/11/2024
% de Execução	Concluída

Valor do Contrato	R\$ 14.354.451,11
Valor Aprovado	R\$ 36.360.665,16
Valor Pago	R\$ 346.963,45



Foto antes



Foto depois

## PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPE) [LIVRE]

<b>Objeto</b>	Pavimentação e Recapeamento de Vias (Recape) [Livre]
<b>Subprefeitura</b>	Penha
<b>Endereço</b>	Rua Nova Serrana
<b>Nº do Termo de Contrato</b>	095/SMSUB/COGEL/2024
<b>Nº do SEI</b>	6012.2024/0012822-6
<b>Data da OIS</b>	21/06/2024
<b>Data de término</b>	21/11/2024
<b>% de Execução</b>	Concluída

<b>Valor do Contrato</b>	R\$ 14.354.451,11
<b>Valor Aprovado</b>	R\$ 36.360.665,16
<b>Valor Pago</b>	R\$ 288.291,79



Foto antes



Foto depois

**PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS [LIVRE][BP]:  
META 34 DO PDM 2021/2024**

## PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPE) [LIVRE]

<b>Objeto</b>	Pavimentação e Recapeamento de Vias (Recape) [Livre][BP]
<b>Subprefeitura</b>	Perus
<b>Endereço</b>	Rua Engenheiro Augusto Durante
<b>Nº do Termo de Contrato</b>	096/SMSUB/COGEL/2024
<b>Nº do SEI</b>	6012.2024/0012819-6
<b>Data da OIS</b>	01/07/2024
<b>Data de término</b>	31/08/2024
<b>% de Execução</b>	Concluída

<b>Valor do Contrato</b>	R\$ 8.818.575,86
<b>Valor Aprovado</b>	R\$ 42.867.842,09
<b>Valor Pago</b>	R\$ 940.718,93

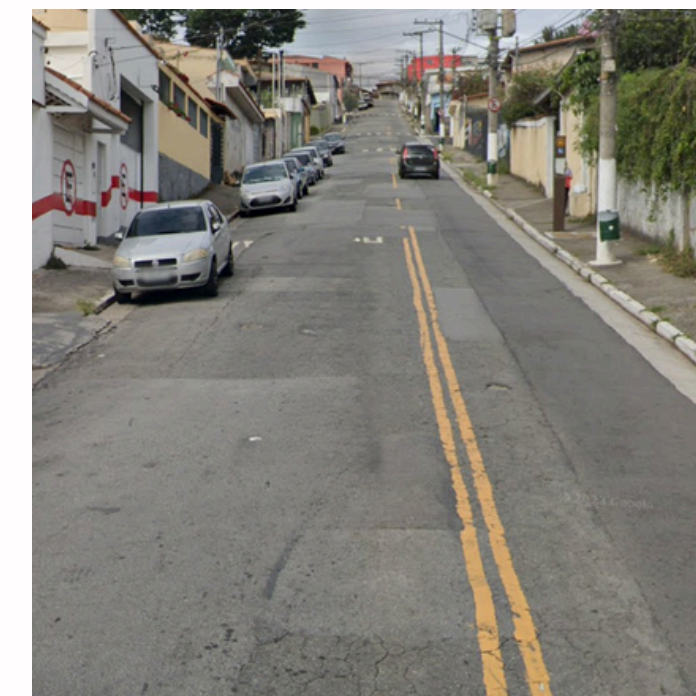


Foto antes

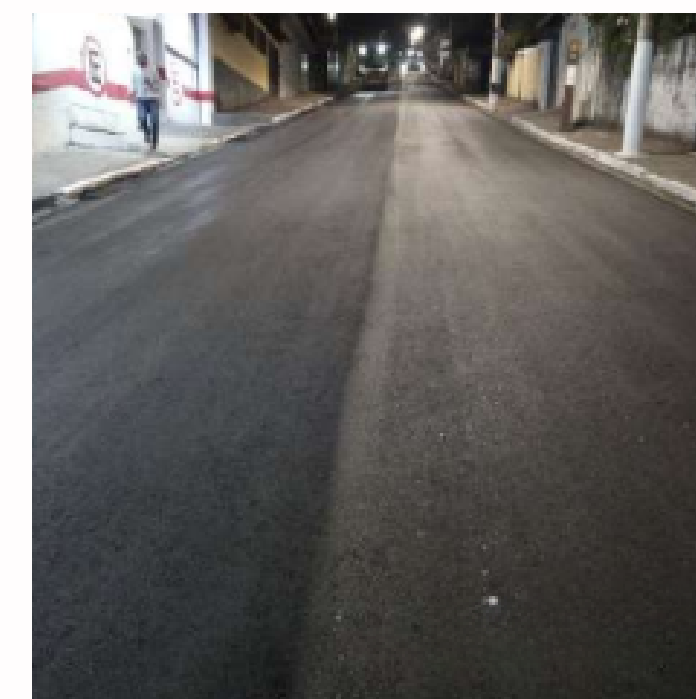


Foto depois

## PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPE) [LIVRE]

<b>Objeto</b>	Pavimentação e Recapeamento de Vias (Recape) [Livre][BP]
<b>Subprefeitura</b>	Itaquera
<b>Endereço</b>	Rua Louceiras
<b>Nº do Termo de Contrato</b>	095/SMSUB/COGEL/2024
<b>Nº do SEI</b>	6012.2024/0012822-6
<b>Data da OIS</b>	21/06/2024
<b>Data de término</b>	21/11/2024
<b>% de Execução</b>	Concluída

<b>Valor do Contrato</b>	R\$ 14.354.451,11
<b>Valor Aprovado</b>	R\$ 42.867.842,09
<b>Valor Pago</b>	R\$ 31.013,37



Foto antes



Foto depois

## PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPE) [LIVRE]

Objeto	Pavimentação e Recapeamento de Vias (Recape) [Livre][BP]
Subprefeitura	Itaquera
Endereço	Rua Freguesia de Poiares
Nº do Termo de Contrato	095/SMSUB/COGEL/2024
Nº do SEI	6012.2024/0012822-6
Data da OIS	21/06/2024
Data de término	21/11/2024
% de Execução	Concluída

Valor do Contrato	R\$ 14.354.451,11
Valor Aprovado	R\$ 42.867.842,09
Valor Pago	R\$ 90.072,01



Foto antes



Foto depois

## PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPE) [LIVRE]

<b>Objeto</b>	Pavimentação e Recapeamento de Vias (Recape) [Livre][BP]
<b>Subprefeitura</b>	Itaquera
<b>Endereço</b>	Rua do Banhado
<b>Nº do Termo de Contrato</b>	095/SMSUB/COGEL/2024
<b>Nº do SEI</b>	6012.2024/0012822-6
<b>Data da OIS</b>	21/06/2024
<b>Data de término</b>	21/11/2024
<b>% de Execução</b>	Concluída

<b>Valor do Contrato</b>	R\$ 14.354.451,11
<b>Valor Aprovado</b>	R\$ 42.867.842,09
<b>Valor Pago</b>	R\$ 48.095,80



Foto antes



Foto depois

# OBRAS DE MELHORIA DE BAIRRO

## OBRAS DE MELHORIA DE BAIRRO [LIVRE]:

Objeto	Pátio de Compostagem
Subprefeitura	Lapa
Endereço	Av. Alexandre Colares, 31 - Jaraguá
Nº do Termo de Contrato	196/SMSUB/COGEL/2023
Nº do SEI	6012.2022/0020268-6
Data da OIS	15/05/2023
Data de término	22/01/2025
% de Execução	Concluído

Valor do Contrato	R\$ 4.009.518,68
Valor Aprovado	R\$ 3.561.308,84
Valor Pago	R\$ 2.927.480,05



Foto em execução



Foto depois

# **OBRAS DE DRENAGEM E ÁREAS DE RISCO**

## **META 32 DO PDM 2021/2024**

## OBRAS DE DRENAGEM E ÁREAS DE RISCO:

Objeto	Execução de obras de drenagem
Subprefeitura	Vila Mariana
Endereço	Rua Correia de Lemos - Chácara Inglesa
Nº do Termo de Contrato	244/SMSUB/COGEL/2023
Nº do SEI	6012.2022/0022216-4
Data da OIS	25/05/2023
Data de término	30/09/2024
% de Execução	Concluída

Valor do Contrato	R\$ 4.203.484,77
Valor Aprovado	R\$ 272.385,24
Valor Liquidado	R\$ 902.385,24



Foto durante



Foto depois

# OBRIGADO!
