



PLANO DE INVESTIMENTO – 2025
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
SIURB X FUNDURB

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2025

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO: Recuperação do pavimento da Rua Said Saad.

DESCRIÇÃO	
AÇÃO	Recuperação do pavimento da Rua Said Saad.
ENDEREÇO	Rua Said Saad.
SITUAÇÃO	Em execução
PROCESSO ADM	6022.2022/0004876-2
INICIO DA OBRA	12/11/2023
PREVISAO DE TÉRMINO	11/05/2025
POSSUI MAIS DE UMA	Não

INVESTIMENTO 2025		
VALOR EMPENHADO	8.597,49	026/25
VALOR LIQUIDADADO	8.597,49	100%



mai/25

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2025

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO: Apoio técnico para fiscalização de obra - Corredor Amador Bueno da Veiga

	DESCRIÇÃO
AÇÃO	Apoio técnico para fiscalização de obra - Amador Bueno da Veiga
ENDEREÇO	Av. Amador Bueno da Veiga
SITUAÇÃO	Em execução
PROCESSO ADM	6022.2023/0000199-7
INICIO DA OBRA	19/06/2024
PREVISAO DE TÉRMINO	18/09/2025
POSSUI MAIS DE UMA	Não



INVESTIMENTO 2025		
VALOR EMPENHADO	1.508.313,66	026/25
VALOR LIQUIDADADO	1.450.947,24	96,20%


**CIDADE DE
SÃO PAULO**
INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

mai/25

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2025

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO: Apoio técnico para fiscalização de obra - Corredor de ônibus Imirim



	DESCRIÇÃO
AÇÃO	Apoio técnico para fiscalização de obra - Corredor de ônibus Imirim
ENDEREÇO	Avenida Imirim
SITUAÇÃO	Em execução
PROCESSO ADM	6022.2023/0000203-9
INICIO DA OBRA	27/07/2023
PREVISAO DE TÉRMINO	30/06/2026
POSSUI MAIS DE UMA	Não



INVESTIMENTO 2025		
VALOR EMPENHADO	722.764,80	026/25
VALOR LIQUIDADADO	722.403,25	99,95%

mai/25

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2025

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO: SISTEMA DE DRENAGEM E RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO R. DR. LUÍS AIRES ALT, 2030 ATÉ AV. PE SENA FREITAS



	DESCRIÇÃO
AÇÃO	SISTEMA DE DRENAGEM E RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO R. DR. LUÍS AIRES ALT, 2030 ATÉ AV. PE SENA FREITAS
ENDEREÇO	R. DR. LUÍS AIRES ALT, 2030 ATÉ AV. PE SENA
SITUAÇÃO	Em execução
PROCESSO ADM	6022.2023/0004539-0
INICIO DA OBRA	08/07/2024
PREVISO DE TÉRMINO	08/01/2025
POSSUI MAIS DE UMA	Não



RECUPERAÇÃO DE TUBULAÇÃO



mai/25

	INVESTIMENTO 2025	
VALOR EMPENHADO	986.807,31	026/25
VALOR LIQUIDADADO	986.807,31	100,00%

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2025

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO: projetos executivos das obras da Ligação Pirituba-Lapa



DESCRIÇÃO	
AÇÃO	Projetos executivos das obras da Ligação Pirituba-Lapa.
ENDEREÇO	Lapa
SITUAÇÃO	Em execução
PROCESSO ADM	6022.2023/0005694-5
INICIO DA OBRA	01/05/2023
PREVISAO DE TÉRMINO	01/08/2028
POSSUI MAIS DE UMA	Não



mai/25

INVESTIMENTO 2025		
VALOR EMPENHADO	949.357,65	026/25
VALOR LIQUIDADADO	670.323,20	71%

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2025

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO: Avenida Senador Teotônio Vilela, no trecho com início próximo a rua José Nicolau de Lima



	DESCRIÇÃO
AÇÃO	Avenida Senador Teotônio Vilela, no trecho com início próximo a rua José Nicolau de Lima
ENDEREÇO	Rua José Nicolau de Lima
SITUAÇÃO	Em execução
PROCESSO ADM	6022.2023/0006708-4
INICIO DA OBRA	09/05/2024
PREVISAO DE TÉRMINO	08/05/2025
POSSUI MAIS DE UMA	Não

	INVESTIMENTO 2025	
VALOR EMPENHADO	689.769,49	026/25
VALOR LIQUIDADADO	118.895,25	17%



mai/25

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2025

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO: Calçadões do Quadrilátero na Região Central de São Paulo



	DESCRIÇÃO
AÇÃO	Calçadões do Quadrilátero na Região Central de São Paulo
ENDEREÇO	República
SITUAÇÃO	Em execução
PROCESSO ADM	6022.2024/0000119-0
INICIO DA OBRA	05/06/2024
REVISAO DE TÉRMINC	31/12/2025
POSSUI MAIS DE	Não



	INVESTIMENTO 2025	
VALOR EMPENHADO	44.839,54	026/25
VALOR LIQUIDADADO	44.839,54	100%

mai/25

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2025

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO: Projeto para execução das obras de implantação da ligação viária Graúna Gaivotas



DESCRIÇÃO	
AÇÃO	Implantação da ligação viária Graúna Gaivotas
ENDEREÇO	Av. das Nações Unidas
SITUAÇÃO	Em execução
PROCESSO ADM	6022.2024/0000199-9
INICIO DA OBRA	26/07/2024
PREVISOAO DE TÉRMINO	30/06/2025
POSSUI MAIS DE UMA	Não

INVESTIMENTO 2025		
VALOR EMPENHADO	44.839,54	026/25
VALOR LIQUIDADADO	44.839,54	100%



mai/25

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2025

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO: Recuperação de redes de infra e recuperação do viário na Avenida do Estado, na altura do nº 812, no cruzamento com a Avenida Mercúrio



	DESCRIÇÃO
AÇÃO	Recuperação do viário na Avenida do Estado
ENDEREÇO	Avenida do Estado, na altura do nº 812
SITUAÇÃO	Em execução
PROCESSO ADM	6022.2024/0005585-1
INICIO DA OBRA	28/11/2024
PREVISAO DE TÉRMINO	28/11/2025
POSSUI MAIS DE UMA	Não



	INVESTIMENTO 2025	
VALOR EMPENHADO	15.000.000,00	026/25
VALOR LIQUIDADADO	8.000.000,00	53%

mai/25

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2025

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO: Execução de obras do Corredor de Ônibus - BRT Radial Leste I



	DESCRIÇÃO
AÇÃO	BRT Radial Leste I
ENDEREÇO	Rua Professor Miguel Russiano
SITUAÇÃO	Em execução
PROCESSO ADM	6022.2024/0007147-4
INICIO DA OBRA	22/08/2024
REVISAO DE TÉRMINC	21/02/2026
POSSUI MAIS DE	Não



	INVESTIMENTO 2025	
VALOR EMPENHADO	13.425.716,40	026/25
VALOR LIQUIDADO	6.264.943,36	47%



mai/25

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2025

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO: Recuperação estrutural, recomposição do pavimento e serviços complementares na Marginal do Rio Tietê, sentido Rodovia Presidente Castelo Branco,



	DESCRIÇÃO
AÇÃO	recomposição do pavimento e serviços complementares na Marginal do Rio Tietê, sentido Rodovia Presidente Castelo Branco, próximo à Ponte do Tatuapé.
ENDEREÇO	altura do nº 5.319 da Avenida Morvan Dias de Figueiredo
SITUAÇÃO	Em execução
PROCESSO ADM	6022.2024/0008346-4
INICIO DA OBRA	07/10/2024
PREVISAÇÃO DE TÉRMINO	07/10/2025
POSSUI MAIS DE UMA	Não



mai/25

	INVESTIMENTO 2025	
VALOR EMPENHADO	10.000.000,00	026/25
VALOR LIQUIDADADO	9.993.422,51	100%

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2025

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO: Elaboração de material técnico para a implantação do Melhoramento Viário Cocaia – Ponte Graúna Gaivotas.



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

DESCRIÇÃO	
AÇÃO	Ponte Graúna Gaivotas
ENDEREÇO	Rua Carmo Fernandes, nº 205
SITUAÇÃO	Em execução
PROCESSO ADM	6022.2024/0008641-2
INICIO DA OBRA	05/12/2024
PREVISAO DE TÉRMINO	05/06/2025
POSSUI MAIS DE UMA	Não



INVESTIMENTO 2025		
VALOR EMPENHADO	934.872,04	026/25
VALOR LIQUIDADADO	140.998,44	15%

mai/25

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2025

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO: Serviços especializados de engenharia consultiva para apoio técnico, topografia, controle tecnológico e ensaios de materiais



DESCRIÇÃO	
AÇÃO	Investigações geotécnicas
ENDEREÇO	Rua Barão de Jaceguai
SITUAÇÃO	Em execução
PROCESSO ADM	6022.2025/0001004-3
INICIO DA OBRA	30/04/2025
PREVISAO DE TÉRMINO	30/05/2025
POSSUI MAIS DE UMA	Não

INVESTIMENTO 2025		
VALOR EMPENHADO	8.705,82	026/25
VALOR LIQUIDADADO	8.705,82	100%

Rua Barão de Jaceguai



mai/25

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2025

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO: Execução das obras de ligação Pirituba-Lapa, implantação das pontes sobre o Rio Tietê e passagem sob a linha 8 – Diamante da CPTM.



	DESCRIÇÃO
AÇÃO	Requalificação da ligação viária Pirituba-Lapa
ENDEREÇO	Av. Raimundo Pereira de
SITUAÇÃO	Em execução
PROCESSO ADM	7910.2017/0000431-6
INICIO DA OBRA	29/06/2016
PREVISAO DE TÉRMINO	22/12/2026
POSSUI MAIS DE UMA	Não



	INVESTIMENTO 2025	
VALOR EMPENHADO	9.851.151,60	026/25
VALOR LIQUIDADADO	8.208.241,04	83%



mai/25

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2025

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO: Projeto adequação dos espaços de interesse turístico no Centro Histórico do Município de São Paulo - República.



DESCRIÇÃO	
AÇÃO	Espaços de interesse turístico no Centro Histórico
ENDEREÇO	República
SITUAÇÃO	Em execução
PROCESSO ADM	7910.2020/0000649-7
INICIO DA OBRA	24/05/2021
PREVISAO DE TÉRMINO	26/05/2025
POSSUI MAIS DE UMA	Não

INVESTIMENTO 2025		
VALOR EMPENHADO	331.180,73	026/25
VALOR LIQUIDADADO	269.514,75	81%



mai/25

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2025

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO: Execução das obras de requalificação urbana e reforma das calçadas e calçadões do Centro Velho do Município de São Paulo – Lote 2.

DESCRIÇÃO	
AÇÃO	Calçadas e Calçadões
ENDEREÇO	Centro Velho
SITUAÇÃO	Em execução
PROCESSO ADM	7910.2021/0001245-6
INICIO DA OBRA	01/12/2022
PREVISAO DE TÉRMINO	07/07/2026
POSSUI MAIS DE UMA	Não



INVESTIMENTO 2025		
VALOR EMPENHADO	17.985.563,41	026/25
VALOR LIQUIDADADO	3.233.399,92	18%

mai/25

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2025


PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2025

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO: Implantação do Corredor de Ônibus Radial Leste Trecho I entre o Terminal Dom Pedro II e Avenida Aricanduva.



DESCRIÇÃO	
AÇÃO	Corredor de ônibus Radial Leste - Trecho I
ENDEREÇO	Av. Aricanduva
SITUAÇÃO	Em execução
PROCESSO ADM	7910.2021/0001247-2
INICIO DA OBRA	27/09/2022
PREVISAO DE TÉRMINO	25/10/2025
POSSUI MAIS DE UMA	Não

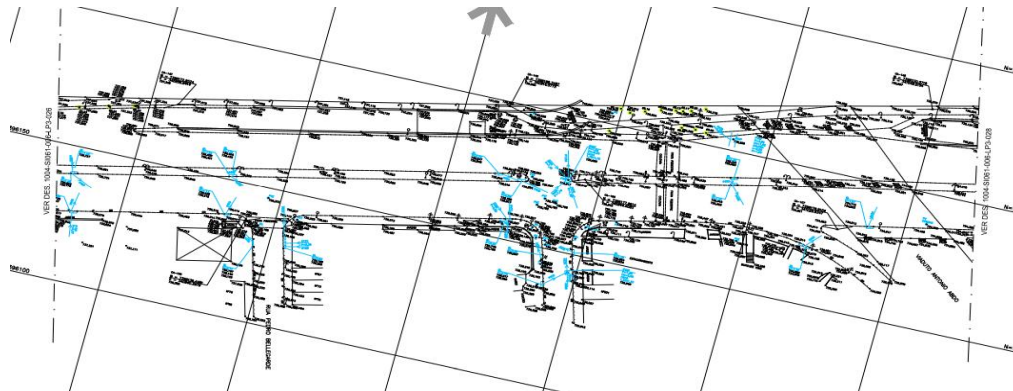

INVESTIMENTO 2025		
VALOR EMPENHADO	3.077.256,05	026/25
VALOR LIQUIDADADO	991.886,37	32%

mai/25

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2025

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO: Recuperação Estrutural do Viaduto Antonio Nakashima - Lote 23



DESCRIÇÃO	
AÇÃO	Recuperação Estrutural do Viaduto Antonio Nakashima - Lote 23
ENDEREÇO	Pq. Dom Pedro II
SITUAÇÃO	Em execução
PROCESSO ADM	7910.2022/0000474-9
INICIO DA OBRA	17/07/2023
PREVISAO DE TÉRMINO	16/09/2024
POSSUI MAIS DE UMA	Não



INVESTIMENTO 2025		
VALOR EMPENHADO	392.965,85	026/25
VALOR LIQUIDADADO	150.717,52	38%

mai/25

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2025

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO: RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO COMPLEXO VIÁRIO JOÃO JORGE SAAD (CEBOLINHA) E VIADUTO IMIGRANTES - LOTE 13.



DESCRIÇÃO	
AÇÃO	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO COMPLEXO VIÁRIO JOÃO JORGE SAAD (CEBOLINHA) E VIADUTO IMIGRANTES - LOTE 13.
ENDEREÇO	Vila Mariana / Moema
SITUAÇÃO	Concluída
PROCESSO ADM	7910.2022/0000508-7
INICIO DA OBRA	10/10/2023
PREVISAO DE TÉRMINO	09/06/2025
POSSUI MAIS DE UMA	Não



INVESTIMENTO 2025		
VALOR EMPENHADO	225.692,41	026/25
VALOR LIQUIDADADO	214.306,37	95%

mai/25

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2025

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO TERMINAL SATÉLITE ITAQUERA



DESCRIÇÃO	
AÇÃO	EXECUÇÃO DE OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO DO TERMINAL SATÉLITE ITAQUERA
ENDEREÇO	Avenida Prof. Engº Ardevan Machado, Rua Dr. Luiz Aires e Rua Salim Jorge Id
SITUAÇÃO	Em execução
PROCESSO ADM	7910.2022/0000592-3
INICIO DA OBRA	26/07/2023
PREVISAO DE TÉRMINO	23/01/2026
POSSUI MAIS DE UMA	Não



INVESTIMENTO 2025		
VALOR EMPENHADO	9.000.000,00	026/25
VALOR LIQUIDADADO	1.200.568,73	13%



mai/25

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2025

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO URBANA E REFORMA DAS CALÇADAS E CALÇADÕES DO CENTRO VELHO



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

DESCRIÇÃO	
AÇÃO	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO URBANA E REFORMA DAS CALÇADAS E CALÇADÕES DO CENTRO VELHO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - LOTE 1.
ENDEREÇO	Centro Histórico
SITUAÇÃO	Em execução
PROCESSO ADM	7910.2022/0001240-7
INICIO DA OBRA	21/10/2022
PREVISAO DE TÉRMINO	20/05/2026
POSSUI MAIS DE UMA	Não



INVESTIMENTO 2025		
VALOR EMPENHADO	6.258.333,35	026/25
VALOR LIQUIDADADO	2.590.181,05	41%



mai/25

OBJETO: Reforma do corredor de ônibus da Avenida Amador Bueno da Veiga

DESCRIÇÃO	
AÇÃO	Reforma do corredor de ônibus da Avenida Amador Bueno da Veiga
ENDEREÇO	Micaela Vieira e R. Embira
SITUAÇÃO	Em execução
PROCESSO ADM	7910.2022/0001454-0
INICIO DA OBRA	18/12/2023
PREVISAO DE TÉRMINO	17/08/2025
POSSUI MAIS DE UMA	Não



INVESTIMENTO 2025		
VALOR EMPENHADO	17.189.743,05	026/25
VALOR LIQUIDADADO	7.829.432,10	46%

mai/25

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2025

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO: Requalificação das interseções e plataforma de ônibus avenida Imirim.



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

DESCRIÇÃO	
AÇÃO	Corredor Imirim
ENDEREÇO	Av. Imirim
SITUAÇÃO	Em execução
PROCESSO ADM	7910.2022/0001455-8
INICIO DA OBRA	20/06/2023
PREVISAO DE TÉRMINO	17/02/2026
POSSUI MAIS DE UMA	Não



INVESTIMENTO 2025		
VALOR EMPENHADO	22.755.561,64	026/25
VALOR LIQUIDADADO	15.527.476,97	68%

mai/25

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2025

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO: Execução das obras e serviços de recuperação estrutural existentes e a duplicação da Ponte Jurubatuba.



DESCRIÇÃO	
AÇÃO	Duplicação da Ponte Jurubatuba.
ENDEREÇO	Av. Interlagos
SITUAÇÃO	Em execução
PROCESSO ADM	7910.2023/0001786-9
INICIO DA OBRA	01/08/2024
PREVISAO DE TÉRMINO	23/01/2026
POSSUI MAIS DE UMA	Não



INVESTIMENTO 2025		
VALOR EMPENHADO	622.952,74	026/25
VALOR LIQUIDADO	280.165,73	45%

mai/25

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2025

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO, URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO - VIADUTO JOÃO BEIÇOLA

DESCRIÇÃO	
ACAO	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO, URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO - VIADUTO JOÃO BEIÇOLA
ENDEREÇO	Av. Pedro Roche Gottsfritz, praça do Condestável, Av. Rubens Montanaro de Borba, Praça Joao Beißola da Silva, Rua Miguel de Barros, Rua Cristóvão Cabral e Av. Lourenço Cabreira
SITUAÇÃO	Em execução
PROCESSO ADM	7910.2022/0001453-1
INICIO DA OBRA	28/03/2023
PREVISAO DE TÉRMINO	27/06/2025
POSSUI MAIS DE UMA	Não



mai/25

INVESTIMENTO 2025		
VALOR EMPENHADO	1.514.630,11	026/25
VALOR LIQUIDADADO	1.431.733,23	95%

