

PLANO CICLOVIÁRIO

Cidade de São Paulo



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
MOBILIDADE
E TRÂNSITO

Janeiro/2025

NOVAS IMPLANTAÇÕES


de Estruturas Ciclovias



CIDADE DE
SÃO PAULO
MOBILIDADE
E TRÂNSITO

Janeiro/2025

MAPA CICLOVIÁRIO

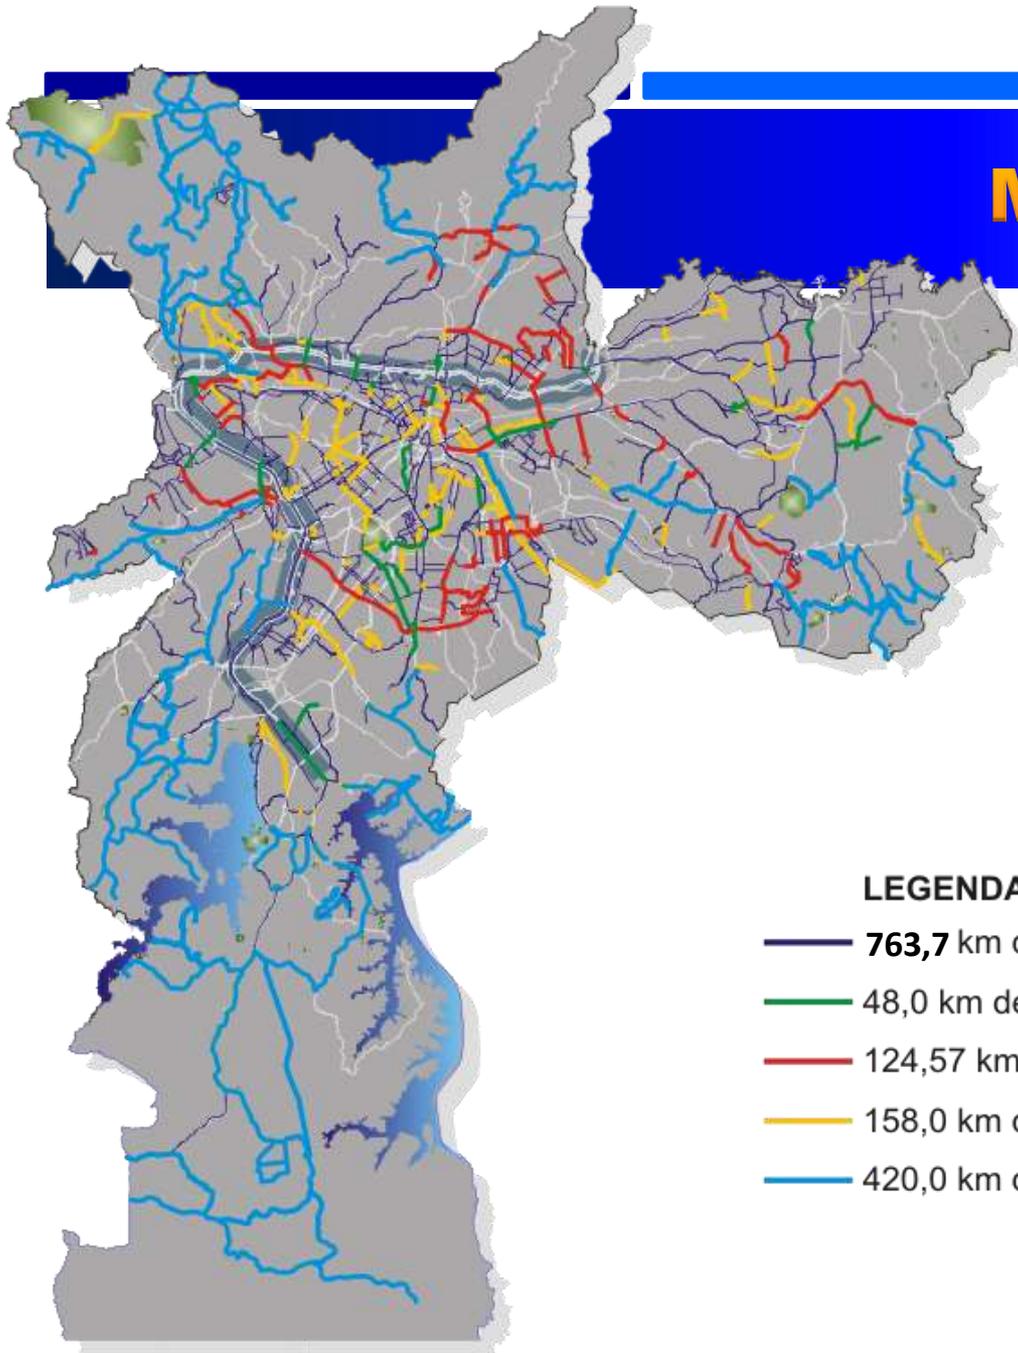

LEGENDA

- 763,7 km de Estruturas Cicloviárias **EXISTENTE**
- 48,0 km de Estruturas Cicloviárias **CONTRATADAS**
- 124,57 km de Estruturas Cicloviárias **PPP COHAB**
- 158,0 km de Estruturas Cicloviárias **EM LICITAÇÃO**
- 420,0 km de Estruturas Cicloviárias **PLANEJADAS/ESTUDO**



CONCORRÊNCIA 02 e 03

CONTRATO ENCERRADO EM 31/12/24



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
MOBILIDADE
E TRÂNSITO

CONTRATO 03

CICLOVIA	EXTENSÃO ORIGINAL (m)	EXTENSÃO REVISADA (m)	SITUAÇÃO DA OBRA	TOTAL EXTENSÃO EXECUTADA (m)	SINALIZAÇÃO	OBSERVAÇÃO
REPÚBLICA DO LÍBANO	650,00	650,00	CONCLUÍDA		CONCLUÍDA	TERMINADA
DOM PEDRO I	1.550,00	1.650,00	CONCLUÍDA		CONCLUÍDA	TERMINADA
SENA MADUREIRA	2.865,00	2.865,00	CONCLUÍDA		CONCLUÍDA	TERMINADA
VIADUTO BRESSER	1.090,00	1.162,00	CONCLUÍDA		CONCLUÍDA	TERMINADA
RUI BARBOSA / 13 DE MAIO	2.270,00	2.270,00	CONCLUÍDA		CONCLUÍDA	TERMINADA
DONA AVELINA/SANGIRARDI	1.332,00	1.432,00	CONCLUÍDA		CONCLUÍDA	TERMINADA
EDUCADOR PAULO FREIRE	220,00	220,00	CONCLUÍDA		CONCLUÍDA	TERMINADA
MIGUEL YUNES	1.450,00	1.563,00	CONCLUÍDA		CONCLUÍDA	TERMINADA
JOSÉ MARIA WHITAKER	1.675,00	1.675,00	CONCLUÍDA		CONCLUÍDA	TERMINADA
VIADUTO ITINGUÇU	1.100,00	85,61	CONCLUÍDA		CONCLUÍDA	TERMINADA
JACU PÊSSEGO	905,00	905,00	CONCLUÍDA		CONCLUÍDA	TERMINADA
NAGIB FARAH MALUF	2.250,00	2.250,00	CONCLUÍDA		AGUARDANDO IMPLANTAÇÃO	
JOÃO BATISTA CONTI	1.600,00	1.500,00	NÃO CONCLUÍDA		IMPLANTAÇÃO PARCIAL	Aguardando parecer da CET para o trecho entre Av. Nagib F. Maluf e
TOTAL	18.957,00	18.227,61		16.727,61		

CONTRATO 04

CICLOVIA	EXTENSÃO ORIGINAL (m)	EXTENSÃO REVISADA (m)	SITUAÇÃO DA OBRA	TOTAL EXTENSÃO EXECUTADA	SINALIZAÇÃO	OBSERVAÇÃO
AVENIDA JAGUARÉ	610,00	886,92	CONCLUÍDA		CONCLUÍDA	TERMINADA
GASTÃO VIDIGAL	1.400,00	1.696,25	CONCLUÍDA		CONCLUÍDA	TERMINADA
PONTE CID. UNIVERSITÁRIA	485,00	980,80	CONCLUÍDA		CONCLUÍDA	TERMINADA
TIRADENTES / S. DUMONT	715,00	1.297,33	CONCLUÍDA		CONCLUÍDA	TERMINADA
CAMPO DE BAGATELLE	820,00	1.099,95	CONCLUÍDA		CONCLUÍDA	TERMINADA
DR. ABRAÃO RIBEIRO	600,00	620,00	CONCLUÍDA		CONCLUÍDA	TERMINADA
RAIMUNDO P. MAGALHÃES	2.120,00	2.120,00	CONCLUÍDA		CONCLUÍDA	TERMINADA
ORDEM E PROGRESSO	969,00	869,00	CONCLUÍDA		CONCLUÍDA	TERMINADA
PONTE FREGUESIA DO Ó	1.000,00	1.966,86	CONCLUÍDA		CONCLUÍDA	TERMINADA
MUTINGA	1.531,00	1.031,00	CONCLUÍDA		AGUARDANDO IMPLANTAÇÃO	
ALVARENGA	2.425,00	1.600,00	CONCLUÍDA		AGUARDANDO IMPLANTAÇÃO	
PONTE DO JAGUARÉ	1.500,00	1.988,18	NÃO CONCLUÍDA		IMPLANTAÇÃO PARCIAL	
TOTAL	14.175,00	16.156,29		14.168,11		

CONTRATO 05

CICLOVIA	EXTENSÃO ORIGINAL (m)	EXTENSÃO REVISADA (m)	SITUAÇÃO DA OBRA	TOTAL EXTENSÃO EXECUTADA	SINALIZAÇÃO	OBSERVAÇÃO
INDIANÓPOLIS	3.520,00	3.620,00	CONCLUÍDA		CONCLUÍDA	TERMINADA
NAÇÕES UNIDAS I	1.260,00	1.281,00	CONCLUÍDA		CONCLUÍDA	TERMINADA
NAÇÕES UNIDAS II	807,00	807,00	CONCLUÍDA		CONCLUÍDA	TERMINADA
ENGº ALBERTO ZAGOTTIS	2.866,00	1.865,00	CONCLUÍDA		CONCLUÍDA	TERMINADA
ARMANDO ARRUDA PEREIRA	1.415,00	1.515,00	CONCLUÍDA		CONCLUÍDA	TERMINADA
RADIAL LESTE	3.044,00	3.044,00	SUSPensa			Obra suspensa devido à obra de implantação do BRT Radial Leste
CARLOS CALDEIRA FILHO	2.900,00	2.390,42	SUSPensa			Obra suspensa por solicitação da CET, tendo em vista a
TOTAL	15.812,00	14.522,42		9.088,00		

Quadro Resumo

- **Estruturas Executadas e Sinalizadas:** 35.102,72
- **Estruturas Executadas:** 38.016,86

REGISTROS FOTOGRÁFICOS

de Atividades



CIDADE DE
SÃO PAULO
MOBILIDADE
E TRÂNSITO

PONTE FREGUESIA DO Ó



PONTE FREGUESIA DO Ó



PPP da HABITAÇÃO



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
MOBILIDADE
E TRÂNSITO

SITUAÇÃO DOS LOTES - 1

LOTE	Estrutura Ciclovial	Extensão (m)	Status	Data da Conclusão
LOTE 01	Projeto	-	Concluído	
LOTE 01	Viaduto Grande São Paulo	1.200,00		
LOTE 01	Av. Abraão de Moraes	3.159,00		
LOTE 01	Rua Salvador Simões	910,00		
LOTE 01	Rua Agostinho Gomes	1.221,00	Concluído	02/02/2024
LOTE 01	Rua Cipriano Barata	650,00		
LOTE 01	Rua Manifesto	1.760,00		
LOTE 01	Rua Cisplatina	709,00		
LOTE 01	Rua Antonio Carlos da Fonseca	2.720,00	Concluído	12/11/2024
LOTE 01	Rua Dom Macario	1.540,00	Concluído	10/02/2025
LOTE 01	Rua Nossa Senhora da Saúde - Trecho I	930,00	Concluído	01/12/2023
LOTE 01	Rua Nossa Senhora da Saúde - Trecho II	627,00		
LOTE 01	Rua José dos Reis	560,00	Concluído	29/11/2024
LOTE 01	Rua Amparo	519,00		
LOTE 01	Sub Total	16.505,00		

SITUAÇÃO DOS LOTES - 2

LOTE	Estrutura Cicloviária	Extensão (m)	Status	Data da Conclusão
LOTE 02	Projeto			
LOTE 02	I - Estrutura Cicloviária Bandeirantes	9.852,00		
LOTE 02	II - Estrutura Cicloviária Farid Miguel Haddad	5.930,00		
LOTE 02	III - Estrutura Cicloviária Conexão Parque Do Estado	720,00		
LOTE 02	IV - Estrutura Cicloviária Rodovia Dos Imigrantes (Trecho Urbano)	1.180,00		
LOTE 02	V - Estrutura Cicloviária Água Funda	1.399,00		
LOTE 02	VI - Estrutura Cicloviária Abílio Soares	1.830,00		
LOTE 02	VII - Estrutura Cicloviária Tutóia	351,00		
LOTE 02	VIII - Estrutura Cicloviária Pedro Álvares Cabral	1.999,00		
LOTE 02	IX - Estrutura Cicloviária José Maria Whitaker	1.250,00		
LOTE 02	X - Estrutura Cicloviária Senador Casemiro Da Rocha	980,00		
LOTE 02	Sub Total	25.491,00		

SITUAÇÃO DOS LOTES - 5

LOTE	Estrutura Ciclovitaria	Extensão (m)	Status	Data da Conclusão
LOTE 05	Projeto	-	Concluído	
LOTE 05	Rua Airton Pretini	645,00	Em Obras	
LOTE 05	Rua Apucarana	1.999,00	Concluído	02/05/2024
LOTE 05	Av. Aricanduva	900,00		
LOTE 05	Rua Adhemar Pereira de Barros	965,00	Em Obras	
LOTE 05	Rua Astarte	778,00	Concluído	02/05/2024
LOTE 05	Av. Salim Farah Maluf	2.539,00	Em Obras	
LOTE 05	Av. Capitão Pacheco Chaves	1.644,00	Em Obras	
LOTE 05	Rua Carlos de Campos	706,00	Concluído	02/05/2024
LOTE 05	Av. Estado	1.614,00		
LOTE 05	Rua Joao Boemer	1.872,00	Concluído	20/01/2025
LOTE 05	Pte Tatuapé	700,00	Em Obras	
LOTE 05	Av. Radial Leste	2.711,00		
LOTE 05	Rua Ribeiro de Lima	430,00		
LOTE 05	Sub Total	17.503,00		

SITUAÇÃO DOS LOTES - 7

LOTE	Estrutura Ciclovial	Extensão (m)	Status	Data da Conclusão
LOTE 07	Projeto	-	Concluído	
LOTE 07	Av. Conceição	1.133,00		
LOTE 07	Av. Guilherme	220,00		
LOTE 07	Rua Maria Cândida	2.341,00	Concluído	04/09/2024
LOTE 07	Rua Alberto Byington	3.311,00		
LOTE 07	Av. Amaro Felicíssimo da Silveira	1.856,00		
LOTE 07	Av. José Maria Fernandes	1.309,00	Concluído	21/10/2024
LOTE 07	Rua Roland Garros	1.303,00		
LOTE 07	Rua Jardim Japão	1.416,00		
LOTE 07	Rua Gueixas	767,00		
LOTE 07	Rua Maria José Barone Fernandes	2.420,00		
LOTE 07	Sub Total	16.076,00		

SITUAÇÃO DOS LOTES - 9

LOTE	Estrutura Ciclovitaria	Extensão (m)	Status	Data da Conclusão
LOTE 09	Projeto	-	Concluido	
LOTE 09	Rua Benjamim Mansur	1.297,00	Concluido	02/01/2024
LOTE 09	Av. Corifeu de Azevedo Marques - Trecho I	1.640,00	Concluido	01/11/2023
LOTE 09	Av. Corifeu de Azevedo Marques - Trecho II	2.790,00		
LOTE 09	Rua José Peres Campelo	3.594,00		
LOTE 09	Rua Adherbal Stresser	114,00	Concluido	15/02/2025
LOTE 09	Rua Camargo	532,00		
LOTE 09	Rua Gal. Asdrúbal da Cunha-TRECHO 2/R. Maj. Walter Carlson	172,00	Concluido	15/02/2025
LOTE 09	Rua Sapetuba	461,00		
LOTE 09	Rua Waldemar Roberto - ligação	285,00		
LOTE 09	Rua Santa Marina	770,00		
LOTE 09	Av. Vital Brasil	1.230,00	Concluido	01/11/2023
LOTE 09	Sub Total	12.885,00		

SITUAÇÃO DOS LOTES - 10

LOTE	Estrutura Ciclovial	Extensão (m)	Status	Data da Conclusão
LOTE 10	Projeto	-	Em Obras	
LOTE 10	I - Estrutura Ciclovial Forte do Leme	1.116,00		
LOTE 10	II - Estrutura Ciclovial Satélite	1.445,00		
LOTE 10	III - Estrutura Ciclovial André de Almeida	3.144,00		
LOTE 10	IV - Estrutura Ciclovial Luís Pires de Minas	1.697,00		
LOTE 10	V - Estrutura Ciclovial Manuel dos Santos Braga	1.592,00		
LOTE 10	VI - Estrutura Ciclovial Riacho dos Machados	2.305,00		
LOTE 10	VII - Estrutura Ciclovial Adriano Bertozzi	2.880,00		
LOTE 10	VIII - Estrutura Ciclovial Shinzaburo Mizutani	1.945,00		
LOTE 10	IX - Estrutura Ciclovial Serra de São Domingos	2.403,00		
LOTE 10	X - Estrutura Ciclovial José Pinheiros Borges	8.450,00		
LOTE 10	Sub Total	26.977,00		

SITUAÇÃO DOS LOTES - 11

LOTE	Estrutura Ciclovitaria	Extensão (m)	Status	Data da Conclusão
LOTE 11	Projeto	-	Concluido	
LOTE 11	Av Queiroz Filho	1.155,00	Em Obras	
LOTE 11	Rua Potsdam	1.137,00		
LOTE 11	Rua Guaipá	1.654,00		
LOTE 11	Av Imperatriz Leopoldina	94,00		
LOTE 11	Rua Major Paladino	373,00		
LOTE 11	Viaduto da Lapa	697,00		
LOTE 11	Ponte do Piqueri/Av. Ermano Marchetti	2.221,00		
LOTE 11	Rua Dronsfield	1.381,00		
LOTE 11	Av Gastão Vidigal - Mergenthaler	290,00		
LOTE 11	Sub Total	9.002,00		

SITUAÇÃO DOS LOTES - 12


LOTE	Estrutura Ciclovial	Extensão (m)	Status	Data da Conclusão
LOTE 12	Projeto	-	Concluído	
LOTE 12	Rua Virgília Rodrigues Alves C. Pinto	1.500,00	Concluído	06/02/2025
LOTE 12	Rua Santa Inês	1.886,00	Em Obras	
LOTE 12	Rua Maria Amália Lopes de Azevedo	4.703,00	Em Obras	
LOTE 12	Rua Antonio Cesar Neto	780,00	Concluído	14/11/2024
LOTE 12	Av. Benjamin Pereira	1.660,00		
LOTE 12	Rua Manuel Gaya	1.842,00	Concluído	02/05/2024
LOTE 12	Rua Antônio Maria de Laet	2.792,00		
LOTE 12	Av. Capitão José Parada Gonçalves	916,00	Concluído	17/02/2025
LOTE 12	Rua Duarte de Azevedo	1.020,00	Concluído	02/05/2024
LOTE 12	Sub Total	17.099,00		

RESUMO POR LOTE

Lotes	Extensão Total (m)	Implantação Concluída (m)	Extensão Em Obras (m)
Lote 01	16.505,00	6.971,00	0,00
Lote 02	25.491,00	0,00	0,00
Lote 05	17.503,00	5.355,00	6.493,00
Lote 07	16.076,00	3.650,00	0,00
Lote 09	12.885,00	4.453,00	0,00
Lote 10	26.977,00	0,00	0,00
Lote 11	9.002,00	0,00	1.155,00
Lote 12	17.099,00	6.058,00	6.589,00
TOTAL PPP	141.538,00	26.487,00	14.237,00

Situação em 10/03/2025

OBRAS CONCLUÍDAS

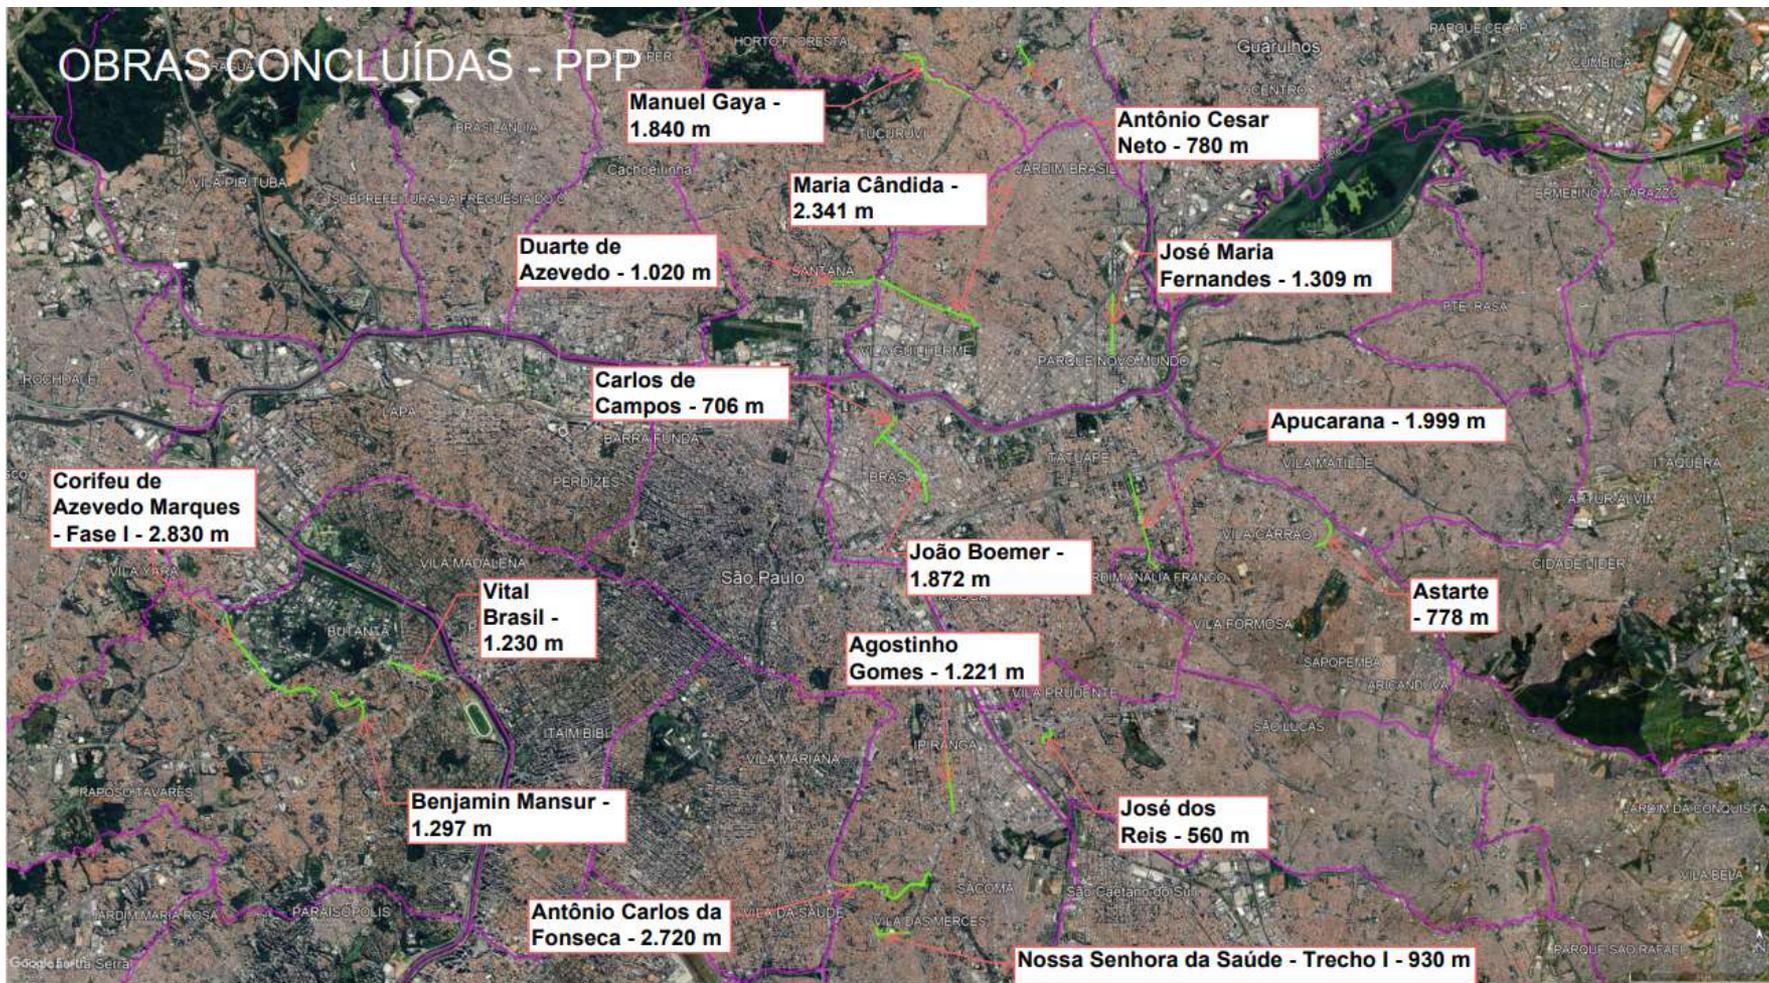

REGISTROS FOTOGRÁFICOS

de Atividades



CIDADE DE
SÃO PAULO
MOBILIDADE
E TRÂNSITO

RUA DOM MACÁRIO




RUA DOM MACÁRIO




AVENIDA SANTA INÊS




RUA MARIA AMÁLIA LOPES DE AZEVEDO

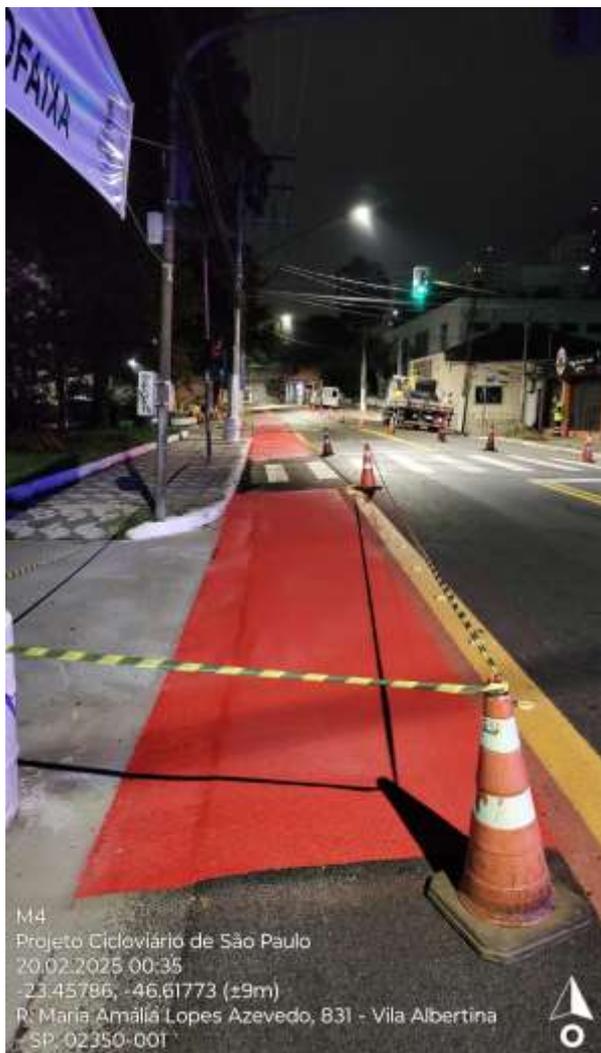

RUA VIRGÍLIA RODRIGUES

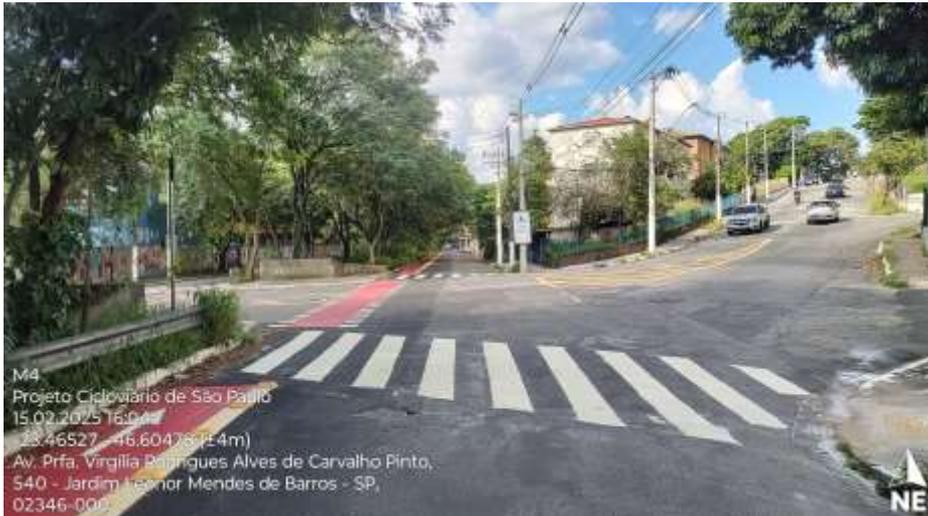

RUA VIRGÍLIA RODRIGUES

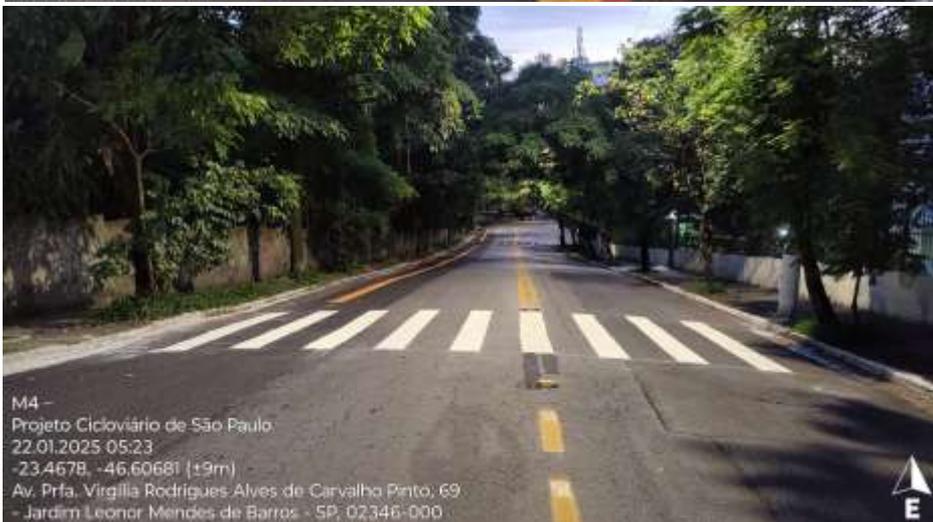

ADERBAL STRESSER-ASDRUBAL DA CUNHA



MANUTENÇÃO

das Estruturas Ciclovviárias



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
MOBILIDADE
E TRÂNSITO

Dezembro/2024

MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS CICLOVIÁRIAS

CONTRATO 22/SMT/23	
Status	Extensão (m)
Estruturas Vistoriadas	580.050,00
OS Emitida + Manut. Concluída	120.639,05
Manutenção Iniciada	14.111,80
Manutenção Concluída	89.765,25
OS Emitida - não iniciada	7.459,00
OS Suspensa	9.303,00

CONTRATO 02/SMT/25	
Status	Extensão (m)
OS Emitida - não iniciada	2.532,00

Situação em 10/03/2025

REGISTROS FOTOGRÁFICOS

de Atividades



CIDADE DE
SÃO PAULO
MOBILIDADE
E TRÂNSITO

RUA PASSO DA PÁTRIA



RUA MAESTRO GABRIEL MIGLIORI




FREGUESIA DO Ó




AV. TORRES DE OLIVEIRA



VILA CARRÃO

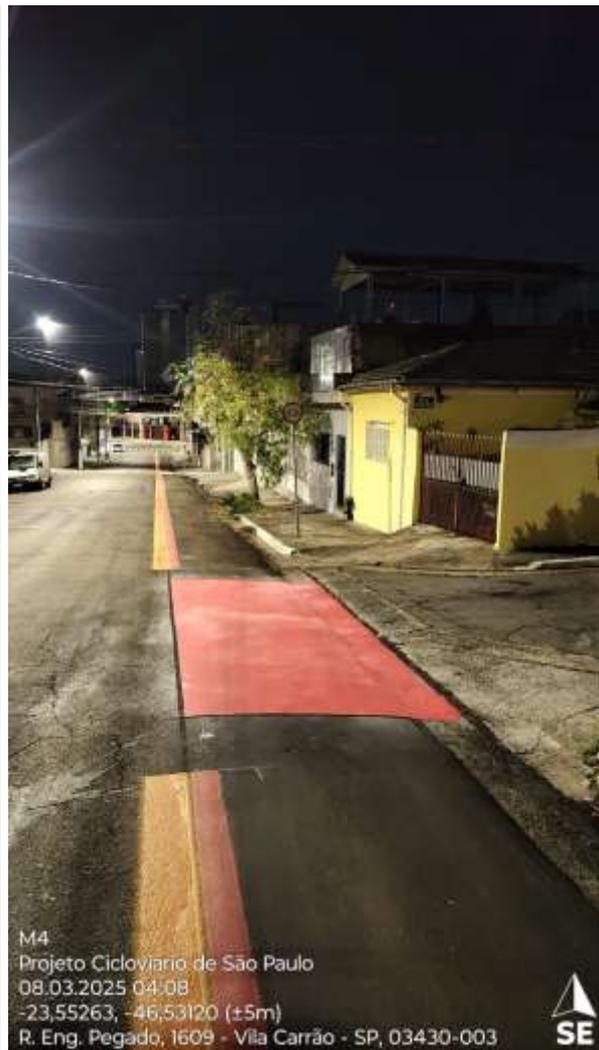

AV. ELISEU DE ALMEIDA

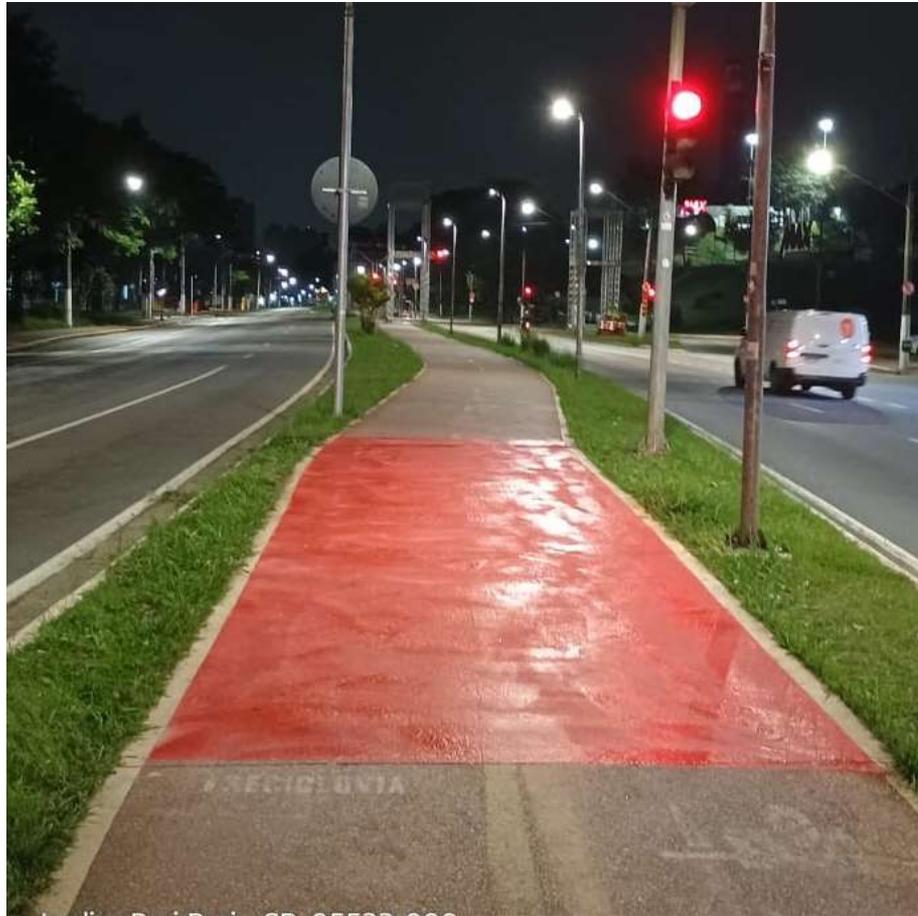

Bade
831.0187 19-0
-23.59033, -46.73662
Av. Eliseu de Almeida, 3150 - Jardim Peri Peri - SP, 05533-000



Bade
831.0187 19-0
-23.59043, -46.73676
Av. Eliseu de Almeida, 3150 - Jardim Peri Peri - SP, 05533-000

AGOSTINHO CANTÚ / ERIKA SALLUM




AGOSTINHO CANTÚ / ERIKA SALLUM



AV. JAGUARÉ



AV. JAGUARÉ

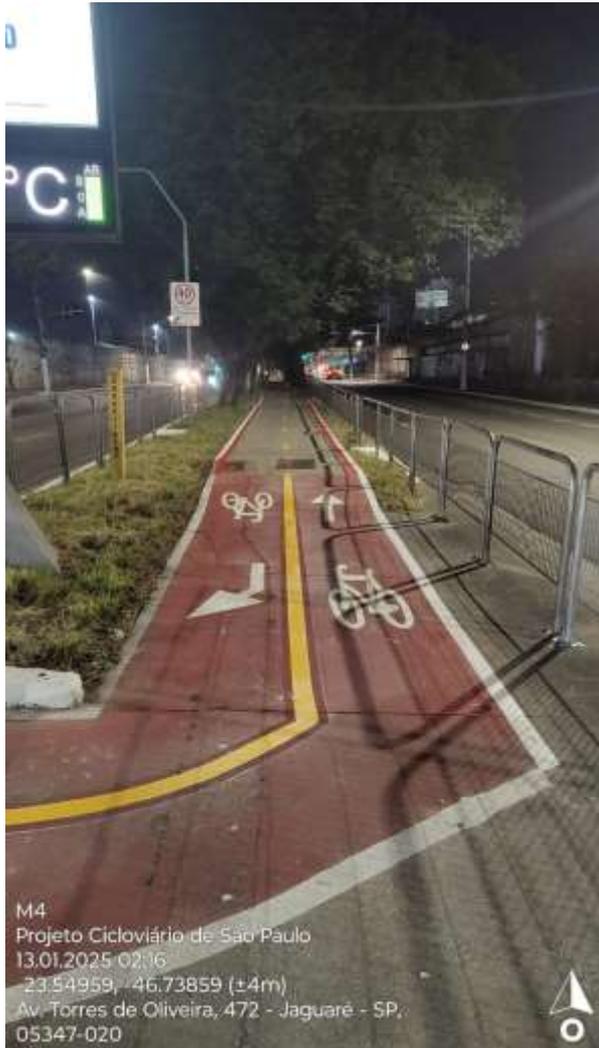

AV. FARIA LIMA



MANUTENÇÃO FINALIZADA

Nome	Extensão
Ciclofaixa Jair Ribeiro	1722,0 m
Ciclovia Teôtonio Vilela	4105,0 m
Ciclofaixa Barão da Passagem	1356,0 m
Ciclovia Octalles / Zagottis	1123,0 m
Ciclovia Sumaré	3245,0 m
Ciclofaixa França Pinto	1536,0 m
Ciclovia Vd Antartica	1388,0 m
Ciclovia Luís Carlos Berrini	3331,0 m
Ciclofaixa Consolação	373,0 m
Ciclovia Santos Dumont - Trecho 1	522,0 m
Ciclofaixa Cecilia Lotemberg	2018,0 m
Ciclofaixa Metalurgico	2624,0 m
Ciclofaixa Santa Eulália	392,0 m
Marquês de São Vicente	4035,0 m
Ciclofaixa Parque da Mooca	1446,0 m
Ciclofaixa Vila Prudente - T1	1295,0 m
Ciclofaixa Vila Prudente - T1 Complemento	971,0 m
Ciclofaixa Vila Prudente - T3	2068,0 m

Nome	Extensão
Jabaquara Trechos 1 e 2	4397,0 m
Jabaquara Trecho 3	627,0 m
Benjamim Constant	230,0 m
Ciclofaixa Jaguará	174,0 m
Ponte Vila Guilherme	695,0 m
Ponte Jânio Quadros	539,0 m
Vd. 9 de Julho	275,0 m
Aratãs	784,0 m
Ciclovia e Ciclofaixa Hebe Camargo	3553,0 m
Ciclofaixa Cambuci	45,0 m
Ciclofaixa Estado (Rua das Figueiras)	26,3 m
Ciclovia Ponte Aricanduva	791,0 m
Jacu-Pêssego	14810,0 m
Ciclofaixa Parque São Rafael	1655,0 m
Norma Pieruccini Giannotti	909,0 m
Ciclofaixa Jardim Helena / São Miguel - T2	1736,00
Martiniano de Carvalho	769,00
São João	768,00

MANUTENÇÃO FINALIZADA

Nome	Extensão
Tancredo Neves	2540,00
Ciclofaixa Patriotas	2158,00
José Alves da Cunha	1309,00
Ciclofaixa Chácara Santo Antônio	971,00
Jardim Cordeiro	909,00
Camargo	464
Parque Arariba T2	842,00
Jaguaré	745
Vitória Speers	1208
Carioca Camumu	1197
Torres de Oliveira	1258,00
Passo da Patria	1765,00
Eliseu de Almeida (parcial)	2363,00
Gabriel Migliori	1361,00
Vinte e Um de Abril	1157,00
Joaquina Ramalho	627,00
Visconde de Taunay	973,00

Total Finalizada: 89.765,25 Km

MANUTENÇÃO EM ANDAMENTO

Nome	Extensão
Paraciclos	
Faria Lima - T2	6759,00
Reposição Geral de Gradis	
Faria Lima - Conexões	1351,00
Costa Carvalho	96,00
Vila Carrão - R. João Vieira Prioste E Outras	2120,00
Arena Corinthians	1394,00
Agostinho Cantu	882,00
Martiniano De Carvalho 2	1171,00
Manoel Da Nóbrega	224,00
Mofarrej	61,30
São Miguel	53,50

**Total de obras em andamento:
14.111,8 Km**

ORDENS DE SERVIÇO EMITIDAS

Nome	Extensão
Ciclovía Inajar de Souza	5997,0 m
Ciclovía Brás Leme	2938,0 m
Ciclofaixa Brás Leme - Ligação	368,0 m
Nazaré - T2 (Tachões)	2400,00
Nazaré - T2	347,00
Caititu	2059,00
Figueira Rangel	986,00
Praça Da República	402,00
Monotrilo Vila Prudente - Liam	396,00
Nhambiquaras - Jurupis x Acoce x Maracatins (Parcial)	869,00



Suspensas para
ajuste de projeto.
9.303,00 Km

OS emitidas e serviços não iniciados: 22.082,80 Km

OBRIGAD@!



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
MOBILIDADE
E TRÂNSITO
