

Consórcio Sumaré

Setembro de 2014



Consórcio Sumaré – Situação Atual



Consórcio Sumaré – Escopo



CONSÓRCIO ENGEFORM



Córrego Água Preta

- Galerias 1.150m
- Túneis: 350m
- Subtotal: 1.500m

Córrego Sumaré:

- Galerias: 380m
- Túneis: 593m
- Subtotal: 973m

Total: 2.473m

Valor Contratual:

- R\$ 178.655.197,77
(Sem reajustes e correções)

Consórcio Sumaré – Fotos



CONSÓRCIO ENGEFORM



PS2 e PS1




Túnel Travessia Marginal

Realizado: 60,5 m

Previsão Total: 200m



Legenda:



Consórcio Sumaré – Fotos



CONSÓRCIO
ENGEFORM



Galeria VCA Marginal
Marquês:
Realizado: 248,20m
Previsão Total: 300m



Consórcio Sumaré – Fotos



CONSÓRCIO ENGEFORM



Túnel Sifão:
Realizado: 224,5m
Previsão Total: 280m



Consórcio Sumaré – Fotos



CONSÓRCIO
ENGEFORM



Galeria VCA Tecnisa

Realizado: 355 m


Previsão Total: 560m



Consórcio Sumaré – Fotos




PS8

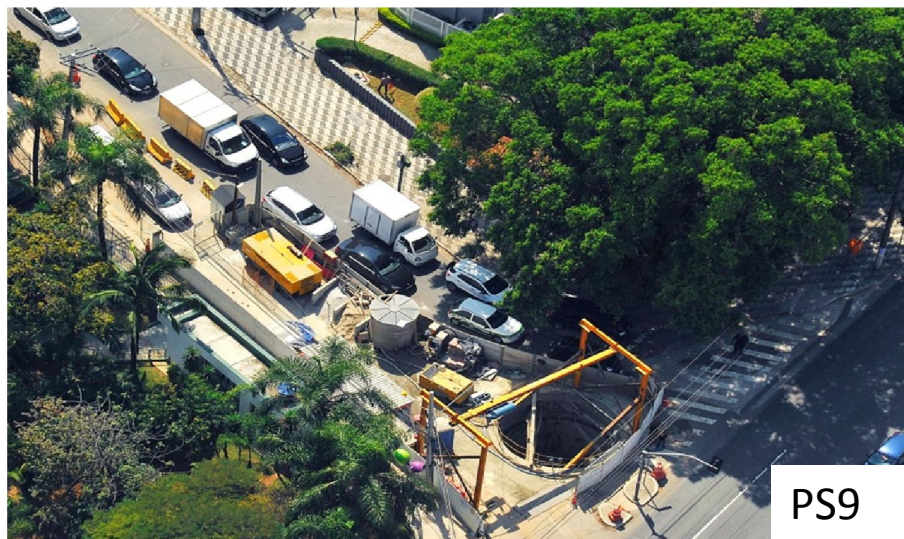

PS9

Túnel Padre Antônio
Tomás:
Realizado: 65m
Previsão Total: 385m

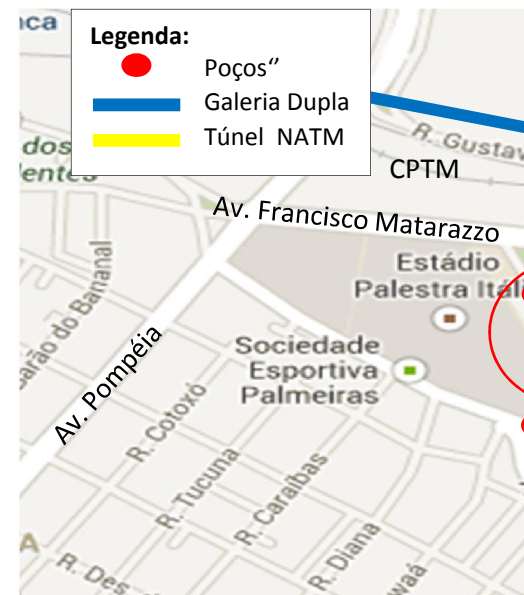

sócio Sumaré – Efetivo

Empresa	MDO Indireta	MDO Direta	Total
Form	15	1	16
relli	13	1	14
Consórcio Sumaré	30	130	160
Empreiteiros	16	118	134
	74	250	324



Equipamentos Principais	
Estaca	2
Escavadeira	1
Escavadeira hidráulica	4
Estaca	1
Escavadeira	4
Boia Submersível	17



Fonte: Controle de e
empres
