

**PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL PLANO DE
INVESTIMENTO – 2024
SIURB X FUNDURB**



PLANO DE INVESTIMENTOS 2024

PLANO 2024 - AÇÕES	Valor Inicial 2024	Recursos Remanescentes 2022	Recursos Remanescentes 2023	Valor Total Aprovado	Valor Pago
Implantação de Estrutura Turística no Triângulo e Quadrilátero Histórico do Centro	22.000.000,00	6.756.706,00	-	28.756.706,00	-
Projeto executivo, vigilância e obras (MOB)	20.000.000,00	6.756.706,00		26.756.706,00	
Gerenciamento (Ger)	2.000.000,00			2.000.000,00	
Implantação de Corredores de Ônibus Novos	35.252.950,00	30.000.000,00	-	65.252.950,00	1.320.834,31
Corredor Radial Leste - Trechos 1 e 2 (MOB)					
Corredor Itaim - São Matheus (MOB)					
Corredor Aricanduva (MOB)	32.052.950,00	30.000.000,00		62.052.950,00	1.320.834,31
Corredor Capão (MOB)					
Corredor Chucri Zaidan (MOB)					
Gerenciamento (Ger)	3.200.000,00			3.200.000,00	
Construção de Terminais de Ônibus	36.800.000,00	13.800.000,00	-	50.600.000,00	470.097,76
Terminal Itaquera (MOB)					
Terminal Itaim (MOB)	33.500.000,00	13.800.000,00		47.300.000,00	470.097,76
Gerenciamento (Ger)	3.300.000,00			3.300.000,00	
Intervenções no Sistema Viário	-	70.000.000,00	-	70.000.000,00	-
Ligação Pirituba-Lapa; (MOB)					
Ponte Graúna-Gaivotas; (MOB)					
Marginal Pinheiros; (MOB)					
Av. Senador Teotônio Vilela; (MOB)					
Pontilhão João Beizola. (MOB)					
Complexo Viário Ragueb Chohfi (MOB)					
Viaduto (ligação Viária Rua Jequirituba e Rua Prof. Roldão de Barros sob Linha 9 CPTM) (MOB)					
Nova Ponte Jurubatuba (MOB)		70.000.000,00		70.000.000,00	

PLANO DE INVESTIMENTOS 2024


PLANO 2024 - AÇÕES	Valor Inicial 2024	Recursos Remanescentes 2022	Recursos Remanescentes 2023	Valor Total Aprovado	Valor Pago
Intervenções no Sistema Viário	31.511.000,00	-	-	31.511.000,00	9.710.403,03
<i>Prolongar a Cruzeiro do Sul até Eng. Caetano alvares; Prolongar Engº Caetano Álvares até a Maria Amália Azevedo; Prolongamento da Av Luis dumont Villares; Duplicação da Rua Darzan; Viário de acesso do Hospital Parelheiros; Av. N. Sra, do Ó, Rua Papaterra Limongi, Rua José Fiúza Guimarães; Av. do Imperador até a Av. Nordestina; Itaquera / Itaqueruna; Av. Rio das Pedras Av. Presidente Wilson Túnel da Senna Madureira Av. Santos Dumont; Prolongamento da Av. Auro Soares de Moura Andrade Viário fábrica do Samba Jardim Lapena - Caminhabilidade Outras intervenções a definir (Rua Afeganistão, Rua Carneiro Leão, Rua Canuto Borelli (Estrada da Servidão), Rua José Ferreira Paz, nº 250, Av. Tiradentes, Av. Rubem Berta, Ruas João Dias da Silva e Rua Oscar de Moura Lacerda). Gerenciamento (Ger)</i>	28.647.000,00			28.647.000,00	9.192.031,88
	2.864.000,00			2.864.000,00	518.371,15
Intervenções na Área de Mobilidade Urbana	13.000.000,00	100.000.000,00	121.497.283,61	234.497.283,61	1.547.391,86
<i>Avenida Amador Bueno (MOB) Avenida Imirim (MOB) Corredor Santo Amaro / João Dias (MOB) Corredor Estrada de Itapeperica (MOB) Avenida Interlagos (MOB) Outras intervenções a definir Gerenciamento (Ger)</i>	12.000.000,00	100.000.000,00	121.497.283,61	233.497.283,61	1.547.391,86
	1.000.000,00			1.000.000,00	

PLANO DE INVESTIMENTOS 2024

PLANO 2024 - AÇÕES	Valor Inicial 2024	Recursos Remanescentes 2022	Recursos Remanescentes 2023	Valor Total Aprovado	Valor Pago
Recuperação e Reforço de Obras de Arte Especiais - OAE	92.705.307,00	96.092.792,50	-	188.798.099,50	4.169.365,33
<i>Intervenções para obras de recuperação estrutural e funcional. (MOB)</i>	83.405.307,00			180.498.099,50	3.747.194,10
<i>Emergencial OAE's (MOB)</i>	1.000.000,00	96.092.792,50			
<i>Gerenciamento (Ger)</i>	8.300.000,00			8.300.000,00	422.171,23
Inspeção de Obras de Artes Especiais - OAE	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	-
<i>Inspeções visuais e especiais a definir</i>	910.000,00			910.000,00	
<i>Gerenciamento (Ger)</i>	90.000,00			90.000,00	
Construção e Implantação de Equipamentos Públicos	1.000,00	-	-	1.000,00	-
<i>Projeto executivo e obras a definir</i>	910,00			910,00	
<i>Gerenciamento (Ger)</i>	90,00			90,00	
Construção e Implantação do Parque Minhocão	350.000,00	-	-	350.000,00	-
<i>Projeto executivo e obras</i>	320.000,00			320.000,00	
<i>Gerenciamento (Ger)</i>	30.000,00			30.000,00	
Intervenções no Sistema de Drenagem	1.000,00	-	-	1.000,00	-
<i>Intervenções a definir</i>	910,00			910,00	
<i>Gerenciamento (Ger)</i>	90,00			90,00	
Obras e Serviços nas Áreas de Riscos Geológicos - Preventivas	2.000,00	-	-	2.000,00	-
<i>Intervenções a definir</i>	1.820,00			1.820,00	
<i>Gerenciamento (Ger)</i>	180,00			180,00	
TOTAL	232.623.257,00	316.649.498,50	121.497.283,61	670.770.039,11	17.218.092,29

Corredores de Ônibus - 30% Mobilidade

CORREDORES	Radial Leste
Subprefeitura	1. Aricanduva/Formosa/Carrão
Valor Pago	1.320.834,31
Situação	Contratação das obras e aquisição de imóveis em andamento.

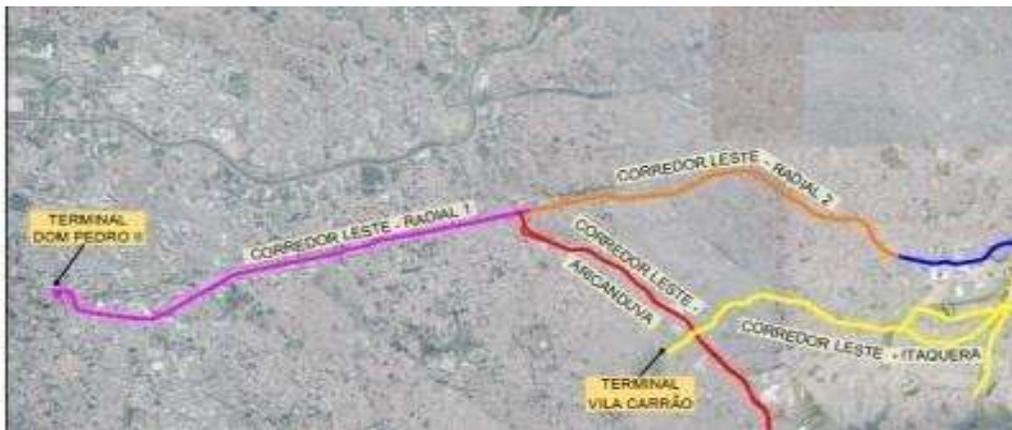


Gerenciamento R\$ 3.200.000,00



Terminais de Ônibus - 30% Mobilidade

TERMINAIS	Itaquera
Subprefeitura	1. Itaquera
Pago	470.097,76
Situação	Em contratação das Obras

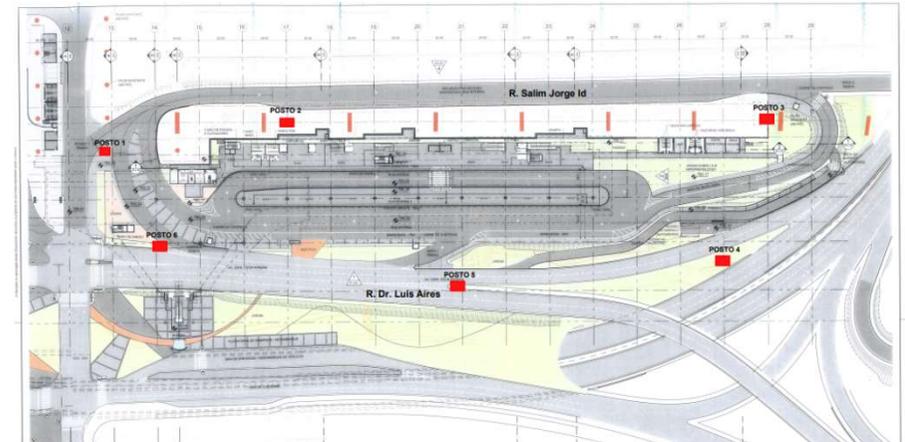

Intervenções no Sistema Viário

SEI – 6022.2022/0006797-0 - Rua Afeganistão – Subprefeitura M'Boi Mirim – Início 07/23 – Término 07/24



SEI – 6022.2023/0001556-4 - Rua Carneiro Leão – Subprefeitura Mooca – Início 03/23 – Término 07/24



Intervenções no Sistema Viário

SEI – 6022.2023/0001852-0 - Rua Canuto Borelli (Estrada da Servidão) – Subprefeitura Santo Amaro – Início 07/23 – Término 07/24




SEI – 6022.2023/0001967-5 - Rua José Ferreira Paz, nº 250 – Subprefeitura Vila Prudente – Início 07/23 – Término 07/24



Intervenções na Área de Mobilidade Urbana **30% Mobilidade**

MOBILIDADE URBANA	Avenida Amador Bueno; Avenida Imirim; Avenida Santo Amaro / João Dias; Estrada de Itapeperica e Avenida Interlagos.
Subprefeitura	1. Santo Amaro; 2. Ermelino Matarazzo; 3. Capela do Socorro; 4. Campo Limpo; 5. M'Boi Mirim e 6. Casa Verde/Cachoeirinha.
Valor Pago	1.547.391,86



Intervenções na Área de Mobilidade Urbana **30% Mobilidade**

SEI – 7910.2022/0001454-0 –
Corredor Amador Bueno da Veiga –
Subprefeitura Penha – Início 12/22 –
Término 10/24




SEI – 7910.2022/0001455-8 –
Corredor Imirim – Subprefeitura
Casa Verde – Início 06/23 – Término
10/24



Obras de Recuperação e Reforço de OAE's **30% Mobilidade**

OAE's - OBRAS DE RECUPERAÇÃO E REFORÇO	Recuperação estrutural do pontilhão na Avenida São Miguel; Complexo Viário Aurélio Batista Félix; Ponte Senador José Ermínio de Moraes e Viaduto Austregésilo de Athaide.
Pago	3.747.194,10
Situação	Obras de recuperação e reforço de Obras de Arte Especiais.

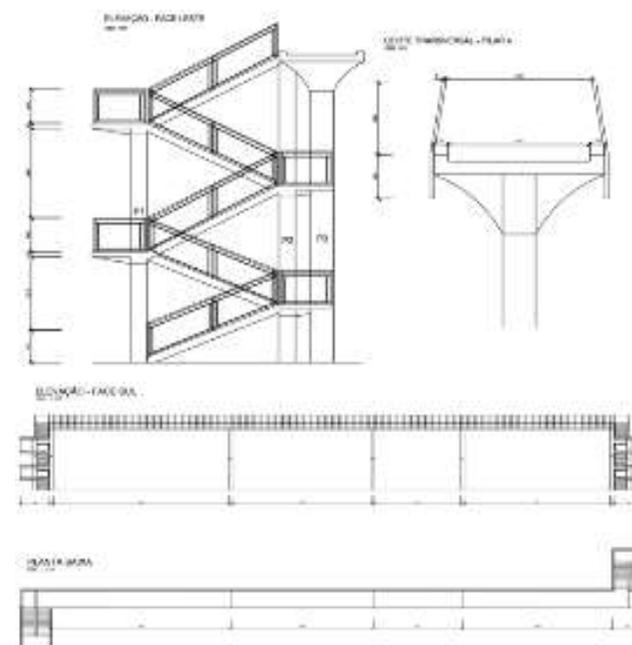

Obras de Recuperação e Reforço de OAE's **30% Mobilidade**

SEI – 6022.2023/0002565-9
pontilhão na Avenida São Miguel –
Subprefeitura São Miguel Paulista –
Início 09/23 – Término 09/24



SEI – 7910.2022/0000509-5 –
Complexo Viário Aurélio Batista Félix
e da Ponte Senador José Ermínio de
Moraes – Início 05/23 – Término
05/24



Obras de Recuperação e Reforço de OAE's **30% Mobilidade**

SEI – 7910.2022/0000673-3 Viaduto Austregésilo de Athaíde – Subprefeitura Santo Amaro – Início 09/23 – Término 08/24





CIDADE DE
SÃO PAULO
INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

