



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
CULTURA

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO – FUNDURB

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2024

Planilha e Relatório Fotográfico

Prestação de contas do FUNDURB (98.25)

Execução orçamentária por item do plano aprovado

Prestação de contas do FUNDURB (98.25)

Execução orçamentária por dotação

DOTAÇÃO	Solicitado (R\$)	Execução orçamentária 2024			
		Reservado (R\$)	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)
98.25.13.391.3001.5.421.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 900.000,00	R\$ 34.000,00	R\$ 34.000,00	R\$ -	R\$ -
98.25.13.391.3001.5.957.44903900.08.1.759.0402.0	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 19.348.215,36	R\$ 10.691.680,32	R\$ 10.564.180,32	R\$ 298.923,25	R\$ 67.776,53
98.25.13.391.3001.5.957.44909200.08.1.759.0402.1	R\$ 27.750,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
98.25.13.392.3001.5.400.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
98.25.13.392.3001.5.425.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 7.618.916,25	R\$ 5.345.942,54	R\$ 5.345.942,54	R\$ 3.156.206,72	R\$ -
98.25.13.392.3001.5.959.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
98.25.13.392.3001.5.960.44903900.08.1.759.0402.0	R\$ 1.213.052,91	R\$ 1.213.052,91	R\$ 1.213.052,91	R\$ -	R\$ -
98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 20.789.064,52	R\$ 13.154.470,47	R\$ 5.601.179,15	R\$ 208.494,70	R\$ 208.494,70
98.25.13.392.3020.5.426.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	R\$ 50.000.000,00	R\$ 30.439.146,24	R\$ 22.758.354,92	R\$ 3.663.624,67	R\$ 276.271,23
		60,88%	45,52%	7,33%	0,55%

*Os dados utilizados são referentes aos Relatórios de Empenho detalhado do SOF atualizados em 30/04/2024.

Item	Equipamento cultural	Ação	Processo	Status	Projeto/atividade	Ação orçamentária	Dotação orçamentária	Valor	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	% do liquidado do valor aprovado no último plano da SMC
1	Centro Cultural São Paulo	Reforma das Fachadas	6025.2023/0002933-2	2. Em licitação / Reservado	Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico	5957	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 3.875.840,51	R\$ 3.858.585,06	R\$ -	R\$ -	0,0%
1	Centro Cultural São Paulo	AVCB e Serviços Corretivos de Elétrica	6025.2021/0003800-1	5. Planejando	Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico	5957	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 126.726,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
1	Centro Cultural São Paulo	Reforma de manutenção predial	Sem processo	5. Planejando	Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico	5957	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 1.200.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
2	Casa de Cultura Cidade Ademar	Implantação da Casa de Cultura Cidade Ademar	6025.2022/0018097-7	0. Em execução	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais	5425	98.25.13.392.3001.5.425.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 7.618.916,25	R\$ 5.345.942,54	R\$ 3.156.206,72	R\$ -	41,4%
3	Sítio Mirim	Reconstrução da Casa-Sede	6025.2020/0016806-0	m licitação / Reserv	Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico	5957	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 3.500.000,00	R\$ 2.539.459,99	R\$ -	R\$ -	0,0%
4	Sítio Morrinhos	Restauo, segurança contra incêndio e acessibilidade	6025.2022/0022026-0	m licitação / Reserv	Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico	5957	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00	R\$ -	R\$ -	0,0%
5	Centro Cultural Penha	Serviços Corretivos para AVCB	6025.2018/0009114-4	2. Em licitação / Reservado	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais	5960	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 218.150,00	R\$ 148.472,45	R\$ 54.398,64	R\$ 54.398,64	24,9%
6	Teatro João Caetano	Reforma geral para Acessibilidade, Segurança contra incêndio, Conservação e Restauero.	6025.2022/0011336-6	0. Em execução	Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico	5957	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 5.500.000,00	R\$ 1.805.986,18	R\$ 298.923,25	R\$ 67.776,53	5,4%
6	Teatro João Caetano	Restauero do Painel Clóvis Graclano	6025.2023/0005815-4	m licitação / Reserv	Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico	5957	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 116.789,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%

Item	Equipamento cultural	Ação	Processo	Status	Projeto/atividade	Ação orçamentária	Dotação orçamentária	Valor	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	% do liquidado do valor aprovado no último plano da SMC
7	Biblioteca Mário de Andrade	Projeto de AVCB	6025.2018/0015645-9	5. Planejando	Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico	5957	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 200.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
8	Edifício Sampaio Moreira	3ª Fase de Obras de restauro - Fase Piso Térreo	6025.2023/0016820-0	0. Em execução	Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico	5957	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 710.000,00	R\$ 585.775,61	R\$ -	R\$ -	0,0%
9	Casa de Cultura Parelheiros	Manutenção Predial	6025.2023/0015198-7	m licitação / Reserv	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais	5960	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 200.000,00	R\$ 347.516,67	R\$ -	R\$ -	0,0%
10	Escola Escola Municipal de Iniciação Artísticas - EMIA	Restauro e troca da cobertura da Casa 2	6025.2023/0012495-5	3. Encaminhado	Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico	5957	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 750.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
11	Praça das Artes	3ª fase - Obras complementares dos corpos artísticos	8510.2022/0000503-4	0. Em execução	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais	5960	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 2.703.326,18	R\$ 2.703.326,18	R\$ -	R\$ -	0,0%
11	Praça das Artes	3ª fase - Gerenciamento e fiscalização de obra - Praça das Artes	8510.2022/0000503-4	0. Em execução	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais	5960	98.25.13.392.3001.5.960.44903900.08.1.759.0402.0	R\$ 603.838,31	R\$ 603.838,31	R\$ -	R\$ -	0,0%
11	Praça das Artes	4ª fase - obras complementares do prédio dos corpos artísticos	7910.2023/0002491-1	5. Planejando	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais	5960	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 7.736.108,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
11	Praça das Artes	4ª fase - gerenciamento e fiscalização das obras complementares do prédio dos corpos artísticos	8510.2023/0000696-2	5. Planejando	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais	5960	98.25.13.392.3001.5.960.44903900.08.1.759.0402.0	R\$ 609.214,60	R\$ 609.214,60	R\$ -	R\$ -	0,0%
12	Memorial dos Afritos	Implantação do Memorial	6025.2019/0015893-3 6025.2023/0014412-3	5. Planejando	Implantação do Memorial dos Afritos	5421	98.25.13.391.3001.5.421.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 900.000,00	R\$ 34.000,00	R\$ -	R\$ -	0,0%

Item	Equipamento cultural	Ação	Processo	Status	Projeto/atividade	Ação orçamentária	Dotação orçamentária	Valor	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	% do liquidado do valor aprovado no último plano da SMC
13	Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso	Serviços Cíveis de Adequação hidráulica e instalação de sala de dança	6025.2023/0005660-7	0. Em execução	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais	5960	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 450.000,00	R\$ 316.177,91	R\$ -	R\$ -	0,0%
13	Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso	Serviços corretivos de AVCB	6025.2022/0011088-0	0. Em execução	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais	5960	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 660.000,00	R\$ 596.284,96	R\$ 154.096,06	R\$ 154.096,06	23,3%
13	Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso	Instalação de Estúdio de Gravação	6025.2022/0022073-1	licitação / Reserv	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais	5960	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 590.000,00	R\$ 490.145,76	R\$ -	R\$ -	0,0%
14	Distritos Criativos	Projeto para reforma de revitalização dos espaços para implantação dos Distritos Criativos	Sem processo 8	5. Planejando	Implantação de Distritos Criativos	5426	98.25.13.392.3020.5.426.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
15	Casa de Cultura Hip Hop Leste - Cidade Tiradentes	Requalificação para acessibilidade e instalação de novo padrão de medição de água e luz na Casa de Cultura	Sem processo 10	5. Planejando	Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico	5957	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 200.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
16	Teatro Arthur Azevedo	Serviços Corretivos para AVCB	6025.2018/0016747-7	0. Em execução	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais	5960	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 50.000,00	R\$ 2.593,36	R\$ -	R\$ -	0,0%
16	Teatro Arthur Azevedo	Manutenção Predial de Telhados dos Teatros	6025.2021/0012695-4	5. Planejando	Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico	5957	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 500.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
17	Monumento	Restauo da Fonte Monumental	6025.2023/0037747-0	5. Planejando	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais	5960	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 479.341,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
18	Biblioteca Chácara do Castelo	Requalificação	6025.2023/0017795-1	4. Encaminhado	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais	5960	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 1.267.000,00	R\$ 999.255,22	R\$ -	R\$ -	0,0%

Item	Equipamento cultural	Ação	Processo	Status	Projeto/atividade	Ação orçamentária	Dotação orçamentária	Valor	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	% do liquidado do valor aprovado no último plano da SMC
					Equipamentos Culturais							
18	Biblioteca Chácara do Castelo	Levantamentos Planialtimétrico e Cadastral	6025.2023/0034072-0	5. Planejando	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais	5960	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 61.708,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
19	Teatro Cacilda Becker	Reforma Predial de Telhados dos Teatros	6025.2021/0012695-4	5. Planejando	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais	5960	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 500.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
20	Teatro Flávio Império	Reforma Predial de Telhados dos Teatros	6025.2021/0012695-4	5. Planejando	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais	5960	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 500.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
21	Casa de Cultura São Mateus	Construção de Novo Edifício	Sem processo	5. Planejando	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais	5960	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 4.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
22	Casa de Cultura Manuel Mendonça	Obra de Restauo	Sem processo	7. Retomar	Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico	5957	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 50.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
23	Casa de Cultura Vila Guilherme	Obra de Restauo	Sem processo	7. Retomar	Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico	5957	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 250.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
23	Casa de Cultura Vila Guilherme	Projeto executivo de restauro	6025.2022/0003748-1	7. Retomar	Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico	5957	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 227.600,00	R\$ 222.990,73	R\$ -	R\$ -	0,0%
24	Centro Cultural Tendal da Lapa	Requalificação e Adequações de Segurança	Sem processo	7. Retomar	Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico	5957	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 250.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
24	Centro Cultural Tendal da Lapa	Levantamentos Planialtimétrico e Cadastral	6025.2023/0034072-0	5. Planejando	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais	5960	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 112.764,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
25	Biblioteca Brito Broca	Projeto executivo para requalificação	Sem processo	7. Retomar	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais	5960	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 50.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%

Item	Equipamento cultural	Ação	Processo	Status	Projeto/atividade	Ação orçamentária	Dotação orçamentária	Valor	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	% do liquidado do valor aprovado no último plano da SMC
26	Biblioteca Sérgio Buarque de Holanda	Levantamentos Planialtimétrico e Cadastral	6025.2023/0034072-0	5. Planejando	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais	5960	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 128.917,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
27	Biblioteca Roberto Santos	Serviços Corretivos para Acessibilidade e Segurança contra incêndio	Sem processo	7. Retomar	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais	5960	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 250.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
28	Bibliotecas Hans Christian Andersen	Projeto executivo para requalificação	Sem processo	7. Retomar	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais	5960	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 150.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
29	Biblioteca Cassiano Ricardo	Projeto executivo para requalificação	Sem processo	7. Retomar	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais	5960	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 150.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
30	Casa Amarela	Projeto executivo e obra de restauro e requalificação	Sem processo 12	5. Planejando	Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico	5957	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 104.758,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
30	Casa Amarela	Gerenciamento e fiscalização de projeto e obra de restauro e requalificação	6025.2023/0007211-4	5. Planejando	Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico	5957	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
31	Biblioteca Sylvia Orthof	Readequação para acessibilidade	Sem processo 22	5. Planejando	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais	5960	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
32	Chácara do Jockey	Reforma para ativação de novas áreas	Sem processo 22	5. Planejando	Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico	5957	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 50.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
33	Biblioteca Pedro Nava	Levantamentos Planialtimétrico e Cadastral	6025.2023/0034072-0	5. Planejando	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais	5960	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 88.846,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
34	Escola Municipal de Iniciação Artística - Perus	Levantamentos Planialtimétrico e Cadastral	6025.2023/0034072-0	5. Planejando	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais	5960	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 53.493,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
35	Casa de Cultura Itaim Paulista	Levantamentos Planialtimétrico e Cadastral	6025.2023/0034072-0	5. Planejando	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais	5960	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 159.517,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%

Item	Equipamento cultural	Ação	Processo	Status	Projeto/atividade	Ação orçamentária	Dotação orçamentária	Valor	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	% do liquidado do valor aprovado no último plano da SMC
		Cadastral			Equipamentos Culturais							
36	Biblioteca Vicente de Carvalho	Levantamentos Planialtimétrico e Cadastral	6025.2023/0034072-0	5. Planejando	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais	5960	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 12.752,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
37	Casa de Cultura Hip-Hop Sul	Levantamentos Planialtimétrico e Cadastral	6025.2023/0034072-0	5. Planejando	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais	5960	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 33.711,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
38	Casa do Caxingui	Levantamentos Planialtimétrico e Cadastral	6025.2023/0034072-0	5. Planejando	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais	5960	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 83.426,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
39	Biblioteca Padre José de Anchieta	Levantamentos Planialtimétrico e Cadastral	6025.2023/0034072-0	5. Planejando	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais	5960	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 50.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
40	Arquivo Histórico Municipal	Serviços corretivos de AVCB - CMAR	6025.2023/0024465-9	5. Planejando	Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico	5957	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 58.000,00	R\$ 48.789,39	R\$ -	R\$ -	0,0%
40	Arquivo Histórico Municipal	Instalação de linha de vida	6025.2023/0030077-0	5. Planejando	Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico	5957	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 127.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
41	Sítio da Ressaca	Pagamento de Despesa do Exercício Anterior	6025.2023/0025407-7	0. Em execução	Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico	5957	98.25.13.391.3001.5.957.44909200.08.1.759.0402.1	R\$ 27.750,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
42	Manutenção de dotação	Construção e Implantação de Espaços Lúdicos e Educativos	Sem processo 20	9. Pausado	Construção e Implantação de Espaços Lúdicos e Educativos	5400	98.25.13.392.3001.5.400.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
42	Manutenção de dotação	Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico	Sem processo 20	9. Pausado	Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico	5957	98.25.13.391.3001.5.957.44903900.08.1.759.0402.0	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
42	Manutenção de dotação	Construção de Equipamentos Culturais	Sem processo 21	9. Pausado	Construção de Equipamentos Culturais	5959	98.25.13.392.3001.5.959.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
TOTAL								R\$ 50.000.000,00	R\$ 22.758.354,92	R\$ 3.663.624,67	R\$ 276.271,23	7,33%

1. Centro Cultural São Paulo

Reforma das Fachadas

Ação: Reforma das Fachadas

Processo: 6025.2023/0002933-2

Valor: R\$ 3.875.840,51

Empenhado: R\$ 3.858.585,06

Liquidado: -

Pago: -

% de liquidação: 00,00%

Endereço: Rua Vergueiro, 1000

Distrito: Liberdade

Subprefeitura: Sé



2. Casa de Cultura Cidade Ademar

Implantação da Casa de Cultura Cidade Ademar

Ação: Implantação da Casa de Cultura Cidade Ademar

Processo: 6025.2022/0018097-7

Valor: R\$ 7.618.916,25

Empenhado: R\$ 5.345.942,54

Liquidado: R\$ 3.156.206,72


Pago: -

% de liquidação: 41,4%

Endereço: Avenida Durval Pinto Ferreira, 820

Distrito: Cidade Ademar

Subprefeitura: Cidade Ademar

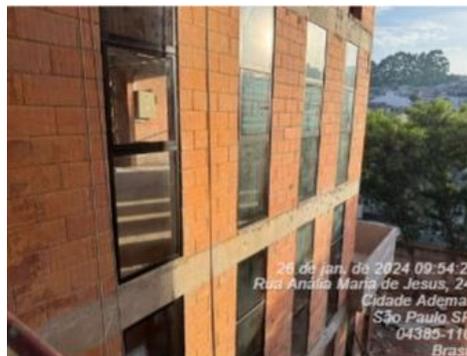

3. Sítio Mirim

Reconstrução da Casa-Sede

Ação: Reconstrução da Casa-Sede

Processo: 6025.2020/0016806-0

Valor: R\$ 3.500.000,00

Empenhado: R\$ 2.539.459,99

Liquidado: -


Pago: -

% de liquidação: -

Endereço: Rua Dr. Assis Ribeiro, s/n - Esquina
c/ Rua Urutu

Distrito: Vila Jacuí

Subprefeitura: São Miguel Paulista

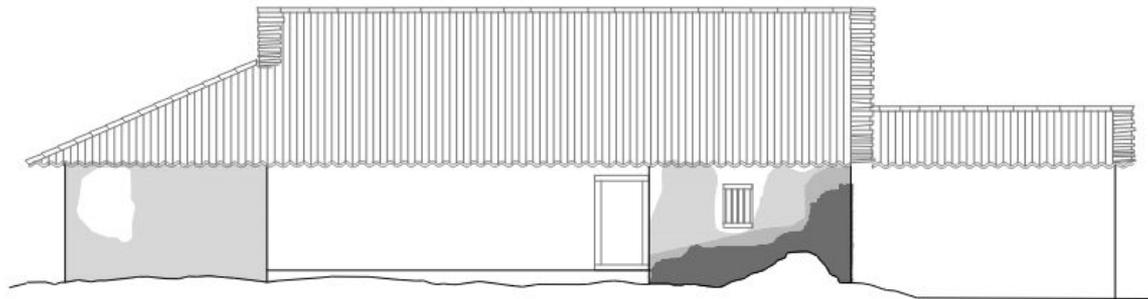

4. Sítio Morrinhos

Restauo, segurança contra incêndio e acessibilidade

Ação: Restauo, segurança contra incêndio e acessibilidade

Processo: 6025.2022/0022026-0

Valor: R\$ 1.500.000,00

Empenhado: R\$ 1.500.000,00

Liquidado: -


Pago: -

% de liquidação: -

Endereço: Rua Santo Anselmo, 102

Distrito: Casa Verde

Subprefeitura: Casa Verde/Cachoeirinha

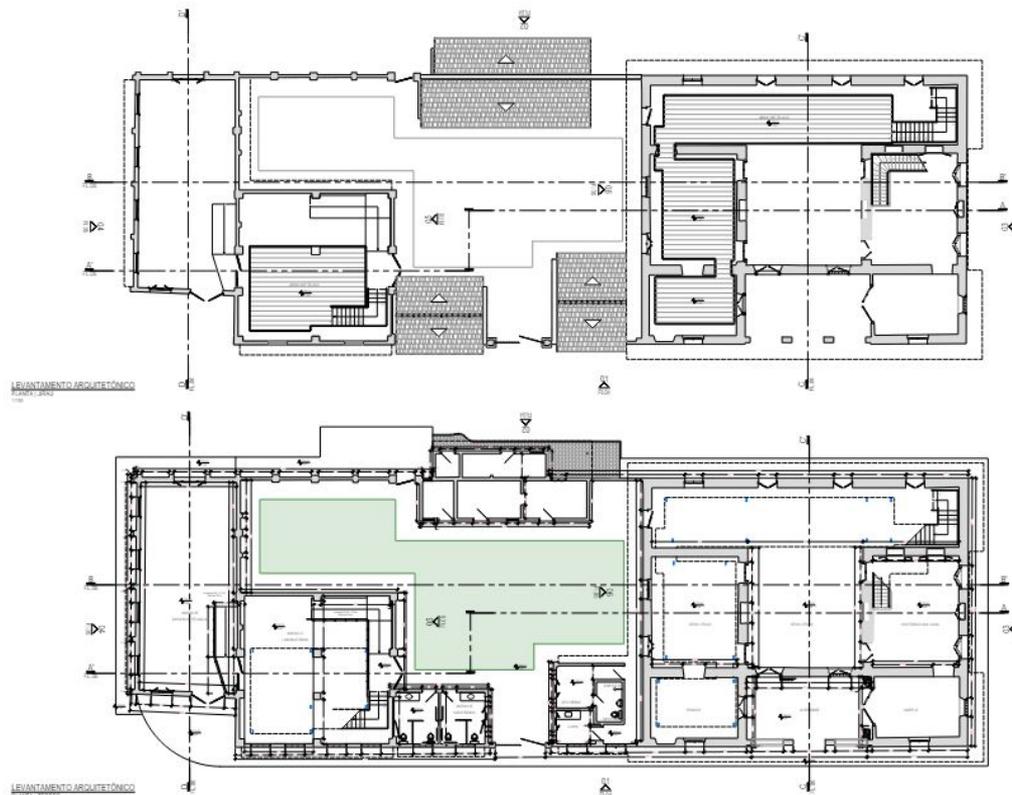

5. Centro Cultural Penha

Serviços Corretivos para AVCB

Ação: Serviços Corretivos para AVCB

Processo: 6025.2018/0009114-4

Valor: R\$ 218.150,00

Empenhado: R\$ 148.472,45

Liquidado: R\$ 54.398,64


Pago: R\$ 54.398,64

% de liquidação: 24,9%

Endereço: Largo do Rosário, 20

Distrito: Penha

Subprefeitura: Penha

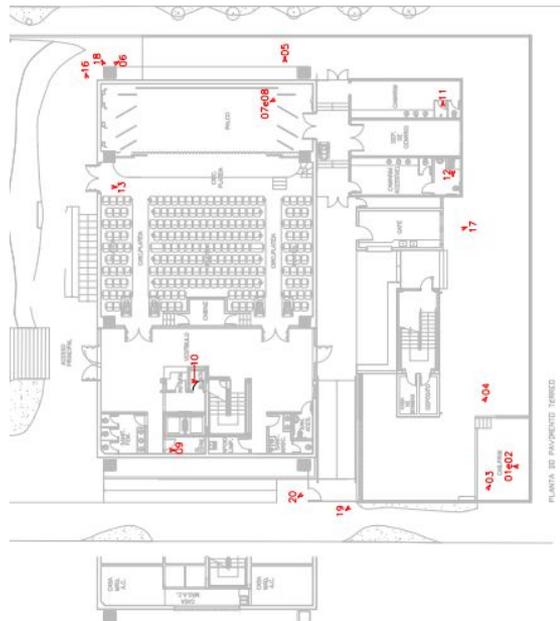

6. Teatro João Caetano

Reforma geral para Acessibilidade, Segurança contra incêndio, Conservação e Restauro.

Ação: Reforma geral para Acessibilidade, Segurança contra incêndio, Conservação e Restauro

Processo: 6025.2022/0011336-6

Valor: R\$ 5.500.000,00

Empenhado: R\$ 1.805.986,18

Liquidado: R\$ 298.923,25




Pago: R\$ 67.776,53

% de liquidação: 5,4%

Endereço: Rua Borges Lagoa, 650

Distrito: Vila Mariana

Subprefeitura: Vila Mariana

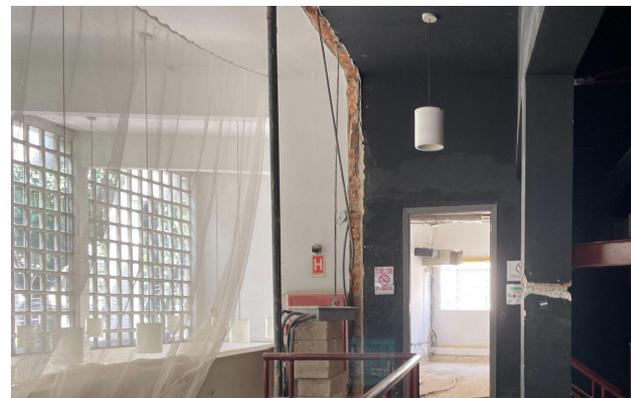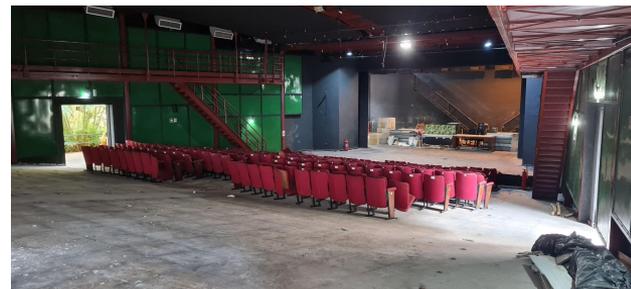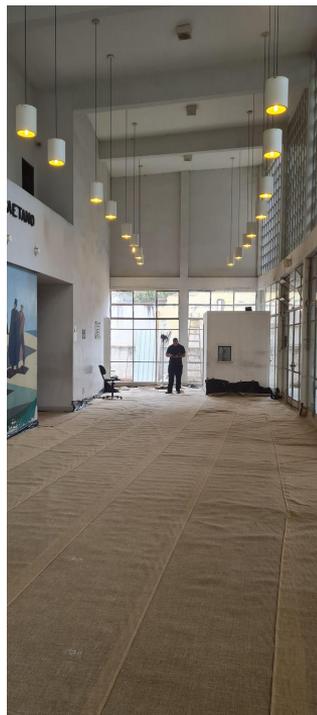

Fotos tiradas em: 31/03/2023

8. Edifício Sampaio Moreira

3ª Fase de Obras de restauro - Fase Piso Térreo

Ação: 3ª Fase de Obras de restauro - Fase Piso Térreo

Processo: 6025.2023/0016820-0

Valor: R\$ 710.000,00

Empenhado: R\$ 585.775,61

Liquidado: -




Pago: -

% de liquidação: 0%

Endereço: R. Líbero Badaró, 346

Distrito: Sé

Subprefeitura: Sé



9. Casa de Cultura Parelheiros

Manutenção Predial

Ação: Manutenção Predial

Processo: 6025.2023/0015198-7

Valor: R\$ 200.000,00

Empenhado: R\$ 347.516,67

Liquidado: -

Pago: -

% de liquidação: -

Endereço: Rua Nazle Mauad Lufti, 169

Distrito: Parelheiros

Subprefeitura: Parelheiros



11. Praça das Artes

3ª fase - Obras complementares dos corpos artísticos

Ação: 3ª fase - Obras complementares dos corpos artísticos

Processo: 8510.2022/0000503-4

Valor: R\$ 2.703.326,18

Empenhado: R\$ 2.703.326,18

Liquidado: -


Pago: -

% de liquidação: -

Endereço: Avenida São João, 281

Distrito: República

Subprefeitura: Sé

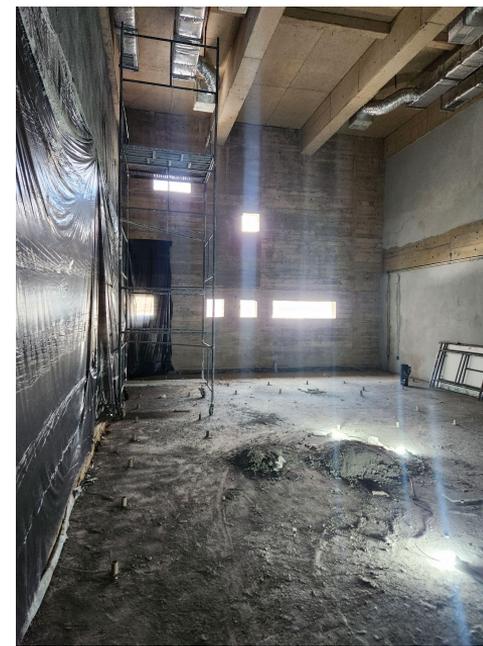

Fotos tiradas em: 19/04/2023

11. Praça das Artes

3ª fase - Gerenciamento e fiscalização de obra - Praça das Artes

Ação: 3ª fase - Gerenciamento e fiscalização de obra - Praça das Artes

Processo: 8510.2022/0000503-4

Valor: R\$ 603.838,31

Empenhado: R\$ 603.838,31

Liquidado: -


Pago: -

% de liquidação: -

Endereço: Avenida São João, 281

Distrito: República

Subprefeitura: Sé

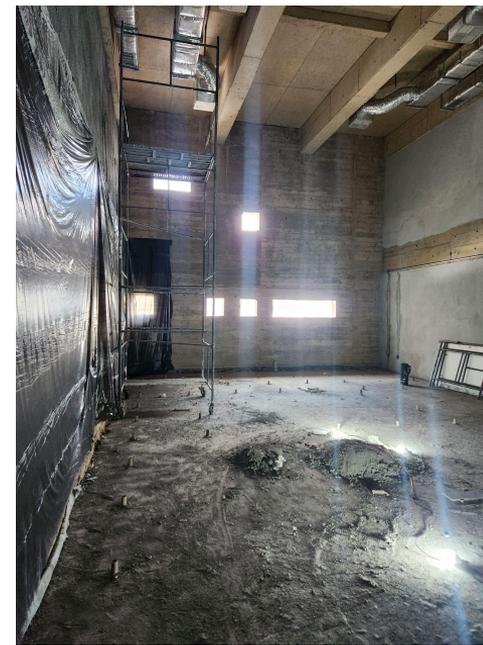

Fotos tiradas em: 19/04/2023

11. Praça das Artes

4ª fase - Gerenciamento e fiscalização de obra - Praça das Artes

Ação: 4ª fase - Gerenciamento e fiscalização de obra - Praça das Artes

Processo: 8510.2023/0000696-2

Valor: R\$ 609.214,60

Empenhado: R\$ 609.214,60

Liquidado: -


Pago: -

% de liquidação: -

Endereço: Avenida São João, 281

Distrito: República

Subprefeitura: Sé

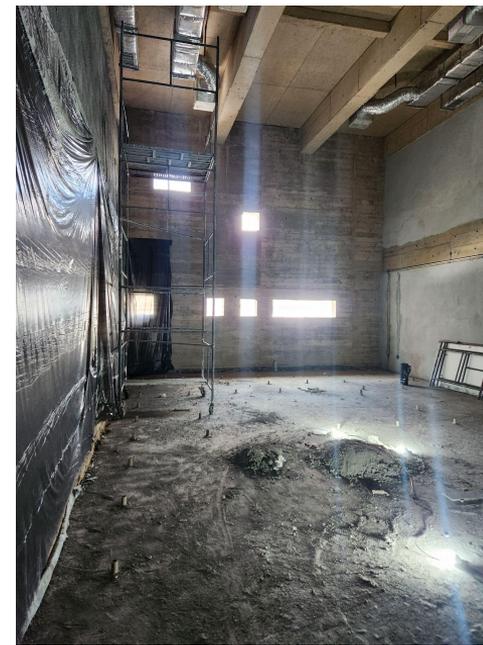

Fotos tiradas em: 19/04/2023

12. Memorial dos Aflitos

Implantação do Memorial

Ação: Implantação do Memorial

Processo: 6025.2019/0015893-3

6025.2023/0014412-3

Valor: R\$ 900.000,00

Empenhado: R\$ 34.000,00

Liquidado: -

Pago: -

% de liquidação: -

Endereço: Rua dos Aflitos, 70 - Traves. Rua dos Estudantes - alt. nº 52

Distrito: Liberdade

Subprefeitura: Sé



13. Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso

Serviços Cíveis de Adequação hidráulica e instalação de sala de dança + Serviços corretivos de AVCB

Ação: Serviços Cíveis de Adequação hidráulica e instalação de sala de dança + Serviços corretivos de AVCB

Processo: 6025.2023/0005660-7

Valor: R\$ 450.000,00

Empenhado: R\$ 316.177,91

Liquidado: -


Pago: -

% de liquidação: -

Endereço: Av. Dep. Emílio Carlos, 3641 - Vila dos Andrades, São Paulo - SP, 02721-200

Distrito: Vila Nova Cachoeirinha

Subprefeitura: Casa Verde/Cachoeirinha

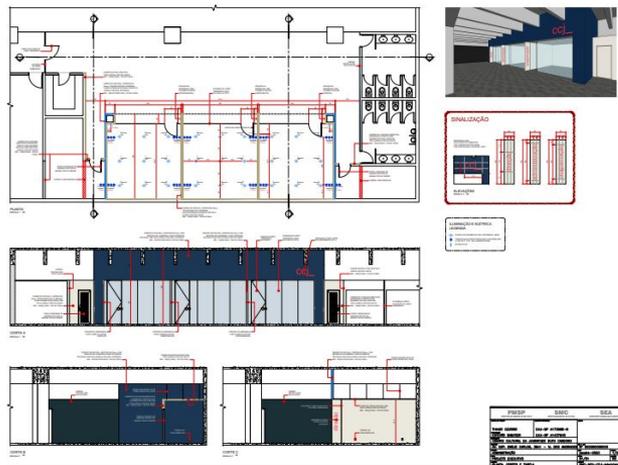

13. Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso

Serviços corretivos de AVCB - Aplicação de CMAR

Ação: Serviços corretivos de AVCB - Aplicação de CMAR

Processo: 6025.2022/0011088-0

Valor: R\$ 660.000,00

Empenhado: R\$ 596.284,96

Liquidado: R\$ 154.096,06


Pago: R\$ 154.096,06

% de liquidação: 23,3%

Endereço: Av. Dep. Emílio Carlos, 3641 - Vila dos Andrades, São Paulo - SP, 02721-200

Distrito: Vila Nova Cachoeirinha

Subprefeitura: Casa Verde/Cachoeirinha

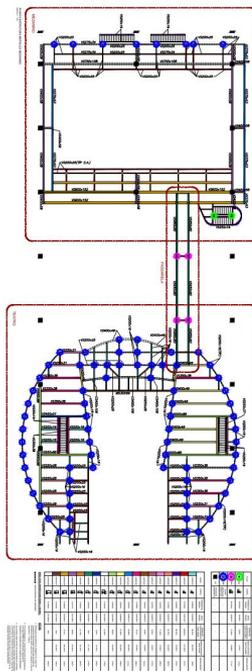

18. Biblioteca Chácara do Castelo

Requalificação

Ação: Requalificação

Processo: 6025.2023/0017795-1

Valor: R\$ 1.267.000,00

Empenhado: R\$ 999.255,22

Liquidado: -


Pago: -

% de liquidação: -

Endereço: R. Brás Lourenço, 333 - Vila Mariana, São Paulo - SP, 04113-110

Distrito: Vila Mariana

Subprefeitura: Vila Mariana

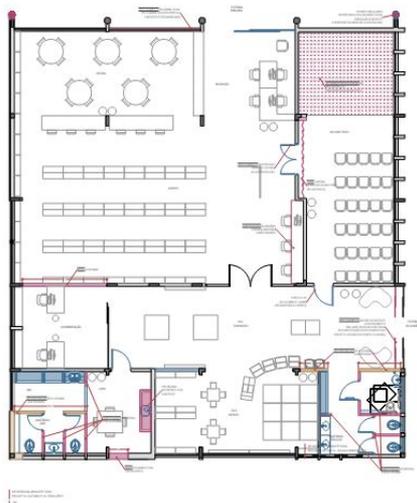

23. Casa de Cultura Vila Guilherme

Projeto Executivo de restauro

Ação: Projeto Executivo de restauro

Processo: 6025.2022/0003748-1

Valor: R\$ 227.600,00

Empenhado: R\$ 222.990,73

Liquidado: -



Pago: -

% de liquidação: -

Endereço: Praça Oscar Silva, s/nº

Distrito: Vila Guilherme

Subprefeitura: Vila Maria-Vila Guilherme

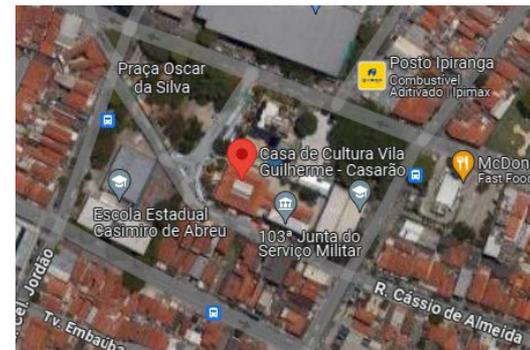

40. Arquivo Histórico Municipal

Serviços corretivos de AVCB - CMAR

Ação: Serviços corretivos de AVCB - CMAR

Processo: 6025.2023/0024465-9

Valor: R\$ 58.000,00

Empenhado: R\$ 48.789,39

Liquidado: -

Pago: -

% de liquidação: -

Endereço: Praça Cel. Fernando Prestes, 152 -
Bom Retiro, São Paulo - SP, 01124-060

Distrito: Bom Retiro

Subprefeitura: Sé

