



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**

**SECRETARIA DAS
SUBPREFEITURAS**

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2026

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS (SMSUB)

TABELA RESUMO

DOTAÇÃO	ATIVIDADE	VALOR APROVADO	VALOR RESERVADO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO
1169	Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos [MOB]	R\$35.151.756,00	R\$26.812.286,58	R\$18.096.385,89	R\$1.863.237,94	R\$1.863.237,94
1137	Pavimentação e Recapeamento de Vias [MOB]	R\$53.062.290,47	R\$58.331.232,68	R\$58.331.232,68	R\$37.206.347,83	R\$37.206.347,83
1137	Pavimentação e Recapeamento de Vias [LIVRE][BP]	R\$196.538.757,41	R\$190.265.051,76	R\$150.850.460,51	R\$101.948.746,93	R\$101.948.746,93
1137	Pavimentação e Recapeamento de Vias [MOB][BP]	R\$86.103.952,41	R\$17.404.095,74	R\$17.404.095,74	R\$8.850.088,43	R\$8.850.088,43
1137	Pavimentação e Recapeamento de Vias [LIVRE]	R\$37.294.999,71	R\$46.626.330,10	R\$44.899.781,39	R\$34.563.185,69	R\$34.563.185,69
3350	Melhorias de Bairro [LIVRE]	R\$70.353.249,00	R\$37.081.525,38	R\$22.897.026,58	R\$10.512.818,44	R\$10.512.818,44
1193	Execução de obras em área de risco - Preventiva [LIVRE]	R\$30.000.000,00	R\$25.849.173,82	R\$2.134.119,08	R\$619.247,58	R\$619.247,58
1194	Execução de obras em área de risco - Emergencial [LIVRE]	R\$2.000.000,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL		R\$510.505.005,00	R\$402.369.696,06	R\$314.613.101,87	R\$195.563.672,84	R\$195.563.672,84

REFORMA E ACESSIBILIDADE EM PASSEIOS PÚBLICOS [MOB]

Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos [MOB]					
Objeto e endereço	Valor aprovado	Valor reservado	Valor empenhado	Valor liquidado	Valor pago
Reforma e Acessibilidade em Passeios Publicos [MOB]: Diversos endereços contemplando as 32 Subprefeituras	R\$25.796.121,08	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Reforma e Acessibilidade em Passeios Publicos [MOB]: Subprefeitura Campo Limpo - Contrato 1	R\$97.665,25	R\$97.665,25	R\$97.665,25	R\$0,00	R\$0,00
Reforma e Acessibilidade em Passeios Publicos [MOB]: Subprefeitura São Miguel Paulista - Contrato 1	R\$702.432,72	R\$702.432,72	R\$702.432,72	R\$0,00	R\$0,00
Reforma e Acessibilidade em Passeios Publicos [MOB]: Subprefeitura São Mateus - Contrato 1	R\$792.370,62	R\$792.370,62	R\$792.370,62	R\$0,00	R\$0,00
Reforma e Acessibilidade em Passeios Publicos [MOB]: Subprefeitura Santana/Tucuruvi - Contrato 1	R\$931.768,81	R\$931.768,81	R\$931.768,81	R\$38.759,43	R\$38.759,43
Reforma e Acessibilidade em Passeios Publicos [MOB]: Subprefeitura Aricanduva - Contrato 1	R\$840.185,50	R\$840.185,50	R\$840.185,50	R\$0,00	R\$0,00
Reforma e Acessibilidade em Passeios Publicos [MOB]: Subprefeitura Vila Prudente - Contrato 1	R\$716.206,40	R\$716.206,40	R\$716.206,40	R\$0,00	R\$0,00
Reforma e Acessibilidade em Passeios Publicos [MOB]: Subprefeitura Santo Amaro - Contrato 1	R\$565.771,83	R\$565.771,83	R\$565.771,83	R\$0,00	R\$0,00
Reforma e Acessibilidade em Passeios Publicos [MOB]: Subprefeitura Sé - Contrato 1	R\$931.759,41	R\$931.759,41	R\$931.759,41	R\$0,00	R\$0,00
Reforma e Acessibilidade em Passeios Publicos [MOB]: Subprefeitura Itaim Paulista - Contrato 1	R\$679.001,58	R\$679.001,58	R\$679.001,58	R\$0,00	R\$0,00
Reforma e Acessibilidade em Passeios Publicos [MOB]: Subprefeitura Mooca - Contrato 1	R\$1.034.858,98	R\$1.034.858,98	R\$1.034.858,98	R\$0,00	R\$0,00
Reforma e Acessibilidade em Passeios Publicos [MOB]: Subprefeitura Pinheiros - Contrato 1	R\$1.412.129,66	R\$1.412.129,66	R\$1.412.129,66	R\$1.193.204,49	R\$1.193.204,49
Reforma e Acessibilidade em Passeios Publicos [MOB]: Subprefeitura Ipiranga - Contrato 1	R\$651.484,16	R\$651.484,16	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00


Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos [MOB]					
Objeto e endereço	Valor aprovado	Valor reservado	Valor empenhado	Valor liquidado	Valor pago
Reforma e Acessibilidade em Passeios Publicos [MOB]: Subprefeitura Casa Verde - Contrato 1	R\$0,00	R\$631.274,02	R\$631.274,02	R\$631.274,02	R\$631.274,02
Reforma e Acessibilidade em Passeios Publicos [MOB]: Subprefeitura Itaquera - Contrato 1	R\$0,00	R\$564.621,48	R\$564.621,48	R\$0,00	R\$0,00
Reforma e Acessibilidade em Passeios Publicos [MOB]: Subprefeitura Parelheiros - Contrato 1	R\$0,00	R\$323.905,88	R\$323.905,88	R\$0,00	R\$0,00
Reforma e Acessibilidade em Passeios Publicos [MOB]: Subprefeitura Vila Maria/ Vila Guilherme - Contrato 1	R\$0,00	R\$687.446,03	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Reforma e Acessibilidade em Passeios Publicos [MOB]: Subprefeitura Vila Mariana - Contrato 1	R\$0,00	R\$741.629,69	R\$741.629,69	R\$0,00	R\$0,00
Reforma e Acessibilidade em Passeios Publicos [MOB]: Subprefeitura Capela do Socorro - Contrato 1	R\$0,00	R\$868.761,88	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Reforma e Acessibilidade em Passeios Publicos [MOB]: Subprefeitura Jabaquara - Contrato 1	R\$0,00	R\$770.166,10	R\$770.166,10	R\$0,00	R\$0,00
Reforma e Acessibilidade em Passeios Publicos [MOB]: Subprefeitura Perus - Contrato 1	R\$0,00	R\$1.341.396,64	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Reforma e Acessibilidade em Passeios Publicos [MOB]: Subprefeitura Lapa - Contrato 1	R\$0,00	R\$929.455,61	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Reforma e Acessibilidade em Passeios Publicos [MOB]: Subprefeitura Cidade Ademar - Contrato 1	R\$0,00	R\$764.658,61	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Reforma e Acessibilidade em Passeios Publicos [MOB]: Subprefeitura Penha - Contrato 1	R\$0,00	R\$837.478,44	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Reforma e Acessibilidade em Passeios Publicos [MOB]: Subprefeitura São Miguel Paulista - Contrato 2	R\$0,00	R\$517.641,22	R\$517.641,22	R\$0,00	R\$0,00
Reforma e Acessibilidade em Passeios Publicos [MOB]: Subprefeitura Freguesia do Ó/ Brasilândia - Contrato 1	R\$0,00	R\$1.006.898,34	R\$1.006.898,34	R\$0,00	R\$0,00

Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos [MOB]					
Objeto e endereço	Valor aprovado	Valor reservado	Valor empenhado	Valor liquidado	Valor pago
Reforma e Acessibilidade em Passeios Publicos [MOB]: Subprefeitura Butantã - Contrato 1	R\$0,00	R\$633.630,33	R\$633.630,33	R\$0,00	R\$0,00
Reforma e Acessibilidade em Passeios Publicos [MOB]: Subprefeitura Mooca - Contrato 2	R\$0,00	R\$2.261.414,53	R\$2.261.414,53	R\$0,00	R\$0,00
Reforma e Acessibilidade em Passeios Publicos [MOB]: Subprefeitura Guaianases - Contrato 1	R\$0,00	R\$684.296,01	R\$684.296,01	R\$0,00	R\$0,00
Reforma e Acessibilidade em Passeios Publicos [MOB]: Subprefeitura Jaçanã/ Tremembé - Contrato 1	R\$0,00	R\$609.964,42	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Reforma e Acessibilidade em Passeios Publicos [MOB]: Subprefeitura M'Boi Mirim - Contrato 1	R\$0,00	R\$832.526,75	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Reforma e Acessibilidade em Passeios Publicos [MOB]: Subprefeitura Casa Verde - Contrato 2	R\$0,00	R\$1.256.757,53	R\$1.256.757,53	R\$0,00	R\$0,00
Reforma e Acessibilidade em Passeios Publicos [MOB]: Subprefeitura Santo Amaro - Contrato 2	R\$0,00	R\$1.192.728,15	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL	R\$35.151.756,00	R\$26.812.286,58	R\$18.096.385,89	R\$1.863.237,94	R\$1.863.237,94

REFORMA E ACESSIBILIDADE EM PASSEIOS PÚBLICOS [MOB]

Objeto	Diversos endereços contemplando as 32 Subprefeituras
Subprefeitura	Diversos
Endereço	Diversos
Nº do SEI	6012.2025/0001298-0
Situação	Em contratação

Valor aprovado 2026	R\$ 25.796.121,08
Valor reservado 2026	R\$ 0,00
Valor empenhado 2026	R\$ 0,00
Valor liquidado 2026	R\$ 0,00

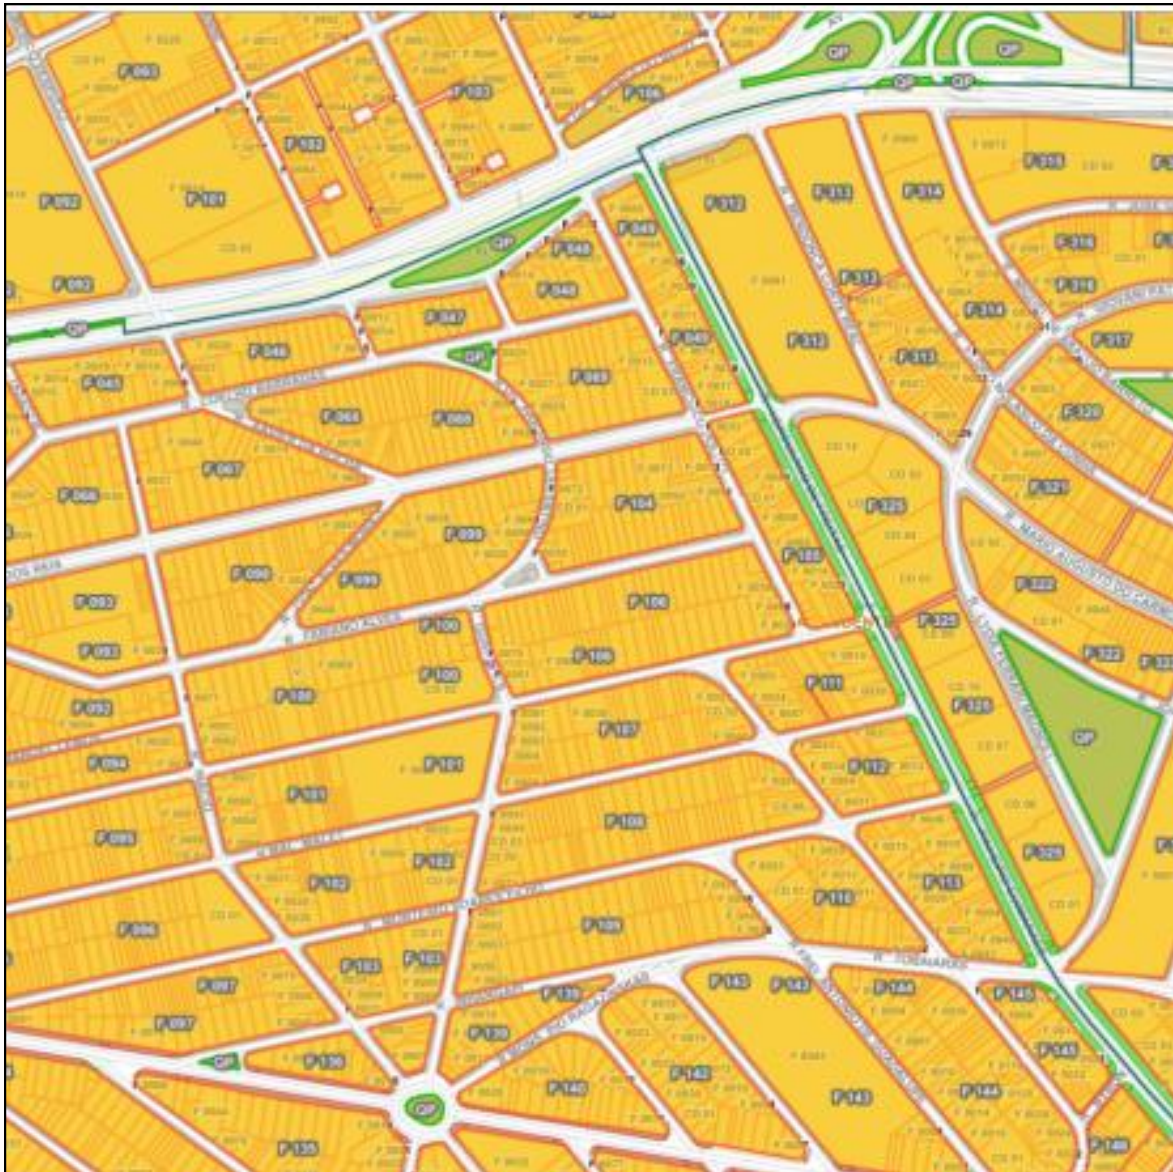

EM CONTRATAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2026

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS (SMSUB)

REFORMA E ACESSIBILIDADE EM PASSEIOS PÚBLICOS [MOB]

Objeto	Subprefeitura Campo Limpo - Contrato 1
Subprefeitura	Campo Limpo
Endereço	Estrada de Itapecerica; Rua Valter Airosa Flaquer
Nº do SEI	6012.2026/0003990-1
Situação	Em execução

Valor aprovado 2026	R\$ 97.665,25
Valor reservado 2026	R\$ 97.665,25
Valor empenhado 2026	R\$ 97.665,25
Valor liquidado 2026	R\$ 0,00



EM EXECUÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2026

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS (SMSUB)

REFORMA E ACESSIBILIDADE EM PASSEIOS PÚBLICOS [MOB]

Objeto	Subprefeitura São Miguel Paulista - Contrato 1
Subprefeitura	São Miguel Paulista
Endereço	Rua Jaime Barcelos
Nº do SEI	6012.2026/0004220-1
Situação	Em execução

Valor aprovado 2026	R\$ 702.432,72
Valor reservado 2026	R\$ 702.432,72
Valor empenhado 2026	R\$ 702.432,72
Valor liquidado 2026	R\$ 0,00



EM EXECUÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2026

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS (SMSUB)

REFORMA E ACESSIBILIDADE EM PASSEIOS PÚBLICOS [MOB]

Objeto	Subprefeitura São Mateus - Contrato 1
Subprefeitura	São Mateus
Endereço	Avenida Satélite
Nº do SEI	6012.2026/0004338-0
Situação	Em execução

Valor aprovado 2026	R\$ 792.370,62
Valor reservado 2026	R\$ 792.370,62
Valor empenhado 2026	R\$ 792.370,62
Valor liquidado 2026	R\$ 0,00



EM EXECUÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2026

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS (SMSUB)

REFORMA E ACESSIBILIDADE EM PASSEIOS PÚBLICOS [MOB]

Objeto	Subprefeitura Santana/Tucuruvi - Contrato 1
Subprefeitura	Santana/Tucuruvi
Endereço	Rua Paineira do Campo; Rua Voluntários da Pátria
Nº do SEI	6012.2026/0004458-1
Situação	Em execução

Valor aprovado 2026	R\$ 931.768,81
Valor reservado 2026	R\$ 931.768,81
Valor empenhado 2026	R\$ 931.768,81
Valor liquidado 2026	R\$ 38.759,43



EM EXECUÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2026

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS (SMSUB)

REFORMA E ACESSIBILIDADE EM PASSEIOS PÚBLICOS [MOB]

Objeto	Subprefeitura Aricanduva - Contrato 1
Subprefeitura	Aricanduva
Endereço	Rua Inconfidência Mineira; Av. Rio das Pedras
Nº do SEI	6012.2026/0005608-3
Situação	Em execução

Valor aprovado 2026	R\$ 840.185,50
Valor reservado 2026	R\$ 840.185,50
Valor empenhado 2026	R\$ 840.185,50
Valor liquidado 2026	R\$ 0,00



EM EXECUÇÃO

REFORMA E ACESSIBILIDADE EM PASSEIOS PÚBLICOS [MOB]

Objeto	Subprefeitura Vila Prudente - Contrato 1
Subprefeitura	Vila Prudente
Endereço	Rua Costa Barros
Nº do SEI	6012.2026/0004617-7
Situação	Em execução

Valor aprovado 2026	R\$ 716.206,40
Valor reservado 2026	R\$ 716.206,40
Valor empenhado 2026	R\$ 716.206,40
Valor liquidado 2026	R\$ 0,00



EM EXECUÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2026

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS (SMSUB)

REFORMA E ACESSIBILIDADE EM PASSEIOS PÚBLICOS [MOB]

Objeto	Subprefeitura Santo Amaro - Contrato 1
Subprefeitura	Santo Amaro
Endereço	Avenida Interlagos
Nº do SEI	6012.2026/0004459-0
Situação	Em execução

Valor aprovado 2026	R\$ 565.771,83
Valor reservado 2026	R\$ 565.771,83
Valor empenhado 2026	R\$ 565.771,83
Valor liquidado 2026	R\$ 0,00



EM EXECUÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2026

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS (SMSUB)

REFORMA E ACESSIBILIDADE EM PASSEIOS PÚBLICOS [MOB]

Objeto	Subprefeitura Sé - Contrato 1
Subprefeitura	Sé
Endereço	R. Benjamim Constant; R. Quintino Bocaiuva; R. Riachuelo.
Nº do SEI	6012.2026/0006080-3
Situação	Em execução

Valor aprovado 2026	R\$ 931.759,41
Valor reservado 2026	R\$ 931.759,41
Valor empenhado 2026	R\$ 931.759,41
Valor liquidado 2026	R\$ 0,00



EM EXECUÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2026

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS (SMSUB)

REFORMA E ACESSIBILIDADE EM PASSEIOS PÚBLICOS [MOB]

Objeto	Subprefeitura Itaim Paulista - Contrato 1
Subprefeitura	Itaim Paulista
Endereço	Av. Marechal Tito; Estrada da Biacica; Rua Dois
Nº do SEI	6012.2026/0005822-1
Situação	Em execução

Valor aprovado 2026	R\$ 679.001,58
Valor reservado 2026	R\$ 679.001,58
Valor empenhado 2026	R\$ 679.001,58
Valor liquidado 2026	R\$ 0,00



EM EXECUÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2026

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS (SMSUB)

REFORMA E ACESSIBILIDADE EM PASSEIOS PÚBLICOS [MOB]

Objeto	Subprefeitura Mooca - Contrato 1
Subprefeitura	Mooca
Endereço	R. João Teodoro; Rua Tiers; Av. Do Estado
Nº do SEI	6012.2026/0006039-0
Situação	A executar

Valor aprovado 2026	R\$ 1.034.858,98
Valor reservado 2026	R\$ 1.034.858,98
Valor empenhado 2026	R\$ 1.034.858,98
Valor liquidado 2026	R\$ 0,00



A EXECUTAR


PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2026

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS (SMSUB)

REFORMA E ACESSIBILIDADE EM PASSEIOS PÚBLICOS [MOB]

Objeto	Subprefeitura Pinheiros - Contrato 1
Subprefeitura	Pinheiros
Endereço	Av. Brigadeiro Luis Antonio; Av. Cidade Jardim; Av. Henrique Chamma
Nº do SEI	6012.2026/0006040-4
Situação	Em execução

Valor aprovado 2026	R\$ 1.412.129,66
Valor reservado 2026	R\$ 1.412.129,66
Valor empenhado 2026	R\$ 1.412.129,66
Valor liquidado 2026	R\$ 1.193.204,49

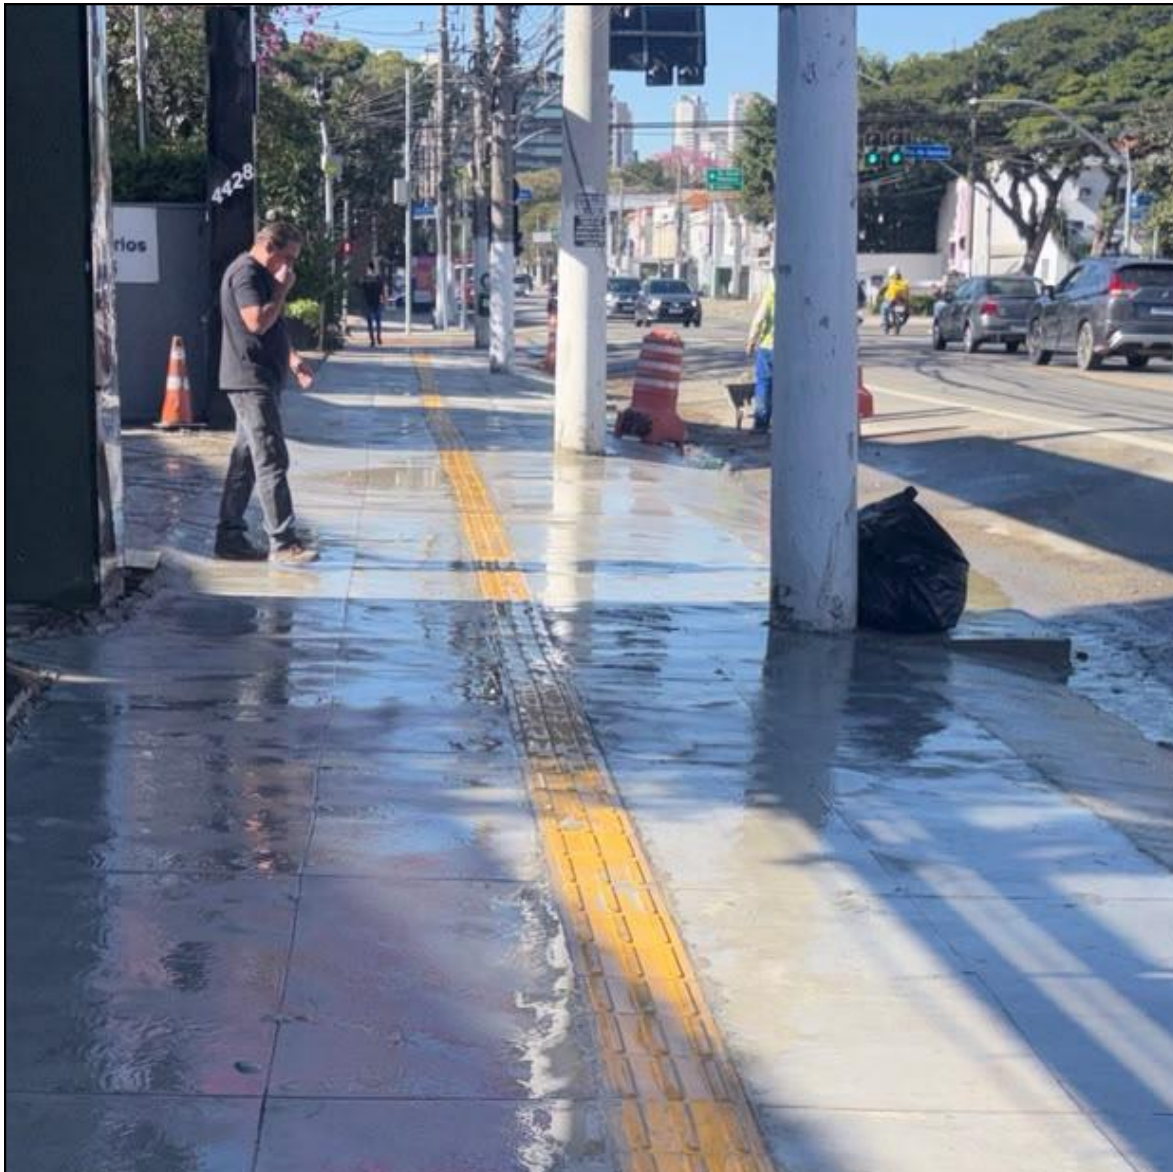

EM EXECUÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2026

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS (SMSUB)

REFORMA E ACESSIBILIDADE EM PASSEIOS PÚBLICOS [MOB]

Objeto	Subprefeitura Ipiranga - Contrato 1
Subprefeitura	Ipiranga
Endereço	Av. do Cursino
Nº do SEI	6012.2026/0005725-0
Situação	Em contratação

Valor aprovado 2026	R\$ 651.484,16
Valor reservado 2026	R\$ 651.484,16
Valor empenhado 2026	R\$ 651.484,16
Valor liquidado 2026	R\$ 0,00



A EXECUTAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2026

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS (SMSUB)

REFORMA E ACESSIBILIDADE EM PASSEIOS PÚBLICOS [MOB]

Objeto	Subprefeitura Casa Verde - Contrato 1
Subprefeitura	Casa Verde
Endereço	Av. Mandaqui
Nº do SEI	6012.2026/0004087-0
Situação	A executar

Valor aprovado 2026	R\$ 0,00
Valor reservado 2026	R\$ 631.274,02
Valor empenhado 2026	R\$ 631.274,02
Valor liquidado 2026	R\$ 631.274,02



EM EXECUÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2026

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS (SMSUB)

REFORMA E ACESSIBILIDADE EM PASSEIOS PÚBLICOS [MOB]

Objeto	Subprefeitura Itaquera - Contrato 1
Subprefeitura	Itaquera
Endereço	R. Gergório Ramalho, R. Flores do Piauí, R. Dr. Aureliano Barreiros
Nº do SEI	6012.2026/0004636-3
Situação	Em execução

Valor aprovado 2026	R\$ 0,00
Valor reservado 2026	R\$ 564.621,48
Valor empenhado 2026	R\$ 564.621,48
Valor liquidado 2026	R\$ 0,00



EM EXECUÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2026

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS (SMSUB)

REFORMA E ACESSIBILIDADE EM PASSEIOS PÚBLICOS [MOB]

Objeto	Subprefeitura Parelheiros - Contrato 1
Subprefeitura	Parelheiros
Endereço	R. Euzebio Coghi, R. Cacoal
Nº do SEI	6012.2026/0005727-6
Situação	A executar

Valor aprovado 2026	R\$ 0,00
Valor reservado 2026	R\$ 323.905,88
Valor empenhado 2026	R\$ 323.905,88
Valor liquidado 2026	R\$ 0,00



A EXECUTAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2026

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS (SMSUB)

REFORMA E ACESSIBILIDADE EM PASSEIOS PÚBLICOS [MOB]

Objeto	Subprefeitura Vila Maria/ Vila Guilherme - Contrato 1
Subprefeitura	Vila Maria/ Vila Guilherme
Endereço	R. Curuçá
Nº do SEI	6012.2026/0005917-1
Situação	A executar

Valor aprovado 2026	R\$ 0,00
Valor reservado 2026	R\$ 687.446,03
Valor empenhado 2026	R\$ 0,00
Valor liquidado 2026	R\$ 0,00



A EXECUTAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2026

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS (SMSUB)

REFORMA E ACESSIBILIDADE EM PASSEIOS PÚBLICOS [MOB]

Objeto	Subprefeitura Vila Mariana - Contrato 1
Subprefeitura	Vila Mariana
Endereço	Av. Ibirapuera, Av. Prof. Ascendino Reis, R. Napoleão de Barros
Nº do SEI	6012.2026/0005918-0
Situação	A executar

Valor aprovado 2026	R\$ 0,00
Valor reservado 2026	R\$ 741.629,69
Valor empenhado 2026	R\$ 741.629,69
Valor liquidado 2026	R\$ 0,00



A EXECUTAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2026

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS (SMSUB)

REFORMA E ACESSIBILIDADE EM PASSEIOS PÚBLICOS [MOB]

Objeto	Subprefeitura Capela do Socorro - Contrato 1
Subprefeitura	Capela do Socorro
Endereço	R. Prof. Oscar Barreto Filho, R. Rosalia Grisi Sandoval
Nº do SEI	6012.2026/0006320-9
Situação	A executar

Valor aprovado 2026	R\$ 0,00
Valor reservado 2026	R\$ 868.761,88
Valor empenhado 2026	R\$ 0,00
Valor liquidado 2026	R\$ 0,00



A EXECUTAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2026

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS (SMSUB)

REFORMA E ACESSIBILIDADE EM PASSEIOS PÚBLICOS [MOB]

Objeto	Subprefeitura Jabaquara - Contrato 1
Subprefeitura	Jabaquara
Endereço	Av. Santa Catarina, R. Dr. Djalma Pinheiro Franco
Nº do SEI	6012.2026/0008572-5
Situação	A executar

Valor aprovado 2026	R\$ 0,00
Valor reservado 2026	R\$ 770.166,10
Valor empenhado 2026	R\$ 770.166,10
Valor liquidado 2026	R\$ 0,00



A EXECUTAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2026

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS (SMSUB)

REFORMA E ACESSIBILIDADE EM PASSEIOS PÚBLICOS [MOB]

Objeto	Subprefeitura Perus - Contrato 1
Subprefeitura	Perus
Endereço	R. Leopoldo de Passos Lima
Nº do SEI	6012.2026/0009144-0
Situação	A executar

Valor aprovado 2026	R\$ 0,00
Valor reservado 2026	R\$ 1.341.396,64
Valor empenhado 2026	R\$ 0,00
Valor liquidado 2026	R\$ 0,00



A EXECUTAR

REFORMA E ACESSIBILIDADE EM PASSEIOS PÚBLICOS [MOB]

Objeto	Subprefeitura Lapa - Contrato 1
Subprefeitura	Lapa
Endereço	R. Camilo, R. Caio Graco
Nº do SEI	6012.2026/0009235-7
Situação	A executar

Valor aprovado 2026	R\$ 0,00
Valor reservado 2026	R\$ 929.455,61
Valor empenhado 2026	R\$ 0,00
Valor liquidado 2026	R\$ 0,00



A EXECUTAR

REFORMA E ACESSIBILIDADE EM PASSEIOS PÚBLICOS [MOB]

Objeto	Subprefeitura Cidade Ademar - Contrato 1
Subprefeitura	Cidade Ademar
Endereço	Av. Yervant Kissaijikian
Nº do SEI	6012.2026/0009238-1
Situação	A executar

Valor aprovado 2026	R\$ 0,00
Valor reservado 2026	R\$ 764.658,61
Valor empenhado 2026	R\$ 0,00
Valor liquidado 2026	R\$ 0,00



A EXECUTAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2026

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS (SMSUB)

REFORMA E ACESSIBILIDADE EM PASSEIOS PÚBLICOS [MOB]

Objeto	Subprefeitura Penha - Contrato 1
Subprefeitura	Penha
Endereço	R. Guaiaúna
Nº do SEI	6012.2026/0009242-0
Situação	A executar

Valor aprovado 2026	R\$ 0,00
Valor reservado 2026	R\$ 837.478,44
Valor empenhado 2026	R\$ 0,00
Valor liquidado 2026	R\$ 0,00



A EXECUTAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2026

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS (SMSUB)

REFORMA E ACESSIBILIDADE EM PASSEIOS PÚBLICOS [MOB]

Objeto	Subprefeitura São Miguel Paulista - Contrato 2
Subprefeitura	São Miguel Paulista
Endereço	R. Cel. Manuel Feliciano de Souza, R. Joao Felisberto Moreira, R. Dona Ana Flora Pinheiro de Sousa
Nº do SEI	6012.2026/0009601-8
Situação	A executar

Valor aprovado 2026	R\$ 0,00
Valor reservado 2026	R\$ 517.641,22
Valor empenhado 2026	R\$ 0,00
Valor liquidado 2026	R\$ 0,00



A EXECUTAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2026

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS (SMSUB)

REFORMA E ACESSIBILIDADE EM PASSEIOS PÚBLICOS [MOB]

Objeto	Subprefeitura Freguesia do Ó/ Brasilândia - Contrato 1
Subprefeitura	Freguesia do Ó/ Brasilândia
Endereço	Av. Itaberaba
Nº do SEI	6012.2026/0011417-2
Situação	A executar

Valor aprovado 2026	R\$ 0,00
Valor reservado 2026	R\$ 1.006.898,34
Valor empenhado 2026	R\$ 1.006.898,34
Valor liquidado 2026	R\$ 0,00



A EXECUTAR


PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2026

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS (SMSUB)

REFORMA E ACESSIBILIDADE EM PASSEIOS PÚBLICOS [MOB]

Objeto	Subprefeitura Butantã - Contrato 1
Subprefeitura	Butantã
Endereço	Av. Eng. Heitor Antônio Eiras Garcia, Praça Isai Leimer
Nº do SEI	6012.2026/0011432-6
Situação	A executar

Valor aprovado 2026	R\$ 0,00
Valor reservado 2026	R\$ 633.630,33
Valor empenhado 2026	R\$ 633.630,33
Valor liquidado 2026	R\$ 0,00

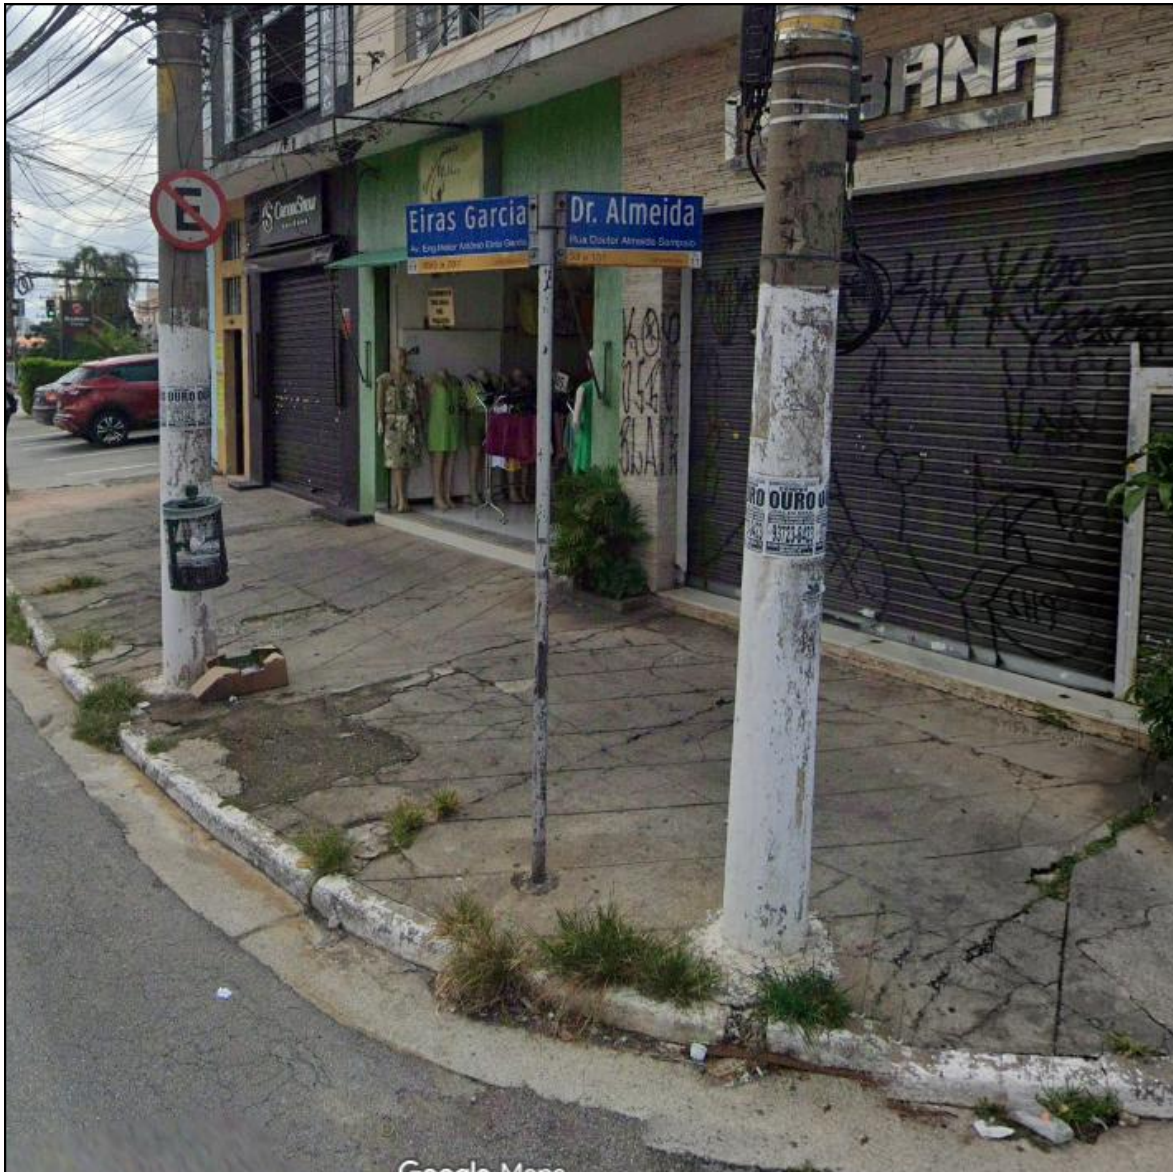

A EXECUTAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2026

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS (SMSUB)

REFORMA E ACESSIBILIDADE EM PASSEIOS PÚBLICOS [MOB]

Objeto	Subprefeitura Mooca- Contrato 2
Subprefeitura	Mooca
Endereço	R. Cajuru, R. Julio de Castilhos, Largo São José do Belém
Nº do SEI	6012.2026/0011500-4
Situação	A executar
Valor aprovado 2026	R\$ 0,00
Valor reservado 2026	R\$ 2.261.414,53
Valor empenhado 2026	R\$ 0,00
Valor liquidado 2026	R\$ 0,00



A EXECUTAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2026

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS (SMSUB)

REFORMA E ACESSIBILIDADE EM PASSEIOS PÚBLICOS [MOB]

Objeto	Subprefeitura Guaianases - Contrato 1
Subprefeitura	Guaianases
Endereço	Estrada Dom João Nery
Nº do SEI	6012.2026/0011578-0
Situação	A executar

Valor aprovado 2026	R\$ 0,00
Valor reservado 2026	R\$ 684.296,01
Valor empenhado 2026	R\$ 0,00
Valor liquidado 2026	R\$ 0,00



A EXECUTAR


PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2026

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS (SMSUB)

REFORMA E ACESSIBILIDADE EM PASSEIOS PÚBLICOS [MOB]

Objeto	Subprefeitura Jaçanã/ Tremembé - Contrato 1
Subprefeitura	Jaçanã/ Tremembé
Endereço	Av. Luiz Stamatis
Nº do SEI	6012.2026/0012682-0
Situação	A executar

Valor aprovado 2026	R\$ 0,00
Valor reservado 2026	R\$ 609.964,42
Valor empenhado 2026	R\$ 0,00
Valor liquidado 2026	R\$ 0,00

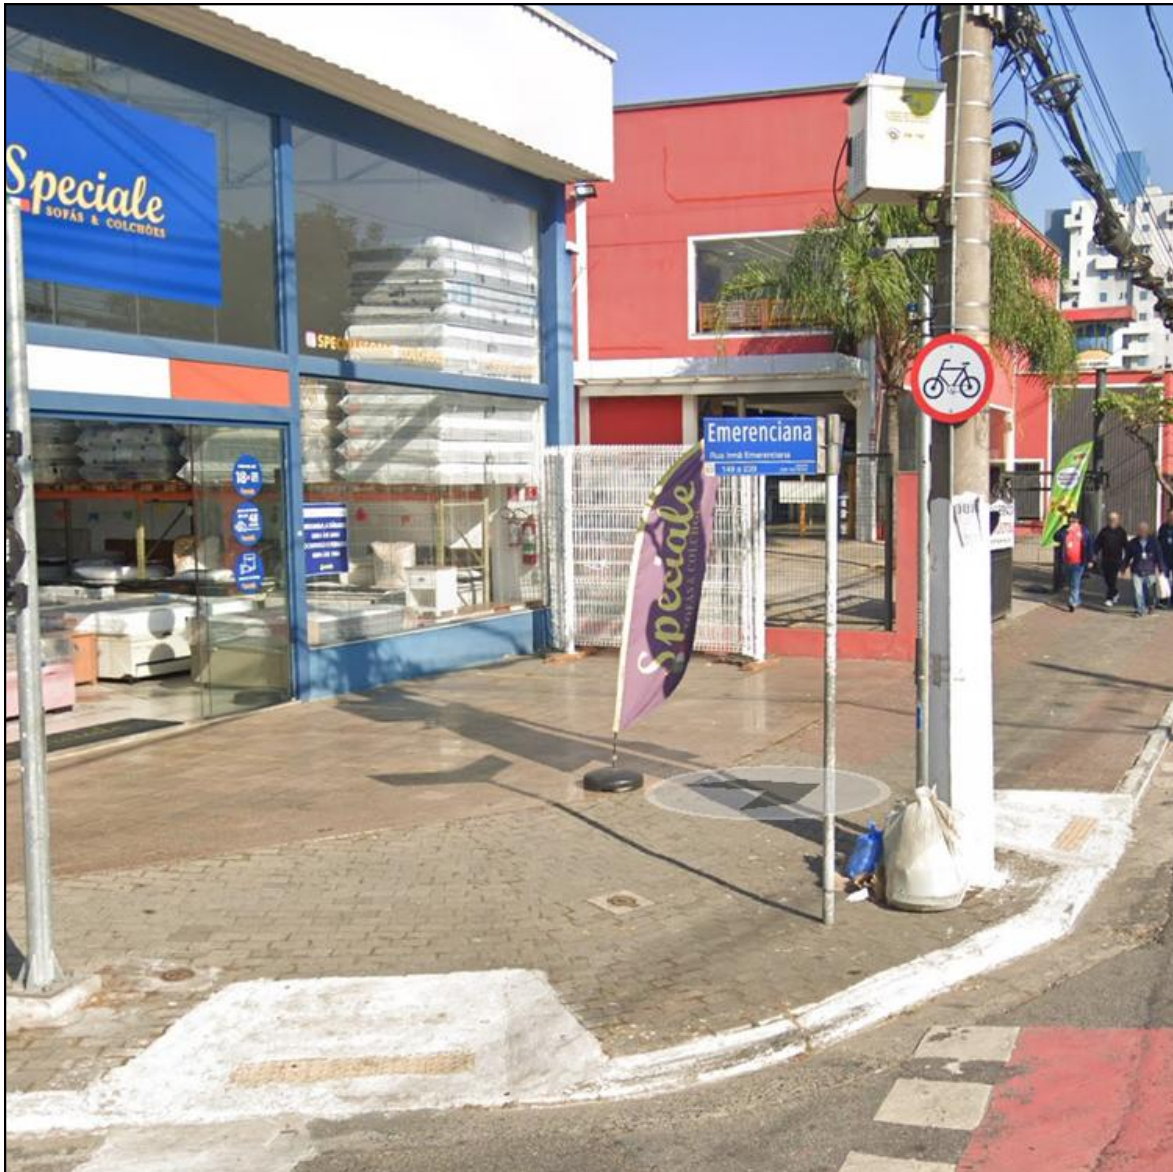

A EXECUTAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2026

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS (SMSUB)

REFORMA E ACESSIBILIDADE EM PASSEIOS PÚBLICOS [MOB]

Objeto	Subprefeitura M'Boi Mirim - Contrato 1
Subprefeitura	M'Boi Mirim
Endereço	Estrada do M'Boi Mirim
Nº do SEI	6012.2026/0005643-1
Situação	A executar

Valor aprovado 2026	R\$ 0,00
Valor reservado 2026	R\$ 832.526,75
Valor empenhado 2026	R\$ 0,00
Valor liquidado 2026	R\$ 0,00



A EXECUTAR


PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2026

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS (SMSUB)

REFORMA E ACESSIBILIDADE EM PASSEIOS PÚBLICOS [MOB]

Objeto	Subprefeitura Casa Verde - Contrato 2
Subprefeitura	Casa Verde
Endereço	Av. Mandaqui, Av. João Marcelino Branco, R. Franklin do Amaral, R. Zilda, Av. Dep. Emílio Carlos
Nº do SEI	6012.2026/0011740-6
Situação	A executar

Valor aprovado 2026	R\$ 0,00
Valor reservado 2026	R\$ 1.256.757,53
Valor empenhado 2026	R\$ 0,00
Valor liquidado 2026	R\$ 0,00

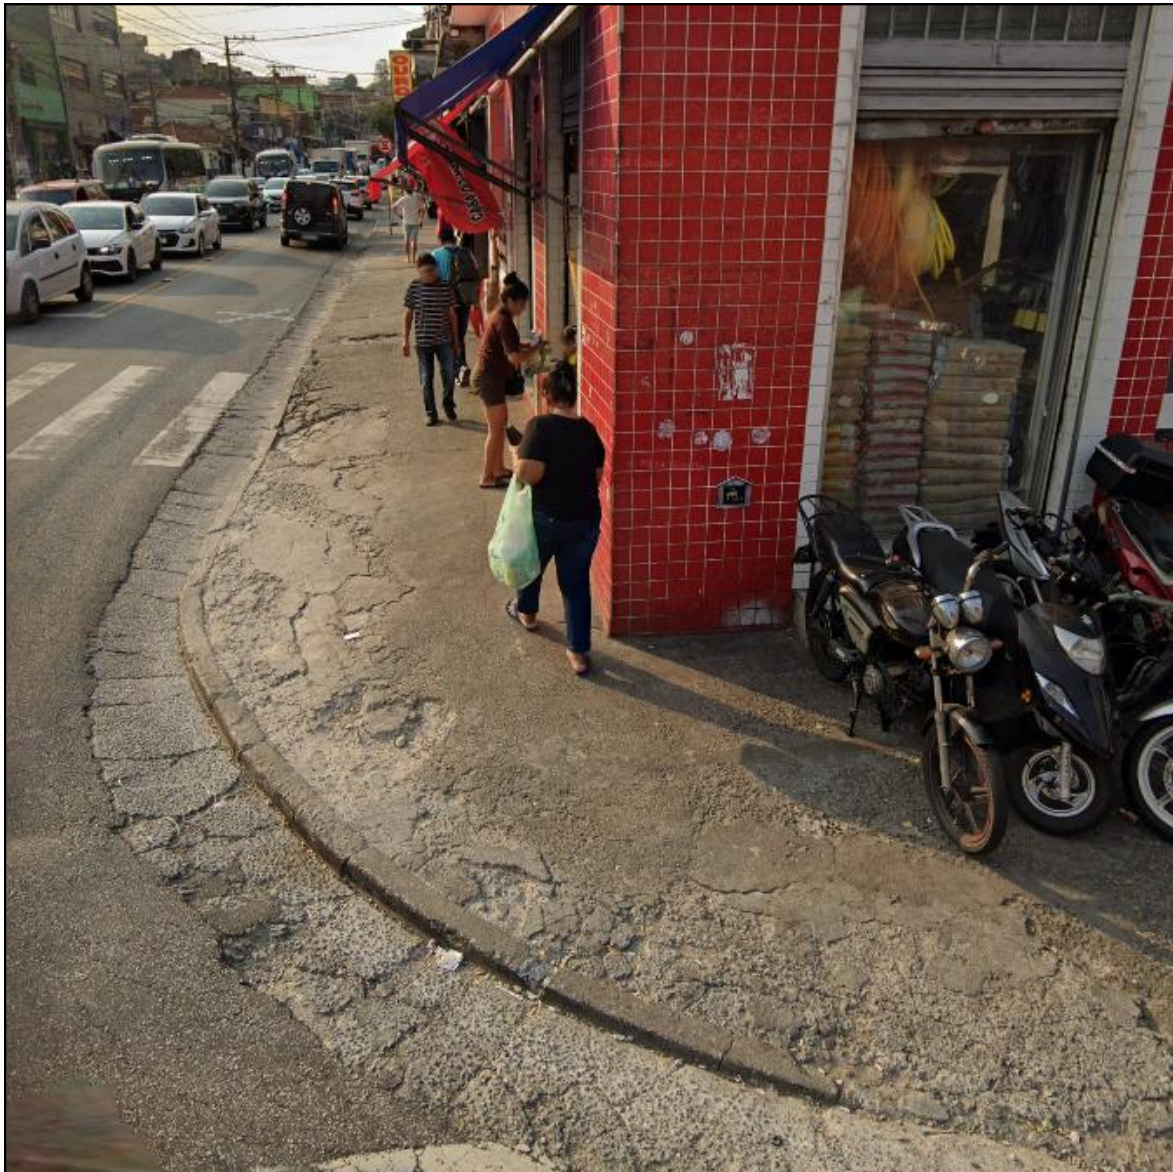


A EXECUTAR

REFORMA E ACESSIBILIDADE EM PASSEIOS PÚBLICOS [MOB]

Objeto	Subprefeitura Santo Amaro - Contrato 2
Subprefeitura	Santo Amaro
Endereço	Av. Interlagos
Nº do SEI	6012.2026/0012430-5
Situação	A executar

Valor aprovado 2026	R\$ 0,00
Valor reservado 2026	R\$ 1.192.728,15
Valor empenhado 2026	R\$ 0,00
Valor liquidado 2026	R\$ 0,00

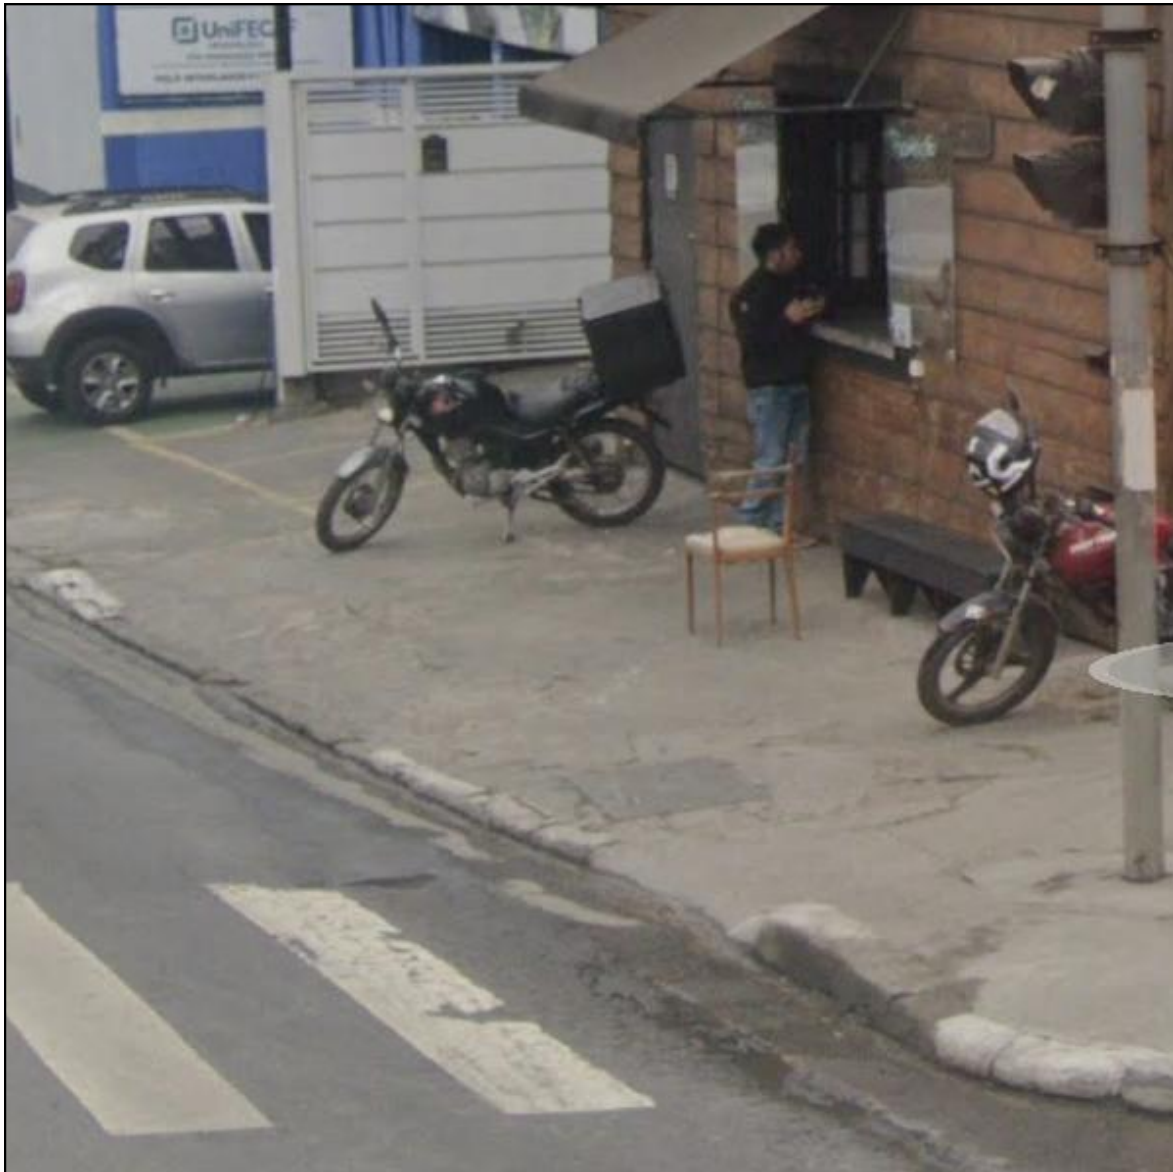

A EXECUTAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2026

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS (SMSUB)

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2026

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS (SMSUB)



Pavimentação e Recapeamento de Vias					
Objeto e endereço	Valor aprovado	Valor reservado	Valor empenhado	Valor liquidado	Valor pago
Pavimentação e Recapeamento de Vias [MOB] - Recapeamento - Av. Dracena	R\$3.681.208,26	R\$3.681.130,23	R\$3.681.130,23	R\$3.476.356,74	R\$3.476.356,74
Pavimentação e Recapeamento de Vias [MOB] - Recapeamento - R. Pará	R\$1.073.661,53	R\$1.073.661,53	R\$1.073.661,53	R\$813.359,62	R\$813.359,62
Pavimentação e Recapeamento de Vias [MOB] - Recapeamento - R. Itaquera	R\$1.335.957,03	R\$1.335.957,03	R\$1.335.957,03	R\$694.245,29	R\$694.245,29
Pavimentação e Recapeamento de Vias [MOB] - Recapeamento - R. dos Patriotas	R\$4.194.133,74	R\$4.194.133,74	R\$4.194.133,74	R\$1.583.288,02	R\$1.583.288,02
Pavimentação e Recapeamento de Vias [MOB] - Recapeamento - R. Elisa Silveira – Trecho II	R\$457.808,28	R\$457.808,28	R\$457.808,28	R\$337.272,61	R\$337.272,61
Pavimentação e Recapeamento de Vias [MOB] - Recapeamento - R. Padre Senepa	R\$420.922,65	R\$420.922,65	R\$420.922,65	R\$261.258,03	R\$261.258,03
Pavimentação e Recapeamento de Vias [MOB] - Recapeamento - R. Eng. Ranulfo Pinheiro Lima	R\$1.013.366,80	R\$1.013.366,80	R\$1.013.366,80	R\$776.884,84	R\$776.884,84
Pavimentação e Recapeamento de Vias [MOB] - Recapeamento - Av. João de Barros	R\$3.329.155,86	R\$3.329.764,80	R\$3.329.764,80	R\$3.149.864,23	R\$3.149.864,23
Pavimentação e Recapeamento de Vias [MOB][BP] - Recapeamento - Av. General Asdrúbal da Cunha	R\$8.717.252,70	R\$8.717.427,60	R\$8.717.427,60	R\$8.411.753,18	R\$8.411.753,18
Pavimentação e Recapeamento de Vias [MOB][BP] - Recapeamento - R. Encruzilhada do Sul	R\$3.694.771,29	R\$3.694.793,20	R\$3.694.793,20	R\$3.590.618,42	R\$3.590.618,42
Pavimentação e Recapeamento de Vias [MOB][BP] - Recapeamento - R. Firminópolis	R\$4.546.909,46	R\$4.546.861,09	R\$4.546.861,09	R\$4.425.773,76	R\$4.425.773,76
Pavimentação e Recapeamento de Vias [MOB][BP] - Recapeamento - R. Ibiraiaras	R\$3.040.067,01	R\$3.040.093,47	R\$3.040.093,47	R\$2.946.162,95	R\$2.946.162,95
Pavimentação e Recapeamento de Vias [MOB][BP] - Recapeamento - R. Manuel Vieira da Luz	R\$4.611.336,76	R\$4.611.336,76	R\$4.611.336,76	R\$3.898.400,61	R\$3.898.400,61
Pavimentação e Recapeamento de Vias [MOB][BP] - Recapeamento - R. dos Filhos da Terra	R\$3.412.118,93	R\$3.412.118,93	R\$3.412.118,93	R\$2.263.478,69	R\$2.263.478,69
Pavimentação e Recapeamento de Vias [MOB][BP] - Recapeamento - R. Cap. Rubens (trecho I)	R\$1.847.096,07	R\$1.847.096,07	R\$1.847.096,07	R\$1.634.100,23	R\$1.634.100,23
Pavimentação e Recapeamento de Vias [LIVRE][BP] - Recapeamento - R. Rei Alberto	R\$3.451.535,15	R\$3.451.535,15	R\$3.451.535,15	R\$2.972.198,82	R\$2.972.198,82
Pavimentação e Recapeamento de Vias [LIVRE][BP] - Recapeamento - Av. Mario Pernambuco	R\$2.643.365,09	R\$2.643.365,09	R\$2.643.365,09	R\$2.028.109,85	R\$2.028.109,85
Pavimentação e Recapeamento de Vias [MOB][BP] - Recapeamento - R. Prof. Enéas de Siqueira Neto	R\$4.153.331,10	R\$4.152.773,41	R\$4.152.773,41	R\$4.008.023,85	R\$4.008.023,85

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2026

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS (SMSUB)



Pavimentação e Recapeamento de Vias					
Objeto e endereço	Valor aprovado	Valor reservado	Valor empenhado	Valor liquidado	Valor pago
Pavimentação e Recapeamento de Vias [MOB][BP] - Recapeamento - Av. das Belezas	R\$1.899.366,77	R\$1.899.366,77	R\$1.899.366,77	R\$1.891.315,77	R\$1.891.315,77
Pavimentação e Recapeamento de Vias [MOB][BP] - Recapeamento - Av. Caporanga	R\$3.741.854,90	R\$4.197.344,05	R\$4.197.344,05	R\$4.197.344,05	R\$4.197.344,05
Pavimentação e Recapeamento de Vias [MOB][BP] - Recapeamento - R. Pietro Marsolo	R\$1.263.667,90	R\$1.263.667,90	R\$1.263.667,90	R\$63.038,53	R\$63.038,53
Pavimentação e Recapeamento de Vias [MOB][BP] - Recapeamento - Av. Esperantina (Inclui Rotatória)	R\$3.942.987,84	R\$3.942.940,86	R\$3.942.940,86	R\$3.884.076,78	R\$3.884.076,78
Pavimentação e Recapeamento de Vias [MOB][BP] - Recapeamento - Av. Oliveira Freire	R\$5.394.776,32	R\$4.514.027,15	R\$4.514.027,15	R\$3.879.010,91	R\$3.879.010,91
Pavimentação e Recapeamento de Vias [MOB][BP] - Recapeamento - Av. Teodoro Bernardo do Nascimento	R\$9.080.365,10	R\$8.050.860,70	R\$8.050.860,70	R\$7.201.379,49	R\$7.201.379,49
Pavimentação e Recapeamento de Vias [MOB][BP] - Recapeamento - R. José Pessota - Trecho II	R\$3.711.012,93	R\$3.261.798,87	R\$3.261.798,87	R\$3.058.497,50	R\$3.058.497,50
Pavimentação e Recapeamento de Vias [MOB][BP] - Recapeamento - R. Estrela Guia	R\$103.693,66	R\$103.690,02	R\$103.690,02	R\$98.992,21	R\$98.992,21
Pavimentação e Recapeamento de Vias [MOB][BP] - Recapeamento - Tv. Paracelsus	R\$1.016.394,62	R\$1.016.354,16	R\$1.016.354,16	R\$847.184,62	R\$847.184,62
Pavimentação e Recapeamento de Vias [MOB][BP] - Recapeamento - R. Sinfonias do Ocaso	R\$1.563.407,57	R\$1.563.378,01	R\$1.563.378,01	R\$1.470.253,22	R\$1.470.253,22
Pavimentação e Recapeamento de Vias [MOB][BP] - Recapeamento - R. Antônio Sarzedas	R\$683.415,75	R\$683.423,23	R\$683.423,23	R\$561.792,50	R\$561.792,50
Pavimentação e Recapeamento de Vias [LIVRE][BP] - Recapeamento - R. Sold. Cândido da Luz Paiva	R\$844.015,30	R\$844.009,68	R\$844.009,68	R\$709.824,53	R\$709.824,53
Pavimentação e Recapeamento de Vias [MOB][BP] - Recapeamento - Av. Primavera de Caiena	R\$3.524.772,47	R\$3.524.804,72	R\$3.524.804,72	R\$3.165.680,96	R\$3.165.680,96
Pavimentação e Recapeamento de Vias [MOB][BP] - Recapeamento - R. Milton da Cruz	R\$1.982.211,91	R\$1.982.240,00	R\$1.982.240,00	R\$1.664.743,45	R\$1.664.743,45
Pavimentação e Recapeamento de Vias [MOB][BP] - Recapeamento - R. Boleadeiras	R\$1.084.360,03	R\$1.084.371,49	R\$1.084.371,49	R\$942.001,64	R\$942.001,64
Pavimentação e Recapeamento de Vias [MOB][BP] - Recapeamento - R. José Francisco Brandão	R\$2.905.422,80	R\$2.905.422,80	R\$2.905.422,80	R\$2.722.446,55	R\$2.722.446,55
Pavimentação e Recapeamento de Vias [MOB][BP] - Recapeamento - R. Douradoquara	R\$1.205.586,95	R\$1.205.586,95	R\$1.205.586,95	R\$1.083.302,30	R\$1.083.302,30
Pavimentação e Recapeamento de Vias [MOB][BP] - Recapeamento - R. Cachoeira do Campo (inclui contorno da Pça. Catas Altas)	R\$2.096.067,95	R\$2.096.067,95	R\$2.096.067,95	R\$1.941.828,81	R\$1.941.828,81

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2026

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS (SMSUB)



Pavimentação e Recapeamento de Vias					
Objeto e endereço	Valor aprovado	Valor reservado	Valor empenhado	Valor liquidado	Valor pago
Pavimentação e Recapeamento de Vias [MOB][BP] - Recapeamento - R. Taiobeiras	R\$716.714,32	R\$716.714,32	R\$716.714,32	R\$624.523,61	R\$624.523,61
Pavimentação e Recapeamento de Vias [MOB][BP] - Recapeamento - R. Padre Nildo do Amaral Jr.	R\$3.884.030,14	R\$3.884.030,14	R\$3.884.030,14	R\$2.773.988,21	R\$2.773.988,21
Pavimentação e Recapeamento de Vias [LIVRE][BP] - Recapeamento - Rua David Pimentel Racy	R\$1.167.884,97	R\$1.219.786,23	R\$1.219.786,23	R\$1.167.884,97	R\$1.167.884,97
Pavimentação e Recapeamento de Vias [LIVRE][BP] - Recapeamento - Rua James Ensor	R\$853.663,08	R\$892.685,52	R\$892.685,52	R\$853.663,08	R\$853.663,08
Pavimentação e Recapeamento de Vias [LIVRE][BP] - Recapeamento - R. Carandazinho	R\$277.401,43	R\$366.338,88	R\$366.338,88	R\$353.152,32	R\$353.152,32
Pavimentação e Recapeamento de Vias [LIVRE][BP] - Recapeamento - R. Dankmar Adler	R\$327.675,88	R\$315.646,33	R\$315.646,33	R\$300.120,57	R\$300.120,57
Pavimentação e Recapeamento de Vias [LIVRE][BP] - Recapeamento - R. Leônidas Busi	R\$222.144,41	R\$254.627,18	R\$254.627,18	R\$243.951,06	R\$243.951,06
Pavimentação e Recapeamento de Vias [LIVRE][BP] - Recapeamento - R. Lydia Damus Maksoud	R\$397.548,79	R\$372.437,23	R\$372.437,23	R\$353.671,10	R\$353.671,10
Pavimentação e Recapeamento de Vias [LIVRE][BP] - Recapeamento - R. Manuel Bicudo	R\$282.837,28	R\$271.411,31	R\$271.411,31	R\$257.961,53	R\$257.961,53
Pavimentação e Recapeamento de Vias [LIVRE][BP] - Recapeamento - R. Vitoriano de Oliveira	R\$915.427,19	R\$867.501,87	R\$867.501,87	R\$821.646,57	R\$821.646,57
Pavimentação e Recapeamento de Vias [LIVRE][BP] - Recapeamento - Tv. Alcebiades Maia Barcelos (Tv. Olímpio Teles de Meneses)	R\$421.491,43	R\$310.801,49	R\$310.801,49	R\$290.923,81	R\$290.923,81
Pavimentação e Recapeamento de Vias [LIVRE][BP] - Recapeamento - Rua Padre Jacob Roland	R\$208.371,73	R\$203.210,15	R\$203.210,15	R\$193.223,22	R\$193.223,22
Pavimentação e Recapeamento de Vias [LIVRE][BP] - Recapeamento - Rua Serrana Fluminense - Trecho I	R\$341.761,39	R\$341.761,39	R\$341.761,39	R\$283.124,51	R\$283.124,51
Pavimentação e Recapeamento de Vias [LIVRE][BP] - Recapeamento - Rua Serrana Fluminense - Trecho II	R\$499.767,25	R\$499.767,25	R\$499.767,25	R\$407.591,94	R\$407.591,94
Pavimentação e Recapeamento de Vias [LIVRE][BP] - Recapeamento - Rua Aprazível	R\$624.845,38	R\$624.845,38	R\$624.845,38	R\$580.716,83	R\$580.716,83
Pavimentação e Recapeamento de Vias [LIVRE][BP] - Recapeamento - Rua Dom Carlos Gouveia	R\$542.152,05	R\$542.152,05	R\$542.152,05	R\$497.515,71	R\$497.515,71
Pavimentação e Recapeamento de Vias [LIVRE][BP] - Recapeamento - Rua Rido Roque	R\$390.195,17	R\$390.195,17	R\$390.195,17	R\$370.172,65	R\$370.172,65
Pavimentação e Recapeamento de Vias [LIVRE][BP] - Recapeamento - Rua Alberto do Rego Rangel	R\$235.745,29	R\$235.745,29	R\$235.745,29	R\$216.194,08	R\$216.194,08

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2026

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS (SMSUB)



Pavimentação e Recapeamento de Vias					
Objeto e endereço	Valor aprovado	Valor reservado	Valor empenhado	Valor liquidado	Valor pago
Pavimentação e Recapeamento de Vias [LIVRE][BP] - Recapeamento - Rua Francisco Ferreira	R\$602.820,01	R\$602.820,01	R\$602.820,01	R\$567.523,38	R\$567.523,38
Pavimentação e Recapeamento de Vias [LIVRE][BP] - Recapeamento - Rua Marina Eston	R\$632.629,12	R\$632.629,12	R\$632.629,12	R\$588.527,13	R\$588.527,13
Pavimentação e Recapeamento de Vias [LIVRE][BP] - Recapeamento - Rua Edgar Baizon	R\$121.396,08	R\$121.396,08	R\$121.396,08	R\$110.404,32	R\$110.404,32
Pavimentação e Recapeamento de Vias [LIVRE][BP] - Recapeamento - Rua Pontalete	R\$7.162,94	R\$7.162,94	R\$7.162,94	R\$7.162,94	R\$7.162,94
Pavimentação e Recapeamento de Vias [LIVRE][BP] - Recapeamento - Rua Tenente Mário Barbedo	R\$3.284.397,89	R\$3.284.397,89	R\$3.284.397,89	R\$3.284.397,89	R\$3.284.397,89
Pavimentação e Recapeamento de Vias [LIVRE][BP] - Recapeamento - Rua Hintem Martins	R\$937.604,54	R\$937.604,54	R\$937.604,54	R\$937.604,54	R\$937.604,54
Pavimentação e Recapeamento de Vias [LIVRE][BP] - Recapeamento - R. Paulino Arena	R\$388.275,64	R\$388.275,64	R\$388.275,64	R\$388.275,64	R\$388.275,64
Pavimentação e Recapeamento de Vias [LIVRE][BP] - Recapeamento - Rua Antônia Francisca de Siqueira	R\$990.368,31	R\$990.368,31	R\$990.368,31	R\$990.368,31	R\$990.368,31
Pavimentação e Recapeamento de Vias [LIVRE][BP] - Recapeamento - Rua Anthémios de Tralles	R\$709.295,63	R\$709.295,63	R\$709.295,63	R\$709.295,63	R\$709.295,63
Pavimentação e Recapeamento de Vias [LIVRE][BP] - Recapeamento - R. Cristóvão Arraes	R\$315.541,91	R\$315.541,91	R\$315.541,91	R\$315.541,91	R\$315.541,91
Pavimentação e Recapeamento de Vias [LIVRE][BP] - Recapeamento - Rua Sabiaúna	R\$408.654,71	R\$408.654,71	R\$408.654,71	R\$408.654,71	R\$408.654,71
Pavimentação e Recapeamento de Vias [LIVRE][BP] - Recapeamento - Rua Laços de Ouro	R\$618.517,00	R\$618.517,00	R\$618.517,00	R\$618.517,00	R\$618.517,00
Pavimentação e Recapeamento de Vias [LIVRE][BP] - Recapeamento - Rua Major Gomes Ribeiro	R\$371.626,05	R\$371.626,05	R\$371.626,05	R\$371.626,05	R\$371.626,05
Pavimentação e Recapeamento de Vias [LIVRE][BP] - Recapeamento - Rua Pedroso da Silva	R\$1.620.595,60	R\$1.620.595,60	R\$1.620.595,60	R\$1.620.595,60	R\$1.620.595,60
Pavimentação e Recapeamento de Vias [LIVRE][BP] - Recapeamento - Rua Muniz Falcão	R\$1.999.042,06	R\$1.999.042,06	R\$1.999.042,06	R\$1.999.042,06	R\$1.999.042,06
Pavimentação e Recapeamento de Vias [LIVRE][BP] - Recapeamento - R. Sol da Meia-Noite	R\$1.768.398,22	R\$1.768.398,22	R\$1.768.398,22	R\$1.768.398,22	R\$1.768.398,22
Pavimentação e Recapeamento de Vias [LIVRE][BP] - Recapeamento - Tv. Tristeza do Jeca	R\$113.312,25	R\$113.312,25	R\$113.312,25	R\$17.929,71	R\$17.929,71
Pavimentação e Recapeamento de Vias [LIVRE][BP] - Recapeamento - Tv. Pé de Manaca	R\$118.420,84	R\$65.838,96	R\$65.838,96	R\$15.485,31	R\$15.485,31

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2026

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS (SMSUB)



Pavimentação e Recapeamento de Vias					
Objeto e endereço	Valor aprovado	Valor reservado	Valor empenhado	Valor liquidado	Valor pago
Pavimentação e Recapeamento de Vias [LIVRE][BP] - Recapeamento - R. Estado do Amazonas	R\$1.103.870,68	R\$1.103.870,68	R\$1.103.870,68	R\$1.034.791,14	R\$1.034.791,14
Pavimentação e Recapeamento de Vias [LIVRE][BP] - Recapeamento - R. Pranchas	R\$384.749,52	R\$384.749,52	R\$384.749,52	R\$371.212,10	R\$371.212,10
Pavimentação e Recapeamento de Vias [LIVRE][BP] - Recapeamento - Tv. João Glama	R\$67.605,61	R\$69.319,99	R\$69.319,99	R\$69.319,99	R\$69.319,99
Pavimentação e Recapeamento de Vias [LIVRE][BP] - Recapeamento - Tv. Mário Vitali	R\$330.699,28	R\$330.699,28	R\$330.699,28	R\$310.675,01	R\$310.675,01
Pavimentação e Recapeamento de Vias [LIVRE][BP] - Recapeamento - R. Alves Seixas	R\$363.100,06	R\$363.100,06	R\$363.100,06	R\$331.004,05	R\$331.004,05
Pavimentação e Recapeamento de Vias [LIVRE][BP] - Recapeamento - R. Filipa Álvares	R\$185.550,14	R\$185.550,14	R\$185.550,14	R\$141.853,87	R\$141.853,87
Pavimentação e Recapeamento de Vias [LIVRE][BP] - Recapeamento - R. Nicolino Guilherme Candido	R\$87.786,75	R\$87.786,75	R\$87.786,75	R\$62.688,57	R\$62.688,57
Pavimentação e Recapeamento de Vias [LIVRE][BP] - Recapeamento - R. Adolfo Celi	R\$332.585,09	R\$332.585,09	R\$332.585,09	R\$322.279,28	R\$322.279,28
Pavimentação e Recapeamento de Vias [LIVRE][BP] - Recapeamento - R. José Freire da Silva	R\$103.153,09	R\$103.153,09	R\$103.153,09	R\$86.030,17	R\$86.030,17
Pavimentação e Recapeamento de Vias [LIVRE][BP] - Recapeamento - R. Soldado Antenor da Costa	R\$219.160,67	R\$219.160,67	R\$219.160,67	R\$218.690,37	R\$218.690,37
Pavimentação e Recapeamento de Vias [LIVRE][BP] - Recapeamento - R. Quarenta e Sete (P. Rio Claro)	R\$0,00	R\$50.867,50	R\$50.867,50	R\$40.358,58	R\$40.358,58
Pavimentação e Recapeamento de Vias [LIVRE][BP] - Recapeamento - R. Roberto Romão de Moraes	R\$375.829,63	R\$375.829,63	R\$375.829,63	R\$286.090,56	R\$286.090,56
Pavimentação e Recapeamento de Vias [LIVRE][BP] - Recapeamento - R. Vicente Decara Neto	R\$1.345.100,32	R\$1.345.100,32	R\$1.345.100,32	R\$1.025.373,28	R\$1.025.373,28
Pavimentação e Recapeamento de Vias [MOB][BP] - Recapeamento - R. Camocim de São Félix (Ambos os sentidos)	R\$4.548.781,03	R\$3.623.104,73	R\$3.623.104,73	R\$3.623.104,73	R\$3.623.104,73
Pavimentação e Recapeamento de Vias [MOB][BP] - Recapeamento - Av. Jerimanduba	R\$4.054.007,63	R\$3.200.901,89	R\$3.200.901,89	R\$3.200.901,89	R\$3.200.901,89
Pavimentação e Recapeamento de Vias [MOB][BP] - Recapeamento - R. Maria da Cruz Cunha (Ambos os sentidos)	R\$1.697.808,54	R\$1.340.877,72	R\$1.340.877,72	R\$1.340.877,72	R\$1.340.877,72
Pavimentação e Recapeamento de Vias [MOB][BP] - Recapeamento - R. José Porfírio de Souza	R\$4.788.866,03	R\$4.788.984,91	R\$4.788.984,91	R\$4.541.215,97	R\$4.541.215,97
Pavimentação e Recapeamento de Vias [MOB] - Recapeamento - R. Baumann	R\$7.093.767,75	R\$7.093.552,00	R\$7.093.552,00	R\$6.645.425,16	R\$6.645.425,16
Pavimentação e Recapeamento de Vias [LIVRE] - Recapeamento - R. Irmã Emerenciana	R\$2.338.180,70	R\$2.338.180,70	R\$2.338.180,70	R\$2.038.386,91	R\$2.038.386,91

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2026

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS (SMSUB)



Pavimentação e Recapeamento de Vias					
Objeto e endereço	Valor aprovado	Valor reservado	Valor empenhado	Valor liquidado	Valor pago
Pavimentação e Recapeamento de Vias [LIVRE] - Recapeamento - R. Comendador Armando Pereira	R\$2.595.361,82	R\$2.595.361,82	R\$2.595.361,82	R\$1.533.275,14	R\$1.533.275,14
Pavimentação e Recapeamento de Vias [MOB] - Recapeamento - R. Tuim	R\$2.841.316,01	R\$2.841.316,01	R\$2.841.316,01	R\$1.993.354,68	R\$1.993.354,68
Pavimentação e Recapeamento de Vias [MOB] - Recapeamento - Al. dos Guatás	R\$6.853.645,63	R\$6.853.645,63	R\$6.853.645,63	R\$5.312.914,03	R\$5.312.914,03
Pavimentação e Recapeamento de Vias [LIVRE] - Recapeamento - Av. João Paulo da Silva	R\$4.380.866,85	R\$4.380.815,60	R\$4.380.815,60	R\$3.969.665,32	R\$3.969.665,32
Pavimentação e Recapeamento de Vias [MOB][BP] - Recapeamento - R. Prof. Leitão da Cunha	R\$7.528.887,07	R\$7.244.975,21	R\$7.244.975,21	R\$7.244.975,21	R\$7.244.975,21
Pavimentação e Recapeamento de Vias [MOB] - Recapeamento - Av. Jorge Amado	R\$2.914.835,17	R\$2.743.257,88	R\$2.743.257,88	R\$2.583.186,05	R\$2.583.186,05
Pavimentação e Recapeamento de Vias [MOB] - Recapeamento - Av. Waldemar Carlos Pereira	R\$5.815.072,18	R\$5.815.119,16	R\$5.815.119,16	R\$5.600.594,32	R\$5.600.594,32
Pavimentação e Recapeamento de Vias [MOB] - Recapeamento - Av. Deputado Doutor Jose Aristodemo Pinotti - Trecho I	R\$5.432.862,07	R\$5.115.006,37	R\$5.115.006,37	R\$3.945.483,03	R\$3.945.483,03
Pavimentação e Recapeamento de Vias [MOB][BP] - Recapeamento - Av. João Batista Santiago	R\$6.701.991,37	R\$9.379.314,70	R\$9.379.314,70	R\$8.373.412,03	R\$8.373.412,03
Pavimentação e Recapeamento de Vias [LIVRE] - Recapeamento - Rua Heráclito Graça	R\$415.894,73	R\$415.894,73	R\$415.894,73	R\$349.935,62	R\$349.935,62
Pavimentação e Recapeamento de Vias [LIVRE] - Recapeamento - Rua Espírita	R\$510.515,71	R\$510.515,71	R\$510.515,71	R\$228.057,57	R\$228.057,57
Pavimentação e Recapeamento de Vias [LIVRE] - Recapeamento - Rua Mituto Mizumoto	R\$368.896,06	R\$368.896,06	R\$368.896,06	R\$236.531,33	R\$236.531,33
Pavimentação e Recapeamento de Vias [LIVRE][BP] - Recapeamento - Rua Guimarães Passos	R\$2.739.921,81	R\$2.739.921,81	R\$2.739.921,81	R\$2.641.821,22	R\$2.641.821,22
Pavimentação e Recapeamento de Vias [LIVRE] - Recapeamento - Rua Batista Caetano	R\$494.236,54	R\$494.236,54	R\$494.236,54	R\$494.236,54	R\$494.236,54
Pavimentação e Recapeamento de Vias [MOB][BP] - Recapeamento - Av. Pavão (Recanto Paraíso)	R\$2.662.093,02	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Pavimentação e Recapeamento de Vias [MOB][BP] - Recapeamento - R. Eduardo Grusius	R\$3.119.514,77	R\$3.119.514,77	R\$3.119.514,77	R\$0,00	R\$0,00
Pavimentação e Recapeamento de Vias [MOB][BP] - Recapeamento - R. Talha-mar	R\$1.095.142,04	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Pavimentação e Recapeamento de Vias [MOB][BP] - Recapeamento - R. Dr. Diogo Canteras Garcia	R\$585.041,99	R\$587.531,25	R\$587.531,25	R\$0,00	R\$0,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2026

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS (SMSUB)



Pavimentação e Recapeamento de Vias					
Objeto e endereço	Valor aprovado	Valor reservado	Valor empenhado	Valor liquidado	Valor pago
Pavimentação e Recapeamento de Vias [MOB][BP] - Recapeamento - R. Ushikichi Kamiya	R\$9.035.298,82	R\$9.035.298,82	R\$9.035.298,82	R\$0,00	R\$0,00
Pavimentação e Recapeamento de Vias [MOB] - Recapeamento - R. Reverendo Jorge Bertolaso Stella	R\$3.447.735,83	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Pavimentação e Recapeamento de Vias [MOB][BP] - Recapeamento - Av. Deputado Doutor Jose Aristodemo Pinotti - Trecho II (Incluí Pista Lateral)	R\$9.263.490,33	R\$9.263.490,33	R\$9.263.490,33	R\$0,00	R\$0,00
Pavimentação e Recapeamento de Vias [MOB] - Recapeamento - Al. dos Tupiniquins	R\$1.169.716,77	R\$4.038.685,01	R\$4.038.685,01	R\$0,00	R\$0,00
Pavimentação e Recapeamento de Vias [MOB][BP] - Recapeamento - Av. Senador Vitorino Freire	R\$3.743.606,27	R\$3.743.606,27	R\$3.743.606,27	R\$0,00	R\$0,00
Pavimentação e Recapeamento de Vias [MOB][BP] - Recapeamento - R. Alice dos Santos Peixe	R\$3.367.390,07	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Pavimentação e Recapeamento de Vias [MOB][BP] - Recapeamento - Av. Fulfaro	R\$2.510.970,09	R\$2.510.970,09	R\$2.510.970,09	R\$0,00	R\$0,00
Pavimentação e Recapeamento de Vias [MOB] - Recapeamento - R. Quirino dos Santos	R\$0,00	R\$2.059.211,65	R\$2.059.211,65	R\$32.861,18	R\$32.861,18
Pavimentação e Recapeamento de Vias [MOB] - Recapeamento - R. Agamenon Magalhães	R\$0,00	R\$3.192.633,78	R\$3.192.633,78	R\$0,00	R\$0,00
Pavimentação e Recapeamento de Vias [MOB] - Recapeamento - R. Alfonso Renaldo Gallucci	R\$0,00	R\$1.084.408,46	R\$1.084.408,46	R\$0,00	R\$0,00
Pavimentação e Recapeamento de Vias [MOB][BP] - Recapeamento - R. Antônio José Bentes	R\$0,00	R\$2.386.853,07	R\$2.386.853,07	R\$0,00	R\$0,00
Pavimentação e Recapeamento de Vias [MOB][BP] - Recapeamento - Av. Fulfaro	R\$417.132,25	R\$417.132,25	R\$417.132,25	R\$0,00	R\$0,00
Pavimentação e Recapeamento de Vias [MOB][BP] - Recapeamento - Rua Dr. Carlos de Rezende Enout	R\$2.355.670,38	R\$2.463.832,67	R\$2.463.832,67	R\$0,00	R\$0,00
Pavimentação e Recapeamento de Vias [MOB][BP] - Recapeamento - Al. Carlos Marchais	R\$3.222.713,55	R\$3.222.713,55	R\$3.222.713,55	R\$0,00	R\$0,00
Pavimentação e Recapeamento de Vias [MOB] - Recapeamento - R. Lisa Ansorge	R\$1.987.124,91	R\$1.987.651,67	R\$1.987.651,67	R\$0,00	R\$0,00
Pavimentação e Recapeamento de Vias [MOB][BP] - Recapeamento - R. Paulo Osório Flores	R\$2.017.358,91	R\$2.017.358,91	R\$2.017.358,91	R\$0,00	R\$0,00

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPEAMENTO)

[MOB] - Av. Dracena	
Subprefeitura	Lapa
Valor empenhado	R\$ 3.681.130,23
Valor liquidado	R\$ 3.476.356,74
Situação	Concluída



ANTES



DEPOIS

[MOB] - R. Pará	
Subprefeitura	Sé
Valor empenhado	R\$ 1.073.661,53
Valor liquidado	R\$ 813.359,62
Situação	Concluída



ANTES



DEPOIS

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPEAMENTO)

[MOB] - Rua Itaquera	
Subprefeitura	Sé
Valor empenhado	R\$ 1.335.957,03
Valor liquidado	R\$ 694.245,29
Situação	Concluída



ANTES



DEPOIS

[MOB] - R. dos Patriotas	
Subprefeitura	Ipiranga
Valor empenhado	R\$ 4.194.133,74
Valor liquidado	R\$ 1.583.288,02
Situação	Concluída



ANTES



DEPOIS

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPEAMENTO)

[MOB] - R. Elisa Silveira – Trecho II	
Subprefeitura	Vila Mariana
Valor empenhado	R\$ 457.808,28
Valor liquidado	R\$ 337.272,61
Situação	Concluída



ANTES




DEPOIS

[MOB] - R. Padre Senepa	
Subprefeitura	Ipiranga
Valor empenhado	R\$ 420.922,65
Valor liquidado	R\$ 261.258,03
Situação	Concluída



ANTES

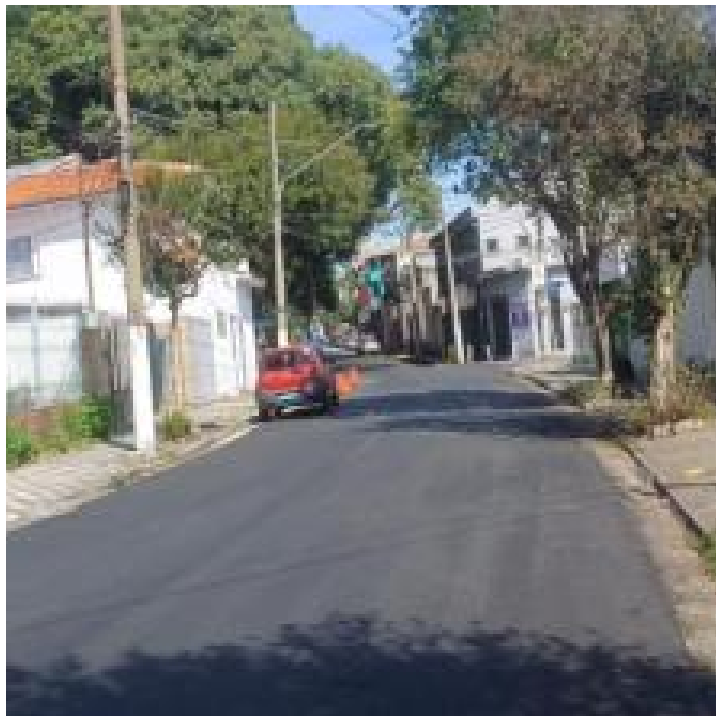

DEPOIS

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPEAMENTO)

[MOB] - R. Eng. Ranulfo Pinheiro Lima	
Subprefeitura	Ipiranga
Valor empenhado	R\$ 1.013.366,80
Valor liquidado	R\$ 776.884,84
Situação	Concluída



ANTES



DEPOIS

[MOB] - Av. João de Barros	
Subprefeitura	Capela do Socorro
Valor empenhado	R\$ 332.9764,80
Valor liquidado	R\$ 314.9864,23
Situação	Concluída



ANTES



DEPOIS

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPEAMENTO)

[MOB] - R. Baumann	
Subprefeitura	Lapa
Valor empenhado	R\$ 7.093.552,00
Valor liquidado	R\$ 6.645.425,16
Situação	Concluída



ANTES



DEPOIS

[MOB] - R. Tuim	
Subprefeitura	Vila Mariana
Valor empenhado	R\$ 2.841.316,01
Valor liquidado	R\$ 1.993.354,68
Situação	Concluída




ANTES



DEPOIS

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPEAMENTO)

[MOB] - Al. dos Guatás	
Subprefeitura	Vila Mariana
Valor empenhado	R\$ 6.853.645,63
Valor liquidado	R\$ 5.312.914,03
Situação	Concluída

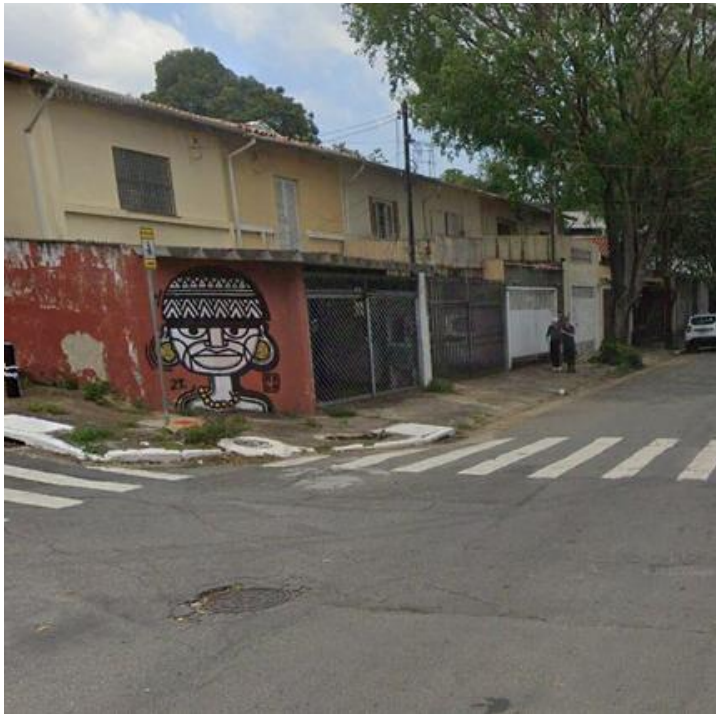

ANTES




DEPOIS

[MOB] - Av. Jorge Amado	
Subprefeitura	Campo Limpo
Valor empenhado	R\$ 2.743.257,88
Valor liquidado	R\$ 2.583.186,05
Situação	Concluída



ANTES

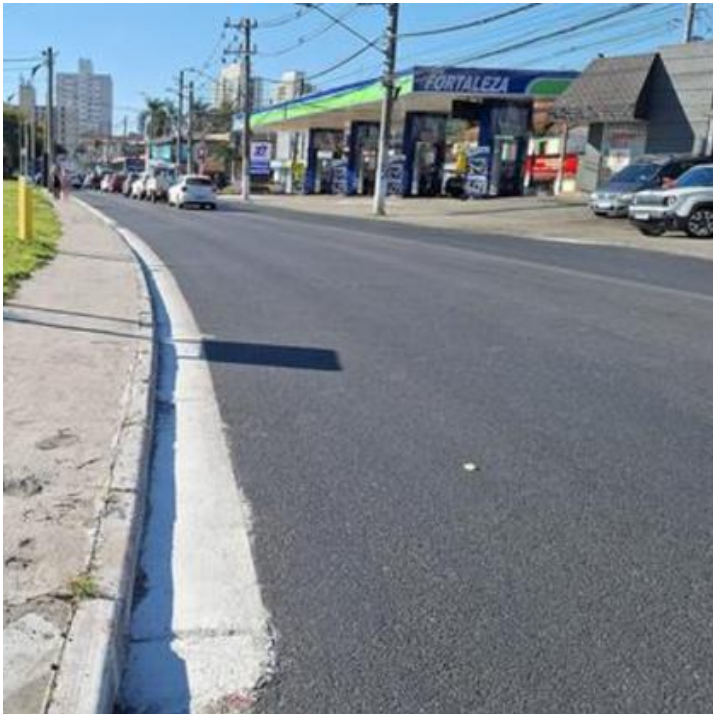

DEPOIS

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPEAMENTO)

[MOB] - Av. Waldemar Carlos Pereira	
Subprefeitura	Penha
Valor empenhado	R\$ 5.815.119,16
Valor liquidado	R\$ 5.600.594,32
Situação	Concluída



ANTES



DEPOIS

[MOB] - Av. Deputado Doutor Jose Aristodemo Pinotti - Trecho I	
Subprefeitura	Itaim Paulista
Valor empenhado	R\$ 5.115.006,37
Valor liquidado	R\$ 3.945.483,03
Situação	Concluída



ANTES



DEPOIS

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPEAMENTO)

[MOB] - R. Reverendo Jorge Bertolaso Stella	
Subprefeitura	Butantã
Valor empenhado	R\$ 0,00
Valor liquidado	R\$ 0,00
Situação	Não contratada



ANTES

[MOB] - Al. dos Tupiniquins	
Subprefeitura	Vila Mariana
Valor empenhado	R\$ 4.038.685,01
Valor liquidado	R\$ 0,00
Situação	Em execução



ANTES



DEPOIS

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPEAMENTO)

[MOB] - R. Quirino dos Santos	
Subprefeitura	Lapa
Valor empenhado	R\$ 2.059.211,65
Valor liquidado	R\$ 32.861,18
Situação	Concluída



ANTES



DEPOIS


[MOB] - R. Agamenon Magalhães	
Subprefeitura	Lapa
Valor empenhado	R\$ 3.192.633,78
Valor liquidado	R\$ 0,00
Situação	A iniciar



ANTES

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPEAMENTO)

[MOB] - R. Alfonso Renaldo Gallucci	
Subprefeitura	Casa Verde
Valor empenhado	R\$ 1.084.408,46
Valor liquidado	R\$ 0,00
Situação	Concluída

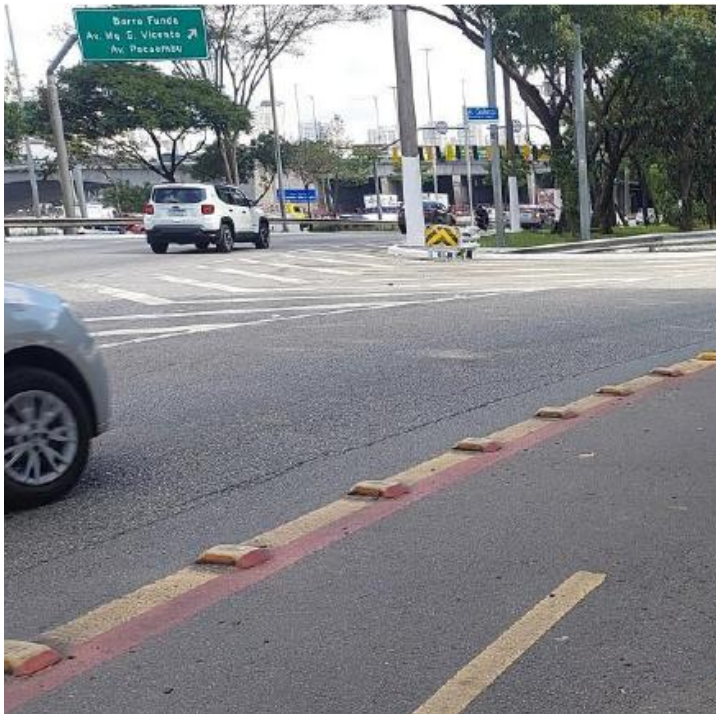

ANTES



DEPOIS

[MOB] - R. Lisa Ansorge	
Subprefeitura	Vila Prudente
Valor empenhado	R\$ 1.987.651,67
Valor liquidado	R\$ 0,00
Situação	Em execução



ANTES



DEPOIS

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPEAMENTO)

[MOB][BP] - Av. General Asdrúbal da Cunha	
Subprefeitura	Butantã
Valor empenhado	R\$ 8.717.427,60
Valor liquidado	R\$ 8.411.753,18
Situação	Concluída



ANTES



DEPOIS

[MOB][BP] - R. Encruzilhada do Sul	
Subprefeitura	Freguesia/ Brasilândia
Valor empenhado	R\$ 3.694.793,20
Valor liquidado	R\$ 3.590.618,42
Situação	Concluída



ANTES



DEPOIS

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPEAMENTO)

[MOB][BP] - R. Firminópolis	
Subprefeitura	Freguesia/ Brasilândia
Valor empenhado	R\$ 4.546.861,09
Valor liquidado	R\$ 4.425.773,76
Situação	Concluída



ANTES



DEPOIS

[MOB][BP] - R. Ibiraiaras	
Subprefeitura	Freguesia/ Brasilândia
Valor empenhado	R\$ 3.040.093,47
Valor liquidado	R\$ 2.946.162,95
Situação	Concluída



ANTES



DEPOIS

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPEAMENTO)

[MOB][BP] - R. Manuel Vieira da Luz	
Subprefeitura	Jaçanã/ Tremembé
Valor empenhado	R\$ 4.611.336,76
Valor liquidado	R\$ 3.898.400,61
Situação	Concluída




ANTES



DEPOIS

[MOB][BP] - R. dos Filhos da Terra	
Subprefeitura	Jaçanã/ Tremembé
Valor empenhado	R\$ 3.412.118,93
Valor liquidado	R\$ 2.2634.78,69
Situação	Concluída

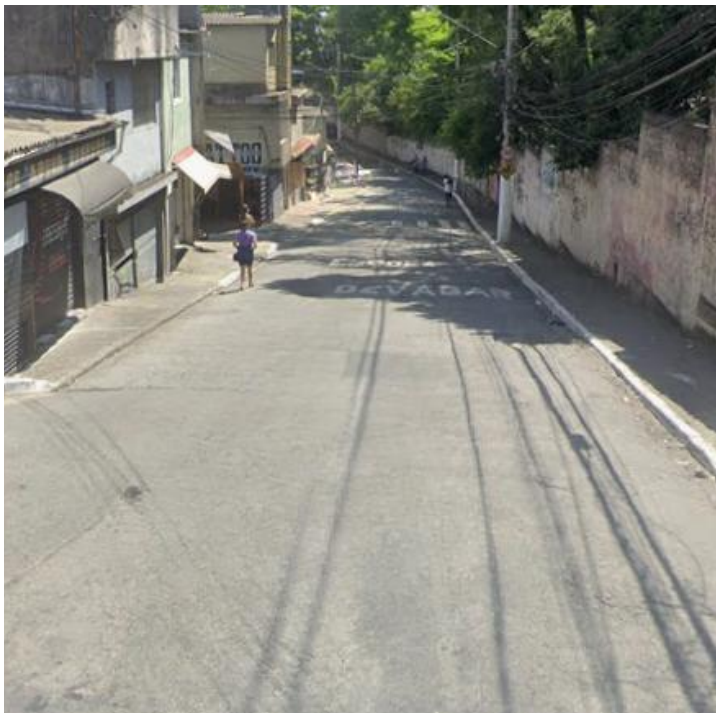

ANTES



DEPOIS

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPEAMENTO)

[MOB][BP] - R. Cap. Rubens (trecho I)	
Subprefeitura	Jaçanã/ Tremembé
Valor empenhado	R\$ 1.847.096,07
Valor liquidado	R\$ 1.634.100,23
Situação	Concluída



ANTES




DEPOIS

[LIVRE][BP] - R. Prof. Enéas de Siqueira Neto	
Subprefeitura	Capela do Socorro
Valor empenhado	R\$ 4.152.773,41
Valor liquidado	R\$ 4.008.023,85
Situação	Concluída



ANTES

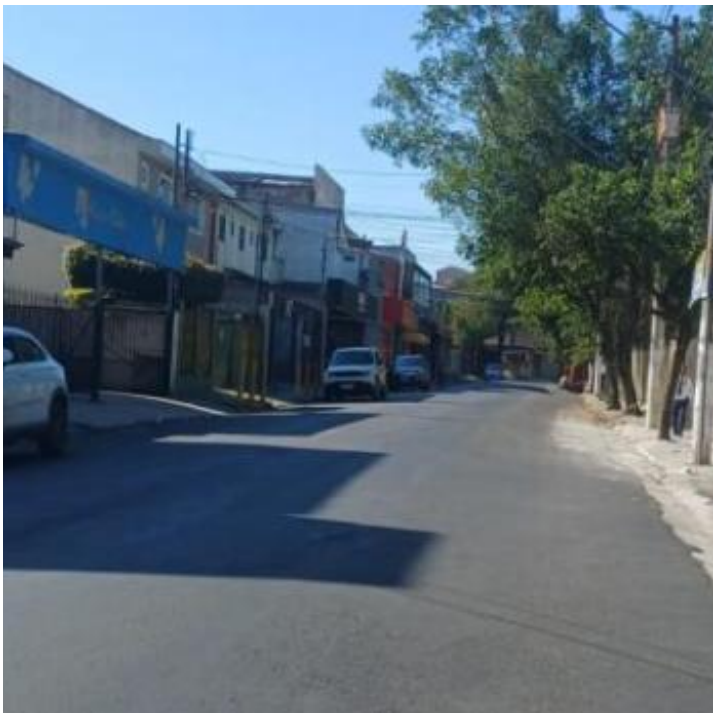

DEPOIS

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPEAMENTO)

[MOB][BP] - Av. das Belezas	
Subprefeitura	Campo Limpo
Valor empenhado	R\$ 1.899.366,77
Valor liquidado	R\$ 1.891.315,77
Situação	Concluída



ANTES



DEPOIS

[MOB][BP] - Av. Caporanga	
Subprefeitura	M'Boi Mirim
Valor empenhado	R\$ 4.197.344,05
Valor liquidado	R\$ 4.197.344,05
Situação	Concluída



ANTES



DEPOIS

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPEAMENTO)

[MOB][BP] - R. Pietro Marsolo	
Subprefeitura	Parelheiros
Valor empenhado	R\$ 1.263.667,90
Valor liquidado	R\$ 63.038,53
Situação	Concluída



ANTES



DEPOIS

[MOB][BP] - Av. Esperantina (Inclui Rotatória)	
Subprefeitura	Penha
Valor empenhado	R\$ 3.942.940,86
Valor liquidado	R\$ 3.884.076,78
Situação	Concluída




ANTES



DEPOIS

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPEAMENTO)

[MOB][BP] - Av. Oliveira Freire	
Subprefeitura	São Miguel Paulista
Valor empenhado	R\$ 4.514.027,15
Valor liquidado	R\$ 3.879.010,91
Situação	Concluída

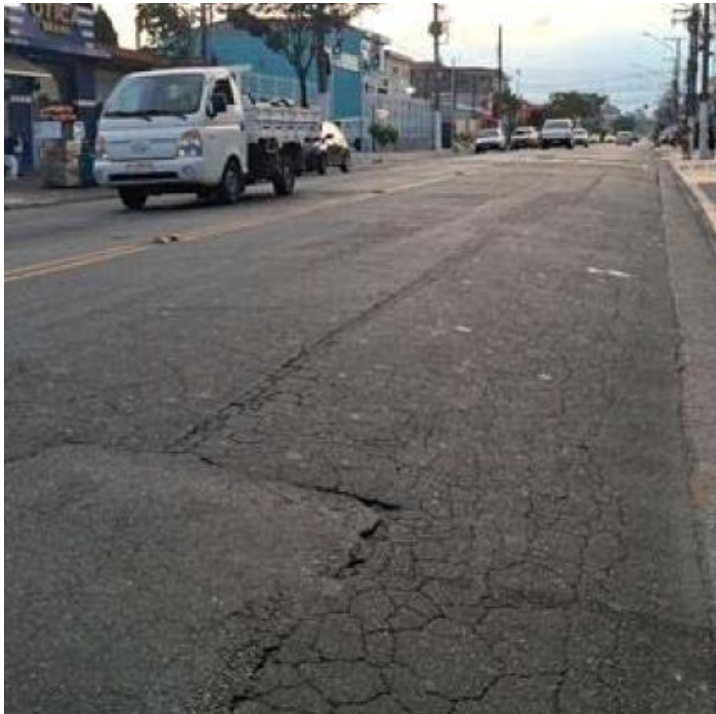

ANTES



DEPOIS

[MOB][BP] - Av. Teodoro Bernardo do Nascimento	
Subprefeitura	Itaim Paulista
Valor empenhado	R\$ 8.050.860,70
Valor liquidado	R\$ 7.201.379,49
Situação	Concluída



ANTES



DEPOIS

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPEAMENTO)

[MOB][BP] - R. José Pessota - Trecho II	
Subprefeitura	Itaim Paulista
Valor empenhado	R\$ 3.261.798,87
Valor liquidado	R\$ 3.058.497,50
Situação	Concluída



ANTES



DEPOIS

[MOB][BP] - R. Estrela Guia	
Subprefeitura	Sapopemba
Valor empenhado	R\$ 103.690,02
Valor liquidado	R\$ 98.992,21
Situação	Concluída



ANTES



DEPOIS

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPEAMENTO)

[MOB][BP] - Tv. Paracelsus	
Subprefeitura	Sapopemba
Valor empenhado	R\$ 1.016.354,16
Valor liquidado	R\$ 847.184,62
Situação	Concluída



ANTES



DEPOIS

[MOB][BP] - R. Sinfonias do Ocaso	
Subprefeitura	Sapopemba
Valor empenhado	R\$ 1.563.378,01
Valor liquidado	R\$ 1.470.253,22
Situação	Concluída



ANTES



DEPOIS

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPEAMENTO)

[MOB][BP] - R. Antônio Sarzedas	
Subprefeitura	Sapopemba
Valor empenhado	R\$ 683.423,23
Valor liquidado	R\$ 561.792,50
Situação	Concluída



ANTES



DEPOIS

[MOB][BP] - Av. Primavera de Caiena	
Subprefeitura	Sapopemba
Valor empenhado	R\$ 3.524.804,72
Valor liquidado	R\$ 3.165.680,96
Situação	Concluída



ANTES



DEPOIS

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPEAMENTO)

[MOB][BP] - R. Milton da Cruz	
Subprefeitura	Sapopemba
Valor empenhado	R\$ 1.982.240,00
Valor liquidado	R\$ 1.664.743,45
Situação	Concluída



ANTES



DEPOIS

[MOB][BP] - R. Boleadeiras	
Subprefeitura	Sapopemba
Valor empenhado	R\$ 1.084.371,49
Valor liquidado	R\$ 942.001,64
Situação	Concluída



ANTES



DEPOIS

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPEAMENTO)

[MOB][BP] - R. José Francisco Brandão	
Subprefeitura	Cidade Tiradentes
Valor empenhado	R\$ 2.905.422,80
Valor liquidado	R\$ 2.722.446,55
Situação	Concluída



ANTES



DEPOIS

[MOB][BP] - R. Douradoquara	
Subprefeitura	São Mateus
Valor empenhado	R\$ 1.205.586,95
Valor liquidado	R\$ 1.083.302,30
Situação	Concluída



ANTES



DEPOIS

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPEAMENTO)

[MOB][BP] - R. Cachoeira do Campo (inclui contorno da Pça. Catas Altas)

Subprefeitura	São Mateus
Valor empenhado	R\$ 2.096.067,95
Valor liquidado	R\$ 1.941.828,81
Situação	Concluída



ANTES



DEPOIS

[MOB][BP] - R. Taiobeiras

Subprefeitura	São Mateus
Valor empenhado	R\$ 716.714,32
Valor liquidado	R\$ 624.523,61
Situação	Concluída



ANTES



DEPOIS

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPEAMENTO)

[MOB][BP] - R. Padre Nildo do Amaral Jr.	
Subprefeitura	Guaianases
Valor empenhado	R\$ 3.884.030,14
Valor liquidado	R\$ 2.773.988,21
Situação	Concluída



ANTES



DEPOIS

[MOB][BP] - R. Camocim de São Félix (Ambos os sentidos)	
Subprefeitura	Pirituba/ Jaraguá
Valor empenhado	R\$ 3.623.104,73
Valor liquidado	R\$ 3.623.104,73
Situação	Concluída




ANTES



DEPOIS

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPEAMENTO)

[MOB][BP] - Av. Jerimanduba	
Subprefeitura	Pirituba/ Jaraguá
Valor empenhado	R\$ 3.200.901,89
Valor liquidado	R\$ 3.200.901,89
Situação	Concluída

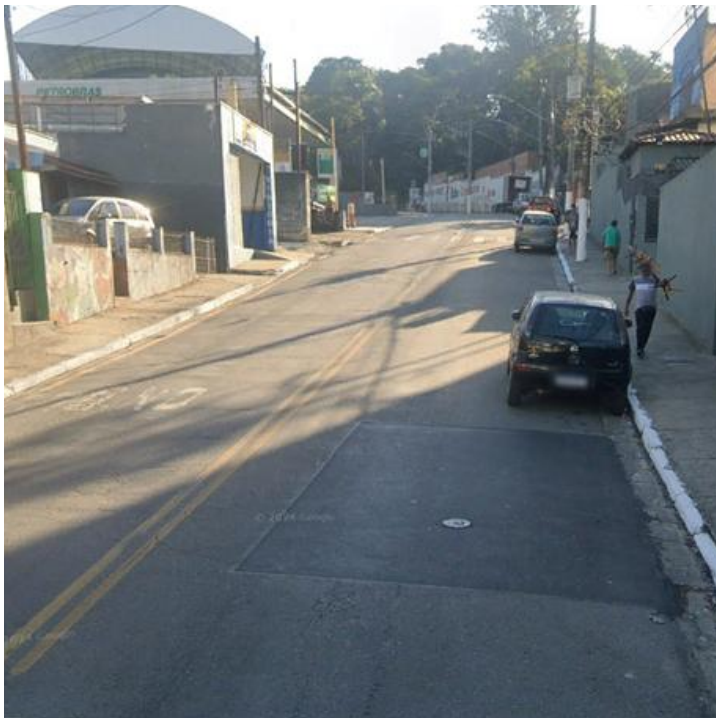

ANTES



DEPOIS

[MOB][BP] - R. Maria da Cruz Cunha (Ambos os sentidos)	
Subprefeitura	Pirituba/ Jaraguá
Valor empenhado	R\$ 1.340.877,72
Valor liquidado	R\$ 1.340.877,72
Situação	Concluída



ANTES



DEPOIS

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPEAMENTO)

[MOB][BP] - R. José Porfírio de Souza	
Subprefeitura	Butantã
Valor empenhado	R\$ 4.788.984,91
Valor liquidado	R\$ 4.541.215,97
Situação	Concluída



ANTES



DEPOIS

[MOB][BP] - R. Prof. Leitão da Cunha	
Subprefeitura	Campo Limpo
Valor empenhado	R\$ 7.244.975,21
Valor liquidado	R\$ 7.244.975,21
Situação	Concluída



ANTES



DEPOIS

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPEAMENTO)

[MOB][BP] - Av. João Batista Santiago	
Subprefeitura	Itaim Paulista
Valor empenhado	R\$ 9.379.314,70
Valor liquidado	R\$ 8.373.412,03
Situação	Concluída



ANTES



DEPOIS

[MOB][BP] - Av. Pavão (Recanto Paraíso)	
Subprefeitura	Perus
Valor empenhado	R\$ 0,00
Valor liquidado	R\$ 0,00
Situação	Em outro recurso



ANTES



DEPOIS

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPEAMENTO)

[MOB][BP] - R. Eduardo Grusius	
Subprefeitura	Perus
Valor empenhado	R\$ 3.119.514,77
Valor liquidado	R\$ 0,00
Situação	Em execução



ANTES


[MOB][BP] - R. Talha-mar	
Subprefeitura	Freguesia/ Brasilândia
Valor empenhado	R\$ 0,00
Valor liquidado	R\$ 0,00
Situação	Não contratada



ANTES

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPEAMENTO)

[MOB][BP] - R. Dr. Diogo Canteras Garcia	
Subprefeitura	Freguesia/ Brasilândia
Valor empenhado	R\$ 587.531,25
Valor liquidado	R\$ 0,00
Situação	Em execução

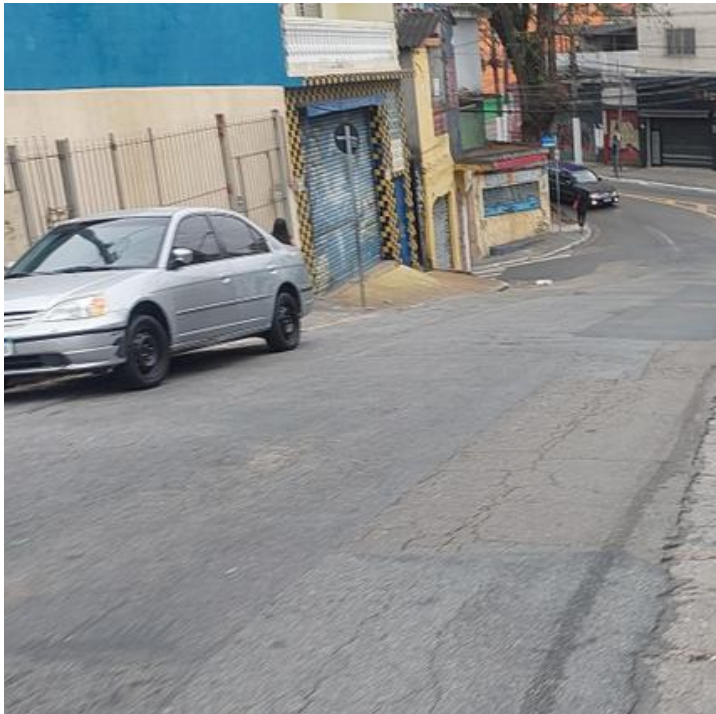

ANTES

[MOB][BP] - R. Ushikichi Kamiya	
Subprefeitura	Freguesia/ Brasilândia
Valor empenhado	R\$ 9.035.298,82
Valor liquidado	R\$ 0,00
Situação	Em execução



ANTES

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPEAMENTO)

[MOB][BP] - Av. Deputado Doutor Jose Aristodemo Pinotti - Trecho II (Incluí Pista Lateral)	
Subprefeitura	São Miguel Paulista
Valor empenhado	R\$ 9.263.490,33
Valor liquidado	R\$ 0,00
Situação	Em execução



ANTES



EM EXECUÇÃO


[MOB][BP] - Av. Senador Vitorino Freire	
Subprefeitura	Cidade Ademar
Valor empenhado	R\$ 3.743.606,27
Valor liquidado	R\$ 0,00
Situação	Em execução



ANTES

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPEAMENTO)

[MOB][BP] - Av. Fulfaro	
Subprefeitura	Cidade Ademar
Valor empenhado	R\$ 2.928.102,34
Valor liquidado	R\$ 0,00
Situação	Em execução

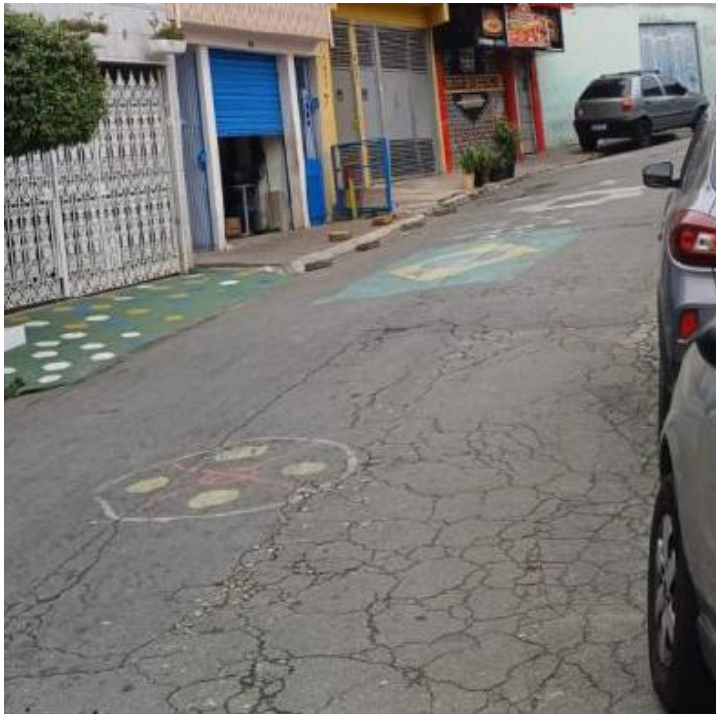

ANTES

[MOB][BP] - R. Antônio José Bentes	
Subprefeitura	Campo Limpo
Valor empenhado	R\$ 2.386.853,07
Valor liquidado	R\$ 0,00
Situação	Em execução




ANTES



EM EXECUÇÃO

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPEAMENTO)

[MOB][BP] - Rua Dr. Carlos de Rezende Enout	
Subprefeitura	Cidade Ademar
Valor empenhado	R\$ 2.463.832,67
Valor liquidado	R\$ 0,00
Situação	Em execução

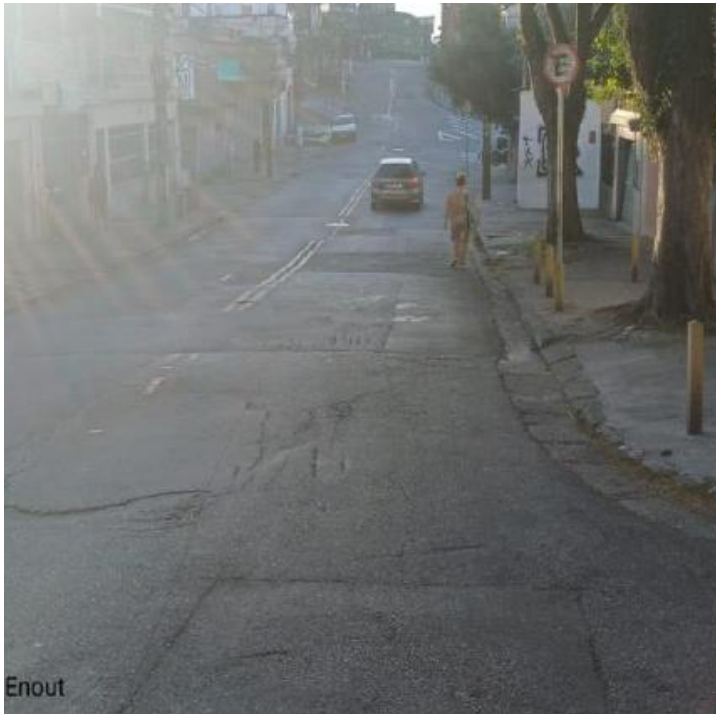

ANTES



EM EXECUÇÃO

[MOB][BP] - Al. Carlos Marchais	
Subprefeitura	M'Boi Mirim
Valor empenhado	R\$ 3.222.713,55
Valor liquidado	R\$ 0,00
Situação	Em execução



ANTES

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPEAMENTO)

[MOB][BP] - R. Paulo Osório Flores	
Subprefeitura	Guaianases
Valor empenhado	R\$ 2.017.358,91
Valor liquidado	R\$ 0,00
Situação	Em execução



ANTES



EM EXECUÇÃO

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPEAMENTO)

[LIVRE] - R. Irmã Emerenciana	
Subprefeitura	Jaçanã/ Tremembé
Valor empenhado	R\$ 2.338.180,70
Valor liquidado	R\$ 2.038.386,91
Situação	Em execução



ANTES



DEPOIS

[MOB][BP] - R. Comendador Armando Pereira	
Subprefeitura	Jaçanã/ Tremembé
Valor empenhado	R\$ 2.595.361,82
Valor liquidado	R\$ 1.533.275,14
Situação	Concluída



ANTES




DEPOIS

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPEAMENTO)

[LIVRE] - Av. João Paulo da Silva	
Subprefeitura	Capela do Socorro
Valor empenhado	R\$ 4.380.815,60
Valor liquidado	R\$ 3.969.665,32
Situação	Concluída



ANTES

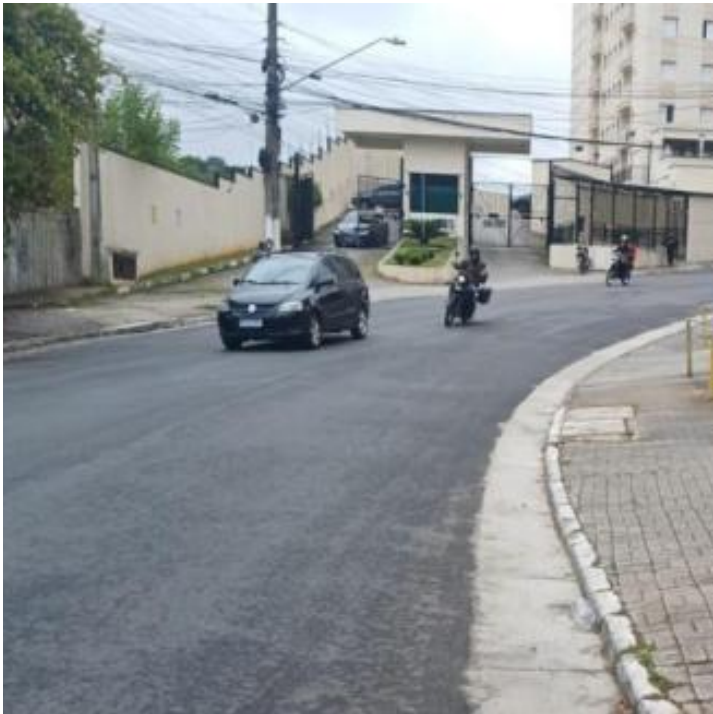

DEPOIS

[MOB][BP] - Rua Heráclito Graça	
Subprefeitura	Casa Verde
Valor empenhado	R\$ 415.894,73
Valor liquidado	R\$ 349.935,62
Situação	Concluída



ANTES



DEPOIS

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPEAMENTO)

[LIVRE] - Rua Espírita	
Subprefeitura	Sé
Valor empenhado	R\$ 510.515,71
Valor liquidado	R\$ 228.057,57
Situação	Concluído



ANTES



DEPOIS

[LIVRE] - Rua Mituto Mizumoto	
Subprefeitura	Sé
Valor empenhado	R\$ 368.896,06
Valor liquidado	R\$ 236.531,33
Situação	Concluído



ANTES



DEPOIS

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPEAMENTO)

[LIVRE] - Rua Batista Caetano	
Subprefeitura	Sé
Valor empenhado	R\$ 494.236,54
Valor liquidado	R\$ 494.236,54
Situação	Concluído



ANTES



DEPOIS

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPEAMENTO)

[LIVRE][BP] - R. Rei Alberto	
Subprefeitura	Jaçanã/ Tremembé
Valor empenhado	R\$ 3.451.535,15
Valor liquidado	R\$ 2.972.198,82
Situação	Concluído




ANTES



DEPOIS

[LIVRE][BP] - Av. Mario Pernambuco	
Subprefeitura	Jaçanã/ Tremembé
Valor empenhado	R\$ 2.643.365,09
Valor liquidado	R\$ 2.028.109,85
Situação	Concluído

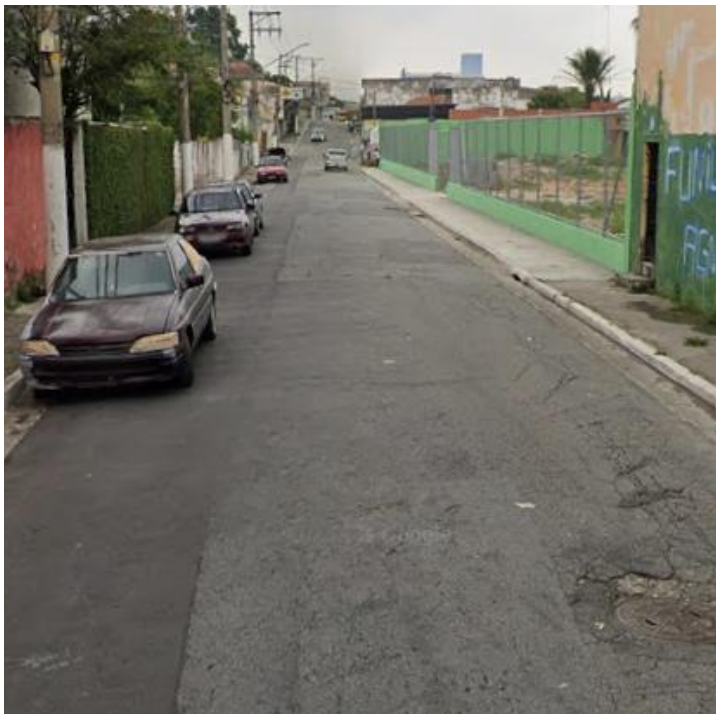

ANTES



DEPOIS

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPEAMENTO)

[LIVRE][BP] - R. Sold. Cândido da Luz Paiva	
Subprefeitura	Sapopemba
Valor empenhado	R\$ 844.009,68
Valor liquidado	R\$ 709.824,53
Situação	Concluído



ANTES



DEPOIS

[LIVRE][BP] - Rua David Pimentel Racy	
Subprefeitura	Campo Limpo
Valor empenhado	R\$ 1.219.786,23
Valor liquidado	R\$ 1.167.884,97
Situação	Concluído



ANTES



DEPOIS

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPEAMENTO)

[LIVRE][BP] - Rua James Ensor	
Subprefeitura	Campo Limpo
Valor empenhado	R\$ 892.685,52
Valor liquidado	R\$ 853.663,08
Situação	Concluído



ANTES



DEPOIS

[LIVRE][BP] - R. Carandazinho	
Subprefeitura	Campo Limpo
Valor empenhado	R\$ 366.338,88
Valor liquidado	R\$ 353.152,32
Situação	Concluído



ANTES



DEPOIS

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPEAMENTO)

[LIVRE][BP] - R. Dankmar Adler	
Subprefeitura	Campo Limpo
Valor empenhado	R\$ 315.646,33
Valor liquidado	R\$ 300.120,57
Situação	Concluído




ANTES



DEPOIS

[LIVRE][BP] - R. Leônidas Busi	
Subprefeitura	Campo Limpo
Valor empenhado	R\$ 254.6627,18
Valor liquidado	R\$ 243.951,06
Situação	Concluído

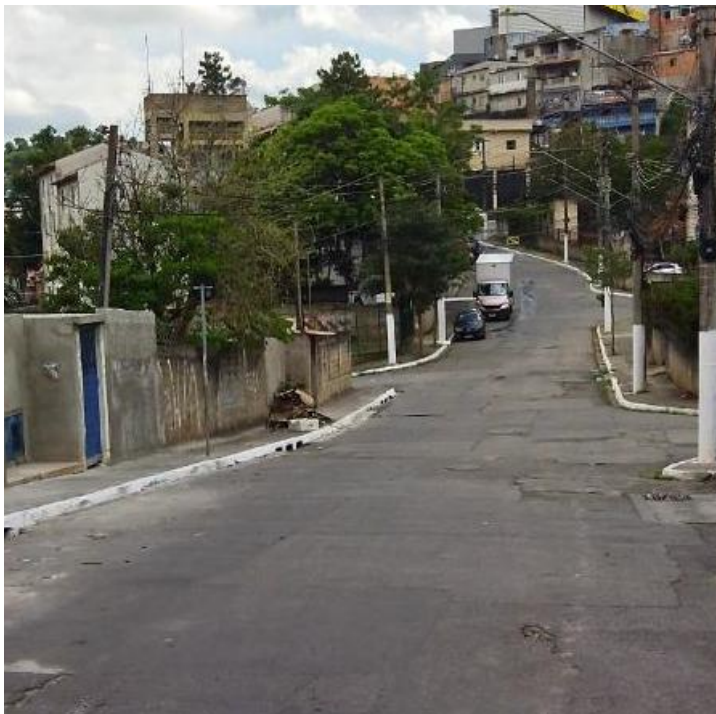


ANTES




DEPOIS

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPEAMENTO)

[LIVRE][BP] - R. Lydia Damus Maksoud	
Subprefeitura	Campo Limpo
Valor empenhado	R\$ 372.437,23
Valor liquidado	R\$ 353.671,10
Situação	Concluído

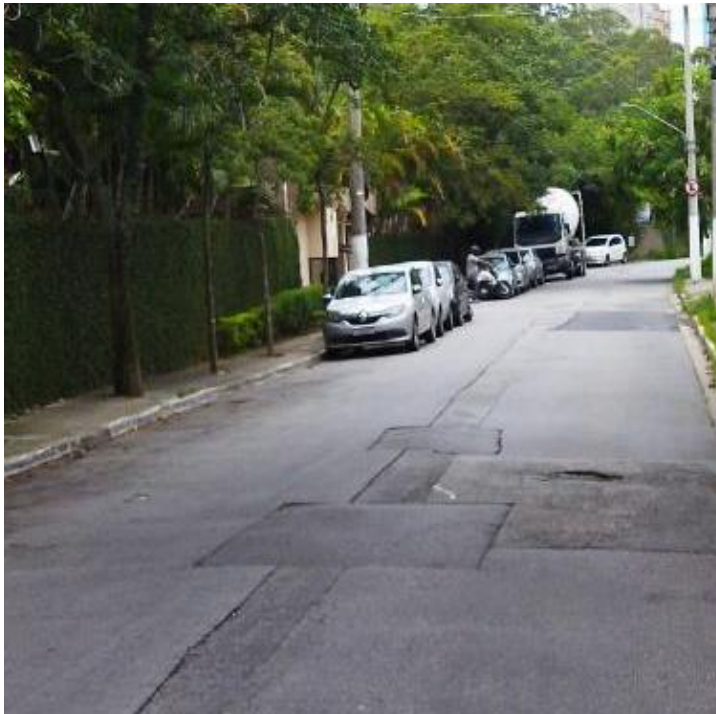

ANTES

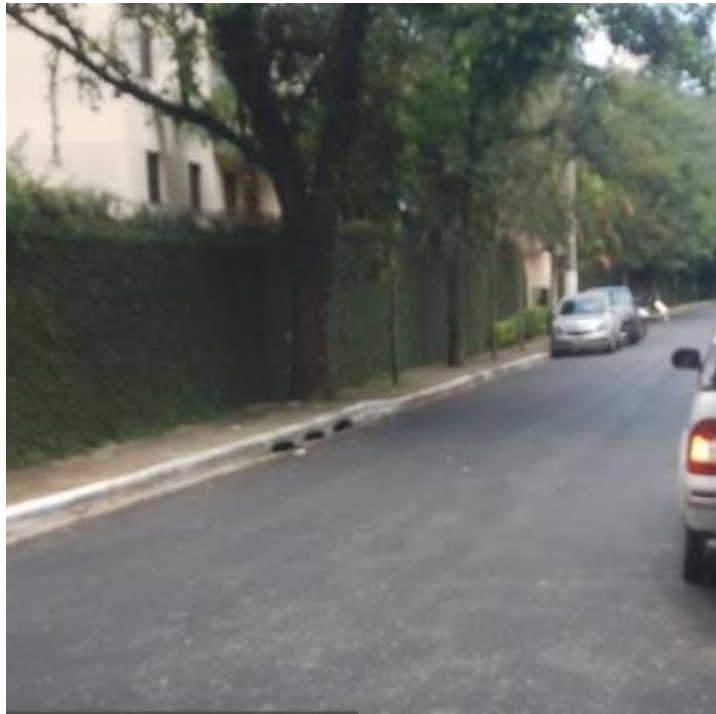

DEPOIS

[LIVRE][BP] - R. Manuel Bicudo	
Subprefeitura	Campo Limpo
Valor empenhado	R\$ 271.411,31
Valor liquidado	R\$ 257.961,53
Situação	Concluído



ANTES



DEPOIS

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2026

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS (SMSUB)

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPEAMENTO)

[LIVRE][BP] - R. Vitoriano de Oliveira	
Subprefeitura	Campo Limpo
Valor empenhado	R\$ 867.501,87
Valor liquidado	R\$ 821.646,57
Situação	Concluído



ANTES



DEPOIS

[LIVRE][BP] - Tv. Alcebiades Maia Barcelos (Tv. Olímpio Teles de Meneses)	
Subprefeitura	Campo Limpo
Valor empenhado	R\$ 310.801,49
Valor liquidado	R\$ 290.923,81
Situação	Concluído



ANTES



DEPOIS

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPEAMENTO)

[LIVRE][BP] - Rua Padre Jacob Roland	
Subprefeitura	Butantã
Valor empenhado	R\$ 203.210,15
Valor liquidado	R\$ 193.223,22
Situação	Concluído



ANTES



DEPOIS

[LIVRE][BP] - Rua Serrana Fluminense - Trecho I	
Subprefeitura	Casa Verde
Valor empenhado	R\$ 341.761,39
Valor liquidado	R\$ 283.124,51
Situação	Concluído



ANTES



DEPOIS

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPEAMENTO)

[LIVRE][BP] - Rua Serrana Fluminense - Trecho II	
Subprefeitura	Casa Verde
Valor empenhado	R\$ 499.767,25
Valor liquidado	R\$ 407.591,94
Situação	Concluído



ANTES



DEPOIS

[LIVRE][BP] - Rua Aprazível	
Subprefeitura	Casa Verde
Valor empenhado	R\$ 624.845,38
Valor liquidado	R\$ 580.716,83
Situação	Concluído



ANTES



DEPOIS

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPEAMENTO)

[LIVRE][BP] - Rua Dom Carlos Gouveia	
Subprefeitura	Casa Verde
Valor empenhado	R\$ 542.152,05
Valor liquidado	R\$ 497.515,71
Situação	Concluído



ANTES



DEPOIS

[LIVRE][BP] - Rua Rido Roque	
Subprefeitura	Casa Verde
Valor empenhado	R\$ 390.195,17
Valor liquidado	R\$ 370.172,65
Situação	Concluído



ANTES



DEPOIS

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPEAMENTO)

[LIVRE][BP] - Rua Alberto do Rego Rangel	
Subprefeitura	Casa Verde
Valor empenhado	R\$ 235.745,29
Valor liquidado	R\$ 216.194,08
Situação	Concluído



ANTES



DEPOIS

[LIVRE][BP] - Rua Francisco Ferreira	
Subprefeitura	Casa Verde
Valor empenhado	R\$ 602.820,01
Valor liquidado	R\$ 567.523,38
Situação	Concluído



ANTES



DEPOIS

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPEAMENTO)

[LIVRE][BP] - Rua Marina Eston	
Subprefeitura	Casa Verde
Valor empenhado	R\$ 632.629,12
Valor liquidado	R\$ 588.527,13
Situação	Concluído



ANTES



DEPOIS

[LIVRE][BP] - Rua Edgar Baizon	
Subprefeitura	Casa Verde
Valor empenhado	R\$ 121.396,08
Valor liquidado	R\$ 110.404,32
Situação	Concluído



ANTES



DEPOIS

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPEAMENTO)

[LIVRE][BP] - Rua Pontalete	
Subprefeitura	Jaçanã/ Tremembé
Valor empenhado	R\$ 7.162,94
Valor liquidado	R\$ 7.162,94
Situação	Concluído



ANTES



DEPOIS

[LIVRE][BP] - Rua Tenente Mário Barbedo	
Subprefeitura	Jaçanã/ Tremembé
Valor empenhado	R\$ 3.284.397,89
Valor liquidado	R\$ 3.284.397,89
Situação	Concluído



ANTES



DEPOIS

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPEAMENTO)

[LIVRE][BP] - Rua Hintem Martins	
Subprefeitura	Jaçanã/ Tremembé
Valor empenhado	R\$ 937.604,54
Valor liquidado	R\$ 937.604,54
Situação	Concluído



ANTES



DEPOIS

[LIVRE][BP] - R. Paulino Arena	
Subprefeitura	Jaçanã/ Tremembé
Valor empenhado	R\$ 388.275,64
Valor liquidado	R\$ 388.275,64
Situação	Concluído



ANTES



DEPOIS

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPEAMENTO)

[LIVRE][BP] - Rua Antônio Francisca de Siqueira	
Subprefeitura	Jaçanã/ Tremembé
Valor empenhado	R\$ 990.368,31
Valor liquidado	R\$ 990.368,31
Situação	Concluído



ANTES



DEPOIS

[LIVRE][BP] - Rua Anthémios de Tralles	
Subprefeitura	Jaçanã/ Tremembé
Valor empenhado	R\$ 709.295,63
Valor liquidado	R\$ 709.295,63
Situação	Concluído



ANTES




DEPOIS

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPEAMENTO)

[LIVRE][BP] - R. Cristóvão Arraes	
Subprefeitura	Jaçanã/ Tremembé
Valor empenhado	R\$ 315.541,91
Valor liquidado	R\$ 315.541,91
Situação	Concluído



ANTES

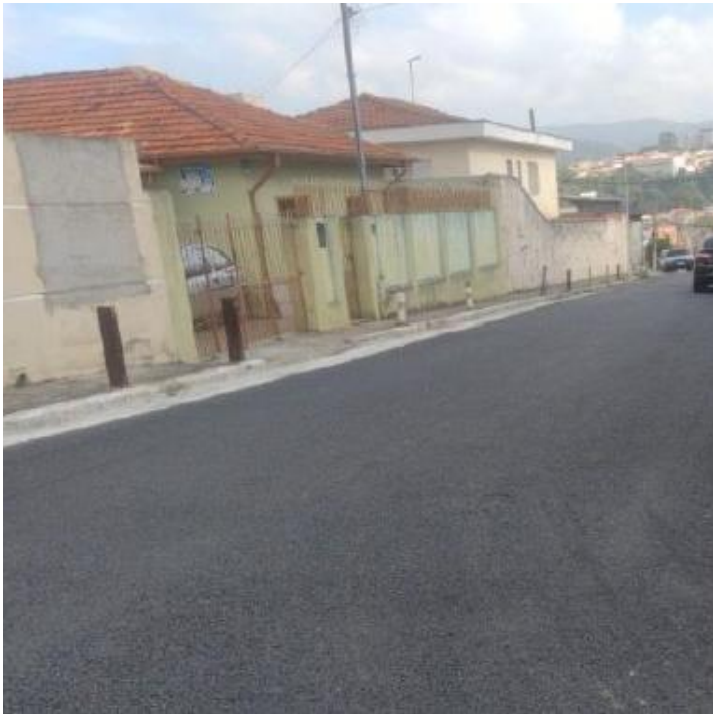

DEPOIS

[LIVRE][BP] - Rua Sabiaúna	
Subprefeitura	Itaim Paulista
Valor empenhado	R\$ 408.654,71
Valor liquidado	R\$ 408.654,71
Situação	Concluído



ANTES



DEPOIS

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPEAMENTO)

[LIVRE][BP] - Rua Laços de Ouro	
Subprefeitura	Itaquera
Valor empenhado	R\$ 618.517,00
Valor liquidado	R\$ 618.517,00
Situação	Concluído



ANTES



DEPOIS

[LIVRE][BP] - Rua Major Gomes Ribeiro	
Subprefeitura	Penha
Valor empenhado	R\$ 371.626,05
Valor liquidado	R\$ 371.626,05
Situação	Concluído



ANTES



DEPOIS

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPEAMENTO)

[LIVRE][BP] - Rua Pedroso da Silva	
Subprefeitura	São Miguel Paulista
Valor empenhado	R\$ 1.620.595,60
Valor liquidado	R\$ 1.620.595,60
Situação	Concluído



ANTES



DEPOIS

[LIVRE][BP] - Rua Muniz Falcão	
Subprefeitura	São Miguel Paulista
Valor empenhado	R\$ 1.999.042,06
Valor liquidado	R\$ 1.999.042,06
Situação	Concluído



ANTES



DEPOIS

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPEAMENTO)

[LIVRE][BP] - R. Sol da Meia-Noite	
Subprefeitura	São Miguel Paulista
Valor empenhado	R\$ 1.768.398,22
Valor liquidado	R\$ 1.768.398,22
Situação	Concluído



ANTES



DEPOIS

[LIVRE][BP] - Tv. Tristeza do Jeca	
Subprefeitura	São Mateus
Valor empenhado	R\$ 113.312,25
Valor liquidado	R\$ 17.929,71
Situação	Concluído



ANTES



DEPOIS

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPEAMENTO)

[LIVRE][BP] - Tv. Pé de Manaca	
Subprefeitura	São Mateus
Valor empenhado	R\$ 65.838,96
Valor liquidado	R\$ 15.485,31
Situação	Concluído




ANTES



DEPOIS

[LIVRE][BP] - Tv. Tristeza do Jeca	
Subprefeitura	São Mateus
Valor empenhado	R\$ 113.312,25
Valor liquidado	R\$ 17.929,71
Situação	Concluído

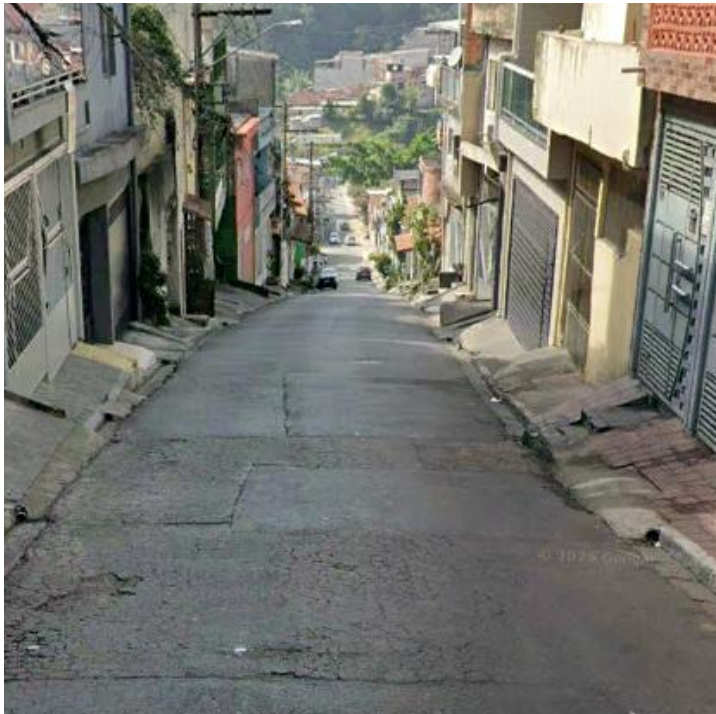

ANTES




DEPOIS

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPEAMENTO)

[LIVRE][BP] - R. Estado do Amazonas	
Subprefeitura	São Mateus
Valor empenhado	R\$ 1.103.870,68
Valor liquidado	R\$ 1.034.791,14
Situação	Concluído



ANTES

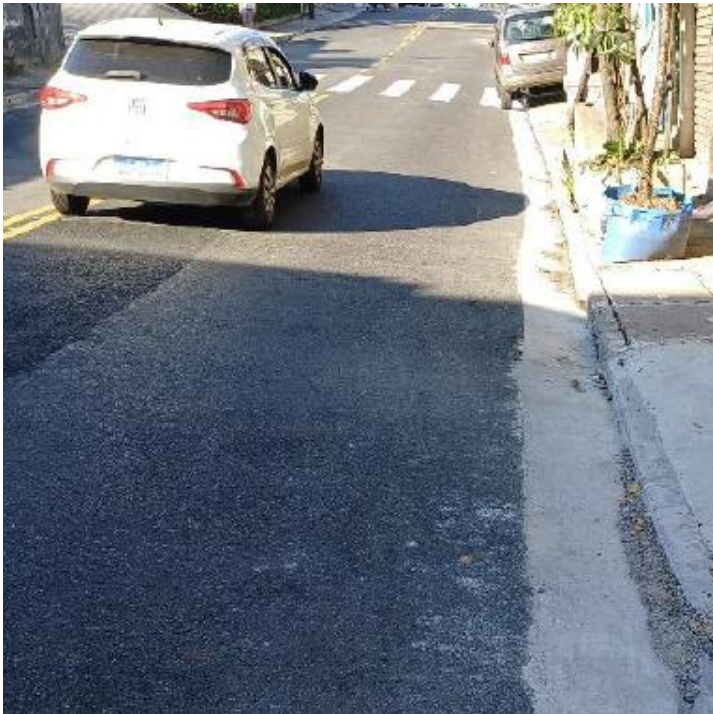

DEPOIS

[LIVRE][BP] - R. Pranchas	
Subprefeitura	São Mateus
Valor empenhado	R\$ 384.749,52
Valor liquidado	R\$ 371.212,10
Situação	Concluído



ANTES



DEPOIS

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPEAMENTO)

[LIVRE][BP] - Tv. João Glama	
Subprefeitura	São Mateus
Valor empenhado	R\$ 69.319,99
Valor liquidado	R\$ 69.319,99
Situação	Concluído



ANTES



DEPOIS

[LIVRE][BP] - Tv. Mário Vitali	
Subprefeitura	São Mateus
Valor empenhado	R\$ 330.699,28
Valor liquidado	R\$ 310.675,01
Situação	Concluído



ANTES



DEPOIS

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPEAMENTO)

[LIVRE][BP] - R. Alves Seixas	
Subprefeitura	Sapopemba
Valor empenhado	R\$ 363.100,06
Valor liquidado	R\$ 331.004,05
Situação	Concluído



ANTES




DEPOIS

[LIVRE][BP] - R. Filipa Álvares	
Subprefeitura	Sapopemba
Valor empenhado	R\$ 185.550,14
Valor liquidado	R\$ 141.853,87
Situação	Concluído



ANTES

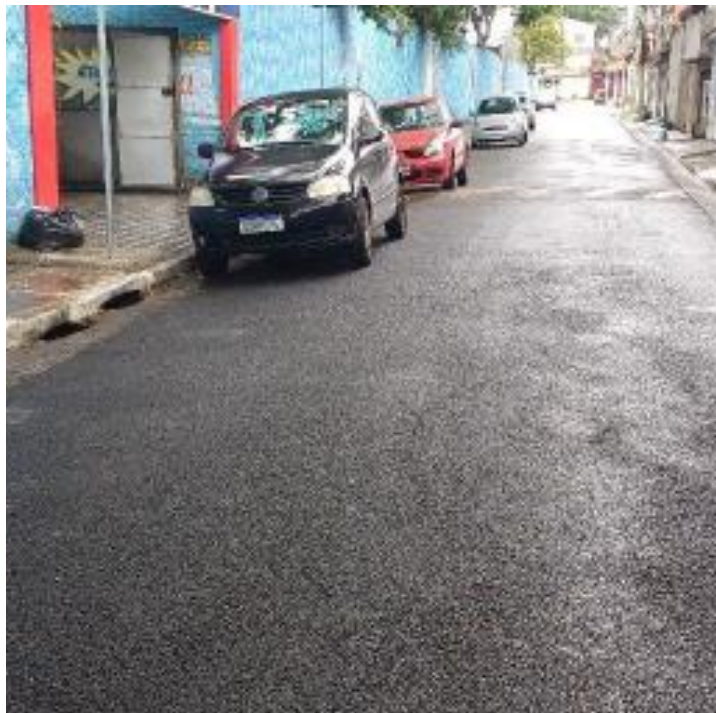

DEPOIS

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPEAMENTO)

[LIVRE][BP] - R. Nicolino Guilherme Candido	
Subprefeitura	Sapopemba
Valor empenhado	R\$ 87.786,75
Valor liquidado	R\$ 62.688,57
Situação	Concluído



ANTES



DEPOIS

[LIVRE][BP] - R. Adolfo Celi	
Subprefeitura	Sapopemba
Valor empenhado	R\$ 332.585,09
Valor liquidado	R\$ 322.279,28
Situação	Concluído



ANTES



DEPOIS

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPEAMENTO)

[LIVRE][BP] - R. José Freire da Silva	
Subprefeitura	Sapopemba
Valor empenhado	R\$ 103.153,09
Valor liquidado	R\$ 86.030,17
Situação	Concluído



ANTES



DEPOIS

[LIVRE][BP] - R. Soldado Antenor da Costa	
Subprefeitura	Sapopemba
Valor empenhado	R\$ 219.160,67
Valor liquidado	R\$ 218.690,37
Situação	Concluído



ANTES



DEPOIS

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPEAMENTO)

[LIVRE][BP] - R. Quarenta e Sete (P. Rio Claro)	
Subprefeitura	São Mateus
Valor empenhado	R\$ 50.867,50
Valor liquidado	R\$ 40.358,58
Situação	Concluído



ANTES



DEPOIS

[LIVRE][BP] - R. Roberto Romão de Moraes	
Subprefeitura	M'Boi Mirim
Valor empenhado	R\$ 375.829,63
Valor liquidado	R\$ 286.090,56
Situação	Concluído



ANTES



DEPOIS

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPEAMENTO)

[LIVRE][BP] - R. Vicente Decara Neto	
Subprefeitura	M'Boi Mirim
Valor empenhado	R\$ 1.345.100,32
Valor liquidado	R\$ 1.025.373,28
Situação	Concluído



ANTES



DEPOIS

[LIVRE][BP] - Rua Guimarães Passos	
Subprefeitura	Vila Mariana
Valor empenhado	R\$ 2.739.921,81
Valor liquidado	R\$ 2.641.821,22
Situação	Concluído



ANTES



DEPOIS

PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DE TERRA

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2026

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS (SMSUB)



Pavimentação em Ruas de Terra					
Objeto e endereço	Valor aprovado	Valor reservado	Valor empenhado	Valor liquidado	Valor pago
Pavimentação de ruas de terra [LIVRE] - Diversos endereços	R\$75.000.000,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Pavimentação de ruas de terra [LIVRE][BP] - Rua Capivari Mirim	R\$0,00	R\$2.343.056,92	R\$2.343.056,92	R\$0,00	R\$0,00
Pavimentação de ruas de terra [LIVRE] - Rua Roberto Lorenz	R\$0,00	R\$1.954.641,51	R\$1.954.641,51	R\$0,00	R\$0,00
Pavimentação de ruas de terra [LIVRE][BP] - Rua São Geraldo	R\$0,00	R\$1.726.548,71	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Pavimentação de ruas de terra [LIVRE] - Estrada de Pirapora	R\$0,00	R\$847.640,10	R\$847.640,10	R\$0,00	R\$0,00
Pavimentação de ruas de terra [LIVRE] - Rua Marjolândia	R\$0,00	R\$1.527.832,55	R\$1.527.832,55	R\$0,00	R\$0,00
Pavimentação de ruas de terra [LIVRE][BBP] - Rua Agrimensor Sugaya	R\$0,00	R\$1.615.001,01	R\$1.615.001,01	R\$0,00	R\$0,00
Pavimentação de ruas de terra [LIVRE] - Rua Astrogildo Pereira	R\$0,00	R\$1.970.080,42	R\$1.970.080,42	R\$0,00	R\$0,00
Pavimentação de ruas de terra [LIVRE][BP] - Rua Ita Fortaleza	R\$0,00	R\$548.788,45	R\$548.788,45	R\$0,00	R\$0,00
Pavimentação de ruas de terra [LIVRE][BP] - Rua Ita Rio de Janeiro	R\$0,00	R\$506.573,95	R\$506.573,95	R\$0,00	R\$0,00
Pavimentação de ruas de terra [LIVRE][BP] - Rua João Barbosa Rabelo	R\$0,00	R\$468.580,90	R\$468.580,90	R\$0,00	R\$0,00
Pavimentação de ruas de terra [LIVRE][BP] - Rua Manuel Felix de Lima	R\$0,00	R\$460.138,00	R\$460.138,00	R\$0,00	R\$0,00
Pavimentação de ruas de terra [LIVRE][BP] - Rua Cachoeira Cairuguaçu	R\$0,00	R\$468.580,90	R\$468.580,90	R\$0,00	R\$0,00
Pavimentação de ruas de terra [LIVRE][BP] - Rua André Furtado de Mendonça	R\$0,00	R\$530.696,52	R\$530.696,52	R\$0,00	R\$0,00
Pavimentação de ruas de terra [LIVRE][BP] - Rua Tomas Lopes de Camargo	R\$0,00	R\$663.370,65	R\$663.370,65	R\$0,00	R\$0,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2026

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS (SMSUB)

PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DE TERRA [LIVRE]

Objeto	Diversos endereços contemplando as 32 Subprefeituras
Subprefeitura	Diversos
Endereço	Diversos
Situação	Em instrução

Valor aprovado 2026	R\$ 75.000.000,00
Valor reservado 2026	R\$ 0,00
Valor empenhado 2026	R\$ 0,00
Valor liquidado 2026	R\$ 0,00



EM CONTRATAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DE TERRA

[LIVRE][BP] - Rua Capivari Mirim	
Subprefeitura	Butantã
Valor empenhado	R\$ 2.343.056,92
Valor liquidado	R\$ 0,00
Situação	Em execução

[LIVRE] - Rua Roberto Lorenz	
Subprefeitura	Butantã
Valor empenhado	R\$ 1.954.641,51
Valor liquidado	R\$ 0,00
Situação	Em execução




ANTES



ANTES

PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DE TERRA

[LIVRE][BP] - Rua São Geraldo	
Subprefeitura	São Mateus
Valor empenhado	R\$ 0,00
Valor liquidado	R\$ 0,00
Situação	A executar

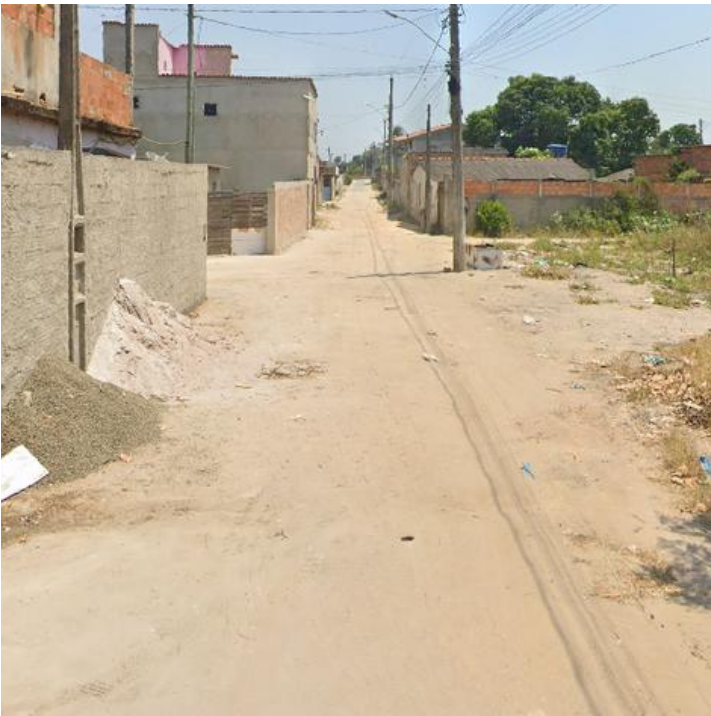

ANTES

[LIVRE] - Estrada de Pirapora	
Subprefeitura	Perus
Valor empenhado	R\$ 847.640,10
Valor liquidado	R\$ 0,00
Situação	A executar



ANTES

PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DE TERRA

[LIVRE] - Rua Marjolândia	
Subprefeitura	Perus
Valor empenhado	R\$ 1.527.832,55
Valor liquidado	R\$ 0,00
Situação	A executar



ANTES

[LIVRE][BBP] - Rua Agrimensor Sugaya	
Subprefeitura	Itaquera
Valor empenhado	R\$ 1.615.001,01
Valor liquidado	R\$ 0,00
Situação	A executar



ANTES

PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DE TERRA

[LIVRE] - Rua Astrogildo Pereira	
Subprefeitura	Itaquera
Valor empenhado	R\$ 1.970.080,42
Valor liquidado	R\$ 0,00
Situação	A executar



ANTES


[LIVRE][BP] - Rua Ita Fortaleza	
Subprefeitura	Itaim Paulista
Valor empenhado	R\$ 548.788,45
Valor liquidado	R\$ 0,00
Situação	A executar



ANTES

PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DE TERRA

[LIVRE][BP] - Rua Ita Rio de Janeiro	
Subprefeitura	Itaim Paulista
Valor empenhado	R\$ 506.573,95
Valor liquidado	R\$ 0,00
Situação	A executar

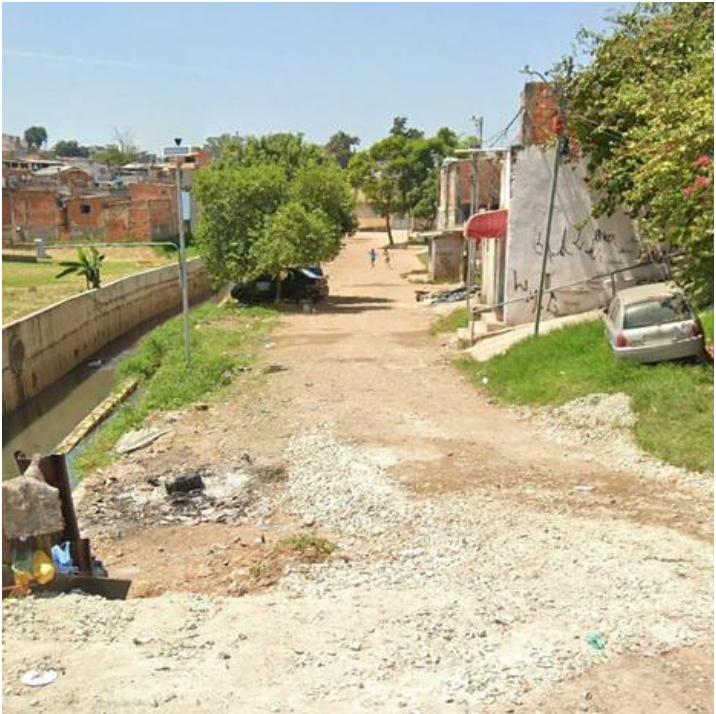

ANTES

[LIVRE][BP] - Rua João Barbosa Rabelo	
Subprefeitura	São Miguel Paulista
Valor empenhado	R\$ 468.580,90
Valor liquidado	R\$ 0,00
Situação	A executar



ANTES

PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DE TERRA

[LIVRE][BP] - Rua Manuel Felix de Lima	
Subprefeitura	São Miguel Paulista
Valor empenhado	R\$ 460.138,00
Valor liquidado	R\$ 0,00
Situação	A executar



ANTES

[LIVRE][BP] - Rua Cachoeira Cairuguaçu	
Subprefeitura	São Miguel Paulista
Valor empenhado	R\$ 468.580,90
Valor liquidado	R\$ 0,00
Situação	A executar




ANTES

PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DE TERRA

[LIVRE][BP] - Rua André Furtado de Mendonça	
Subprefeitura	São Miguel Paulista
Valor empenhado	R\$ 530.696,52
Valor liquidado	R\$ 0,00
Situação	A executar

[LIVRE][BP] - Rua Tomas Lopes de Camargo	
Subprefeitura	São Miguel Paulista
Valor empenhado	R\$ 663.370,65
Valor liquidado	R\$ 0,00
Situação	A executar

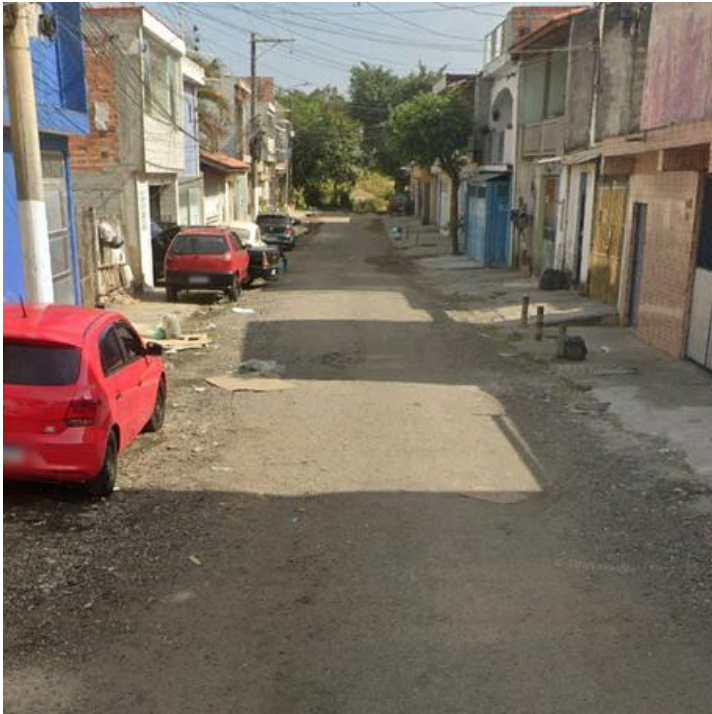

ANTES



ANTES

MELHORIAS DE BAIRRO

Melhorias de bairro					
Objeto e endereço	Valor aprovado	Valor reservado	Valor empenhado	Valor liquidado	Valor pago
Implantação de bosques urbanos - Diversos endereços	R\$35.683.299,22	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Implantação de bosques urbanos - Bosque Jaçanã (Av. Dr. Arnaldo x Av. Paulista x Rua Dr. Antônio dos Santos Rocha)	R\$50.000,00	R\$1.640.617,15	R\$1.640.617,15	R\$416.491,90	R\$416.491,90
Implantação de bosques urbanos - Bosque Pica-Pau (Avenida do Estado, 205)	R\$396.941,35	R\$396.941,35	R\$396.941,35	R\$61.858,23	R\$61.858,23
Implantação de bosques urbanos - Bosque Gavião (Rua Hely Lopes Meirelles, 1450 x Av. Condessa Elizabeth de Robiano, 4054)	R\$1.047.832,37	R\$1.047.832,37	R\$1.047.832,37	R\$450.986,46	R\$450.986,46
Implantação de bosques urbanos - Bosque Irerê (Alça de retorno - Ponte Jânio Quadros)	R\$517.898,43	R\$517.898,43	R\$517.898,43	R\$306.326,38	R\$306.326,38
Implantação de bosques urbanos - Bosque Anú (Alça de retorno - Ponte Jânio Quadros)	R\$662.606,41	R\$662.606,41	R\$662.606,41	R\$0,00	R\$0,00
Implantação de bosques urbanos - Bosque Saíra (Acesso Ponte Vila Guilherme)	R\$416.086,33	R\$416.086,33	R\$416.086,33	R\$0,00	R\$0,00
Implantação de bosques urbanos - Bosque Bem-te-vi (Rua Antônio de Sá)	R\$955.184,12	R\$955.184,12	R\$955.184,12	R\$0,00	R\$0,00
Implantação de bosques urbanos - Bosque Suindara (Alça de acesso da Ponte da Casa Verde)	R\$108.344,73	R\$108.344,73	R\$108.344,73	R\$73.431,46	R\$73.431,46
Implantação de bosques urbanos - Bosque Antiguaçu (Alça de acesso da Ponte do Limão)	R\$457.149,80	R\$457.149,80	R\$457.149,80	R\$0,00	R\$0,00
Implantação de bosques urbanos - Bosque João-de-Barro (Alça de acesso da Ponte do Limão)	R\$452.904,70	R\$452.904,70	R\$452.904,70	R\$0,00	R\$0,00
Implantação de bosques urbanos - Bosque Papagaio (Alça de acesso Ponte Vila Guilherme)	R\$480.277,90	R\$480.277,90	R\$480.277,90	R\$0,00	R\$0,00
Implantação de bosques urbanos - Bosque Sanhaço (Alça de acesso da Ponte da Casa Verde)	R\$436.166,57	R\$436.166,57	R\$582.245,50	R\$87.748,36	R\$87.748,36

Melhorias de bairro					
Objeto e endereço	Valor aprovado	Valor reservado	Valor empenhado	Valor liquidado	Valor pago
Implantação de bosques urbanos - Bosque Cardeal (Alça de acesso da Ponte da Casa Verde)	R\$578.746,35	R\$578.746,35	R\$526.367,20	R\$107.522,36	R\$107.522,36
Implantação de bosques urbanos - Bosque Ema (Alça de acesso da Ponte da Casa Verde)	R\$605.612,08	R\$605.612,08	R\$620.335,71	R\$115.839,99	R\$115.839,99
Implantação de bosques urbanos - Bosque Udu (Pç. Ary da Rocha)	R\$559.879,16	R\$559.879,16	R\$393.564,95	R\$88.812,05	R\$88.812,05
Implantação de bosques urbanos - Bosque Mariquita (Av. 23 de maio x Acesso ao Viaduto Dr. Manuel José Chaves)	R\$1.228.183,72	R\$1.228.183,72	R\$1.228.183,72	R\$111.797,00	R\$111.797,00
Implantação de bosques urbanos - Bosque Tesourinha (Av Santos Dummont x Av Tiradentes)	R\$1.318.952,54	R\$1.318.952,54	R\$1.318.952,54	R\$1.154.673,14	R\$1.154.673,14
Implantação de bosques urbanos - Bosque Suiriri (Vd. Santa Ifigênia x Av. Prestes Maia)	R\$1.118.691,10	R\$1.118.691,10	R\$1.118.691,10	R\$0,00	R\$0,00
Implantação de bosques urbanos - Bosque Pardal (Pq. Dom Pedro II x Rua Dr. Itapura de Miranda)	R\$707.294,88	R\$707.294,88	R\$707.294,88	R\$361.525,22	R\$361.525,22
Implantação de bosques urbanos - Bosque Trica-Ferro (R. Sto. Antônio do Pinhal x R. Manoel Graça)	R\$1.644.273,69	R\$1.644.273,69	R\$1.644.273,69	R\$0,00	R\$0,00
Implantação de bosques urbanos - Bosque Pintassilgo (R. João Passalaqua, 66)	R\$573.674,55	R\$573.674,55	R\$573.674,55	R\$157.898,37	R\$157.898,37
Requalificação de escadões e vielas - Diversos endereços	R\$1.636.062,44	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Requalificação de espaço público - Av. dos Ourives, alt. nº 785	R\$5.766.501,54	R\$5.766.501,54	R\$5.766.501,54	R\$0,00	R\$0,00
Revitalização da espaço público - Rua Ana Cintra, 225 - Santa Cecília	R\$1.300.000,00	R\$1.300.000,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Revitalização e acessibilidade no Beco do Batman	R\$853.696,90	R\$853.696,90	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

Melhorias de bairro					
Objeto e endereço	Valor aprovado	Valor reservado	Valor empenhado	Valor liquidado	Valor pago
Requalificação de espaço público - Av. Presidente Wilson x Rua da Mooca	R\$6.000.000,00	R\$6.000.000,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Requalificação de espaço público - Rua Reverendo João Euclides Pereira x Rua São Vicente de Minas - Jardim Matarazzo	R\$1.564.940,83	R\$1.223.207,11	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Drenagem - Rua Capitão Felisbino de Moraes	R\$911.088,84	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Requalificação e promoção da ocupação dos espaços públicos - Campo Pirituba - Rua Oscar Pander	R\$1.500.000,00	R\$1.249.843,45	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Readequação e reabilitação do sistema de drenagem viária e serviços complementares de pavimentação - Rua Demóstenes, entre vias Rua Antônio de Macedo Soares e Rua Barão de Jaceguai	R\$820.958,45	R\$820.958,45	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL	R\$70.353.249,00	R\$37.081.525,38	R\$21.615.928,67	R\$3.494.910,92	R\$3.494.910,92

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2026

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS (SMSUB)

MELHORIAS DE BAIRRO- IMPLANTAÇÃO DE BOSQUES URBANOS

Objeto	Bosque Jaçanã
Subprefeitura	Sé
Endereço	Av. Dr. Arnaldo x Av. Paulista x Rua Dr. Antônio dos Santos Rocha
Nº do SEI	6012.2025/0022172-4
Situação	Concluído

Valor aprovado 2026	R\$ 50.000,00
Valor reservado 2026	R\$ 1.640.617,15
Valor empenhado 2026	R\$ 1.640.617,15
Valor liquidado 2026	R\$ 416.491,90




CONCLUÍDO

MELHORIAS DE BAIRRO- IMPLANTAÇÃO DE BOSQUES URBANOS

Objeto	Bosque Pica-Pau
Subprefeitura	Sé
Endereço	Avenida do Estado, 205
Nº do SEI	6012.2025/0022173-2
Situação	Em execução

Valor aprovado 2026	R\$ 396.941,35
Valor reservado 2026	R\$ 396.941,35
Valor empenhado 2026	R\$ 396.941,35
Valor liquidado 2026	R\$ 61.858,23

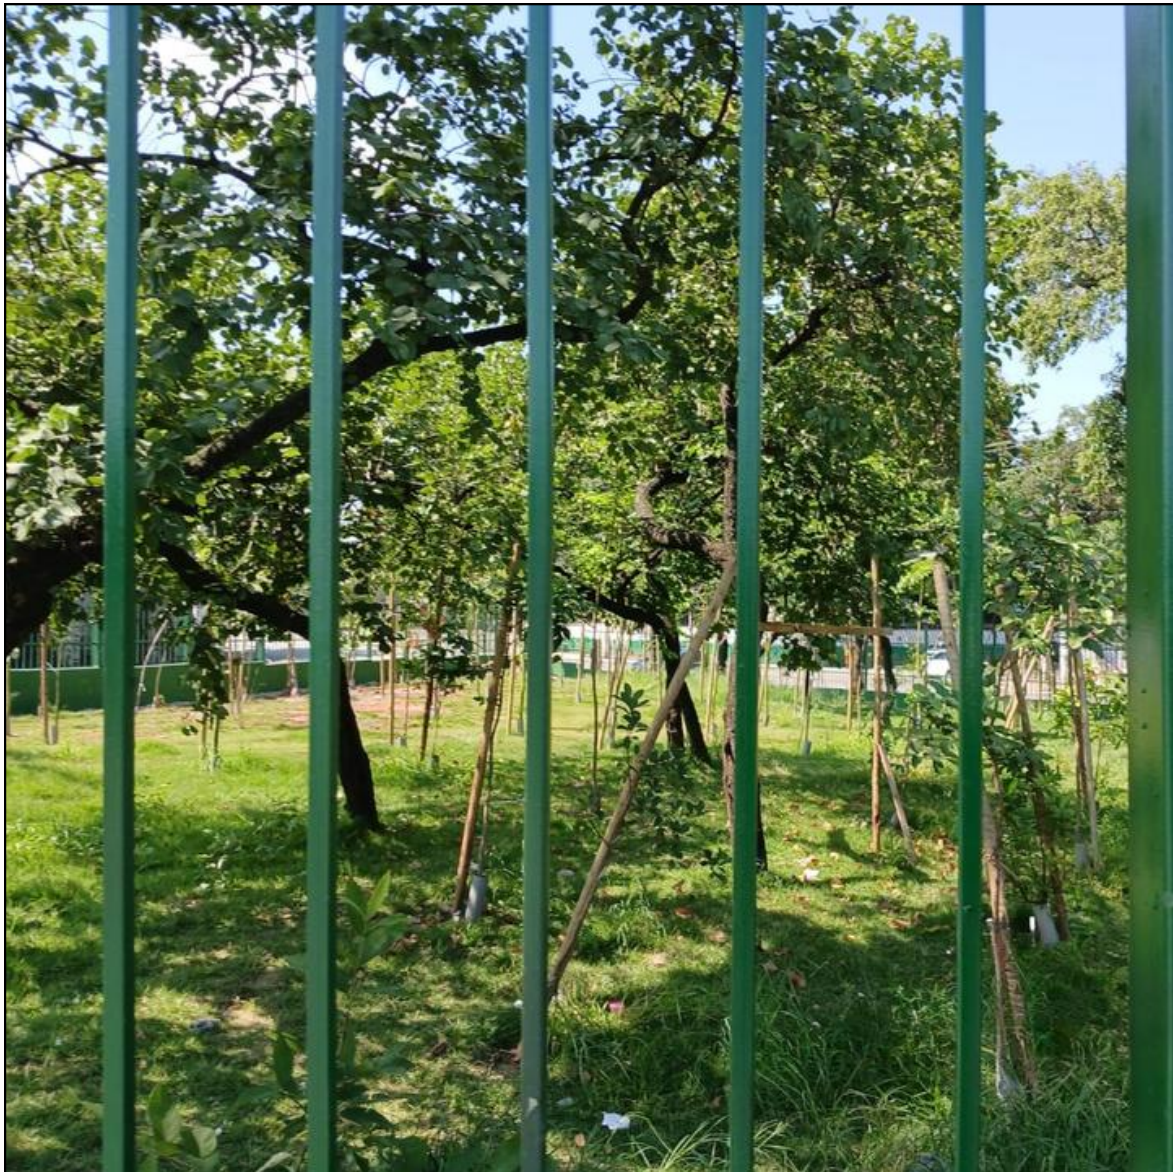

EM EXECUÇÃO

MELHORIAS DE BAIRRO- IMPLANTAÇÃO DE BOSQUES URBANOS

Objeto	Bosque Gavião
Subprefeitura	Mooca
Endereço	Rua Hely Lopes Meirelles, 1450 x Av. Condessa Elizabeth de Robiano, 4054
Nº do SEI	6012.2025/0022173-2
Situação	Em execução

Valor aprovado 2026	R\$ 1.047.832,37
Valor reservado 2026	R\$ 1.047.832,37
Valor empenhado 2026	R\$ 1.047.832,37
Valor liquidado 2026	R\$ 450.986,46




EM EXECUÇÃO

MELHORIAS DE BAIRRO- IMPLANTAÇÃO DE BOSQUES URBANOS

Objeto	Bosque Irerê
Subprefeitura	Vila Maria/ Vila Guilherme
Endereço	Alça de retorno - Ponte Jânio Quadros
Nº do SEI	6012.2025/0022639-4
Situação	Concluído

Valor aprovado 2026	R\$ 517.898,43
Valor reservado 2026	R\$ 517.898,43
Valor empenhado 2026	R\$ 517.898,43
Valor liquidado 2026	R\$ 306.326,38

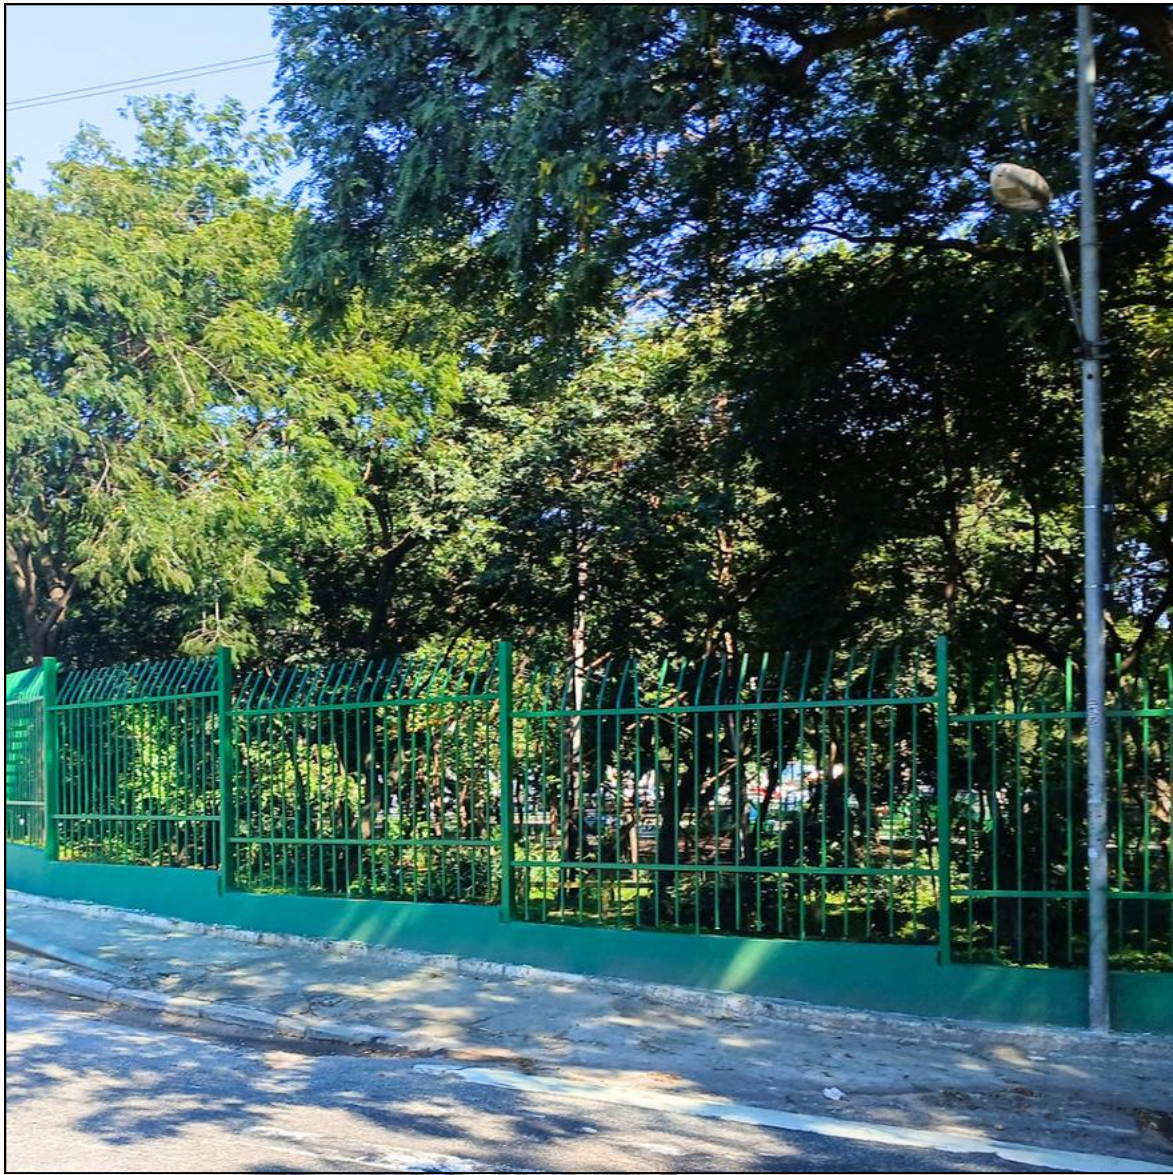

CONCLUÍDO

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2026

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS (SMSUB)

MELHORIAS DE BAIRRO- IMPLANTAÇÃO DE BOSQUES URBANOS

Objeto	Bosque Anú
Subprefeitura	Mooca
Endereço	Alça de retorno - Ponte Jânio Quadros
Nº do SEI	6012.2025/0022639-4
Situação	A executar

Valor aprovado 2026	R\$ 662.606,41
Valor reservado 2026	R\$ 662.606,41
Valor empenhado 2026	R\$ 662.606,41
Valor liquidado 2026	R\$ 0,00



A EXECUTAR

MELHORIAS DE BAIRRO- IMPLANTAÇÃO DE BOSQUES URBANOS

Objeto	Bosque Saíra
Subprefeitura	Mooca
Endereço	Acesso Ponte Vila Guilherme
Nº do SEI	6012.2025/0022639-4
Situação	A executar

Valor aprovado 2026	R\$ 416.086,33
Valor reservado 2026	R\$ 416.086,33
Valor empenhado 2026	R\$ 416.086,33
Valor liquidado 2026	R\$ 0,00



A EXECUTAR

MELHORIAS DE BAIRRO- IMPLANTAÇÃO DE BOSQUES URBANOS

Objeto	Bosque Bem-te-vi
Subprefeitura	Sé
Endereço	Rua Antônio de Sá
Nº do SEI	6012.2025/0022639-4
Situação	A executar

Valor aprovado 2026	R\$ 955.184,12
Valor reservado 2026	R\$ 955.184,12
Valor empenhado 2026	R\$ 955.184,12
Valor liquidado 2026	R\$ 0,00



A EXECUTAR

MELHORIAS DE BAIRRO- IMPLANTAÇÃO DE BOSQUES URBANOS

Objeto	Bosque Suindara
Subprefeitura	Casa Verde
Endereço	Alça de acesso da Ponte da Casa Verde
Nº do SEI	6012.2025/0022640-8
Situação	Concluído

Valor aprovado 2026	R\$ 108.344,73
Valor reservado 2026	R\$ 108.344,73
Valor empenhado 2026	R\$ 108.344,73
Valor liquidado 2026	R\$ 73.431,46



CONCLUÍDO

MELHORIAS DE BAIRRO- IMPLANTAÇÃO DE BOSQUES URBANOS

Objeto	Bosque Antiguaçu
Subprefeitura	Casa Verde
Endereço	Alça de acesso da Ponte do Limão
Nº do SEI	6012.2025/0022640-8
Situação	A executar

Valor aprovado 2026	R\$ 457.149,80
Valor reservado 2026	R\$ 457.149,80
Valor empenhado 2026	R\$ 457.149,80
Valor liquidado 2026	R\$ 0,00



A EXECUTAR

MELHORIAS DE BAIRRO- IMPLANTAÇÃO DE BOSQUES URBANOS

Objeto	Bosque Papagaio
Subprefeitura	Vila Maria/ Vila Guilherme
Endereço	Alça de acesso Ponte Vila Guilherme
Nº do SEI	6012.2025/0022640-8
Situação	A executar

Valor aprovado 2026	R\$ 480.277,90
Valor reservado 2026	R\$ 480.277,90
Valor empenhado 2026	R\$ 480.277,90
Valor liquidado 2026	R\$ 0,00




A EXECUTAR

MELHORIAS DE BAIRRO- IMPLANTAÇÃO DE BOSQUES URBANOS

Objeto	Bosque Sanhaço
Subprefeitura	Lapa
Endereço	Alça de acesso da Ponte da Casa Verde
Nº do SEI	6012.2025/0022641-6
Situação	Concluído

Valor aprovado 2026	R\$ 436.166,57
Valor reservado 2026	R\$ 436.166,57
Valor empenhado 2026	R\$ 582.245,50
Valor liquidado 2026	R\$ 87.748,36

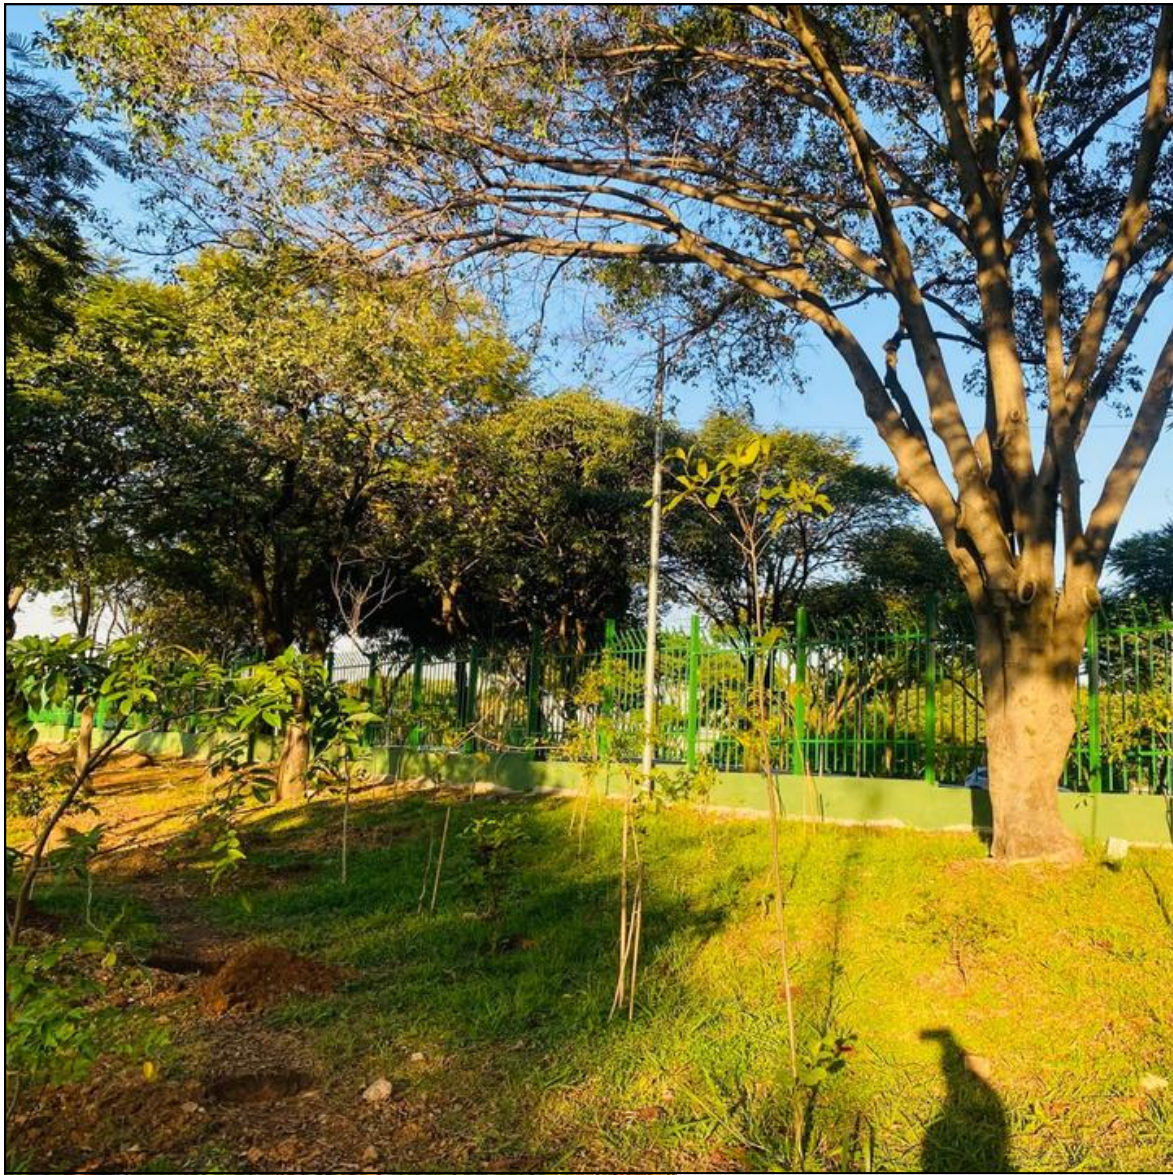

CONCLUIDO

MELHORIAS DE BAIRRO- IMPLANTAÇÃO DE BOSQUES URBANOS

Objeto	Bosque Cardeal
Subprefeitura	Sé
Endereço	Alça de acesso da Ponte da Casa Verde
Nº do SEI	6012.2025/0022641-6
Situação	Concluído

Valor aprovado 2026	R\$ 578.746,35
Valor reservado 2026	R\$ 578.746,35
Valor empenhado 2026	R\$ 526.367,20
Valor liquidado 2026	R\$ 107.522,36



CONCLUIDO

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2026

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS (SMSUB)

MELHORIAS DE BAIRRO- IMPLANTAÇÃO DE BOSQUES URBANOS

Objeto	Bosque Ema
Subprefeitura	Sé
Endereço	Alça de acesso da Ponte da Casa Verde
Nº do SEI	6012.2025/0022641-6
Situação	Concluído

Valor aprovado 2026	R\$ 605.612,08
Valor reservado 2026	R\$ 605.612,08
Valor empenhado 2026	R\$ 620.335,71
Valor liquidado 2026	R\$ 115.839,99



CONCLUIDO

MELHORIAS DE BAIRRO- IMPLANTAÇÃO DE BOSQUES URBANOS

Objeto	Bosque Udu
Subprefeitura	Ipiranga
Endereço	Pç. Ary da Rocha
Nº do SEI	6012.2025/0022641-6
Situação	Concluído

Valor aprovado 2026	R\$ 559.879,16
Valor reservado 2026	R\$ 559.879,16
Valor empenhado 2026	R\$ 393.564,95
Valor liquidado 2026	R\$ 88.812,05



CONCLUIDO

MELHORIAS DE BAIRRO- IMPLANTAÇÃO DE BOSQUES URBANOS

Objeto	Bosque Mariquita
Subprefeitura	Sé
Endereço	Av. 23 de maio x Acesso ao Viaduto Dr. Manuel José Chaves
Nº do SEI	6012.2025/0022759-5
Situação	Concluído

Valor aprovado 2026	R\$ 1.228.183,72
Valor reservado 2026	R\$ 1.228.183,72
Valor empenhado 2026	R\$ 1.228.183,72
Valor liquidado 2026	R\$ 111.797,00



CONCLUIDO

MELHORIAS DE BAIRRO- IMPLANTAÇÃO DE BOSQUES URBANOS

Objeto	Bosque Tesourinha
Subprefeitura	Sé
Endereço	Av. 23 de maio x Acesso ao Viaduto Dr. Manuel José Chaves
Nº do SEI	6012.2025/0022759-5
Situação	Concluído

Valor aprovado 2026	R\$ 1.318.952,54
Valor reservado 2026	R\$ 1.318.952,54
Valor empenhado 2026	R\$ 1.318.952,54
Valor liquidado 2026	R\$ 1.154.673,14



CONCLUIDO

MELHORIAS DE BAIRRO- IMPLANTAÇÃO DE BOSQUES URBANOS

Objeto	Bosque Suiriri
Subprefeitura	Sé
Endereço	Vd. Santa Ifigênia x Av. Prestes Maia
Nº do SEI	6012.2025/0022760-9
Situação	Concluído

Valor aprovado 2026	R\$ 1.118.691,10
Valor reservado 2026	R\$ 1.118.691,10
Valor empenhado 2026	R\$ 1.118.691,10
Valor liquidado 2026	R\$ 0,00



CONCLUIDO

MELHORIAS DE BAIRRO- IMPLANTAÇÃO DE BOSQUES URBANOS

Objeto	Bosque Pardal
Subprefeitura	Sé
Endereço	Pq. Dom Pedro II x Rua Dr. Itapura de Miranda
Nº do SEI	6012.2025/0022760-9
Situação	Em execução

Valor aprovado 2026	R\$ 707.294,88
Valor reservado 2026	R\$ 707.294,88
Valor empenhado 2026	R\$ 707.294,88
Valor liquidado 2026	R\$ 361.525,22



EM EXECUÇÃO

MELHORIAS DE BAIRRO- IMPLANTAÇÃO DE BOSQUES URBANOS

Objeto	Bosque Trica-Ferro
Subprefeitura	Mooca
Endereço	R. Sto. Antônio do Pinhal x R. Manoel Graça
Nº do SEI	6012.2025/0022761-7
Situação	Em execução

Valor aprovado 2026	R\$ 1.644.273,69
Valor reservado 2026	R\$ 1.644.273,69
Valor empenhado 2026	R\$ 1.644.273,69
Valor liquidado 2026	R\$ 0,00



EM EXECUÇÃO

MELHORIAS DE BAIRRO- IMPLANTAÇÃO DE BOSQUES URBANOS

Objeto	Bosque Pintassilgo
Subprefeitura	Sé
Endereço	Vd. Santa Ifigênia x Av. Prestes Maia
Nº do SEI	6012.2025/0022761-7
Situação	Concluído

Valor aprovado 2026	R\$ 573.674,55
Valor reservado 2026	R\$ 573.674,55
Valor empenhado 2026	R\$ 573.674,55
Valor liquidado 2026	R\$ 157.898,37




CONCLUIDO

MELHORIAS DE BAIRRO - REQUALIFICAÇÃO DE ESCADÕES E VIELAS

Objeto	Diversos endereços contemplando as 32 Subprefeituras
Subprefeitura	Diversos
Endereço	Diversos
Situação	A contratar

Valor aprovado 2026	R\$ 1.636.062,44
Valor reservado 2026	R\$ 0,00
Valor empenhado 2026	R\$ 0,00
Valor liquidado 2026	R\$ 0,00

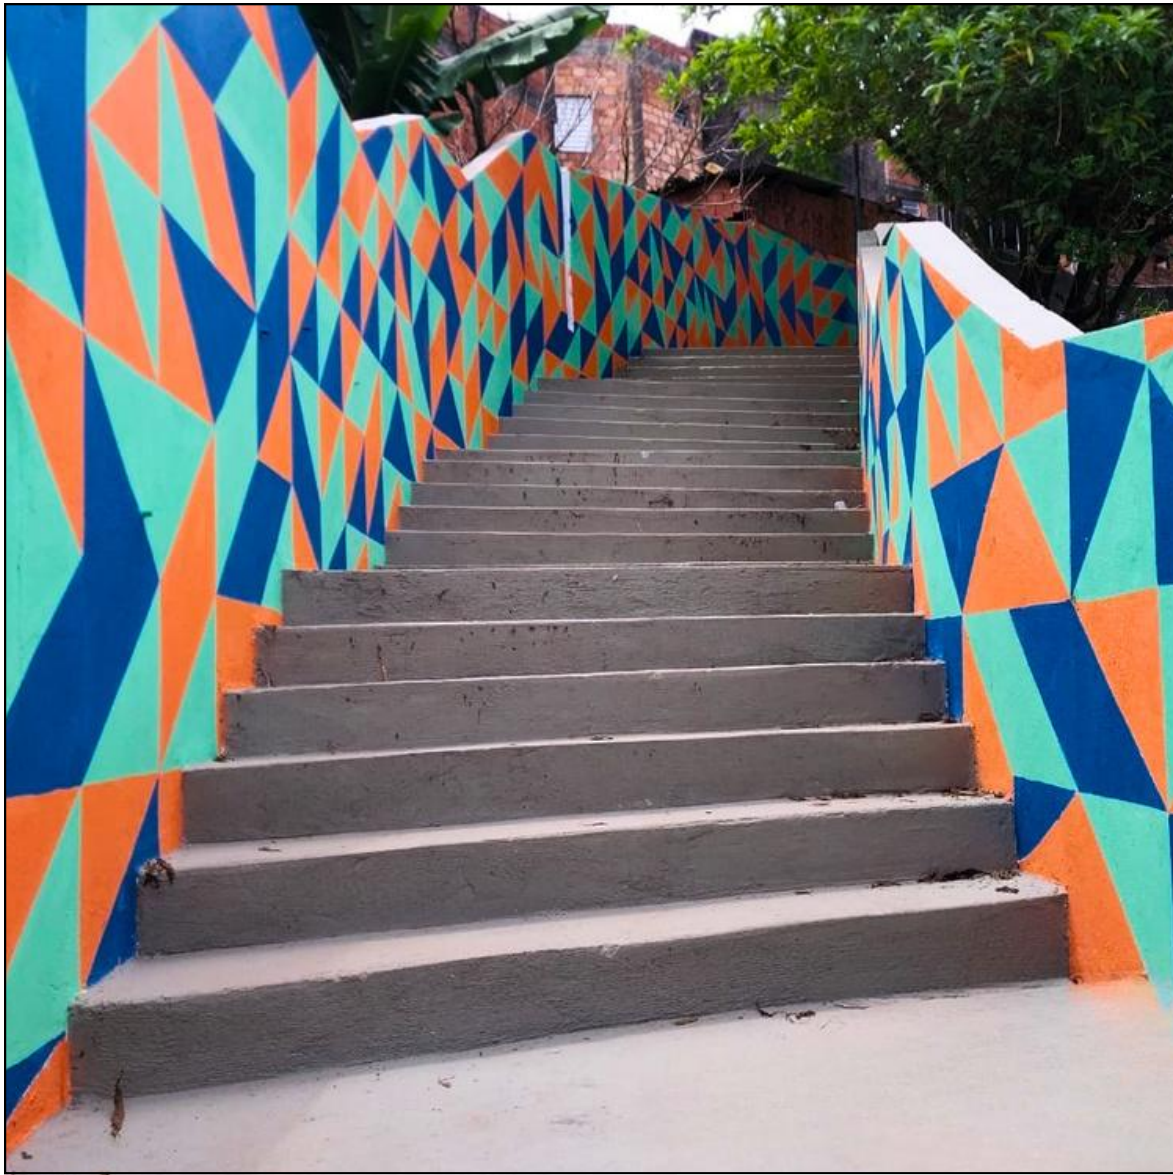

A CONTRATAR

MELHORIAS DE BAIRRO- REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO

Objeto	Requalificação de espaço público - Av. dos Ourives, alt. nº 785
Subprefeitura	Ipiranga
Endereço	Av. dos Ourives, alt. nº 785
Nº do SEI	6039.2025/0006571-1
Situação	Em execução

Valor aprovado 2026	R\$ 5.766.501,54
Valor reservado 2026	R\$ 5.766.501,54
Valor empenhado 2026	R\$ 5.766.501,54
Valor liquidado 2026	R\$ 157.898,37



EM EXECUÇÃO

MELHORIAS DE BAIRRO- REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO

Objeto	Revitalização e acessibilidade no Beco do Batman
Subprefeitura	Pinheiros
Endereço	Rua Gonçalo Afonso - Vila Madalena
Nº do SEI	6012.2026/0001380-5
Situação	Em licitação

Valor aprovado 2026	R\$ 853.696,90
Valor reservado 2026	R\$ 853.696,90
Valor empenhado 2026	R\$ 0,00
Valor liquidado 2026	R\$ 0,00



EM LICITAÇÃO

MELHORIAS DE BAIRRO- REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO

Objeto	Revitalização da espaço público - Rua Ana Cintra, 225 - Santa Cecília
Subprefeitura	Sé
Endereço	Rua Ana Cintra, 225
Nº do SEI	6012.2026/0001378-3
Situação	A licitar

Valor aprovado 2026	R\$ 1.300.000,00
Valor reservado 2026	R\$ 1.300.000,00
Valor empenhado 2026	R\$ 0,00
Valor liquidado 2026	R\$ 0,00



A LICITAR

MELHORIAS DE BAIRRO- REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO

Objeto	Requalificação de espaço público - Av. Presidente Wilson x Rua da Mooca
Subprefeitura	Sé
Endereço	Av. Presidente Wilson x Rua da Mooca
Nº do SEI	6012.2026/0004416-6
Situação	A licitar

Valor aprovado 2026	R\$ 6.000.000,00
Valor reservado 2026	R\$ 6.000.000,00
Valor empenhado 2026	R\$ 0,00
Valor liquidado 2026	R\$ 0,00



A LICITAR

MELHORIAS DE BAIRRO- REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO

Objeto	Requalificação de espaço público - Rua Reverendo João Euclides Pereira x Rua São Vicente de Minas - Jardim Matarazzo
Subprefeitura	Ermelino Matarazzo
Endereço	Rua Reverendo João Euclides Pereira x Rua São Vicente de Minas - Jardim Matarazzo
Nº do SEI	6012.2025/0018323-7
Situação	Em execução
Valor aprovado 2026	R\$ 1.564.940,83
Valor reservado 2026	R\$ 1.223.207,11
Valor empenhado 2026	R\$ 0,00
Valor liquidado 2026	R\$ 0,00



EM EXECUÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2026

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS (SMSUB)

MELHORIAS DE BAIRRO- DRENAGEM

Objeto	Drenagem na Rua Capitão Felisbino de Moraes
Subprefeitura	Santo Amaro
Endereço	Rua Capitão Felisbino de Moraes
Nº do SEI	6012.2025/0021676-3
Situação	Em licitação

Valor aprovado 2026	R\$ 911.088,84
Valor reservado 2026	R\$ 0,00
Valor empenhado 2026	R\$ 0,00
Valor liquidado 2026	R\$ 0,00



EM LICITAÇÃO


PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2026

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS (SMSUB)

MELHORIAS DE BAIRRO- DRENAGEM

Objeto	Requalificação e promoção da ocupação dos espaços públicos - Campo Pirituba - Rua Oscar Pander
Subprefeitura	Pirituba/Jaraguá
Endereço	
Nº do SEI	6012.2025/0023253-0
Situação	A licitar

Valor aprovado 2026	R\$ 1.500.000,00
Valor reservado 2026	R\$ 1.249.843,45
Valor empenhado 2026	R\$ 0,00
Valor liquidado 2026	R\$ 0,00

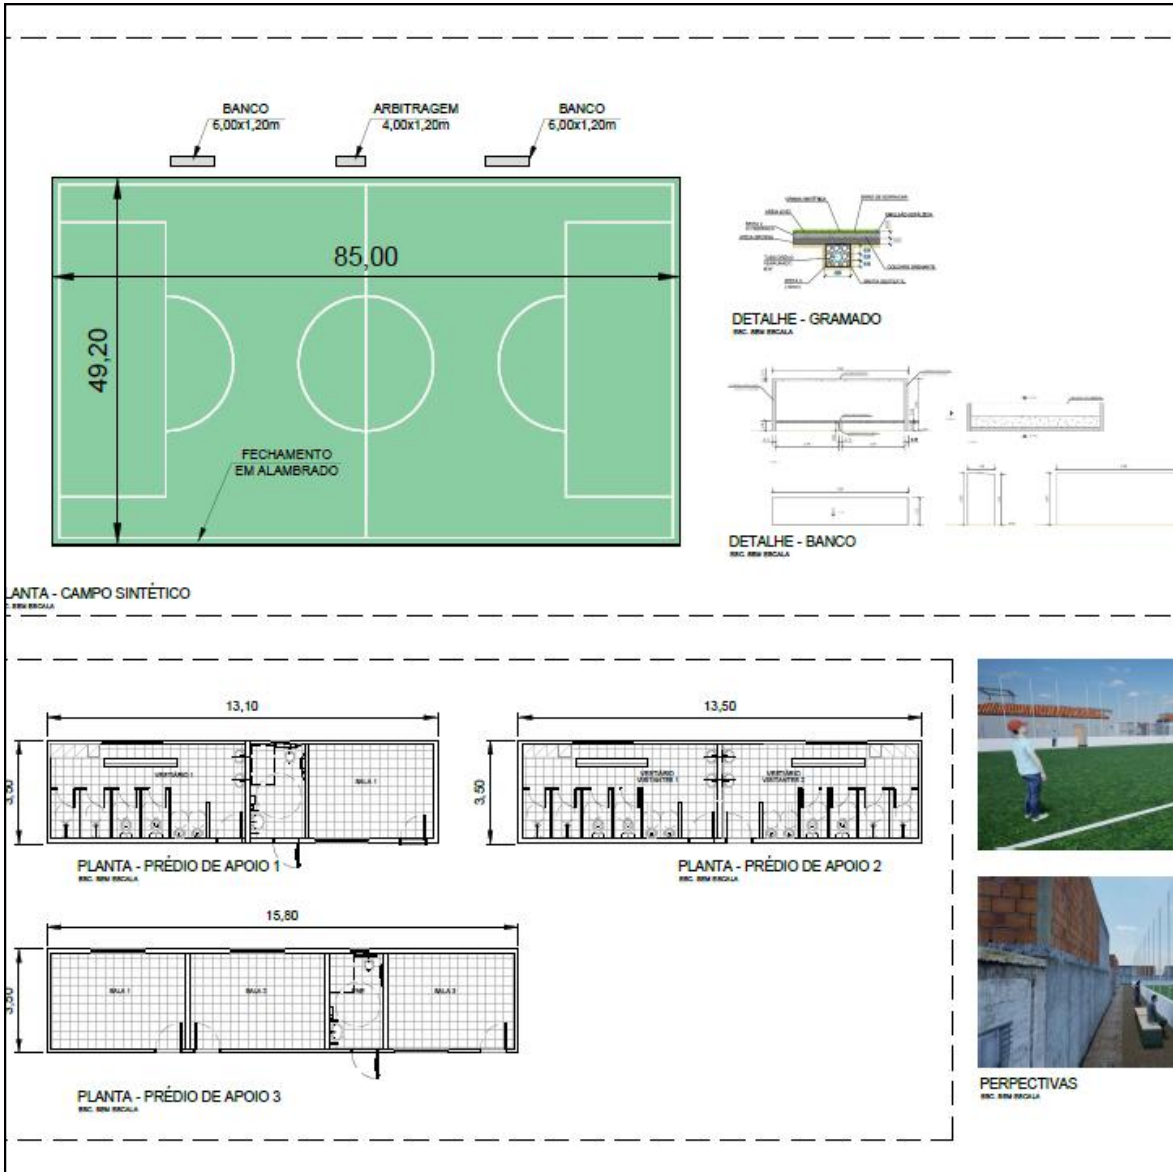

A LICITAR

MELHORIAS DE BAIRRO- REQUALIFICAÇÃO

Objeto	Readequação e reabilitação do sistema de drenagem viária e serviços complementares de pavimentação - Rua Demóstenes, entre vias Rua Antônio de Macedo Soares e Rua Barão de Jaceguai
Subprefeitura	Santo Amaro
Endereço	Rua Demóstenes, entre vias Rua Antônio de Macedo Soares e Rua Barão de Jaceguai
Nº do SEI	6012.2025/0023253-0
Situação	Em licitação

Valor aprovado 2026	R\$ 820.958,45
Valor reservado 2026	R\$ 820.958,45
Valor empenhado 2026	R\$ 0,00
Valor liquidado 2026	R\$ 0,00




EM LICITAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2026

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS (SMSUB)

MELHORIAS DE BAIRRO- DRENAGEM

Objeto	Readequação e reabilitação do sistema de drenagem viária e serviços complementares de pavimentação
Subprefeitura	Santo Amaro
Endereço	Rua Demóstenes, entre vias Rua Antônio de Macedo Soares e Rua Barão de Jaceguai
Nº do SEI	6012.2026/0002281-2
Situação	Em licitação
Valor aprovado 2026	R\$ 820.958,45
Valor reservado 2026	R\$ 820.958,45
Valor empenhado 2026	R\$ 0,00
Valor liquidado 2026	R\$ 0,00

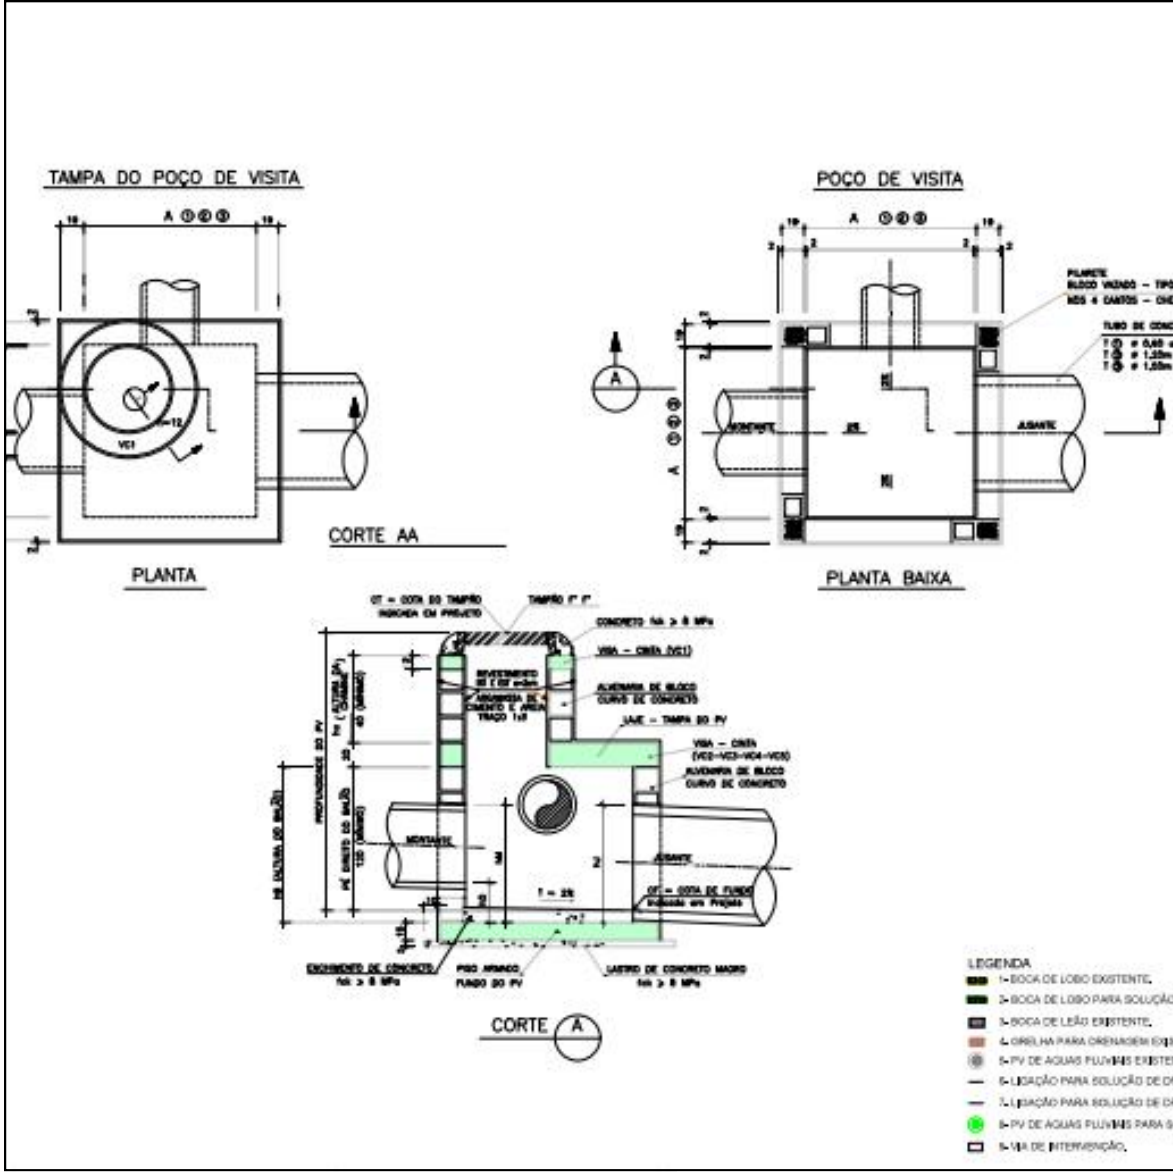

EM LICITAÇÃO

EXECUÇÃO DE OBRAS EM ÁREAS DE RISCO - PREVENTIVA [LIVRE]

Execução de obras de drenagem - Preventiva [LIVRE]					
Objeto e endereço	Valor aprovado	Valor reservado	Valor empenhado	Valor liquidado	Valor pago
Execução de obras civis para implantação de jardins de chuva - Diversos endereços	R\$2.183.650,82	R\$2.532.824,64	R\$2.134.119,08	R\$619.247,58	R\$619.247,58
Execução de obras de contenção de margem de córrego, com elaboração de projeto executivo - Córrego Ogum	R\$3.316.349,18	R\$3.316.349,18	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Elaboração de projeto executivo e obras civis de readequação de rede de águas pluviais na Praça Luigi Palma - Jardim Cidália	R\$20.000.000,00	R\$20.000.000,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Obras civis de drenagem no Corrego Ayrosa, proximo à rua João Frederico Agricola - Tremembé	R\$4.500.000,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL	R\$30.000.000,00	R\$25.849.173,82	R\$2.134.119,08	R\$619.247,58	R\$619.247,58

EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS PARA IMPLANTAÇÃO DE JARDINS DE CHUVA

Objeto	Execução de obras civis para implantação de jardins de chuva - Diversos endereços
Subprefeitura	Diversos
Endereço	Diversos
Nº do SEI	6012.2025/0011708-0
Situação	Em execução

Valor aprovado 2026	R\$ 2.183.650,82
Valor reservado 2026	R\$ 2.532.824,64
Valor empenhado 2026	R\$ 2.134.119,08
Valor liquidado 2026	R\$ 619.247,58



EM EXECUÇÃO

EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM - PREVENTIVA [LIVRE]

Objeto	Execução de obras de contenção de margem de córrego, com elaboração de projeto executivo - Córrego Ogum
Subprefeitura	Capela do Socorro
Endereço	Rua Oceano Pacífico até Tv. da Sereia
Nº do SEI	6012.2023/0012470-9
Situação	A licitar
Valor aprovado 2026	R\$ 3.316.349,18
Valor reservado 2026	R\$ 3.316.349,18
Valor empenhado 2026	R\$ 0,00
Valor liquidado 2026	R\$ 0,00



A LICITAR

EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM - PREVENTIVA [LIVRE]

Objeto	Elaboração de projeto executivo e obras civis de readequação de rede de águas pluviais na Praça Luigi Palma - Jardim Cidália
Subprefeitura	Cidade Ademar
Endereço	Praça Luigi Palma - Jardim Cidália
Nº do SEI	6012.2026/0003314-8
Situação	Em licitação
Valor aprovado 2026	R\$ 20.000.000,00
Valor reservado 2026	R\$ 20.000.000,00
Valor empenhado 2026	R\$ 0,00
Valor liquidado 2026	R\$ 0,00



EM LICITAÇÃO

EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM - PREVENTIVA [LIVRE]

Objeto	Obras civis de drenagem no Corrego Ayrosa, proximo à rua João Frederico Agrícola - Tremembé
Subprefeitura	Jaçanã
Endereço	Praça Luigi Palma - Jardim Cidália
Nº do SEI	6012.2026/0001356-2
Situação	A licitar

Valor aprovado 2026	R\$ 4.500.000,00
Valor reservado 2026	R\$ 0,00
Valor empenhado 2026	R\$ 0,00
Valor liquidado 2026	R\$ 0,00



A LICITAR

EXECUÇÃO DE OBRAS EM ÁREAS DE RISCO - EMERGENCIAL [LIVRE]

Execução de obras de drenagem - Preventiva [LIVRE]					
Objeto e endereço	Valor aprovado	Valor reservado	Valor empenhado	Valor liquidado	Valor pago
Obra emergencial - Diversos endereços	R\$2.000.000,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
TOTAL	R\$2.000.000,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2026

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS (SMSUB)

OBRIGADO!



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
SECRETARIA DAS
SUBPREFEITURAS
