



**CIDADE DE
SÃO PAULO**

CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO – FUNDURB

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2025

Planilha e Relatório Fotográfico

Prestação de contas do FUNDURB (98.25)

Execução orçamentária por item do plano aprovado

Prestação de contas do FUNDURB (98.25)

Execução orçamentária por dotação

DOTAÇÃO	Solicitado (R\$)	Execução orçamentária 2025			
		Reservado (R\$)	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)
98.25.13.391.3001.5.957.44903900.08.1.759.0402.0	R\$ 75.981,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 27.275.191,97	R\$ 8.431.279,40	R\$ 7.370.186,03	R\$ 2.331.989,60	R\$ 879.458,02
98.25.13.392.3001.5.960.44903900.08.1.759.0402.0	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 10.961.796,30	R\$ 10.790.432,69	R\$ 8.869.883,48	R\$ 1.864.805,76	R\$ 1.679.649,09
98.25.13.392.3001.5.959.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
98.25.13.392.3001.5.400.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 51.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
98.25.13.391.3001.5.421.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 1.000.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
98.25.13.392.3001.5.425.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
98.25.13.392.3001.5.425.44909200.08.1.759.0402.1	R\$ 390.375,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
98.25.13.392.3020.5.426.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ 39.756.345,00		R\$ 19.221.712,09	R\$ 16.240.069,51	R\$ 4.196.795,36	R\$ 2.559.107,11
		48,35%	40,85%	10,56%	6,44%

*Os dados utilizados são referentes aos Relatórios de Empenho detalhado do SOF atualizados em 07/05/2025.

Item	Equipamento cultural	Processo	Ação	Status	Dotação orçamentária	Valor aprovado abril/2025	Empenhado	Liquidado	Pago	% de liquidação do valor aprovado
1	Centro Cultural São Paulo	6025.2016/0008822-0	Reforma em imóvel tombado - Medidas de Segurança	1. em desenvolvimento	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	416.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1	Centro Cultural São Paulo	6025.2024/0014973-9	Reforma de manutenção predial - Impermeabilizações	5. em execução/obra	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	262.557,23	262.425,15	262.423,71	0,00	99,95%
1	Centro Cultural São Paulo	Sem processo	Reforma em imóvel tombado - Instalações elétricas	1. em desenvolvimento	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	1.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1	Centro Cultural São Paulo	6025.2023/0002933-2	Reforma das Fachadas	5. em execução/obra	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	409.058,25	1.907.702,67	1.065.599,23	297.317,52	260,50%
1	Centro Cultural São Paulo	6025.2024/0014937-2	Reforma de manutenção predial - Cobertura zenital	5. em execução/obra	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	332.668,03	368.282,84	368.278,86	0,00	110,70%
1	Centro Cultural São Paulo	Sem processo	Reforma em imóvel tombado - Alçamento	1. em desenvolvimento	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1	Centro Cultural São Paulo	6025.2024/0035362-0	Manutenção de troca de vidros na área externa do CCSP	5. em execução/obra	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	1.394.318,30	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	Sítio Mirim	6025.2020/0016806-0	Reconstrução da Casa-Sede	5. em execução/obra	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	3.157.375,70	2.194.664,72	144.729,61	144.729,61	4,58%
3	Sítio Morrinhos	6025.2022/0022026-0	Restauo, segurança contra incêndio e acessibilidade	5. em execução/obra	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	2.152.774,86	1.589.774,96	150.111,87	150.111,87	6,97%
4	Teatro João Caetano	6025.2022/0011336-6	Reforma geral para Acessibilidade, Segurança contra incêndio, Conservação e Restauo.	5. em execução/obra	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	1.772.051,97	496.857,96	101.530,05	47.982,75	5,73%
5	Escola Municipal de Iniciação Artística - Jabaquara	6025.2023/0012495-5	Restauo e reforma da Casa 2	3. aguardando autorizações/aprovações	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	1.305.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Memorial dos Afritos	Sem processo	Projeto executivo de implantação do Memorial dos Afritos	0. em planejamento	98.25.13.391.3001.5.421.44905100.08.1.759.0402.0	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Memorial dos Afritos	Sem processo	Implantação do Memorial	0. em planejamento	98.25.13.391.3001.5.421.44905100.08.1.759.0402.0	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Teatro Cacilda Becker	6025.2021/0012695-4	Reforma e manutenção predial	1. em desenvolvimento	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	Casa de Cultura São Mateus	6025.2024/0023689-5	Construção de Novo Edifício	4. em licitação	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	3.655.330,00	6.700.000,00	0,00	0,00	0,00%
9	Casa de Cultura Vila Guilherme	6025.2025/0001101-1	Reforma e restauo em imóvel tombado	2. processo SEI iniciado	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	3.826.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10	Biblioteca Mário de Andrade	6025.2018/0015645-9	Projeto de AVCB	0. em planejamento	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Item	Equipamento cultural	Processo	Ação	Status	Dotação orçamentária	Valor aprovado abril/2025	Empenhado	Liquidado	Pago	% de liquidação do valor aprovado
10	Biblioteca Mário de Andrade	6025.2022/0023974-2	Restauro da calçada	0. em planejamento	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10	Biblioteca Mário de Andrade	Sem processo	Projeto executivo para reforma e manutenção predial	0. em planejamento	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10	Biblioteca Mário de Andrade	Sem processo	Projeto Básico e Executivo de Climatização para a Biblioteca Mário de Andrade e a Hemeroteca	0. em planejamento	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	223.790,33	0,00	0,00	0,00	0,00%
11	Monumento	6025.2023/0037747-0	Restauro da Fonte Monumental	0. em planejamento	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12	Monumento à Independência	6025.2024/0013810-9	Restauro	0. em planejamento	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13	Arquivo Histórico Municipal	6025.2024/0008869-1	Conservação e Restauro do Edifício Anexo	0. em planejamento	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
14	Casa Amarela	6025.2023/0007211-4	Gerenciamento e fiscalização de projeto e obra de restauro e requalificação	0. em planejamento	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
14	Casa Amarela	Sem processo 21	Projeto executivo e obra de restauro e requalificação	0. em planejamento	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	104.758,82	0,00	0,00	0,00	0,00%
15	Centro Cultural Tendal da Lapa	Sem processo 26	Projeto executivo de reforma e restauro	7. pausado	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
15	Centro Cultural Tendal da Lapa	6025.2023/0034072-0	Levantamento de edificações e terreno	4. em licitação	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	104.500,00	62.184,93	0,00	0,00	0,00%
16	Biblioteca Pedro Nava	Sem processo 14	Projeto executivo e Obra de reforma e manutenção predial	0. em planejamento	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
16	Biblioteca Pedro Nava	6025.2023/0034072-0	Levantamento de edificações e terreno	4. em licitação	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	60.000,00	35.704,27	0,00	0,00	0,00%
17	Escola Municipal de Iniciação Artística - Perus	6025.2023/0034072-0	Levantamento de edificações e terreno	4. em licitação	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	37.000,00	22.017,63	0,00	0,00	0,00%
18	Casa de Cultura Itaim Paulista	6025.2023/0034072-0	Levantamento de edificações e terreno	4. em licitação	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	24.000,00	14.281,71	0,00	0,00	0,00%
19	Casa de Cultura Hip-Hop Sul	6025.2023/0034072-0	Levantamento de edificações e terreno	4. em licitação	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	9.000,00	5.355,64	0,00	0,00	0,00%
20	Casa do Caxingui	6025.2023/0034072-0	Levantamento de edificações e terreno	4. em licitação	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	44.300,00	26.361,65	0,00	0,00	0,00%

Item	Equipamento cultural	Processo	Ação	Status	Dotação orçamentária	Valor aprovado abril/2025	Empenhado	Liquidado	Pago	% de liquidação do valor aprovado
21	Biblioteca Ricardo Ramos	6025.2023/0034072-2	Levantamento de edificações e terreno	4. em licitação	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
22	Biblioteca Padre José de Anchieta	6025.2023/0034072-0	Levantamento de edificações e terreno	4. em licitação	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	10.300,00	6.129,23	0,00	0,00	0,00%
22	Biblioteca Padre José de Anchieta	Sem processo 13	Reforma e manutenção predial	7. pausado	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
23	Biblioteca Álvares de Azevedo	6025.2023/0034072-0	Levantamento de edificações e terreno	4. em licitação	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	20.000,00	11.901,42	0,00	0,00	0,00%
24	Biblioteca Narbal Fontes	Sem processo	Levantamento de edificações e terreno	0. em planejamento	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
24	Biblioteca Narbal Fontes	Sem processo	Projeto executivo de reforma e restauro	0. em planejamento	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
25	Teatro Flávio Império	6025.2023/0034072-0	Levantamento de edificações e terreno	4. em licitação	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	20.000,00	11.901,42	0,00	0,00	0,00%
25	Teatro Flávio Império	Sem processo	Projeto executivo estrutural e de drenagem	0. em planejamento	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
26	Biblioteca Arnaldo Magalhães Giácomo	6025.2023/0034072-0	Levantamento de edificações e terreno	4. em licitação	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	18.000,00	10.711,28	0,00	0,00	0,00%
27	Biblioteca Sérgio Buarque de Holanda	6025.2023/0034072-0	Levantamento de edificações e terreno	4. em licitação	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	152.000,00	90.450,81	0,00	0,00	0,00%
27	Biblioteca Sérgio Buarque de Holanda	Sem processo 17	Projeto executivo de reforma e restauro	0. em planejamento	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
27	Biblioteca Sérgio Buarque de Holanda	Sem processo 18	Reforma em imóvel tombado	1. em desenvolvimento	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
27	Biblioteca Sérgio Buarque de Holanda	Sem processo 18	Reforma e manutenção da área externa	0. em planejamento	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
28	Biblioteca Cassiano Ricardo	Sem processo 4	Projeto executivo de reforma	0. em planejamento	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
29	Biblioteca Roberto Santos	6025.2024/0017170-0	Reforma e manutenção predial	4. em execução/obra	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	239.316,47	239.316,27	239.316,27	239.316,27	100,00%
29	Biblioteca Roberto Santos	Sem processo 16	Reforma em imóvel tombado - Instalações elétricas e SPDA	7. pausado	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
30	Biblioteca Castro Alves	6025.2024/0026619-0	Reforma e manutenção predial	5. em execução/obra	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	991.082,45	932.056,49	932.053,26	746.896,59	94,04%

Item	Equipamento cultural	Processo	Ação	Status	Dotação orçamentária	Valor aprovado abril/2025	Empenhado	Liquidado	Pago	% de liquidação do valor aprovado
31	Biblioteca Aureliano Leite	6025.2024/0023990-8	Reforma e manutenção predial	5. em execução/obra	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	168.647,43	137.387,97	71.075,48	71.075,48	42,14%
32	Casa de Cultura da Brasilândia	6025.2024/0026807-0	Reforma e manutenção predial	5. em execução/obra	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	1.151.349,65	951.349,65	861.677,02	861.677,02	74,84%
33	Biblioteca Milton Santos	Sem processo 12	Reforma e manutenção predial	0. em planejamento	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
34	Biblioteca Vinicius de Moraes	Sem processo 19	Reforma e manutenção predial	1. em desenvolvimento	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
35	Bibliotecas Hans Christian Andersen	Sem processo 20	Projeto executivo de reforma	7. pausado	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
36	Casa de Cultura Perus	Sem processo 14	Projeto executivo para construção de Casa de Cultura em Perus	0. em planejamento	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
37	Casa de Cultura Pirituba	Sem processo 15	Construção de Casa de Cultura em Pirituba	0. em planejamento	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
38	Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso	6025.2023/0005660-7	Serviços Cíveis de Adequação hidráulica e instalação de sala de dança	5. em execução/obra	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	31.086,77	31.086,77	0,00	0,00	0,00%
39	Edifício Sampaio Moreira	6025.2023/0016820-0	3ª Fase de Obras de restauro - Fase Piso Térreo	4. em execução/obra	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	309.407,73	132.164,06	0,00	0,00	0,00%
39	Edifício Sampaio Moreira	6025.2025/0005330-0	Instalação de divisórias de vidro no Edifício Sampaio Moreira	0. em planejamento	98.25.13.391.3001.5.957.44903900.08.1.759.0402.0	75.981,17	0,00	0,00	0,00	0,00%
40	Centro Cultural Vila Itororó	Sem processo	Reforço estrutural	0. em planejamento	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
40	Centro Cultural Vila Itororó	Sem processo	Projeto executivo para reforma e manutenção predial	0. em planejamento	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
41	Biblioteca Alceu Amoroso Lima	Sem processo	Reforma e manutenção predial - Guarda-corpo	1. em desenvolvimento	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	137.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
42	Biblioteca Nuto Sant'anna	Sem processo	Reforma e manutenção predial	1. em desenvolvimento	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
43	Escola Municipal de Iniciação Artística - Cantinho do céu	Sem processo	Instalação de ar-condicionado	0. em planejamento	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
43	Escola Municipal de Iniciação Artística - Cantinho do céu	Sem processo	Instalação de elevador	0. em planejamento	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Item	Equipamento cultural	Processo	Ação	Status	Dotação orçamentária	Valor aprovado abril/2025	Empenhado	Liquidado	Pago	% de liquidação do valor aprovado
44	Centro de Culturas Negras	Sem processo	Projeto executivo de reforma	0. em planejamento	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
45	Casa de Cultura Cidade Ademar	6025.2022/0018097-7	Despesa do Exercício Anterior 2024 - Implantação da Casa de Cultura Cidade Ademar	6. finalizado	98.25.13.392.3001.5.425.44909200.08.1.759.0402.1	390.375,56	0,00	0,00	0,00	0,00%
46	Biblioteca Monteiro Lobato	Sem processo	Projeto executivo para reforma e manutenção predial	0. em planejamento	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
47	Casa das Retortas	Sem processo	Projeto executivo de reforma e restauro	0. em planejamento	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	1.202.509,28	0,00	0,00	0,00	0,00%
48	Territórios Culturais para a Primeira Infância na Subprefeitura da Sé	Sem processo 27	Projetos Técnicos e Acompanhamento Executivo Complementar para implantação do projeto Territórios Culturais para a Primeira Infância	0. em planejamento	98.25.13.392.3001.5.400.44905100.08.1.759.0402.0	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
49	Casa Modernista	Sem processo	Obra de reforma e restauro	0. em planejamento	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
50	Chácara Lane	Sem processo	Obra de reforma e restauro	0. em planejamento	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
51	Cine Art Palácio	Sem processo	Projeto executivo de reforma e restauro	0. em planejamento	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
52	Manutenção de dotação	Sem processo 30	Construção de Equipamentos Culturais	9. Pausado	98.25.13.392.3001.5.959.44905100.08.1.759.0402.0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
52	Manutenção de dotação	Sem processo 29	Implantação de Distritos Criativos	9. Pausado	98.25.13.392.3020.5.426.44905100.08.1.759.0402.0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
						39.756.345,00	16.240.069,51	4.196.795,36	2.559.107,11	10,56%

1. Centro Cultural São Paulo

Reforma de manutenção predial - impermeabilizações

Ação: Reforma de manutenção predial - impermeabilizações

Status: Finalizado

Processo: 6025.2024/0014973-9

Início da obra: 30/09/2024

Previsão de término: 29/03/2025

Valor: R\$ 262.557,23

Empenhado: R\$ 262.425,15

Liquidado: R\$ 262.423,71

Pago: R\$ -

% de liquidação: 99,95%

Endereço: Rua Vergueiro, 1000

Distrito: Liberdade

Subprefeitura: Sé



1. Centro Cultural São Paulo

Reforma das Fachadas

Ação: Reforma das Fachadas

Status: Em Execução/Obra

Processo: 6025.2023/0002933-2

Início da obra: 17/06/2024

Previsão de término: junho/2025

Valor: R\$ 409.058,25

Empenhado: R\$ 1.907.702,67

Liquidado: R\$ 1.065.599,23


Pago: R\$ 297.317,52

% de liquidação: 260,50%

Endereço: Rua Vergueiro, 1000

Distrito: Liberdade

Subprefeitura: Sé

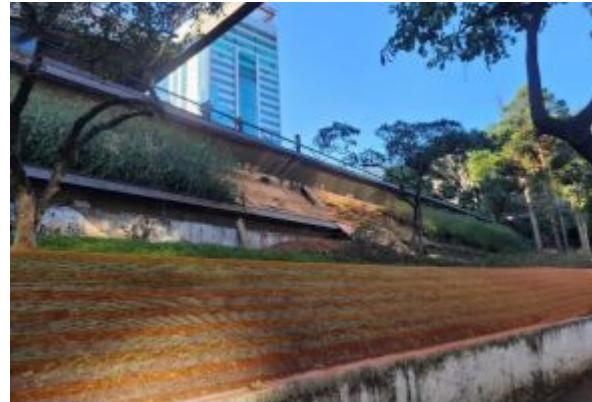

Fotos: 31/03/2025

1. Centro Cultural São Paulo

Reforma de manutenção predial - cobertura zenital

Ação: Reforma de manutenção predial

Status: Finalizado

Processo: 6025.2024/0014937-2

Início da obra: 07/10/2024

Previsão de término: 05/04/2025

Valor: R\$ 332.668,03

Empenhado: R\$ 368.282,84

Liquidado: R\$ 368.278,86


Pago: R\$ -

% de liquidação: 110,70%

Endereço: Rua Vergueiro, 1000

Distrito: Liberdade

Subprefeitura: Sé

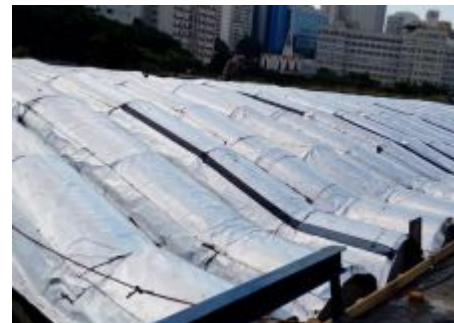

2. Sítio Mirim

Reconstrução da Casa-Sede

Ação: Reconstrução da Casa-Sede

Status: Em Execução/Obra

Processo: 6025.2020/0016806-0

Início da obra: 03/06/2024

Previsão de término: fevereiro/2026

Valor: R\$ 3.157.375,70

Empenhado: R\$ 2.194.664,72

Liquidado: R\$ 144.729,61


Pago: R\$ 144.729,61

% de liquidação: 4,58%

Endereço: Estrada Assis Ribeiro, 10573

Distrito: Vila Jacuí

Subprefeitura: São Miguel Paulista

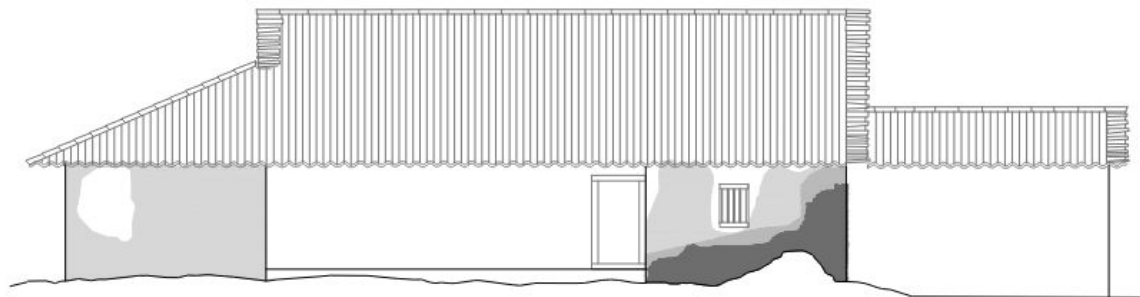

3. Sítio Morrinhos

Restauro, segurança contra incêndio e acessibilidade

Ação: Restauro, segurança contra incêndio e acessibilidade

Status: Em Execução/Obra

Processo: 6025.2022/0022026-0

Início da obra: 29/05/2024

Previsão de término: abril/2025

Valor: R\$ 2.152.774,86

Empenhado: R\$ 1.589.774,96

Liquidado: R\$ 150.111,87

Pago: R\$ 150.111,87

% de liquidação: 6,97%

Endereço: Rua Santo Anselmo, 101

Distrito: Casa Verde

Subprefeitura: Casa Verde/Cachoeirinha



Fotos 16/04/2025

4. Teatro João Caetano

Reforma geral para Acessibilidade, Segurança contra incêndio,
Conservação e Restauro.

Ação: Reforma geral para Acessibilidade,
Segurança contra incêndio, Conservação e
Restauro

Status: Em Execução/Obra

Processo: 6025.2022/0011336-6

Início da obra: 19/12/2022

Previsão de término: junho/2025

Valor: R\$ 1.772.051,97

Empenhado: R\$ 496.857,96

Liquidado: R\$ 101.530,05

Pago: R\$ 47.982,75

% de liquidação: 5,73%

Endereço: Rua Borges Lagoa, 650

Distrito: Vila Mariana

Subprefeitura: Vila Mariana



Fotos do período de 09/02/2025 até 19/02/2025

8. Casa de Cultura São Mateus

Construção de Novo Edifício

Ação: Construção de Novo Edifício

Status: Em licitação

Processo: 6025.2024/0023689-5

Início da obra: 31/03/2025

Previsão de término: junho/2026

Valor: R\$ 3.655.330,00

Empenhado: R\$ 6.700.000,00

Liquidado: R\$ -


Pago: R\$ -

% de liquidação: 0,00%

Endereço: Rua Monte Mandirá, 40

Distrito: São Mateus

Subprefeitura: São Mateus

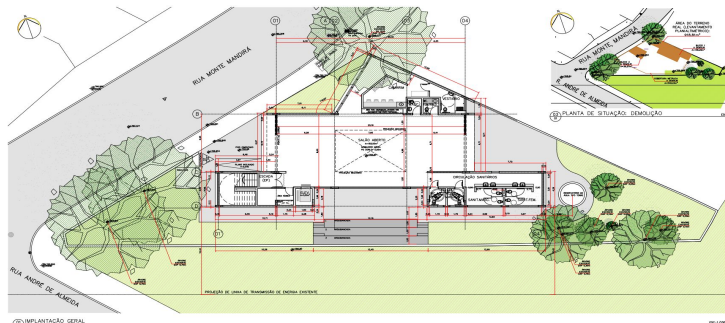

15. Centro Cultural Tendal da Lapa

Levantamento de edificações e terreno

Ação: Levantamento de edificações e terreno

Status: Em licitação

Processo: 6025.2023/0034072-0

Início da obra: 14/04/2025

Previsão de término: dezembro/2025

Valor: R\$ 104.500,00

Empenhado: R\$ 62.184,93

Liquidado: R\$ -


Pago: R\$ -

% de liquidação: 0,00%

Endereço: R Guaicurus, 1.100

Distrito: Lapa

Subprefeitura: Lapa

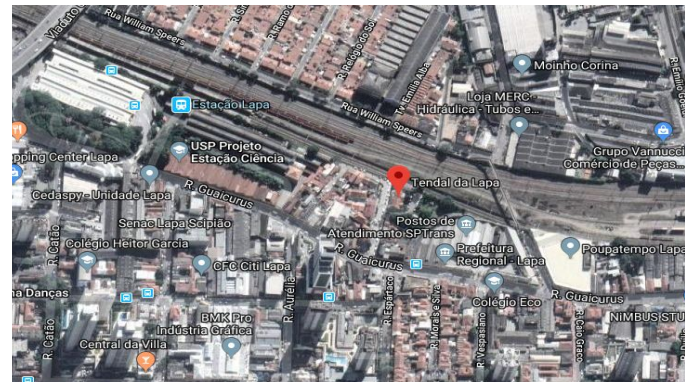

16. Biblioteca Pedro Nava

Levantamento de edificações e terreno

Ação: Levantamento de edificações e terreno

Status: Em licitação

Processo: 6025.2023/0034072-0

Início da obra: 14/04/2025

Previsão de término: dezembro/2025

Valor: R\$ 60.000,00

Empenhado: R\$ 35.704,27

Liquidado: R\$ -


Pago: R\$ -

% de liquidação: 0,00%

Endereço: Av. Eng. Caetano Álvares, 5903 -
Mandaqui, São Paulo - SP, 02413-100

Distrito: Mandaqui

Subprefeitura: Santana-Tucuruvi

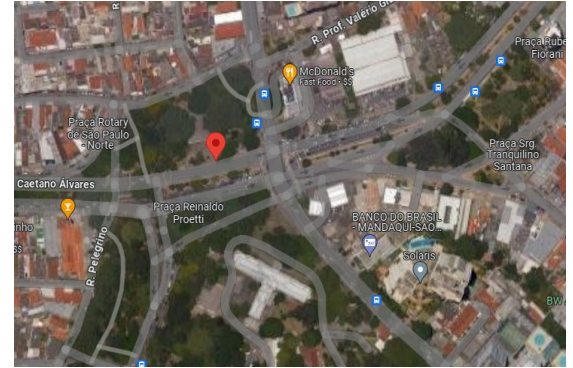

17. Escola Municipal de Iniciação Artística - Perus

Levantamento de edificações e terreno

Ação: Levantamento de edificações e terreno

Status: Em licitação

Processo: 6025.2023/0034072-0

Início da obra: 14/04/2025

Previsão de término: dezembro/2025

Valor: R\$ 37.000,00

Empenhado: R\$ 22.017,63

Liquidado: R\$ -

Pago: R\$ -

% de liquidação: 0,00%

Endereço: Rua Joaquim Antonio Arruda, 74 -
Perus

Distrito: Perus

Subprefeitura: Perus



18. Casa de Cultura Itaim Paulista

Levantamento de edificações e terreno

Ação: Levantamento de edificações e terreno

Status: Em licitação

Processo: 6025.2023/0034072-0

Início da obra: 14/04/2025

Previsão de término: dezembro/2025

Valor: R\$ 24.000,00

Empenhado: R\$ 14.281,71

Liquidado: R\$ -


Pago: R\$ -

% de liquidação: 0,00%

Endereço: R. Monte Camberela, 490 - Vila Silva
Teles, São Paulo - SP, 08142-444

Distrito: Itaim Paulista

Subprefeitura: Itaim Paulista

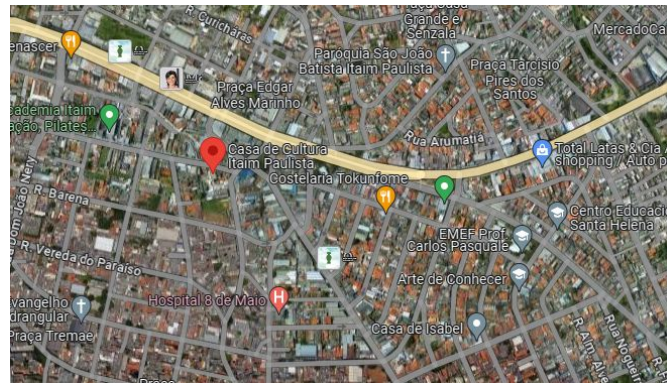

19. Casa de Cultura Hip-Hop Sul

Levantamento de edificações e terreno

Ação: Levantamento de edificações e terreno

Status: Em licitação

Processo: 6025.2023/0034072-0

Início da obra: 14/04/2025

Previsão de término: dezembro/2025

Valor: R\$ 9.000,00

Empenhado: R\$ 5.355,64

Liquidado: R\$ -

Pago: R\$ -

% de liquidação: 0,00%

Endereço: Rua Sant'Ana, 201 - Vila Sao Pedro, São Paulo - SP, 04676-110

Distrito: Santo Amaro

Subprefeitura: Santo Amaro



20. Casa do Caxingui

Levantamento de edificações e terreno

Ação: Levantamento de edificações e terreno

Status: Em licitação

Processo: 6025.2023/0034072-0

Início da obra: 14/04/2025

Previsão de término: dezembro/2025

Valor: R\$ 44.300,00

Empenhado: R\$ 26.361,65

Liquidado: R\$ -


Pago: R\$ -

% de liquidação: 0,00%

Endereço: Praça Ênio Barbato, s/n - Caxingui, São Paulo - SP, 05517-040

Distrito: Butantã

Subprefeitura: Butantã

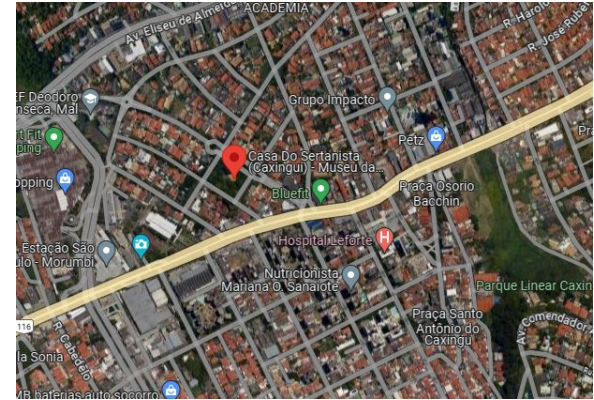

22. Biblioteca Padre José de Anchieta

Levantamento de edificações e terreno

Ação: Levantamento de edificações e terreno

Status: Em licitação

Processo: 6025.2023/0034072-0

Início da obra: 14/04/2025

Previsão de término: dezembro/2025

Valor: R\$ 10.300,00

Empenhado: R\$ 6.129,23

Liquidado: R\$ -


Pago: R\$ -

% de liquidação: 0,00%

Endereço: R. Antônio Maia, 651 - Vila Perus, São Paulo - SP, 05204-110

Distrito: Perus

Subprefeitura: Perus

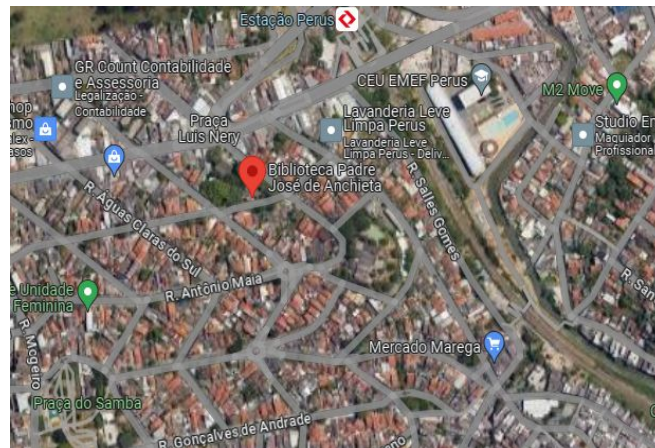

23. Biblioteca Álvares de Azevedo

Levantamento de edificações e terreno

Ação: Levantamento de edificações e terreno

Status: Em licitação

Processo: 6025.2023/0034072-0

Início da obra: 14/04/2025

Previsão de término: dezembro/2025

Valor: R\$ 20.000,00

Empenhado: R\$ 11.901,42

Liquidado: R\$ -

Pago: R\$ -

% de liquidação: 0,00%

Endereço: Praça Joaquim José da Nova, s/n

Distrito: Vila Maria

Subprefeitura: Vila Maria / Vila Guilherme



25. Teatro Flávio Império

Levantamento de edificações e terreno

Ação: Levantamento de edificações e terreno

Status: Em licitação

Processo: 6025.2023/0034072-0

Início da obra: 14/04/2025

Previsão de término: dezembro/2025

Valor: R\$ 20.000,00

Empenhado: R\$ 11.901,42

Liquidado: R\$ -

Pago: R\$ -

% de liquidação: 0,00%

Endereço: R Prof. Alves Pedroso, 600

Distrito: Cangaíba

Subprefeitura: Penha



26. Biblioteca Arnaldo Magalhães Giácomo

Levantamento de edificações e terreno

Ação: Levantamento de edificações e terreno

Status: Em licitação

Processo: 6025.2023/0034072-0

Início da obra: 14/04/2025

Previsão de término: dezembro/2025

Valor: R\$ 18.000,00

Empenhado: R\$ 10.711,28

Liquidado: R\$ -

Pago: R\$ -

% de liquidação: 0,00%

Endereço: R. Restinga, 136 - Tatuapé, São Paulo - SP, 03065-020

Distrito: Tatuapé

Subprefeitura: Mooca



27. Biblioteca Sérgio Buarque de Holanda

Levantamento de edificações e terreno

Ação: Levantamento de edificações e terreno

Status: Em licitação

Processo: 6025.2023/0034072-0

Início da obra: 14/04/2025

Previsão de término: dezembro/2025

Valor: R\$ 152.000,00

Empenhado: R\$ 90.450,81

Liquidado: R\$ -

Pago: R\$ -

% de liquidação: 0,00%

Endereço: R. Restinga, 136 - Tatuapé, São Paulo - SP, 03065-020

Distrito: Tatuapé

Subprefeitura: Mooca



29. Biblioteca Roberto Santos

Reforma e manutenção predial

Ação: Reforma e manutenção predial

Status: Em Execução/Obra

Processo: 6025.2024/0017170-0

Início da obra: 27/09/2024

Previsão de término: 25/02/2025

Valor: R\$ 239.316,47

Empenhado: R\$ 239.316,27

Liquidado: R\$ 239.316,27

Pago: R\$ 239.316,27

% de liquidação: 100,00%

Endereço: Rua Cisplatina, 505

Distrito: Ipiranga

Subprefeitura: Ipiranga



Fotos do período de 01/12/2024 a 31/12/2024

30. Biblioteca Castro Alves

Reforma e manutenção predial

Ação: Reforma e manutenção predial

Status: Em Execução/Obra

Processo: 6025.2024/0026619-0

Início da obra: 14/11/2024

Previsão de término: 14/03/2025

Valor: R\$ 991.082,45

Empenhado: R\$ 932.056,49

Liquidado: R\$ 932.053,26

Pago: R\$ 746.896,59

% de liquidação: 94,04%

Endereço: Rua Abrahão Mussa, s/n - Jardim
Patente Novo

Distrito: Sacomã

Subprefeitura: Ipiranga



Fotos do período de 14/11/2024 a 31/12/2024

31. Biblioteca Aureliano Leite

Reforma e manutenção predial

Ação: Reforma e manutenção predial

Status: Em Execução/Obra

Processo: 6025.2024/0023990-8

Início da obra: 03/10/2024

Previsão de término: 02/04/2025

Valor: R\$ 168.647,43

Empenhado: R\$ 137.387,97

Liquidado: R\$ 71.075,48


Pago: R\$ 71.075,48

% de liquidação: 42,14%

Endereço: Rua Otto Shubart, 196 - Parque São Lucas

Distrito: São Lucas

Subprefeitura: Vila Prudente

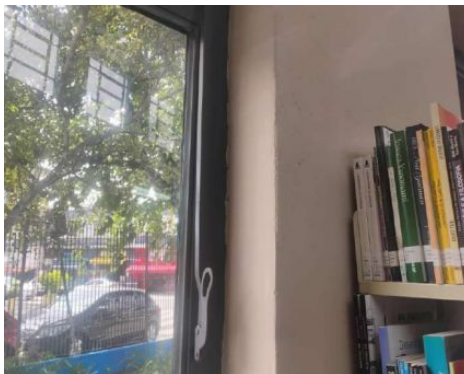

Fotos do período de 01/03/2025 a 02/04/2025

32. Casa de Cultura da Brasilândia

Reforma e manutenção predial

Ação: Reforma e manutenção predial

Status: Finalizada

Processo: 6025.2024/0026807-0

Início da obra: 14/11/2024

Término: 13/03/2025

Valor: R\$ 1.151.349,65

Empenhado: R\$ 951.349,65

Liquidado: R\$ 861.677,02

Pago: R\$ 861.677,02

% de liquidação: 74,84%

Endereço: Praça Benedicta Cavalheiro, s/nº -
Freguesia do Ó

Distrito: Freguesia do Ó

Subprefeitura: Freguesia/Brasilândia



Fotos do período de 01/12/2024 até 31/12/2024

Serviços Cíveis de Adequação hidráulica e instalação de sala de dança

Status: Em Execução/Obra

Processo: 6025.2023/0005660-7

Início dos serviços: 15/12/2023

Previsão de término: 14/06/2025

Valor: R\$ 31.086,77

Empenhado: R\$ 31.086,77

Liquidado: R\$ -


Pago: R\$ -

% de liquidação: 0,00%

Endereço: Av. Dep. Emílio Carlos, 3641 - Vila dos Andrades, São Paulo - SP, 02721-200

Distrito: Vila Nova Cachoeirinha

Subprefeitura: Casa Verde/Cachoeirinha

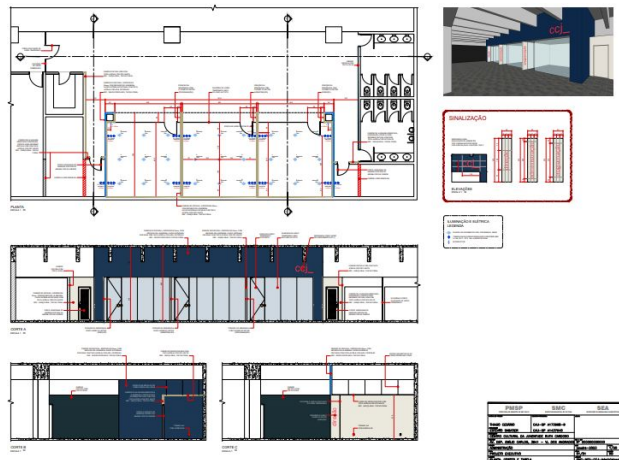

39. Edifício Sampaio Moreira

3ª Fase de Obras de restauro - Fase Piso Térreo

Ação: 3ª Fase de Obras de restauro -
Fase Piso Térreo

Status: Em Execução/Obra

Processo: 6025.2023/0016820-0

Início da obra: 02/10/2023

Previsão de término: 02/07/2025

Valor: R\$ 309.407,73

Empenhado: R\$ 132.164,06

Liquidado: R\$ -

Pago: R\$ -

% de liquidação: 0,00%

Endereço: R. Líbero Badaró, 346

Distrito: Sé

Subprefeitura: Sé

