



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
CULTURA

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO – FUNDURB

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2024

Planilha e Relatório Fotográfico

Prestação de contas do FUNDURB (98.25)

Execução orçamentária por item do plano aprovado

Prestação de contas do FUNDURB (98.25)

Execução orçamentária por dotação

DOTAÇÃO	Solicitado (R\$)	Execução orçamentária 2024				Liquidado com restos a pagar	Pago com restos a pagar
		Reservado (R\$)	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$) (até 31/12/2024)		
98.25.13.391.3001.5.957.44903900.08.1.759.0	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0	R\$ 17.997.739,22	R\$ 15.411.110,93	R\$ 15.411.110,93	R\$ 9.031.297,10	R\$ 8.906.423,43	R\$ 12.139.971,77	R\$ 12.015.098,10
98.25.13.391.3001.5.957.44909200.08.1.759.0	R\$ 27.750,96	R\$ 27.750,96	R\$ 27.750,96	R\$ 27.750,96	R\$ 27.750,96	R\$ 27.750,96	R\$ 27.750,96
98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
98.25.13.392.3001.5.960.44903900.08.1.759.0	R\$ 1.204.547,22	R\$ 603.838,31	R\$ 603.838,31	R\$ 603.838,31	R\$ 603.838,31	R\$ -	R\$ 603.838,31
98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0	R\$ 11.191.184,84	R\$ 6.636.640,75	R\$ 6.636.640,75	R\$ 5.395.610,20	R\$ 4.457.597,68	R\$ 8.000.355,36	R\$ 7.062.342,84
98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0	R\$ 11.412.301,58	R\$ 2.435.063,44	R\$ 2.435.063,44	R\$ 85.280,93	R\$ 85.280,93	R\$ 1.635.369,83	R\$ 1.635.369,83
98.25.13.392.3001.5.959.44905100.08.1.759.0	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
98.25.13.392.3001.5.400.44905100.08.1.759.0	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
98.25.13.391.3001.5.421.44905100.08.1.759.0	R\$ 34.000,00	R\$ 34.000,00	R\$ 34.000,00	R\$ 34.000,00	R\$ 34.000,00	R\$ 34.000,00	R\$ 34.000,00
98.25.13.392.3001.5.425.44905100.08.1.759.0	R\$ 5.359.782,00	R\$ 5.345.942,54	R\$ 5.345.942,54	R\$ 5.345.942,54	R\$ 5.345.942,54	R\$ 5.345.942,54	R\$ 5.345.942,54
98.25.13.392.3001.5.425.44905100.08.1.759.0	R\$ 2.649.509,81	R\$ 2.259.134,25	R\$ 2.259.134,25	R\$ 1.640.823,50	R\$ 1.640.823,50	R\$ 2.257.716,26	R\$ 2.257.716,26
98.25.13.392.3020.5.426.44905100.08.1.759.0	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	R\$ 49.979.815,63	R\$ 32.753.481,18	R\$ 32.753.481,18	R\$ 22.164.543,54	R\$ 21.101.657,35	R\$ 29.441.106,72	R\$ 28.982.058,84
		65,53%	65,53%	44,35%	42,22%	58,91%	57,99%

Item	Equipamento cultural	Ação	Processo	Status	Dotação orçamentária	Valor	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$) (até 31/12/2024)	Liquidado restos a pagar (R\$)	Liquidado total	Pago restos a pagar (R\$)	Pago total	% do pago do valor aprovado no último plano de
1	Centro Cultural São Paulo	Reforma das Fechadas	6025.2023/0002933-2	4. em execução/obra	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 3.875.840,51	R\$ 3.858.385,06	R\$ 3.008.063,66	R\$ 3.008.063,66	R\$ 553.203,60	R\$ 3.561.267,26	R\$ 553.203,60	R\$ 3.561.267,26	91,9%
1	Centro Cultural São Paulo	Reforma de manutenção predial - cobertura zenital	6025.2024/0014937-2	4. em execução/obra	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 750.000,00	R\$ 1.061.658,65	R\$ 511.658,63	R\$ 511.658,63	R\$ 514.308,44	R\$ 1.023.967,09	R\$ 514.308,44	R\$ 1.023.967,09	136,8%
1	Centro Cultural São Paulo	Reforma de manutenção predial - impermeabilizações	6025.2024/0014973-9	4. em execução/obra	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 750.000,00	R\$ 1.120.542,07	R\$ 570.542,07	R\$ 570.542,07	R\$ 549.999,74	R\$ 1.120.541,81	R\$ 549.999,74	R\$ 1.120.541,81	149,4%
2	Casa de Cultura Cidade Ademar	Implantação da Casa de Cultura	6025.2022/0018097-7	4. em execução/obra	98.25.13.392.3001.5.425.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 5.359.782,00	R\$ 5.345.942,54	R\$ 5.345.942,54	R\$ 5.345.942,54	R\$ -	R\$ 5.345.942,54	R\$ -	R\$ 5.345.942,54	99,7%
2	Casa de Cultura Cidade Ademar	Implantação da Casa de Cultura	6025.2022/0018097-7	4. em execução/obra	98.25.13.392.3001.5.425.44905100.08.1.759.0402.1	R\$ 2.649.509,81	R\$ 2.259.134,25	R\$ 1.640.823,50	R\$ 1.640.823,50	R\$ 616.892,76	R\$ 2.257.716,26	R\$ 616.892,76	R\$ 2.257.716,26	85,2%
3	Sítio Mirim	Reconstrução da Casa-sede	6025.2020/0016806-0	4. em execução/obra	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 800.000,00	R\$ 2.539.459,99	R\$ 95.872,80	R\$ 95.872,80	R\$ 248.922,47	R\$ 344.795,27	R\$ 248.922,47	R\$ 344.795,27	43,1%
4	Sítio Morrinhos	Restaur. segurança contra incêndio e acessibilidade	6025.2022/0022026-0	4. em execução/obra	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 200.000,00	R\$ 440.143,84	R\$ 440.143,84	R\$ 440.143,84	R\$ -	R\$ 440.143,84	R\$ -	R\$ 440.143,84	220,1%
5	Centro Cultural Penha	Serviços Corretivos para AVCB	6025.2018/0009114-4	6. finalizado	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 211.536,40	R\$ 211.536,40	R\$ 211.536,40	R\$ 211.536,40	R\$ -	R\$ 211.536,40	R\$ -	R\$ 211.536,40	100,0%
6	Teatro João Caetano	Reforma geral para Acessibilidade, Segurança contra incêndio, Conservação e Restauro.	6025.2022/0011336-6	4. em execução/obra	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 8.533.266,05	R\$ 4.719.698,21	R\$ 3.384.544,74	R\$ 3.384.544,74	R\$ 838.255,51	R\$ 4.222.800,25	R\$ 838.255,51	R\$ 4.222.800,25	49,5%
7	Edifício Sampaio Moreira	3ª Fase de Obras de restauro - Fase Piso Térreo	6025.2023/0016820-0	4. em execução/obra	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 585.775,61	R\$ 585.775,61	R\$ 453.611,55	R\$ 453.611,55	R\$ -	R\$ 453.611,55	R\$ -	R\$ 453.611,55	77,4%
8	Casa de Cultura Parelheiros	Manutenção Predial	6025.2023/0015198-7	6. finalizado	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 347.516,67	R\$ 346.827,11	R\$ 346.827,11	R\$ 346.827,11	R\$ -	R\$ 346.827,11	R\$ -	R\$ 346.827,11	99,8%
9	Praça das Artes	3ª fase - Obras complementares dos corpos artísticos	8510.2022/0000503-4	4. em execução/obra	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 3.803.543,67	R\$ 2.703.326,18	R\$ 2.289.743,44	R\$ 1.351.730,92	R\$ 2.149.782,51	R\$ 4.439.525,95	R\$ 2.149.782,51	R\$ 3.501.513,43	92,1%
9	Praça das Artes	3ª fase - Obras complementares dos corpos artísticos	8510.2022/0000503-4	4. em execução/obra	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.1	R\$ 2.149.782,51	R\$ 2.149.782,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.350.088,90	R\$ 1.350.088,90	R\$ 1.350.088,90	R\$ 1.350.088,90	62,8%
9	Praça das Artes	3ª fase - Gerenciamento e fiscalização de obra - Praça das Artes	8510.2022/0000503-4	4. em execução/obra	98.25.13.392.3001.5.960.44903900.08.1.759.0402.0	R\$ 595.332,62	R\$ 603.838,31	R\$ 603.838,31	R\$ 603.838,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 603.838,31	101,4%
10	Memorial dos Afritos	Sondagem e Parecer de fundações para implantação do Edifício do Memorial dos Afritos.	6025.2023/0014412-3	6. finalizado	98.25.13.391.3001.5.421.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 34.000,00	R\$ 34.000,00	R\$ 34.000,00	R\$ 34.000,00	R\$ -	R\$ 34.000,00	R\$ -	R\$ 34.000,00	100,0%
11	Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso	Serviços Cíveis de Adequação hidráulica e instalação de sala de dança	6025.2023/0005660-7	4. em execução/obra	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 398.445,44	R\$ 398.445,44	R\$ 367.358,67	R\$ 367.358,67	R\$ -	R\$ 367.358,67	R\$ -	R\$ 367.358,67	92,1%
11	Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso	Serviços corretivos de AVCB	6025.2022/0011088-0	6. finalizado	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 663.256,69	R\$ 663.256,69	R\$ 663.256,69	R\$ 663.256,69	R\$ -	R\$ 663.256,69	R\$ -	R\$ 663.256,69	100,0%
12	Biblioteca Chácara do Castelo	Requalificação	6025.2023/0017795-1	6. finalizado	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 1.100.205,62	R\$ 1.100.205,62	R\$ 732.596,38	R\$ 732.596,38	R\$ 289.159,94	R\$ 1.021.756,32	R\$ 289.159,94	R\$ 1.021.756,32	92,9%
14	Casa de Cultura Vila Guilherme	Projeto executivo de restauro	6025.2022/0003748-1	6. finalizado	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 359.149,67	R\$ 222.990,73	R\$ 133.535,38	R\$ 133.535,38	R\$ 89.455,35	R\$ 222.990,73	R\$ 89.455,35	R\$ 222.990,73	62,1%
18	Arquivo Histórico Municipal	Serviços corretivos de AVCB - CMAR	6025.2023/0024465-9	6. finalizado	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 58.000,00	R\$ 48.789,39	R\$ 48.789,39	R\$ 48.789,39	R\$ -	R\$ 48.789,39	R\$ -	R\$ 48.789,39	84,1%
18	Arquivo Histórico Municipal	Instalação de linha de vida	6025.2023/0030077-0	6. finalizado	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 127.500,00	R\$ 127.500,00	R\$ 58.461,22	R\$ 58.461,22	R\$ 69.038,78	R\$ 127.500,00	R\$ 69.038,78	R\$ 127.500,00	100,0%
19	Sítio da Ressaca	Pagamento de Despesa do Exercício Anterior	6025.2023/0025407-7	6. finalizado	98.25.13.391.3001.5.957.44909200.08.1.759.0402.1	R\$ 27.750,96	R\$ 27.750,96	R\$ 27.750,96	R\$ 27.750,96	R\$ -	R\$ 27.750,96	R\$ -	R\$ 27.750,96	100,0%
27	Biblioteca Brito Broca	Reforma e manutenção predial	6025.2024/0015470-8	6. finalizado	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 722.942,96	R\$ 722.824,10	R\$ 722.824,10	R\$ 722.824,10	R\$ -	R\$ 722.824,10	R\$ -	R\$ 722.824,10	100,0%
30	Biblioteca Roberto Santos	Reforma e manutenção predial	6025.2024/0017170-0	4. em execução/obra	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 686.007,38	R\$ 686.007,38	R\$ 326.073,80	R\$ 201.200,13	R\$ 245.490,78	R\$ 571.564,58	R\$ 245.490,78	R\$ 446.690,91	65,1%
31	Biblioteca Castro Alves	Reforma e manutenção predial	6025.2024/0026619-0	4. em execução/obra	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 1.040.974,00	R\$ 260.243,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 108.917,55	R\$ 108.917,55	R\$ 108.917,55	R\$ 108.917,55	10,5%
33	Biblioteca Aureliano Leite	Reforma e manutenção predial	6025.2024/0023990-8	4. em execução/obra	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 229.975,70	R\$ 229.975,70	R\$ 61.467,41	R\$ 61.467,41	R\$ 56.885,16	R\$ 118.352,57	R\$ 56.885,16	R\$ 118.352,57	51,5%
34	Casa de Cultura da Brasília	Reforma e manutenção predial	6025.2024/0026807-0	4. em execução/obra	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.1	R\$ 1.236.630,58	R\$ 285.280,93	R\$ 85.280,93	R\$ 85.280,93	R\$ 200.000,00	R\$ 285.280,93	R\$ 200.000,00	R\$ 285.280,93	23,1%
Total						R\$ 49.979.815,63	R\$ 32.753.481,18	R\$ 22.164.543,54	R\$ 21.101.657,35	R\$ 7.880.401,49	R\$ 29.441.106,72	R\$ 7.880.401,49	R\$ 28.982.058,64	57,99%

1. Centro Cultural São Paulo

Reforma das Fachadas

Ação: Reforma das Fachadas

Status: Em Execução/Obra

Processo: 6025.2023/0002933-2

Início da obra: 17/06/2024

Previsão de término: 30/03/26

Valor: R\$ 3.875.840,51

Empenhado: R\$ 3.858.585,06

Liquidado: R\$ 3.008.063,66

Pago: R\$ 3.008.063,66

% do pago do valor aprovado no último plano da SMC: 91,9%

Endereço: Rua Vergueiro, 1000

Distrito: Liberdade

Subprefeitura: Sé



NOVOS VIDROS INSTALADOS



LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHO

Fotos: 21/01/2025



JARDINAGEM

1. Centro Cultural São Paulo

Reforma de manutenção predial - cobertura zenital

Ação: Reforma de manutenção predial

Status: Em Execução/Obra

Processo: 6025.2024/0014937-2

Início da obra: 07/10/2024

Previsão de término: 06/04/2025

Valor: R\$ 750.000,00

Empenhado: R\$ 1.061.658,65

Liquidado: R\$ 511.658,65

Pago: R\$ 511.658,65

% do pago do valor aprovado no último plano da SMC: 136,8%


Endereço: Rua Vergueiro, 1000

Distrito: Liberdade

Subprefeitura: Sé



Fotos do período: 07/10/2024 até dia 04/02/2025

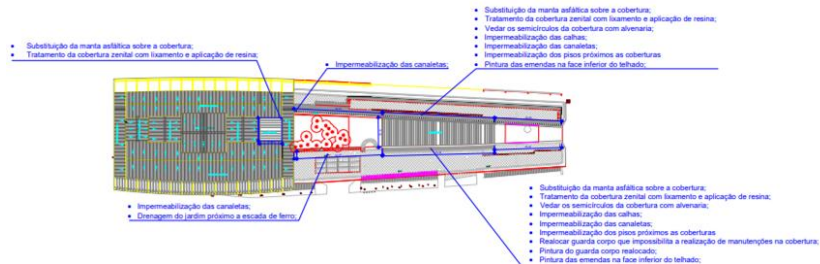

1. Centro Cultural São Paulo

Reforma de manutenção predial - impermeabilizações

Ação: Reforma de manutenção predial - impermeabilizações

Status: Em Execução/Obra

Processo: 6025.2024/0014973-9

Início da obra: 30/09/2024

Previsão de término: 30/03/2025

Valor: R\$ 750.000,00

Empenhado: R\$ 1.120.542,07

Liquidado: R\$ 570.542,07

Pago: R\$ 570.542,07

% do pago do valor aprovado no último plano da SMC: 149,4%

Endereço: Rua Vergueiro, 1000

Distrito: Liberdade

Subprefeitura: Sé




Fotos: 31/01/2025

- BIBLIOTECA
- Revisão dos caixilhos inferiores;
- Impermeabilização das bases dos caixilhos inferiores;



SEM ESCALA

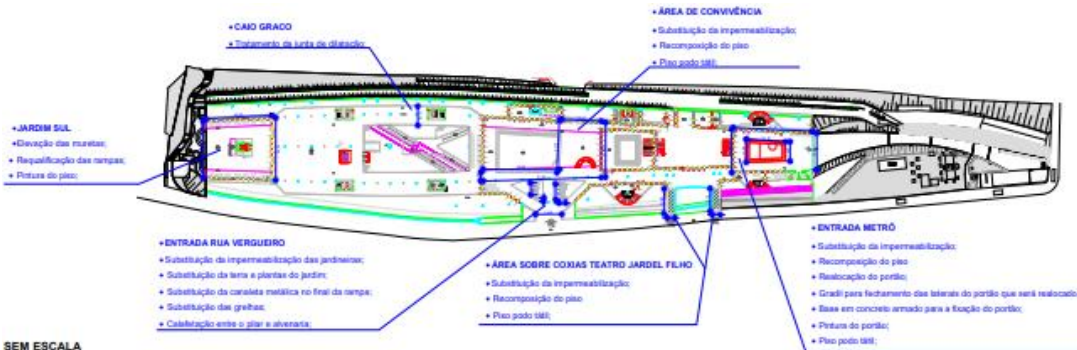

SEM ESCALA

2. Casa de Cultura Cidade Ademar

Implantação da Casa de Cultura Cidade Ademar

Ação: Implantação da Casa de Cultura Cidade Ademar

Status: Finalizado

Processo: 6025.2022/0018097-7

Início da obra: 19/12/2022

Previsão de término: 31/12/2024

Valor: R\$ 2.649.509,81

Empenhado: R\$ 2.259.134,25

Liquidado: R\$ 1.640.823,50

Pago: R\$ 1.640.823,50

% do pago do valor aprovado no último plano da SMC: 85,2%

Endereço: Avenida Durval Pinto Ferreira, 820

Distrito: Cidade Ademar

Subprefeitura: Cidade Ademar



Fotos do período: 13/09/2024 até 18/09/2024

3. Sítio Mirim

Reconstrução da Casa-Sede

Ação: Reconstrução da Casa-Sede

Status: Em Execução/Obra

Processo: 6025.2020/0016806-0

Início da obra: 03/06/2024

Previsão de término: 03/02/2026

Valor: R\$ 800.000,00

Empenhado: R\$ 2.539.459,99

Liquidado: R\$ 95.872,80


Pago: R\$ 95.872,80

% do pago do valor aprovado no último plano da SMC: 43,1%

Endereço: Estrada Assis Ribeiro, 10573

Distrito: Vila Jacuí

Subprefeitura: São Miguel Paulista

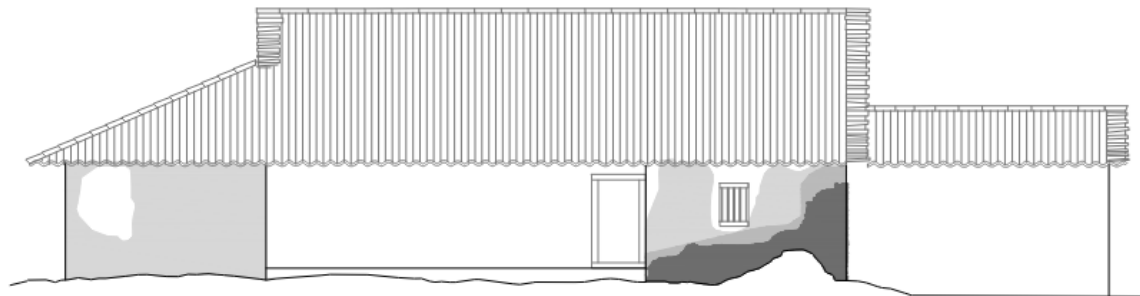

6. Teatro João Caetano

Reforma geral para Acessibilidade, Segurança contra incêndio,
Conservação e Restauro.

Ação: Reforma geral para Acessibilidade,
Segurança contra incêndio, Conservação e
Restauro

Status: Em Execução/Obra

Processo: 6025.2022/0011336-6

Início da obra: 19/12/2022

Previsão de término: 19/11/2025

Valor: R\$ 8.533.266,05

Empenhado: R\$ 4.719.658,21

Liquidado: R\$ 3.384.544,74

Pago: R\$ 3.384.544,74

**% do pago do valor aprovado no
último plano da SMC:** 49,5%

Endereço: Rua Borges Lagoa, 650

Distrito: Vila Mariana

Subprefeitura: Vila Mariana



Fotos do período de 01/11/2024 até 30/11/2024

9. Praça das Artes

3ª fase - Obras complementares dos corpos artísticos

Ação: 3ª fase - Obras complementares dos corpos artísticos

Status: Finalizado

Processo: 8510.2022/0000503-4

Início da obra: 23/01/2023

Previsão de término: 31/12/2024

Valor: R\$ 5.953.326,18

Empenhado: R\$ 4.853.108,69

Liquidado: R\$ 2.289.743,44


Pago: R\$ 1.351.730,92

% do pago do valor aprovado no último plano da SMC: 77,4%

Endereço: Avenida São João, 281

Distrito: República

Subprefeitura: Sé

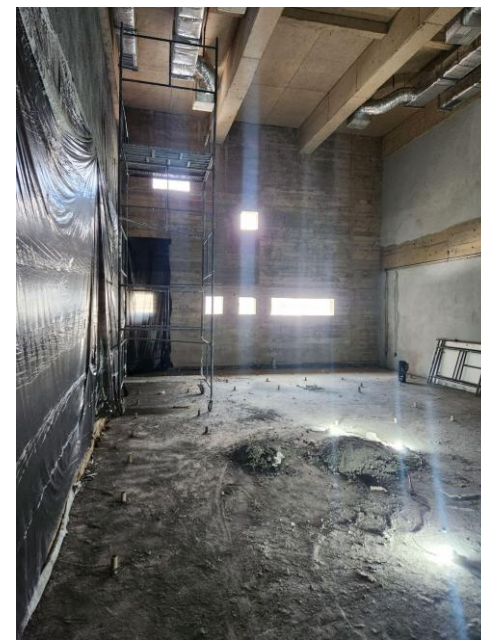

Fotos tiradas em: 19/04/2023

12. Biblioteca Chácara do Castelo

Requalificação

Ação: Requalificação

Status: Finalizado

Processo: 6025.2023/0017795-1

Início da obra: 19/12/2022

Previsão de término: 26/12/2024

Valor: R\$ 1.100.205,62

Empenhado: R\$ 1.100.205,62

Liquidado: R\$ 732.596,38


Pago: R\$ 732.596,38

% do pago do valor aprovado no último plano da SMC: 92,9%

Endereço: R. Brás Lourenço, 333 - Vila Mariana, São Paulo - SP, 04113-110

Distrito: Vila Mariana

Subprefeitura: Vila Mariana

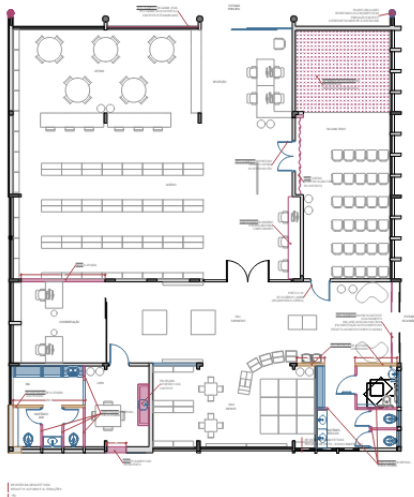

14. Casa de Cultura Vila Guilherme

Projeto Executivo de restauro

Ação: Projeto Executivo de restauro

Status: Finalizado

Processo: 6025.2022/0003748-1

Valor: R\$ 359.149,67

Empenhado: R\$ 222.990,73

Liquidado: R\$ 133.535,38



Pago: R\$ 133.535,38

% do pago do valor aprovado no último plano da SMC: 62,1%

Endereço: Praça Oscar Silva, 110

Distrito: Vila Guilherme

Subprefeitura: Vila Maria/Vila Guilherme

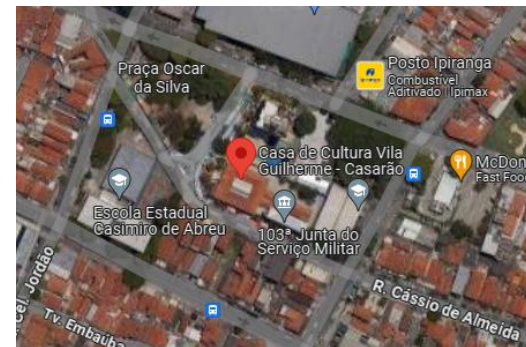

18. Arquivo Histórico Municipal

Instalação de linha de vida

Ação: Instalação de linha de vida

Status: Finalizado

Processo: 6025.2023/0030077-0

Início da obra: 12/08/2024

Previsão de término: 12/12/2024

Valor: R\$ 127.500,00

Empenhado: R\$ 127.500,00

Liquidado: R\$ 58.461,22

Pago: R\$ 58.461,22

% do pago do valor aprovado no último plano da SMC: 100,0%

Endereço: Praça Cel. Fernando Prestes, 152 - Bom Retiro, São Paulo - SP, 01124-060

Distrito: Bom Retiro

Subprefeitura: Sé



30. Biblioteca Roberto Santos

Reforma e manutenção predial

Ação: Reforma e manutenção predial

Status: Finalizado

Processo: 6025.2024/0017170-0

Início da obra: 27/09/2024

Previsão de término: 25/02/2025

Valor: R\$ 686.007,38

Empenhado: R\$ 686.007,38

Liquidado: R\$ 326.073,80

Pago: R\$ 201.200,13

% do pago do valor aprovado no último plano da SMC: 65,1%

Endereço: Rua Cisplatina, 505

Distrito: Ipiranga

Subprefeitura: Ipiranga



Fotos do período de 01/12/2024 a 31/12/2024

31. Biblioteca Castro Alves

Reforma e manutenção predial

Ação: Reforma e manutenção predial

Status: Finalizado

Processo: 6025.2024/0026619-0

Início da obra: 14/11/2024

Previsão de término: 14/03/2025

Valor: R\$ 1.040.974,00

Empenhado: R\$ 260.243,51

Liquidado: -

Pago: -

% do pago do valor aprovado no último plano da SMC: 10,5%

Endereço: Rua Abraão Mussa, s/n - Jardim Patente Novo

Distrito: Sacomã

Subprefeitura: Ipiranga



Fotos do período de 14/11/2024 a 31/12/2024

33. Biblioteca Aureliano Leite

Reforma e manutenção predial

Ação: Reforma e manutenção predial

Status: Finalizado

Processo: 6025.2024/0023990-8

Início da obra: 03/10/2024

Previsão de término: 02/04/2025

Valor: R\$ 229.975,70

Empenhado: R\$ 229.975,70

Liquidado: R\$ 61.467,41

Pago: R\$ 61.467,41

% do pago do valor aprovado no último plano da SMC: 51,5%

Endereço: Rua Otto Shubart, 196 - Parque São Lucas

Distrito: São Lucas

Subprefeitura: Vila Prudente



34. Casa de Cultura da Brasilândia

Reforma e manutenção predial

Ação: Reforma e manutenção predial

Status: Finalizado

Processo: 6025.2024/0026807-0

Início da obra: 14/11/2024

Previsão de término: 14/03/2025

Valor: R\$ 1.236.630,58

Empenhado: R\$ 285.280,93

Liquidado: R\$ 85.280,93

Pago: R\$ 85.280,93

% do pago do valor aprovado no último plano da SMC: 23,1%

Endereço: Praça Benedicta Cavalheiro, s/nº - Freguesia do Ó

Distrito: Freguesia do Ó

Subprefeitura: Freguesia/Brasilândia



Fotos do período de 01/12/2024 até 31/12/2024
