

# PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2026

## SMSUB / FUNDURB



PREFEITURA DE  
**SÃO PAULO**  
SECRETARIA DAS  
SUBPREFEITURAS

05/2026

# PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL FUNDURB/ SMSUB 2026

## • VALOR DISPONÍVEL SMSUB

DOTAÇÃO	ATIVIDADE	VALOR APROVADO	VALOR RESERVADO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	VALOR PAGO
1169	Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos [MOB]	R\$150.151.756,00	R\$99.251.173,42	R\$6.257.162,12	R\$0,00	R\$0,00
1137	Pavimentação e Recapeamento de Vias [MOB]	R\$18.000.000,00	R\$15.506.214,15	R\$15.506.214,15	R\$0,00	R\$0,00
1137	Pavimentação e Recapeamento de Vias [LIVRE][BP]	R\$104.000.000,00	R\$118.378.071,15	R\$118.363.139,79	R\$25.073.222,40	R\$24.139.490,29
1137	Pavimentação e Recapeamento de Vias [MOB][BP]	R\$50.000.000,00	R\$40.000.000,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
1137	Pavimentação e Recapeamento de Vias [LIVRE]	R\$86.000.000,00	R\$74.115.714,70	R\$74.106.181,50	R\$3.950.582,28	R\$3.950.582,28
3350	Melhorias de Bairro [LIVRE]	R\$70.353.249,00	R\$38.584.504,49	R\$21.615.928,67	R\$3.494.910,92	R\$3.494.910,92
1193	Execução de obras em áreas de risco - Preventiva [LIVRE]	R\$30.000.000,00	R\$26.634.119,08	R\$2.134.119,08	R\$362.962,09	R\$362.962,09
1194	Execução de obras em áreas de risco - Emergencial [LIVRE]	R\$2.000.000,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$510.505.005,00</b>	<b>R\$412.469.796,99</b>	<b>R\$237.982.745,31</b>	<b>R\$32.881.677,69</b>	<b>R\$31.947.945,58</b>

# REFORMA E ACESSIBILIDADE EM PASSEIOS PÚBLICOS [MOB]


# PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL FUNDURB/ SMSUB 2026

Plano de Aplicação FUNDURB 2026					
Objeto e endereço	Valor aprovado	Valor reservado	Valor empenhado	Valor liquidado	Valor pago
<b>Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos [MOB]</b>					
Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos [MOB]: Diversos endereços contemplando as 32 Subprefeituras		R\$89.895.538,50	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos [MOB]: Subprefeitura Campo Limpo - Contrato 1		R\$97.665,25	R\$97.665,25	R\$0,00	R\$0,00
Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos [MOB]: Subprefeitura São Miguel Paulista - Contrato 1		R\$702.432,72	R\$702.432,72	R\$0,00	R\$0,00
Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos [MOB]: Subprefeitura São Mateus - Contrato 1		R\$792.370,62	R\$792.370,62	R\$0,00	R\$0,00
Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos [MOB]: Subprefeitura Santana/Tucuruvi - Contrato 1		R\$931.768,81	R\$931.768,81	R\$0,00	R\$0,00
Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos [MOB]: Subprefeitura Aricanduva - Contrato 1		R\$840.185,50	R\$840.185,50	R\$0,00	R\$0,00
Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos [MOB]: Subprefeitura Vila Prudente - Contrato 1	R\$150.151.756,00	R\$716.206,40	R\$716.206,40	R\$0,00	R\$0,00
Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos [MOB]: Subprefeitura Santo Amaro - Contrato 1		R\$565.771,83	R\$565.771,83	R\$0,00	R\$0,00
Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos [MOB]: Subprefeitura Sé - Contrato 1		R\$931.759,41	R\$931.759,41	R\$0,00	R\$0,00
Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos [MOB]: Subprefeitura Itaim Paulista - Contrato 1		R\$679.001,58	R\$679.001,58	R\$0,00	R\$0,00
Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos [MOB]: Subprefeitura Mooca - Contrato 1		R\$1.034.858,98	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos [MOB]: Subprefeitura Pinheiros - Contrato 1		R\$1.412.129,66	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos [MOB]: Subprefeitura Ipiranga - Contrato 1		R\$651.484,16	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
<b>Total</b>	<b>R\$150.151.756,00</b>	<b>R\$99.251.173,42</b>	<b>R\$6.257.162,12</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>

## REFORMA E ACESSIBILIDADE EM PASSEIOS PÚBLICOS [MOB]

<b>Objeto</b>	Subprefeitura Campo Limpo - Contrato 1
<b>Subprefeitura</b>	Campo Limpo
<b>Endereço</b>	Estrada de Itapecerica; Rua Valter Airosa Flaquer
<b>Nº do SEI</b>	6012.2026/0003990-1
<b>Situação</b>	Em execução

<b>Valor aprovado 2026</b>	R\$ 0,00
<b>Valor reservado 2026</b>	R\$ 97.665,25
<b>Valor empenhado 2026</b>	R\$ 97.665,25
<b>Valor liquidado 2026</b>	R\$ 0,00

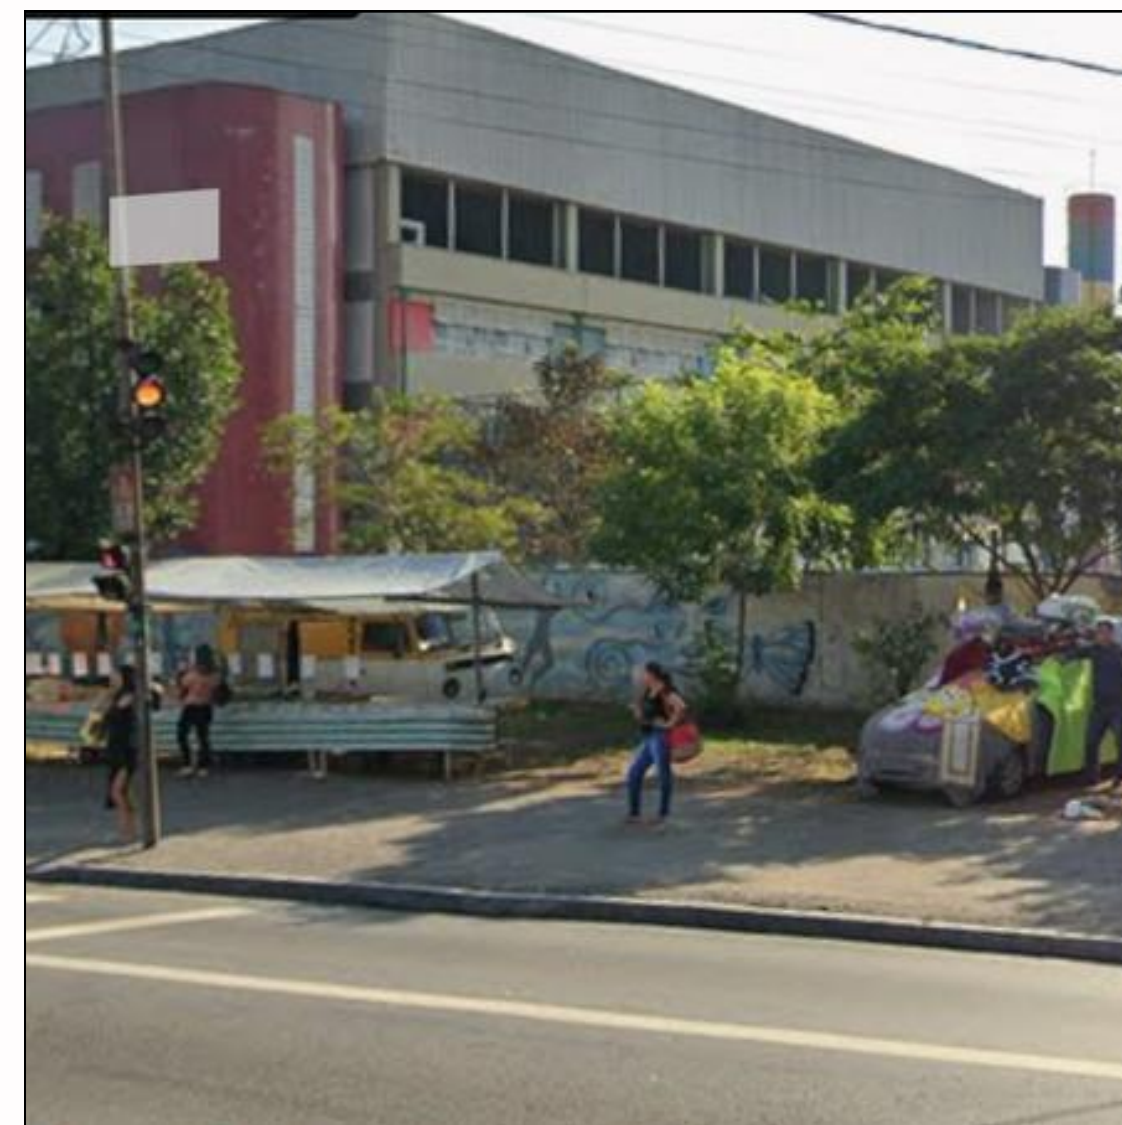

## REFORMA E ACESSIBILIDADE EM PASSEIOS PÚBLICOS [MOB]

<b>Objeto</b>	Subprefeitura São Miguel Paulista - Contrato 1
<b>Subprefeitura</b>	São Miguel Paulista
<b>Endereço</b>	Rua Jaime Barcelos; Praça José Cardoso de Moura;
<b>Nº do SEI</b>	6012.2026/0004220-1
<b>Situação</b>	A executar

<b>Valor aprovado 2026</b>	R\$ 0,00
<b>Valor reservado 2026</b>	R\$ 702.432,72
<b>Valor empenhado 2026</b>	R\$ 702.432,72
<b>Valor liquidado 2026</b>	R\$ 0,00



## REFORMA E ACESSIBILIDADE EM PASSEIOS PÚBLICOS [MOB]

<b>Objeto</b>	Subprefeitura São Mateus - Contrato 1
<b>Subprefeitura</b>	São Mateus
<b>Endereço</b>	Avenida Satélite
<b>Nº do SEI</b>	6012.2026/0004338-0
<b>Situação</b>	Em execução

<b>Valor aprovado 2026</b>	R\$ 0,00
<b>Valor reservado 2026</b>	R\$ 792.370,62
<b>Valor empenhado 2026</b>	R\$ 792.370,62
<b>Valor liquidado 2026</b>	R\$ 0,00



## REFORMA E ACESSIBILIDADE EM PASSEIOS PÚBLICOS [MOB]

<b>Objeto</b>	Subprefeitura Santana/Tucuruvi - Contrato 1
<b>Subprefeitura</b>	Santana/Tucuruvi
<b>Endereço</b>	Rua Paineira do Campo; Rua Voluntários da Pátria
<b>Nº do SEI</b>	6012.2026/0004458-1
<b>Situação</b>	Em execução


<b>Valor aprovado 2026</b>	R\$ 0,00
<b>Valor reservado 2026</b>	R\$ 931.768,81
<b>Valor empenhado 2026</b>	R\$ 931.768,81
<b>Valor liquidado 2026</b>	R\$ 0,00



## REFORMA E ACESSIBILIDADE EM PASSEIOS PÚBLICOS [MOB]

<b>Objeto</b>	Subprefeitura Aricanduva - Contrato 1
<b>Subprefeitura</b>	Aricanduva
<b>Endereço</b>	Rua Inconfidência Mineira; Av. Rio das Pedras
<b>Nº do SEI</b>	6012.2026/0005608-3
<b>Situação</b>	A executar

<b>Valor aprovado 2026</b>	R\$ 0,00
<b>Valor reservado 2026</b>	R\$ 840.185,50
<b>Valor empenhado 2026</b>	R\$ 840.185,50
<b>Valor liquidado 2026</b>	R\$ 0,00

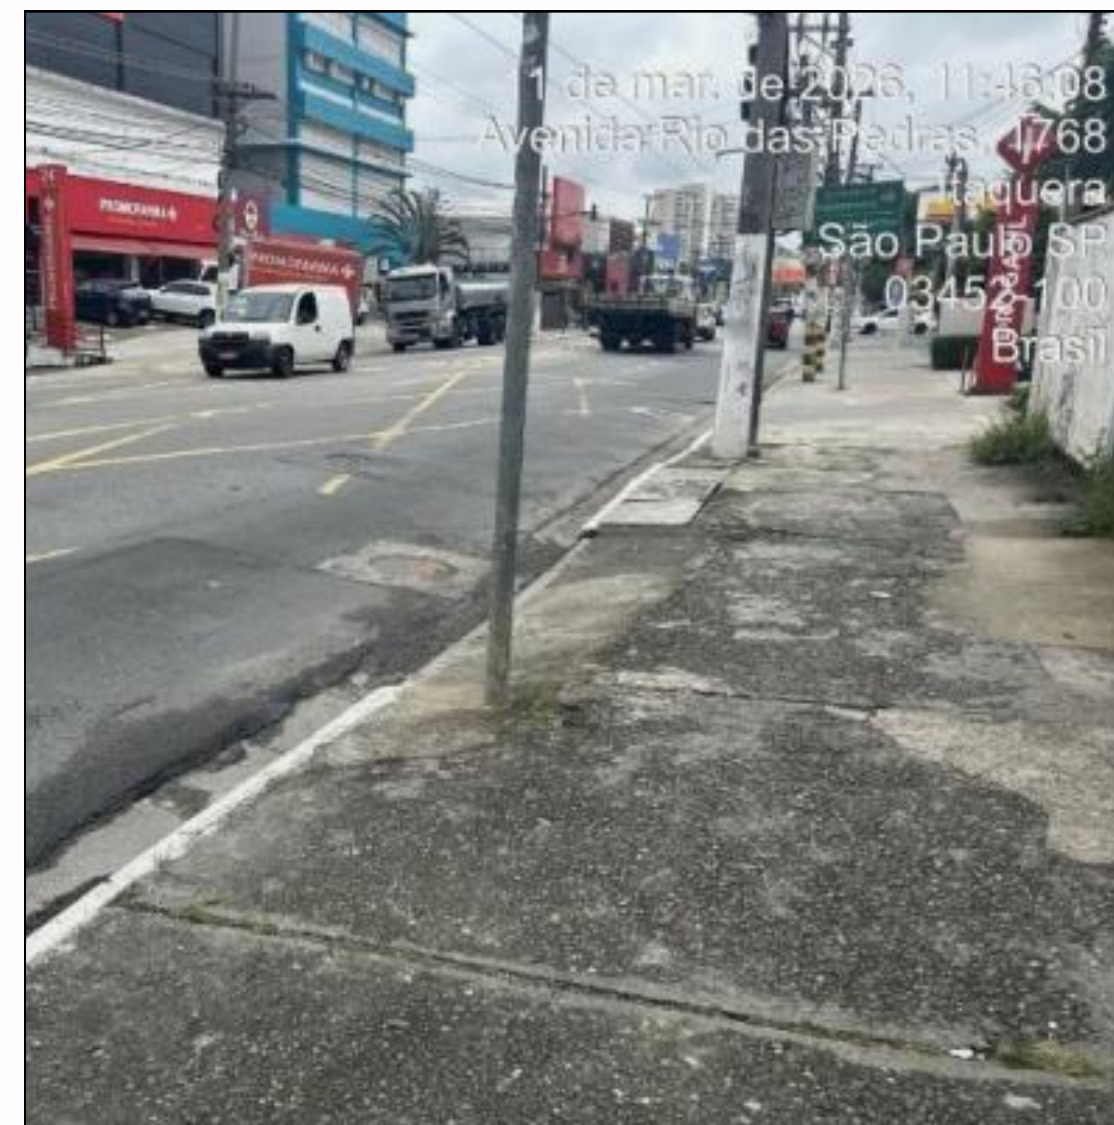

## REFORMA E ACESSIBILIDADE EM PASSEIOS PÚBLICOS [MOB]

Objeto	Subprefeitura Vila Prudente - Contrato 1
Subprefeitura	Vila Prudente
Endereço	Rua Costa Barros
Nº do SEI	6012.2026/0004617-7
Situação	Em execução

Valor aprovado 2026	R\$ 0,00
Valor reservado 2026	R\$ 716.206,40
Valor empenhado 2026	R\$ 716.206,40
Valor liquidado 2026	R\$ 0,00



## REFORMA E ACESSIBILIDADE EM PASSEIOS PÚBLICOS [MOB]

Objeto	Subprefeitura Santo Amaro - Contrato 1
Subprefeitura	Santo Amaro
Endereço	Avenida Interlagos
Nº do SEI	6012.2026/0004459-0
Situação	Em execução

Valor aprovado 2026	R\$ 0,00
Valor reservado 2026	R\$ 565.771,83
Valor empenhado 2026	R\$ 565.771,83
Valor liquidado 2026	R\$ 0,00



## REFORMA E ACESSIBILIDADE EM PASSEIOS PÚBLICOS [MOB]

Objeto	Subprefeitura Sé - Contrato 1
Subprefeitura	Sé
Endereço	R. Benjamim Constant; R. Quintino Bocaiuva; R. Riachuelo.
Nº do SEI	6012.2026/0006080-3
Situação	A executar


Valor aprovado 2026	R\$ 0,00
Valor reservado 2026	R\$ 931.759,41
Valor empenhado 2026	R\$ 931.759,41
Valor liquidado 2026	R\$ 0,00



## REFORMA E ACESSIBILIDADE EM PASSEIOS PÚBLICOS [MOB]

<b>Objeto</b>	Subprefeitura Itaim Paulista - Contrato 1
<b>Subprefeitura</b>	Itaim Paulista
<b>Endereço</b>	Av. Marechal Tito; Estrada da Biacica; Rua Dois
<b>Nº do SEI</b>	6012.2026/0005822-1
<b>Situação</b>	A executar

<b>Valor aprovado 2026</b>	R\$ 0,00
<b>Valor reservado 2026</b>	R\$ 679.001,58
<b>Valor empenhado 2026</b>	R\$ 679.001,58
<b>Valor liquidado 2026</b>	R\$ 0,00

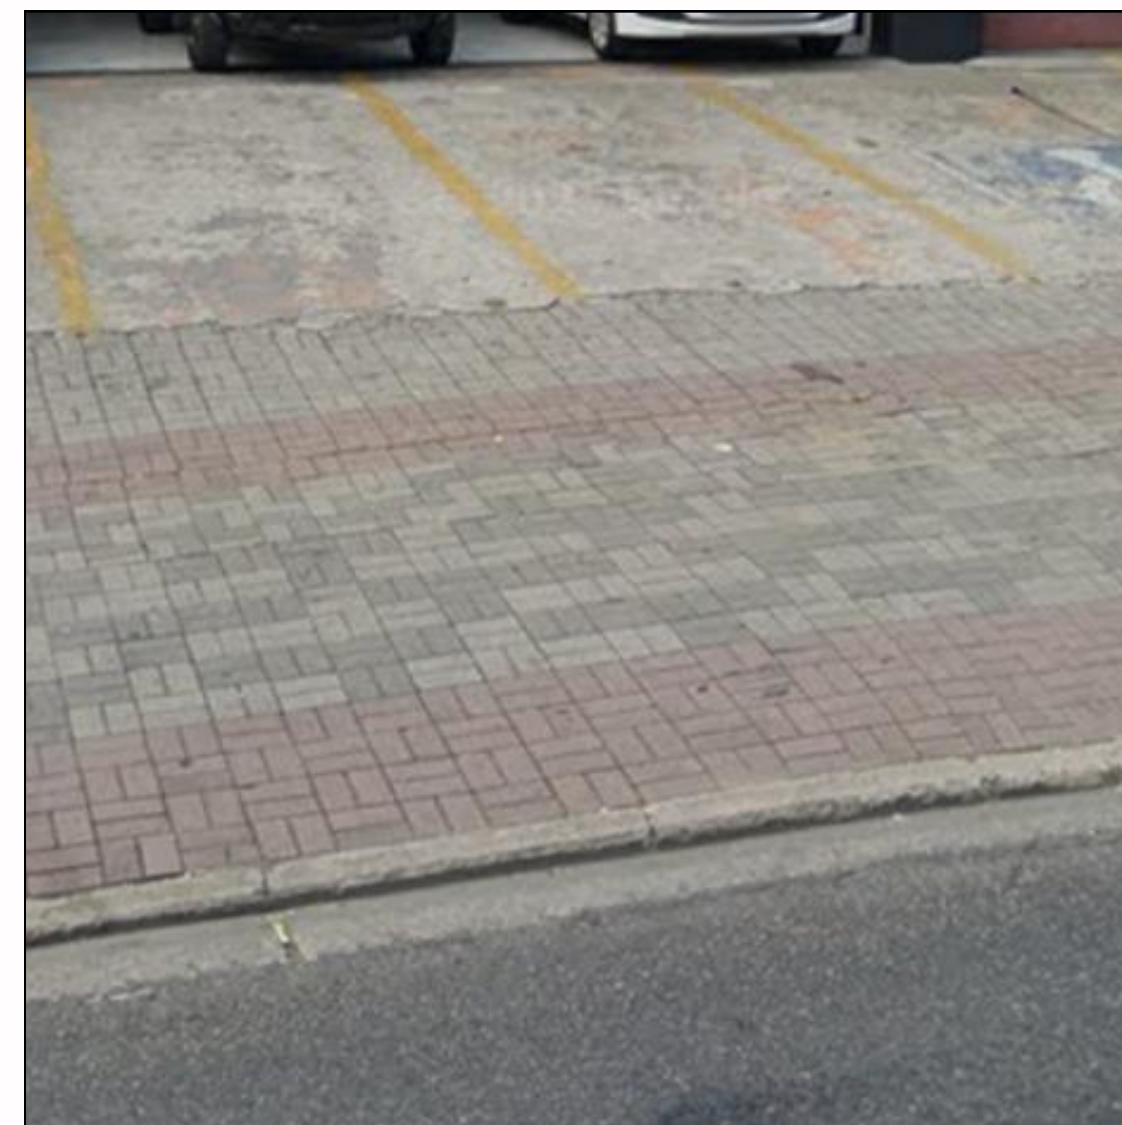

## REFORMA E ACESSIBILIDADE EM PASSEIOS PÚBLICOS [MOB]

Objeto	Subprefeitura Mooca - Contrato 1
Subprefeitura	Mooca
Endereço	R. João Teodoro; Rua Tiers; Av. Do Estado
Nº do SEI	6012.2026/0006039-0
Situação	A executar

Valor aprovado 2026	R\$ 0,00
Valor reservado 2026	R\$ 1.034.858,98
Valor empenhado 2026	R\$ 0,00
Valor liquidado 2026	R\$ 0,00



## REFORMA E ACESSIBILIDADE EM PASSEIOS PÚBLICOS [MOB]

<b>Objeto</b>	Subprefeitura Pinheiros - Contrato 1
<b>Subprefeitura</b>	Pinheiros
<b>Endereço</b>	Av. Brigadeiro Luis Antonio; Av. Cidade Jardim; Av. Henrique Chamma
<b>Nº do SEI</b>	6012.2026/0006040-4
<b>Situação</b>	A executar

<b>Valor aprovado 2026</b>	R\$ 0,00
<b>Valor reservado 2026</b>	R\$ 1.412.129,66
<b>Valor empenhado 2026</b>	R\$ 0,00
<b>Valor liquidado 2026</b>	R\$ 0,00



## REFORMA E ACESSIBILIDADE EM PASSEIOS PÚBLICOS [MOB]

Objeto	Subprefeitura Ipiranga - Contrato 1
Subprefeitura	Ipiranga
Endereço	Av. Do Cursino
Nº do SEI	6012.2026/0005725-0
Situação	A executar

Valor aprovado 2026	R\$ 0,00
Valor reservado 2026	R\$ 651.484,16
Valor empenhado 2026	R\$ 0,00
Valor liquidado 2026	R\$ 0,00



# PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS

# PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL FUNDURB/ SMSUB 2026

## Plano de Aplicação FUNDURB 2026

Objeto e endereço	Valor aprovado	Valor reservado	Valor empenhado	Valor liquidado	Valor pago
<b>Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos [MOB]</b>					
Pavimentação e Recapeamento de Vias [MOB] - Recapeamento - Diversos endereços	R\$18.000.000,00	R\$15.506.214,15	R\$15.506.214,15	R\$0,00	R\$0,00
Pavimentação e Recapeamento de Vias [LIVRE][BP] - Recapeamento - Diversos endereços	R\$104.000.000,00	R\$118.378.071,15	R\$118.363.139,79	R\$25.073.222,40	R\$24.139.490,29
Pavimentação e Recapeamento de Vias [MOB][BP] - Recapeamento - Diversos endereços	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Pavimentação e Recapeamento de Vias [LIVRE] - Recapeamento - Diversos endereços	R\$86.000.000,00	R\$74.115.714,70	R\$74.106.181,50	R\$3.950.582,28	R\$3.950.582,28
Pavimentação e Recapeamento de Vias [MOB][BP]: Contratação de empresa de engenharia para elaboração do projeto executivo e execução das obras de duplicação e requalificação do sistema viário na Avenida dos Metalúrgicos.	R\$30.000.000,00	R\$30.000.000,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Pavimentação e Recapeamento de Vias [MOB][BP]: Contratação de empresa de engenharia para elaboração do projeto executivo e execução das obras de alargamento e requalificação do sistema viário na Estrada do Iguatemi.	R\$10.000.000,00	R\$10.000.000,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Pavimentação e Recapeamento de Vias [MOB][BP] - Contratação de empresa de engenharia para elaboração do projeto executivo e execução das obras de alargamento e requalificação do sistema viário para a ligação da Estrada do Iguatemi à Avenida Jacu Pêssego.	R\$10.000.000,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
<b>Total SMSUB 2025</b>	<b>R\$258.000.000,00</b>	<b>R\$248.000.000,00</b>	<b>R\$207.975.535,44</b>	<b>R\$29.023.804,68</b>	<b>R\$28.090.072,57</b>

## PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPEAMENTO)

[MOB] - Av. Dracena	
Subprefeitura	Lapa
Valor empenhado	R\$ 3.681.208,26
Valor liquidado	R\$ 0,00
Situação	Concluída



[MOB] - R. Pará	
Subprefeitura	Sé
Valor empenhado	R\$ 1.073.661,53
Valor liquidado	R\$ 0,00
Situação	Concluída



## PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPEAMENTO)

[MOB] - R. Itaquera	
Subprefeitura	Sé
Valor empenhado	R\$ 1.335.957,03
Valor liquidado	R\$ 0,00
Situação	Concluída

[MOB] - R. dos Patriotas	
Subprefeitura	Ipiranga
Valor empenhado	R\$ 4.194.133,74
Valor liquidado	R\$ 0,00
Situação	Concluída




## PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPEAMENTO)

[MOB] - R. Elisa Silveira – Trecho II	
Subprefeitura	Vila Mariana
Valor empenhado	R\$ 457.808,28
Valor liquidado	R\$ 0,00
Situação	Concluída



[MOB] - R. Padre Senepa	
Subprefeitura	Ipiranga
Valor empenhado	R\$ 420.922,65
Valor liquidado	R\$ 0,00
Situação	Concluída

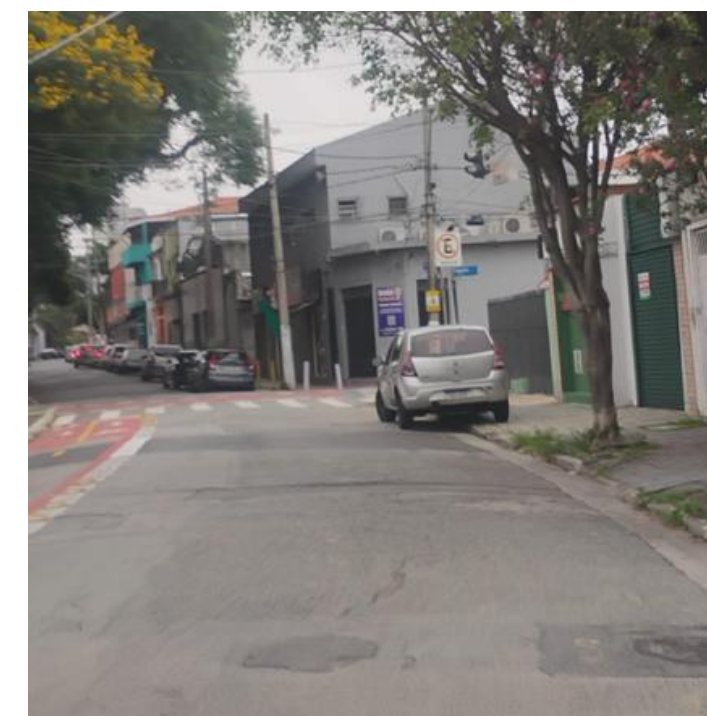

## PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPEAMENTO)

[MOB] - R. Eng. Ranulfo Pinheiro Lima	
Subprefeitura	Ipiranga
Valor empenhado	R\$ 1.013.366,80
Valor liquidado	R\$ 0,00
Situação	Concluída



[MOB] - Av. João de Barros	
Subprefeitura	Capela do Socorro
Valor empenhado	R\$ 3.329.155,86
Valor liquidado	R\$ 0,00
Situação	Em execução



## PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPEAMENTO)

[MOB] - Rua das Rosas	
Subprefeitura	Vila Mariana
Valor empenhado	R\$ 0,00
Valor liquidado	R\$ 0,00
Situação	A contratar



[LIVRE][BP] - Av. General Asdrúbal da Cunha	
Subprefeitura	Butantã
Valor empenhado	R\$ 8.717.252,70
Valor liquidado	R\$ 0,00
Situação	Concluída



## PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPEAMENTO)

[LIVRE][BP] - R. Encruzilhada do Sul	
Subprefeitura	Freguesia/ Brasilândia
Valor empenhado	R\$ 3.694.771,29
Valor liquidado	R\$ 0,00
Situação	Concluída



[LIVRE][BP] - R. Firminópolis	
Subprefeitura	Freguesia/ Brasilândia
Valor empenhado	R\$ 4.546.909,46
Valor liquidado	R\$ 0,00
Situação	Em Execução



## PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPEAMENTO)

[LIVRE][BP] - R. Ibiraiaras	
Subprefeitura	Freguesia/ Brasilândia
Valor empenhado	R\$ 3.040.067,01
Valor liquidado	R\$ 0,00
Situação	A Iniciar



[LIVRE][BP] - Recapeamento - R. Manuel Vieira da Luz	
Subprefeitura	Jaçanã/ Tremembé
Valor empenhado	R\$ 4.611.336,76
Valor liquidado	R\$ 0,00
Situação	Em execução



## PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPEAMENTO)

[LIVRE][BP] - R. dos Filhos da Terra	
Subprefeitura	Jaçanã/ Tremembé
Valor empenhado	R\$ 3.412.118,93
Valor liquidado	R\$ 0,00
Situação	Em execução



[LIVRE][BP] - R. Cap. Rubens (trecho I)	
Subprefeitura	Jaçanã/ Tremembé
Valor empenhado	R\$ 1.847.096,07
Valor liquidado	R\$ 0,00
Situação	A iniciar



## PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPEAMENTO)

[LIVRE][BP] - R. Rei Alberto	
Subprefeitura	Jaçanã/ Tremembé
Valor empenhado	R\$ 3.451.535,15
Valor liquidado	R\$ 0,00
Situação	Em execução



[LIVRE][BP] - Av. Mario Pernambuco	
Subprefeitura	Jaçanã/ Tremembé
Valor empenhado	R\$ 2.643.365,09
Valor liquidado	R\$ 0,00
Situação	Em execução



## PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPEAMENTO)

[LIVRE][BP] - R. Prof. Enéas de Siqueira Neto	
Subprefeitura	Capela do Socorro
Valor empenhado	R\$ 4.153.331,10
Valor liquidado	R\$ 0,00
Situação	Concluída



[LIVRE][BP] - Av. das Belezas	
Subprefeitura	Campo Limpo
Valor empenhado	R\$ 1.898.626,05
Valor liquidado	R\$ 0,00
Situação	A Iniciar



## PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPEAMENTO)

[LIVRE][BP] - Av. Caporanga	
Subprefeitura	M'Boi Mirim
Valor empenhado	R\$ 3.740.395,65
Valor liquidado	R\$ 0,00
Situação	A Iniciar



[LIVRE][BP] - R. Pietro Marsolo	
Subprefeitura	Parelheiros
Valor empenhado	R\$ 1.263.175,09
Valor liquidado	R\$ 0,00
Situação	Paralisada



## PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPEAMENTO)

[LIVRE][BP] - Av. Esperantina (Inclui Rotatória)	
Subprefeitura	Penha
Valor empenhado	R\$ 3.942.987,84
Valor liquidado	R\$ 0,00
Situação	A Iniciar



[LIVRE][BP] - Av. Oliveira Freire	
Subprefeitura	São Miguel Paulista
Valor empenhado	R\$ 5.392.348,82
Valor liquidado	R\$ 0,00
Situação	Concluída



## PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPEAMENTO)

[LIVRE][BP] - Av. Teodoro Bernardo do Nascimento	
Subprefeitura	Itaim Paulista
Valor empenhado	R\$ 9.076.279,18
Valor liquidado	R\$ 0,00
Situação	Em execução




[LIVRE][BP] - R. José Pessota - Trecho II	
Subprefeitura	Itaim Paulista
Valor empenhado	R\$ 3.709.343,07
Valor liquidado	R\$ 0,00
Situação	Em execução




## PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPEAMENTO)

[LIVRE][BP] - R. Estrela Guia	
Subprefeitura	Sapopemba
Valor empenhado	R\$ 103.693,66
Valor liquidado	R\$ 0,00
Situação	Concluída

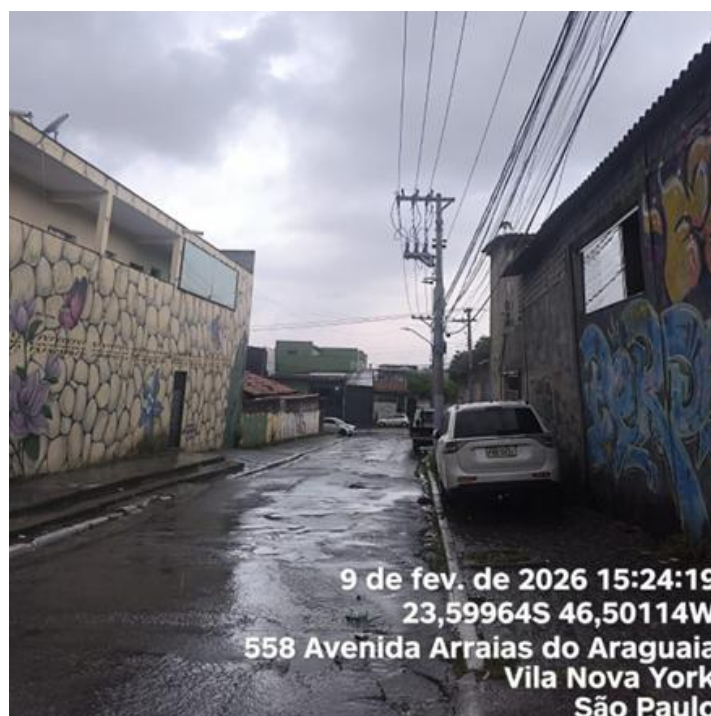

[LIVRE][BP] - Tv. Paracelsus	
Subprefeitura	Sapopemba
Valor empenhado	R\$ 1.016.394,62
Valor liquidado	R\$ 0,00
Situação	Concluída

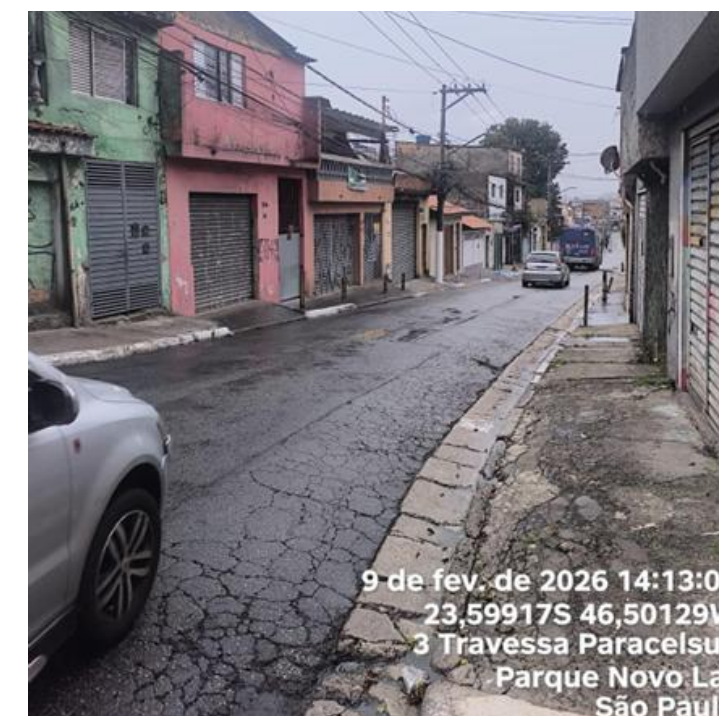


## PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPEAMENTO)

[LIVRE][BP] - R. Sinfonias do Ocaso	
Subprefeitura	Sapopemba
Valor empenhado	R\$1.563.407,57
Valor liquidado	R\$ 0,00
Situação	Concluída



[LIVRE][BP] - Recapeamento - R. Antônio Sarzedas	
Subprefeitura	Sapopemba
Valor empenhado	R\$ 683.415,75
Valor liquidado	R\$ 0,00
Situação	Em execução

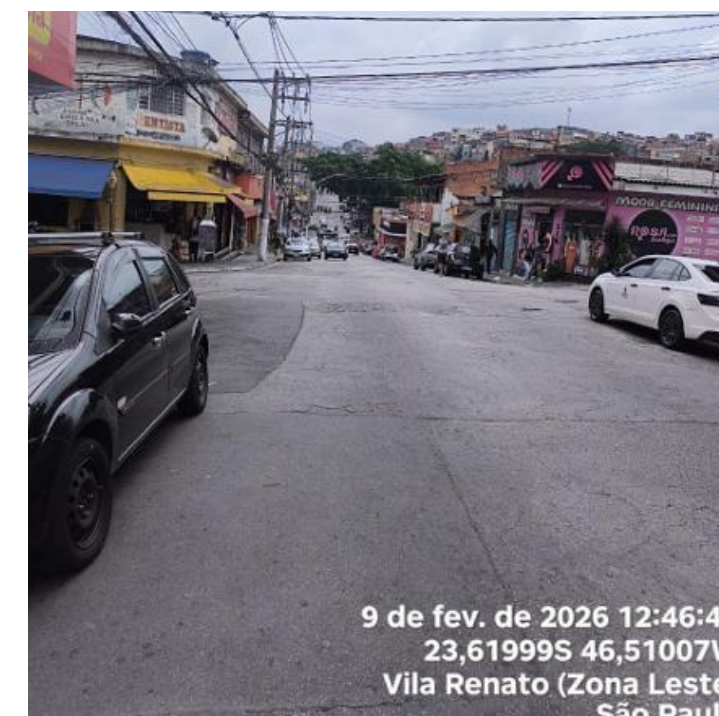


## PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPEAMENTO)

[LIVRE][BP] - R. Sold. Cândido da Luz Paiva	
Subprefeitura	Sapopemba
Valor empenhado	R\$ 844.015,30
Valor liquidado	R\$ 0,00
Situação	Em execução



[LIVRE][BP] - Av. Primavera de Caiena	
Subprefeitura	Sapopemba
Valor empenhado	R\$ 3.524.772,47
Valor liquidado	R\$ 0,00
Situação	Em execução

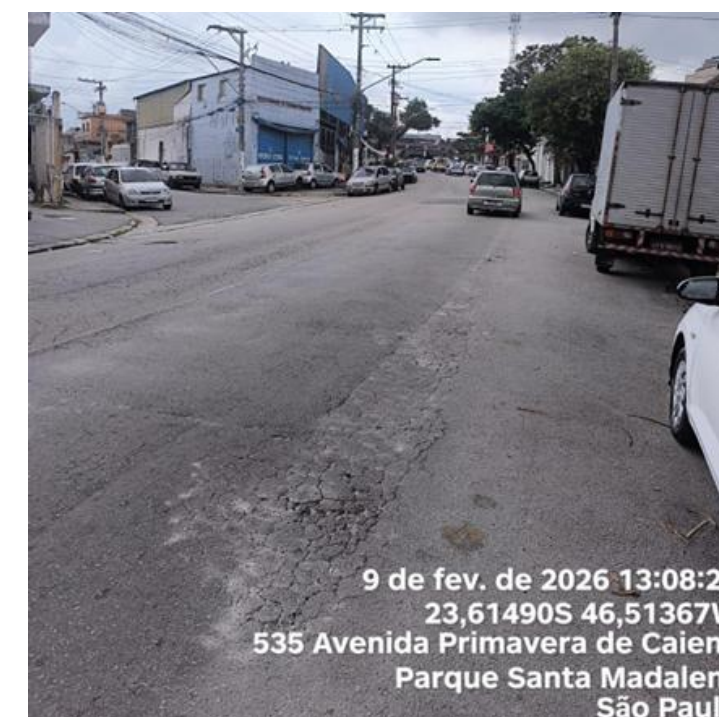

## PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPEAMENTO)

[LIVRE][BP] - R. Milton da Cruz	
Subprefeitura	Sapopemba
Valor empenhado	R\$ 1.982.211,91
Valor liquidado	R\$ 0,00
Situação	A iniciar



[LIVRE][BP] - R. Boleadeiras	
Subprefeitura	Sapopemba
Valor empenhado	R\$ 1.084.360,03
Valor liquidado	R\$ 0,00
Situação	Em execução



## PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPEAMENTO)

[LIVRE][BP] - R. José Francisco Brandão	
Subprefeitura	Cidade Tiradentes
Valor empenhado	R\$ 2.904.332,63
Valor liquidado	R\$ 0,00
Situação	Concluída



[LIVRE][BP] - R. Douradoquara	
Subprefeitura	São Mateus
Valor empenhado	R\$ 1.205.134,59
Valor liquidado	R\$ 0,00
Situação	Em execução



## PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPEAMENTO)

[LIVRE][BP] - R. Cachoeira do Campo (inclui contorno da Pça. Catas Altas)	
Subprefeitura	São Mateus
Valor empenhado	R\$ 2.095.281,47
Valor liquidado	R\$ 0,00
Situação	A Iniciar

[LIVRE][BP] - R. Taiobeiras	
Subprefeitura	São Mateus
Valor empenhado	R\$ 716.445,40
Valor liquidado	R\$ 0,00
Situação	Em execução




## PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPEAMENTO)

[LIVRE][BP] - R. Padre Nildo do Amaral Jr.	
Subprefeitura	Guaianases
Valor empenhado	R\$ 3.882.572,77
Valor liquidado	R\$ 0,00
Situação	Em execução



[LIVRE][BP] - R. Oscar Pedroso Horta	
Subprefeitura	Butantã
Valor empenhado	R\$ 0,00
Valor liquidado	R\$ 0,00
Situação	A contratar

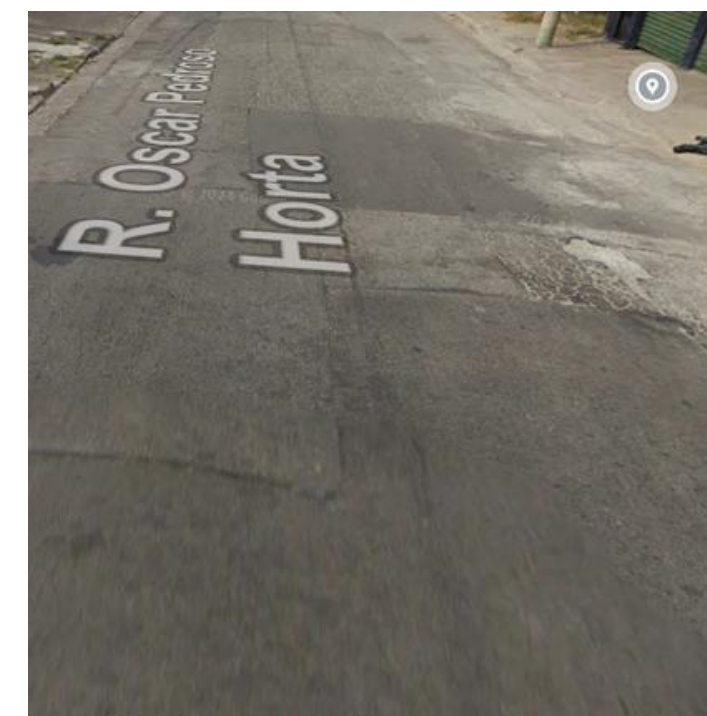

## PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPEAMENTO)

[LIVRE][BP] - R. Alfredo Lorenz	
Subprefeitura	Campo Limpo
Valor empenhado	R\$ 0,00
Valor liquidado	R\$ 0,00
Situação	A contratar



[LIVRE][BP] - R. Antônio Martins Costa	
Subprefeitura	Butantã
Valor empenhado	R\$ 0,00
Valor liquidado	R\$ 0,00
Situação	A contratar



## PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPEAMENTO)

[LIVRE][BP] - R. Nelson Alves Filgueiras	
Subprefeitura	Campo Limpo
Valor empenhado	R\$ 0,00
Valor liquidado	R\$ 0,00
Situação	A contratar



[LIVRE][BP] - R. Trinta e Um de Março	
Subprefeitura	Campo Limpo
Valor empenhado	R\$ 0,00
Valor liquidado	R\$ 0,00
Situação	A contratar



## PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPEAMENTO)

[LIVRE][BP] - R. Doutor James Ferraz Alvim	
Subprefeitura	Campo Limpo
Valor empenhado	R\$ 0,00
Valor liquidado	R\$ 0,00
Situação	A contratar



[LIVRE][BP] - R. Eusébio da Costa Dourado	
Subprefeitura	Campo Limpo
Valor empenhado	R\$ 0,00
Valor liquidado	R\$ 0,00
Situação	A contratar



## PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPEAMENTO)

[LIVRE][BP] - R. Francisco Gonzaga	
Subprefeitura	Campo Limpo
Valor empenhado	R\$ 0,00
Valor liquidado	R\$ 0,00
Situação	A contratar



[LIVRE][BP] - R. Gustavo Paiva	
Subprefeitura	Campo Limpo
Valor empenhado	R\$ 0,00
Valor liquidado	R\$ 0,00
Situação	A contratar



## PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPEAMENTO)

[LIVRE][BP] - R. Miguel Francisco Dias	
Subprefeitura	Campo Limpo
Valor empenhado	R\$ 0,00
Valor liquidado	R\$ 0,00
Situação	A contratar



[LIVRE][BP] - R. Omar Simão Racy	
Subprefeitura	Campo Limpo
Valor empenhado	R\$ 0,00
Valor liquidado	R\$ 0,00
Situação	A contratar



## PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPEAMENTO)

[LIVRE][BP] - Rua David Pimentel Racy	
Subprefeitura	Campo Limpo
Valor empenhado	R\$ 1.167.884,97
Valor liquidado	R\$ 1.167.884,97
Situação	Concluída



[LIVRE][BP] - Rua James Ensor	
Subprefeitura	Campo Limpo
Valor empenhado	R\$ 853.663,08
Valor liquidado	R\$ 853.663,08
Situação	Concluída



## PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPEAMENTO)

[LIVRE][BP] - R. Carandazinho	
Subprefeitura	Campo Limpo
Valor empenhado	R\$ 277.401,43
Valor liquidado	R\$ 185.293,84
Situação	Concluída



[LIVRE][BP] - R. Dankmar Adler	
Subprefeitura	Campo Limpo
Valor empenhado	R\$ 327.675,88
Valor liquidado	R\$ 280.108,03
Situação	Concluída



## PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPEAMENTO)

[LIVRE][BP] - R. Leônidas Busi	
Subprefeitura	Campo Limpo
Valor empenhado	R\$ 222.144,41
Valor liquidado	R\$ 24.912,60
Situação	Concluída



[LIVRE][BP] - R. Lydia Damus Maksoud	
Subprefeitura	Campo Limpo
Valor empenhado	R\$ 397.548,79
Valor liquidado	R\$ 353.671,10
Situação	Concluída



## PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPEAMENTO)

[LIVRE][BP] - R. Manuel Bicudo	
Subprefeitura	Campo Limpo
Valor empenhado	R\$ 282.837,28
Valor liquidado	R\$ 257.961,53
Situação	Concluída



[LIVRE][BP] - R. Vitoriano de Oliveira	
Subprefeitura	Campo Limpo
Valor empenhado	R\$ 915.427,19
Valor liquidado	R\$ 821.646,57
Situação	Concluída



## PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPEAMENTO)

[LIVRE][BP] - Tv. Alcebiades Maia Barcelos (Tv. Olímpio Teles de Menezes)	
Subprefeitura	Campo Limpo
Valor empenhado	R\$ 421.491,43
Valor liquidado	R\$ 288.754,96
Situação	Concluída



[LIVRE][BP] - Rua Padre Jacob Roland	
Subprefeitura	Butantã
Valor empenhado	R\$ 208.371,73
Valor liquidado	R\$ 0,00
Situação	Concluída



## PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPEAMENTO)

[LIVRE][BP] - R. Safira Azul	
Subprefeitura	Freguesia/ Brasilândia
Valor empenhado	R\$ 0,00
Valor liquidado	R\$ 0,00
Situação	A contratar



[LIVRE][BP] - R. Amanacaia	
Subprefeitura	Freguesia/ Brasilândia
Valor empenhado	R\$ 0,00
Valor liquidado	R\$ 0,00
Situação	A contratar




## PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPEAMENTO)

[LIVRE][BP] - R. Santo Adriano	
Subprefeitura	Casa Verde
Valor empenhado	R\$ 0,00
Valor liquidado	R\$ 0,00
Situação	A contratar



[LIVRE][BP] - R. Fonte das Figueiras	
Subprefeitura	Casa Verde
Valor empenhado	R\$ 0,00
Valor liquidado	R\$ 0,00
Situação	A contratar

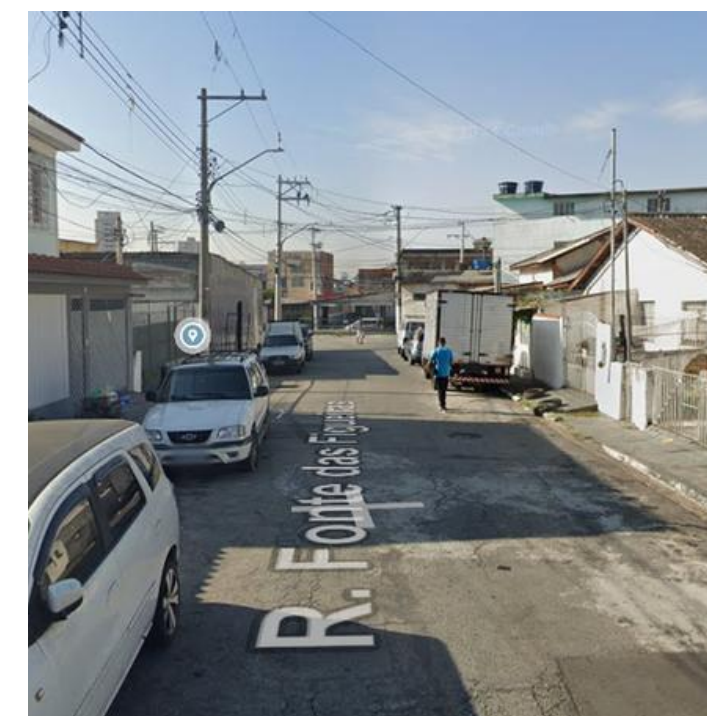

## PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPEAMENTO)

[LIVRE][BP] - R. Mirangaoba	
Subprefeitura	Freguesia/ Brasilândia
Valor empenhado	R\$ 0,00
Valor liquidado	R\$ 0,00
Situação	A contratar



[LIVRE][BP] - R. Catanduvras	
Subprefeitura	Freguesia/ Brasilândia
Valor empenhado	R\$ 0,00
Valor liquidado	R\$ 0,00
Situação	A contratar



## PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPEAMENTO)

[LIVRE][BP] - Rua Serrana Fluminense - Trecho I	
Subprefeitura	Casa Verde
Valor empenhado	R\$ 341.761,39
Valor liquidado	R\$ 283.124,51
Situação	Concluída



[LIVRE][BP] - Rua Serrana Fluminense - Trecho II	
Subprefeitura	Casa Verde
Valor empenhado	R\$ 499.767,25
Valor liquidado	R\$ 407.591,94
Situação	Concluída



## PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPEAMENTO)

[LIVRE][BP] - Rua Aprazível	
Subprefeitura	Casa Verde
Valor empenhado	R\$ 624.845,38
Valor liquidado	R\$ 580.716,83
Situação	Concluída



[LIVRE][BP] - Rua Dom Carlos Gouveia	
Subprefeitura	Casa Verde
Valor empenhado	R\$ 542.152,05
Valor liquidado	R\$ 497.515,71
Situação	Concluída



## PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPEAMENTO)

[LIVRE][BP] - Rua Rido Roque	
Subprefeitura	Casa Verde
Valor empenhado	R\$ 390.195,17
Valor liquidado	R\$ 370.172,65
Situação	Concluída



[LIVRE][BP] - Rua Alberto do Rego Rangel	
Subprefeitura	Casa Verde
Valor empenhado	R\$ 235.745,29
Valor liquidado	R\$ 216.194,08
Situação	Concluída



## PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPEAMENTO)

[LIVRE][BP] - Rua Francisco Ferreira	
Subprefeitura	Casa Verde
Valor empenhado	R\$ 602.820,01
Valor liquidado	R\$ 567.523,38
Situação	Concluída



[LIVRE][BP] - Rua Marina Eston	
Subprefeitura	Casa Verde
Valor empenhado	R\$ 632.629,12
Valor liquidado	R\$ 588.527,13
Situação	Concluída



## PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPEAMENTO)

[LIVRE][BP] - Rua Edgar Baizon	
Subprefeitura	Casa Verde
Valor empenhado	R\$ 121.396,08
Valor liquidado	R\$ 110.404,32
Situação	Concluída



[LIVRE][BP] - R. Thomaz Cyro Pozzi	
Subprefeitura	Jaçanã/ Tremembé
Valor empenhado	R\$ 0,00
Valor liquidado	R\$ 0,00
Situação	A contratar



## PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPEAMENTO)

[LIVRE][BP] - Rua Pontalete	
Subprefeitura	Jaçanã/ Tremembé
Valor empenhado	R\$ 7.162,94
Valor liquidado	R\$ 7.162,94
Situação	Concluída



[LIVRE][BP] - Rua Tenente Mário Barbedo	
Subprefeitura	Jaçanã/ Tremembé
Valor empenhado	R\$ 3.284.397,89
Valor liquidado	R\$ 3.284.397,89
Situação	Concluída



## PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPEAMENTO)

[LIVRE][BP] - Rua Hintem Martins	
Subprefeitura	Jaçanã/ Tremembé
Valor empenhado	R\$ 937.604,54
Valor liquidado	R\$ 937.604,54
Situação	Concluída



[LIVRE][BP] - R. Paulino Arena	
Subprefeitura	Jaçanã/ Tremembé
Valor empenhado	R\$ 388.275,64
Valor liquidado	R\$ 388.275,64
Situação	Concluída



## PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPEAMENTO)

[LIVRE][BP] - Rua Antônia Francisca de Siqueira	
Subprefeitura	Jaçanã/ Tremembé
Valor empenhado	R\$ 990.368,31
Valor liquidado	R\$ 990.368,31
Situação	Concluída



[LIVRE][BP] - Rua Anthémios de Tralles	
Subprefeitura	Jaçanã/ Tremembé
Valor empenhado	R\$ 709.295,63
Valor liquidado	R\$ 709.295,63
Situação	Concluída



## PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPEAMENTO)

[LIVRE][BP] - R. Cristóvão Arraes	
Subprefeitura	Jaçanã/ Tremembé
Valor empenhado	R\$ 315.541,91
Valor liquidado	R\$ 315.541,91
Situação	Concluída




[LIVRE][BP] - R. Osório Franco Vilhena	
Subprefeitura	Itaim Paulista
Valor empenhado	R\$ 0,00
Valor liquidado	R\$ 0,00
Situação	A contratar



## PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPEAMENTO)

[LIVRE][BP] - R. Antônio Viana	
Subprefeitura	São Miguel Paulista
Valor empenhado	R\$ 0,00
Valor liquidado	R\$ 0,00
Situação	A contratar

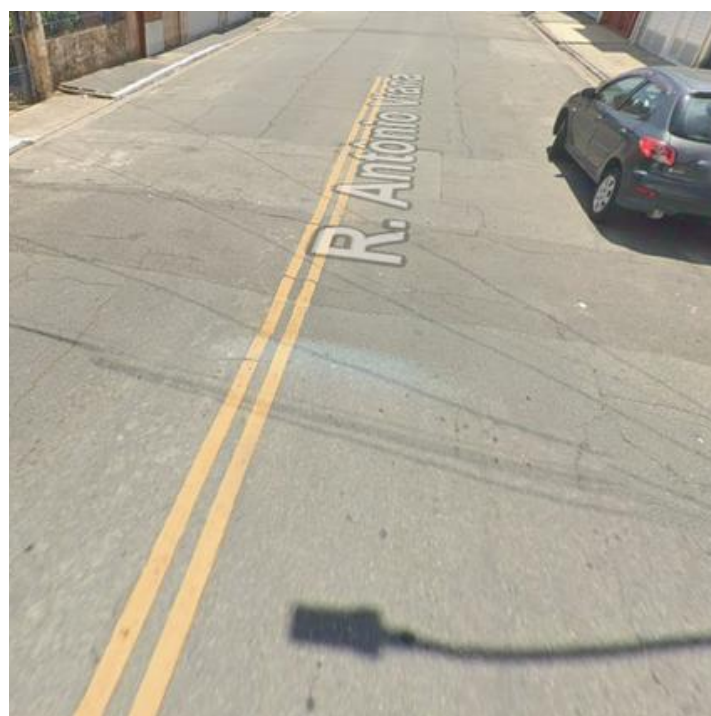


[LIVRE][BP] - R. Maria Susano Polilo	
Subprefeitura	São Miguel Paulista
Valor empenhado	R\$ 0,00
Valor liquidado	R\$ 0,00
Situação	A contratar



## PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPEAMENTO)

[LIVRE][BP] - R. Silveira Pires	
Subprefeitura	São Miguel Paulista
Valor empenhado	R\$ 0,00
Valor liquidado	R\$ 0,00
Situação	A contratar

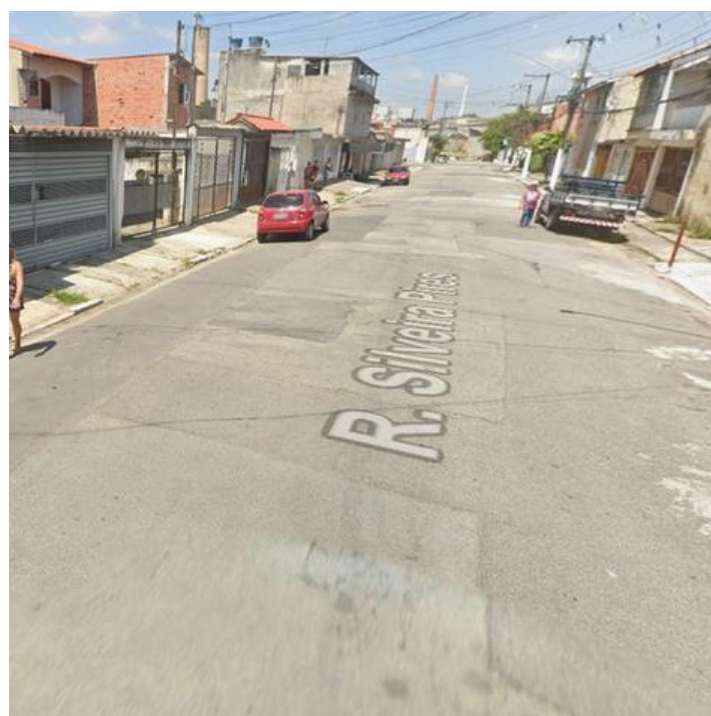

[LIVRE][BP] - R. Paranacity	
Subprefeitura	São Miguel Paulista
Valor empenhado	R\$ 0,00
Valor liquidado	R\$ 0,00
Situação	A contratar



## PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPEAMENTO)

[LIVRE][BP] - R. Antônio Dias de Moura (inclui contorno da Praça Coronel Albuquerque Câmara)	
Subprefeitura	São Miguel Paulista
Valor empenhado	R\$ 0,00
Valor liquidado	R\$ 0,00
Situação	A contratar



[LIVRE][BP] - R. Filipe Lauri - Trecho II	
Subprefeitura	Itaquera
Valor empenhado	R\$ 0,00
Valor liquidado	R\$ 0,00
Situação	A contratar



## PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPEAMENTO)

[LIVRE][BP] - Rua Sabiaúna	
Subprefeitura	Itaim Paulista
Valor empenhado	R\$ 408.654,71
Valor liquidado	R\$ 408.654,71
Situação	Concluída



## PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPEAMENTO)

[LIVRE][BP] - Rua Laços de Ouro	
Subprefeitura	Itaquera
Valor empenhado	R\$ 618.517,00
Valor liquidado	R\$ 618.517,00
Situação	Concluída



[LIVRE][BP] - Rua Major Gomes Ribeiro	
Subprefeitura	Penha
Valor empenhado	R\$ 371.626,05
Valor liquidado	R\$ 371.626,05
Situação	Concluída



## PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPEAMENTO)

[LIVRE][BP] - Rua Pedroso da Silva	
Subprefeitura	São Miguel Paulista
Valor empenhado	R\$ 1.620.595,60
Valor liquidado	R\$ 1.620.595,60
Situação	Concluída



[LIVRE][BP] - Rua Muniz Falcão	
Subprefeitura	São Miguel Paulista
Valor empenhado	R\$ 1.999.042,06
Valor liquidado	R\$ 1.999.042,06
Situação	Concluída



## PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPEAMENTO)

[LIVRE][BP] - Rua Sol da Meia-Noite	
Subprefeitura	São Miguel Paulista
Valor empenhado	R\$ 1.768.398,22
Valor liquidado	R\$ 1.768.398,22
Situação	Concluída



[LIVRE][BP] - Rua Quarenta e Sete (P. Rio Claro)	
Subprefeitura	São Mateus
Valor empenhado	R\$ 0,00
Valor liquidado	R\$ 0,00
Situação	A contratar




## PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPEAMENTO)

[LIVRE][BP] - Travessa Tristeza do Jeca	
Subprefeitura	São Mateus
Valor empenhado	R\$ 113.312,25
Valor liquidado	R\$ 17.929,71
Situação	Concluída



[LIVRE][BP] - Travessa Pé de Manaca	
Subprefeitura	São Mateus
Valor empenhado	R\$ 118.420,84
Valor liquidado	R\$ 15.485,31
Situação	Concluída

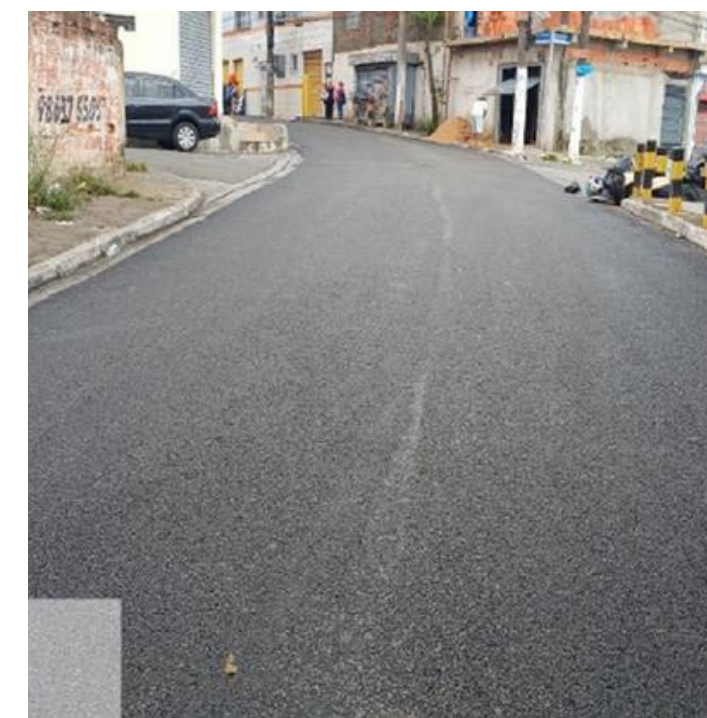


## PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPEAMENTO)

[LIVRE][BP] - Rua Estado do Amazonas	
Subprefeitura	São Mateus
Valor empenhado	R\$ 1.103.870,68
Valor liquidado	R\$ 1.020.651,45
Situação	Concluída



[LIVRE][BP] - Rua Pranchas	
Subprefeitura	São Mateus
Valor empenhado	R\$ 384.749,52
Valor liquidado	R\$ 357.553,78
Situação	Concluída

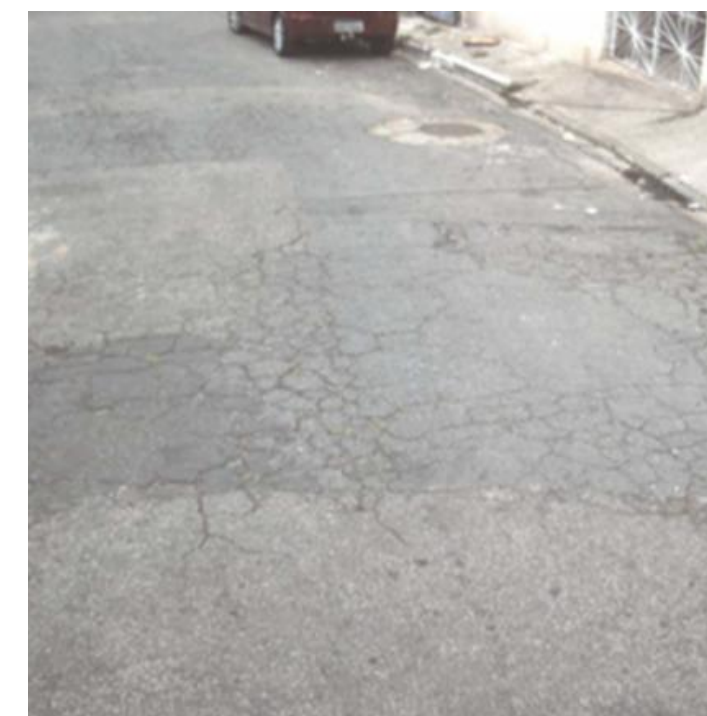

## PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPEAMENTO)

[LIVRE][BP] - Travessa João Glama	
Subprefeitura	São Mateus
Valor empenhado	R\$ 67.605,61
Valor liquidado	R\$ 50.910,39
Situação	Concluída



[LIVRE][BP] - Travessa Mário Vitali	
Subprefeitura	São Mateus
Valor empenhado	R\$ 330.699,28
Valor liquidado	R\$ 239.265,61
Situação	Concluída



## PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPEAMENTO)

[LIVRE][BP] - Rua Alves Seixas	
Subprefeitura	Sapopemba
Valor empenhado	R\$ 363.100,06
Valor liquidado	R\$ 331.004,05
Situação	Concluída



[LIVRE][BP] - Rua Filipa Álvares	
Subprefeitura	Sapopemba
Valor empenhado	R\$ 185.550,14
Valor liquidado	R\$ 141.853,87
Situação	Concluída




## PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPEAMENTO)

[LIVRE][BP] - Rua Nicolino Guilherme Candido	
Subprefeitura	Sapopemba
Valor empenhado	R\$ 87.786,75
Valor liquidado	R\$ 62.688,57
Situação	Concluída



[LIVRE][BP] - Rua Adolfo Celi	
Subprefeitura	Sapopemba
Valor empenhado	R\$ 332.585,09
Valor liquidado	R\$ 322.279,28
Situação	Concluída

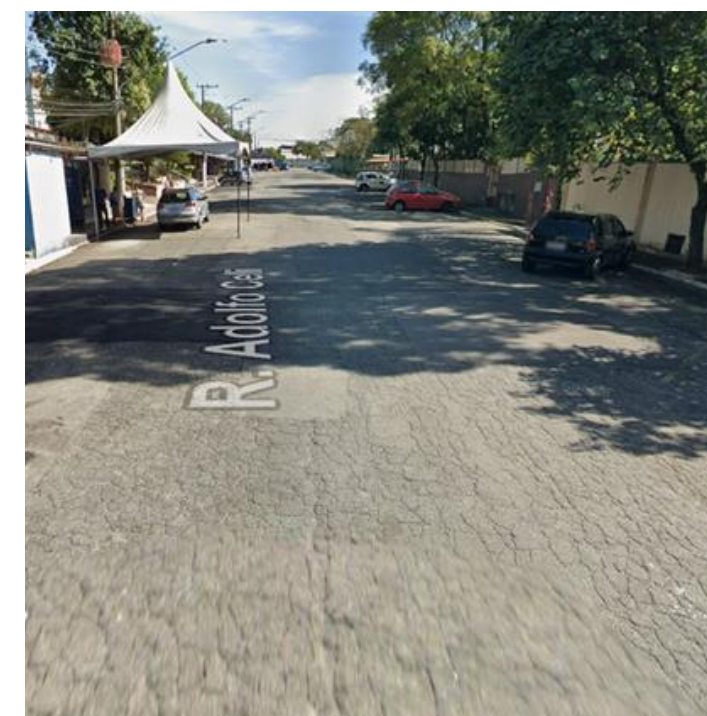

## PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPEAMENTO)

[LIVRE][BP] - Rua José Freire da Silva	
Subprefeitura	Sapopemba
Valor empenhado	R\$ 103.153,09
Valor liquidado	R\$ 86.030,17
Situação	Concluída



[LIVRE][BP] - Rua Soldado Antenor da Costa	
Subprefeitura	Sapopemba
Valor empenhado	R\$ 219.160,67
Valor liquidado	R\$ 218.690,37
Situação	Concluída



## PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPEAMENTO)

[LIVRE][BP] - Rua Vulnerária	
Subprefeitura	M'Boi Mirim
Valor empenhado	R\$ 0,00
Valor liquidado	R\$ 0,00
Situação	A executar



[LIVRE][BP] - Rua Roberto Romão de Moraes	
Subprefeitura	M'Boi Mirim
Valor empenhado	R\$ 375.829,63
Valor liquidado	R\$ 280.260,08
Situação	Concluída



## PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPEAMENTO)

[LIVRE][BP] - Rua Vicente Decara Neto	
Subprefeitura	M'Boi Mirim
Valor empenhado	R\$ 1.345.100,32
Valor liquidado	R\$ 653.472,03
Situação	Concluída



[LIVRE] - R. Camocim de São Félix (Ambos os sentidos)	
Subprefeitura	Pirituba/Jaraguá
Valor empenhado	R\$ 4.548.781,03
Valor liquidado	R\$ 0,00
Situação	Concluída



## PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPEAMENTO)

[LIVRE] - Av. Jerimanduba	
Subprefeitura	Pirituba/Jaraguá
Valor empenhado	R\$ 4.054.007,63
Valor liquidado	R\$ 0,00
Situação	Concluída




[LIVRE] - Rua Barão Geraldo de Rezende	
Subprefeitura	Perus
Valor empenhado	R\$ 0,00
Valor liquidado	R\$ 0,00
Situação	Cancelada



## PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPEAMENTO)

[LIVRE] - Rua Maria da Cruz Cunha (Ambos os sentidos)	
Subprefeitura	Pirituba/Jaraguá
Valor empenhado	R\$ 1.697.808,54
Valor liquidado	R\$ 0,00
Situação	Concluída

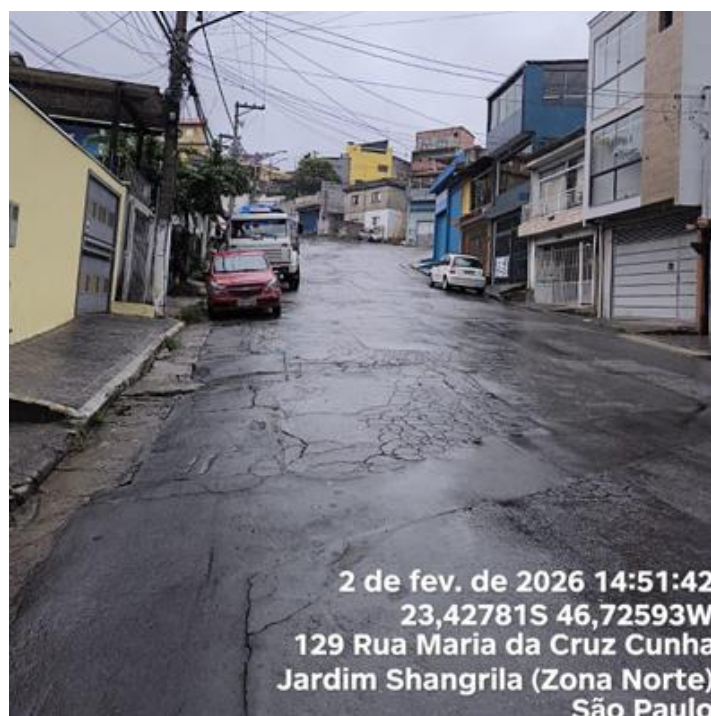

[LIVRE] - Rua José Porfírio de Souza	
Subprefeitura	Butantã
Valor empenhado	R\$ 4.788.866,03
Valor liquidado	R\$ 0,00
Situação	Em execução



## PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPEAMENTO)

[LIVRE] - Rua Baumann	
Subprefeitura	Lapa
Valor empenhado	R\$ 7.093.767,75
Valor liquidado	R\$ 0,00
Situação	Em execução



[LIVRE] - Rua Irmã Emerenciana	
Subprefeitura	Jaçanã/Tremembé
Valor empenhado	R\$ 2.338.180,70
Valor liquidado	R\$ 0,00
Situação	Em execução



## PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPEAMENTO)

[LIVRE] - Rua Comendador Armando Pereira	
Subprefeitura	Jaçanã/Tremembé
Valor empenhado	R\$ 2.595.361,82
Valor liquidado	R\$ 0,00
Situação	Em execução



[LIVRE] - R. Tuim	
Subprefeitura	Vila Mariana
Valor empenhado	R\$ 2.841.316,01
Valor liquidado	R\$ 0,00
Situação	Concluída




## PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPEAMENTO)

[LIVRE] - Al. dos Guatás	
Subprefeitura	Vila Mariana
Valor empenhado	R\$ 6.853.645,63
Valor liquidado	R\$ 0,00
Situação	Em execução



[LIVRE] - Av. João Paulo da Silva	
Subprefeitura	Capela do Socorro
Valor empenhado	R\$ 4.380.866,85
Valor liquidado	R\$ 0,00
Situação	Em execução

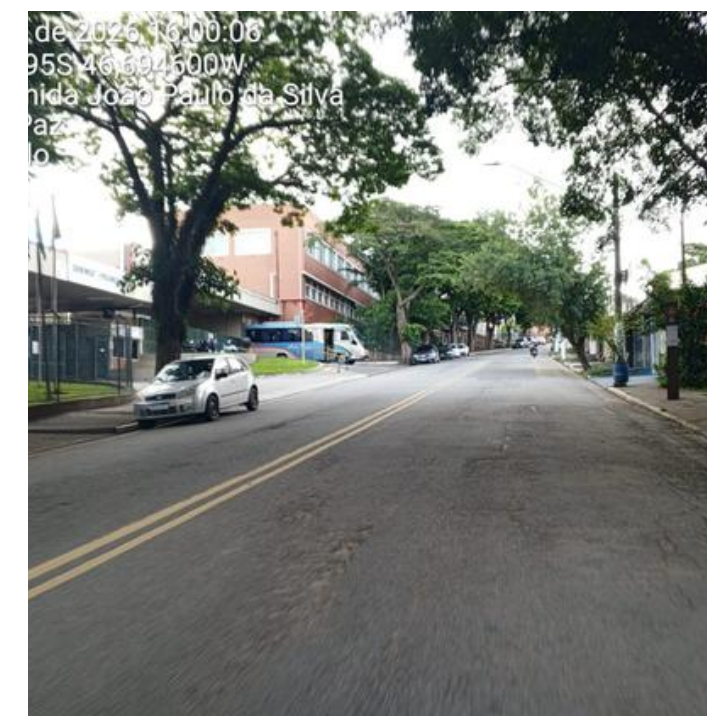

## PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPEAMENTO)

[LIVRE] - Rua Prof. Leitão da Cunha	
Subprefeitura	Campo Limpo
Valor empenhado	R\$ 7.525.950,95
Valor liquidado	R\$ 0,00
Situação	Em execução



[LIVRE] - Av. Jorge Amado	
Subprefeitura	Campo Limpo
Valor empenhado	R\$ 2.913.698,45
Valor liquidado	R\$ 0,00
Situação	A iniciar



## PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPEAMENTO)

[LIVRE] - Av. Waldemar Carlos Pereira	
Subprefeitura	Penha
Valor empenhado	R\$ 5.815.072,18
Valor liquidado	R\$ 0,00
Situação	Em execução

[LIVRE] - Av. Deputado Doutor Jose Aristodemo Pinotti - Trecho I	
Subprefeitura	Itaim Paulista
Valor empenhado	R\$ 5.430.417,43
Valor liquidado	R\$ 0,00
Situação	Em execução



## PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPEAMENTO)

[LIVRE] - Av. João Batista Santiago	
Subprefeitura	Itaim Paulista
Valor empenhado	R\$ 6.698.975,65
Valor liquidado	R\$ 0,00
Situação	A iniciar




[LIVRE] - Rua Dom Bento Pickel	
Subprefeitura	Casa Verde
Valor empenhado	R\$ 0,00
Valor liquidado	R\$ 0,00
Situação	A contratar



## PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPEAMENTO)

[LIVRE] - R. Lavinio Salles Arcuri - Trecho II	
Subprefeitura	Casa Verde
Valor empenhado	R\$ 0,00
Valor liquidado	R\$ 0,00
Situação	A contratar

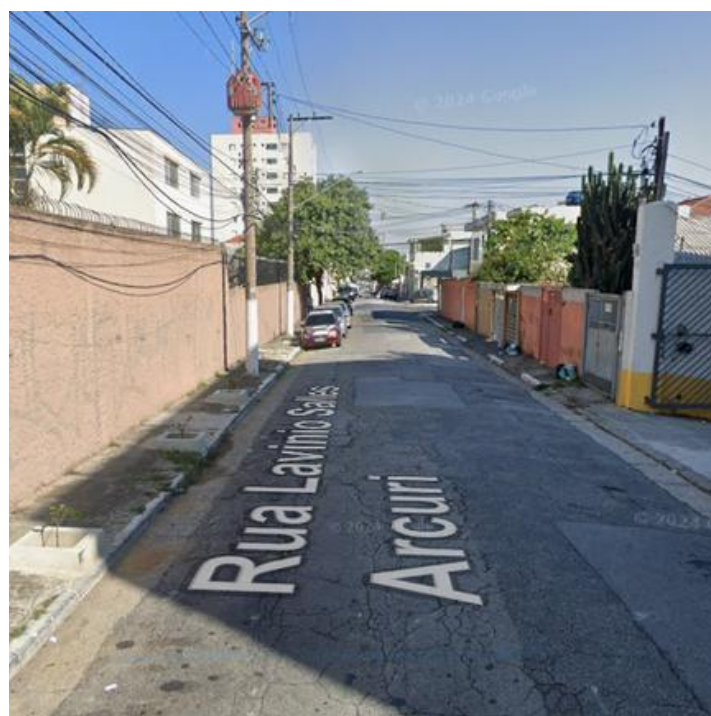

[LIVRE] - Rua Adriano Racine	
Subprefeitura	Ipiranga
Valor empenhado	R\$ 0,00
Valor liquidado	R\$ 0,00
Situação	A contratar



## PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPEAMENTO)

[LIVRE] - Rua Heráclito Graça	
Subprefeitura	Casa Verde
Valor empenhado	R\$ 415.894,73
Valor liquidado	R\$ 349.935,62
Situação	Concluída



[LIVRE] - Rua Espírita	
Subprefeitura	Sé
Valor empenhado	R\$ 510.515,71
Valor liquidado	R\$ 228.057,57
Situação	Concluída



## PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPEAMENTO)

[LIVRE] - Rua Mituto Mizumoto	
Subprefeitura	Sé
Valor empenhado	R\$ 368.896,06
Valor liquidado	R\$ 236.531,33
Situação	Concluída



[LIVRE] - Rua Guimarães Passos	
Subprefeitura	Vila Mariana
Valor empenhado	R\$ 2.739.921,81
Valor liquidado	R\$ 2.641.821,22
Situação	Concluída



## PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPEAMENTO)

[LIVRE] - Estrada Três Cruzes	
Subprefeitura	Jaçanã/Tremembé
Valor empenhado	R\$ 0,00
Valor liquidado	R\$ 0,00
Situação	A contratar



[LIVRE] - Rua Professor Brito Machado	
Subprefeitura	Itaquera
Valor empenhado	R\$ 0,00
Valor liquidado	R\$ 0,00
Situação	A contratar



## PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPEAMENTO)

[LIVRE] - Rua Pedro Talarico	
Subprefeitura	Penha
Valor empenhado	R\$ 0,00
Valor liquidado	R\$ 0,00
Situação	A contratar



[LIVRE][BP] - Rua Padre Nelson	
Subprefeitura	M'Boi Mirim
Valor empenhado	R\$ 0,00
Valor liquidado	R\$ 0,00
Situação	A executar



## PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPEAMENTO)

[LIVRE] - Rua Barão do Rego	
Subprefeitura	Santo Amaro
Valor empenhado	R\$ 0,00
Valor liquidado	R\$ 0,00
Situação	A executar



[LIVRE] - Rua Batista Caetano	
Subprefeitura	Sé
Valor empenhado	R\$ 494.236,54
Valor liquidado	R\$ 494.236,54
Situação	Concluída



# MELHORIAS DE BAIRRO

# PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL FUNDURB/ SMSUB 2026

## Plano de Aplicação FUNDURB 2026

Objeto e endereço	Valor aprovado	Valor reservado	Valor empenhado	Valor liquidado	Valor pago
<b>Melhorias de Bairro [LIVRE]</b>					
Implantação de bosques urbanos - Diversos endereços	R\$50.000.000,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Implantação de bosques urbanos - Bosque Jaçanã (Av. Dr. Arnaldo x Av. Paulista x Rua Dr. Antônio dos Santos Rocha)	R\$0,00	R\$1.640.617,15	R\$1.640.617,15	R\$416.491,90	R\$416.491,90
Implantação de bosques urbanos - Bosque Pica-Pau (Avenida do Estado, 205)	R\$0,00	R\$396.941,35	R\$396.941,35	R\$61.858,23	R\$61.858,23
Implantação de bosques urbanos - Bosque Gavião (Rua Hely Lopes Meirelles, 1450 x Av. Condessa Elizabeth de Robiano, 4054)	R\$0,00	R\$1.047.832,37	R\$1.047.832,37	R\$450.986,46	R\$450.986,46
Implantação de bosques urbanos - Bosque Irerê (Alça de retorno - Ponte Jânio Quadros)	R\$0,00	R\$517.898,43	R\$517.898,43	R\$306.326,38	R\$306.326,38
Implantação de bosques urbanos - Bosque Anú (Alça de retorno - Ponte Jânio Quadros)	R\$0,00	R\$662.606,41	R\$662.606,41	R\$0,00	R\$0,00
Implantação de bosques urbanos - Bosque Saíra (Acesso Ponte Vila Guilherme)	R\$0,00	R\$416.086,33	R\$416.086,33	R\$0,00	R\$0,00
Implantação de bosques urbanos - Bosque Bem-te-vi (Rua Antônio de Sá)	R\$0,00	R\$955.184,12	R\$955.184,12	R\$0,00	R\$0,00
Implantação de bosques urbanos - Bosque Suindara (Alça de acesso da Ponte da Casa Verde)	R\$0,00	R\$108.344,73	R\$108.344,73	R\$73.431,46	R\$73.431,46
Implantação de bosques urbanos - Bosque Antiguaçu (Alça de acesso da Ponte do Limão)	R\$0,00	R\$457.149,80	R\$457.149,80	R\$0,00	R\$0,00
Implantação de bosques urbanos - Bosque João-de-Barro (Alça de acesso da Ponte do Limão)	R\$0,00	R\$452.904,70	R\$452.904,70	R\$0,00	R\$0,00
<b>Total</b>	<b>R\$50.000.000,00</b>	<b>R\$6.655.565,39</b>	<b>R\$6.655.565,39</b>	<b>R\$1.309.094,43</b>	<b>R\$1.309.094,43</b>

# PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL FUNDURB/ SMSUB 2026


## Plano de Aplicação FUNDURB 2026

Objeto e endereço	Valor aprovado	Valor reservado	Valor empenhado	Valor liquidado	Valor pago
<b>Melhorias de Bairro [LIVRE]</b>					
Implantação de bosques urbanos - Bosque Papagaio (Alça de acesso Ponte Vila Guilherme)	R\$0,00	R\$480.277,90	R\$480.277,90	R\$0,00	R\$0,00
Implantação de bosques urbanos - Bosque Sanhaço (Alça de acesso da Ponte da Casa Verde)	R\$0,00	R\$436.166,57	R\$582.245,50	R\$87.748,36	R\$87.748,36
Implantação de bosques urbanos - Bosque Cardeal (Alça de acesso da Ponte da Casa Verde)	R\$0,00	R\$578.746,35	R\$526.367,20	R\$107.522,36	R\$107.522,36
Implantação de bosques urbanos - Bosque Ema (Alça de acesso da Ponte da Casa Verde)	R\$0,00	R\$605.612,08	R\$620.335,71	R\$115.839,99	R\$115.839,99
Implantação de bosques urbanos - Bosque Udu (Pç. Ary da Rocha)	R\$0,00	R\$559.879,16	R\$393.564,95	R\$88.812,05	R\$88.812,05
Implantação de bosques urbanos - Bosque Mariquita (Av. 23 de maio x Acesso ao Viaduto Dr. Manuel José Chaves)	R\$0,00	R\$1.228.183,72	R\$1.228.183,72	R\$111.797,00	R\$111.797,00
Implantação de bosques urbanos - Bosque Tesourinha (Av Santos Dummont x Av Tiradentes)	R\$0,00	R\$1.318.952,54	R\$1.318.952,54	R\$1.154.673,14	R\$1.154.673,14
Implantação de bosques urbanos - Bosque Suiriri (Vd. Santa Ifigênia x Av. Prestes Maia)	R\$0,00	R\$1.118.691,10	R\$1.118.691,10	R\$0,00	R\$0,00
Implantação de bosques urbanos - Bosque Pardal (Pq. Dom Pedro II x Rua Dr. Itapura de Miranda)	R\$0,00	R\$707.294,88	R\$707.294,88	R\$361.525,22	R\$361.525,22
Implantação de bosques urbanos - Bosque Trica-Ferro (R. Sto. Antônio do Pinhal x R. Manoel Graça)	R\$0,00	R\$1.644.273,69	R\$1.644.273,69	R\$0,00	R\$0,00
Implantação de bosques urbanos - Bosque Pintassilgo (R. João Passalacqua, 66)	R\$0,00	R\$573.674,55	R\$573.674,55	R\$157.898,37	R\$157.898,37
<b>Total</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$9.251.752,54</b>	<b>R\$9.193.861,74</b>	<b>R\$2.185.816,49</b>	<b>R\$2.185.816,49</b>

## IMPLANTAÇÃO DE BOSQUES URBANOS

<b>Objeto</b>	Bosque Jaçanã
<b>Subprefeitura</b>	Sé
<b>Endereço</b>	Av. Dr. Arnaldo x Av. Paulista x Rua Dr. Antônio dos Santos Rocha
<b>Nº do SEI</b>	6012.2025/0022172-4
<b>Situação</b>	Em execução

<b>Valor aprovado 2026</b>	R\$ 0,00
<b>Valor reservado 2026</b>	R\$ 1.640.617,15
<b>Valor empenhado 2026</b>	R\$ 1.640.617,15
<b>Valor liquidado 2026</b>	R\$ 0,00

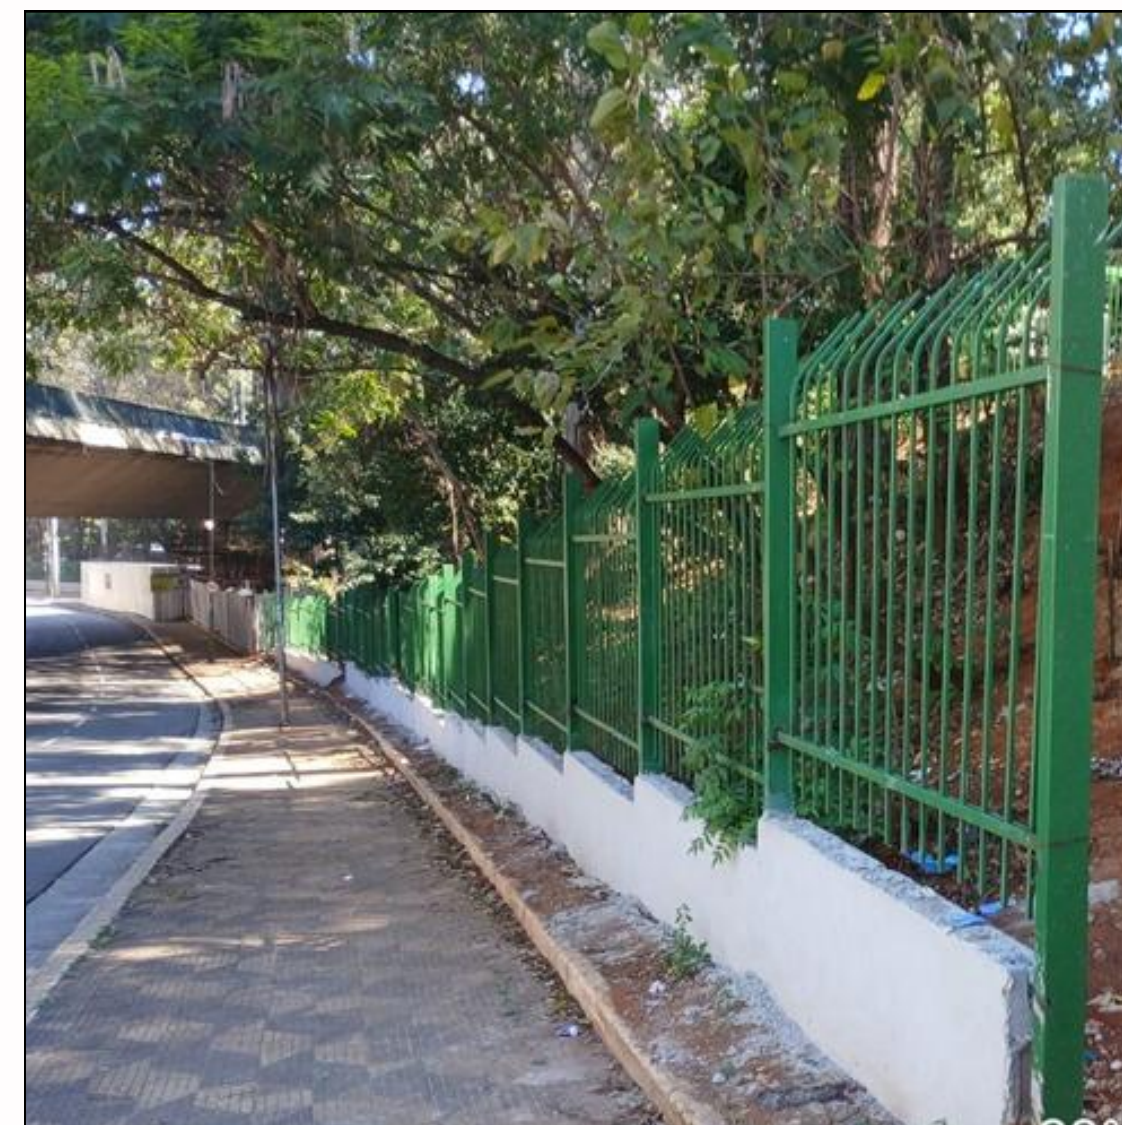

## IMPLANTAÇÃO DE BOSQUES URBANOS

Objeto	Bosque Pica-Pau
Subprefeitura	Sé
Endereço	Avenida do Estado, 205
Nº do SEI	6012.2025/0022173-2
Situação	Em execução

Valor aprovado 2026	R\$ 0,00
Valor reservado 2026	R\$ 396.941,35
Valor empenhado 2026	R\$ 396.941,35
Valor liquidado 2026	R\$ 0,00



## IMPLANTAÇÃO DE BOSQUES URBANOS

<b>Objeto</b>	Bosque Gavião
<b>Subprefeitura</b>	Mooca
<b>Endereço</b>	Rua Hely Lopes Meirelles, 1450 x Av. Condessa Elizabeth de Robiano, 4054
<b>Nº do SEI</b>	6012.2025/0022172-4
<b>Situação</b>	Em execução

<b>Valor aprovado 2026</b>	R\$ 0,00
<b>Valor reservado 2026</b>	R\$ 1.047.832,37
<b>Valor empenhado 2026</b>	R\$ 1.047.832,37
<b>Valor liquidado 2026</b>	R\$ 0,00



## IMPLANTAÇÃO DE BOSQUES URBANOS

Objeto	Bosque Irerê
Subprefeitura	Vila Maria/ Vila Guilherme
Endereço	Alça de retorno - Ponte Jânio Quadros
Nº do SEI	6012.2025/0022639-4
Situação	Em execução

Valor aprovado 2026	R\$ 0,00
Valor reservado 2026	R\$ 662.606,41
Valor empenhado 2026	R\$ 662.606,41
Valor liquidado 2026	R\$ 0,00



## IMPLANTAÇÃO DE BOSQUES URBANOS

Objeto	Bosque Anú
Subprefeitura	Mooca
Endereço	Alça de retorno - Ponte Jânio Quadros
Nº do SEI	6012.2025/0022639-4
Situação	A executar


Valor aprovado 2026	R\$ 0,00
Valor reservado 2026	R\$ 662.606,41
Valor empenhado 2026	R\$ 662.606,41
Valor liquidado 2026	R\$ 0,00



## IMPLANTAÇÃO DE BOSQUES URBANOS

<b>Objeto</b>	Bosque Saíra
<b>Subprefeitura</b>	Mooca
<b>Endereço</b>	Acesso Ponte Vila Guilherme
<b>Nº do SEI</b>	6012.2025/0022639-4
<b>Situação</b>	A executar


<b>Valor aprovado 2026</b>	R\$ 0,00
<b>Valor reservado 2026</b>	R\$ 416.086,33
<b>Valor empenhado 2026</b>	R\$ 416.086,33
<b>Valor liquidado 2026</b>	R\$ 0,00

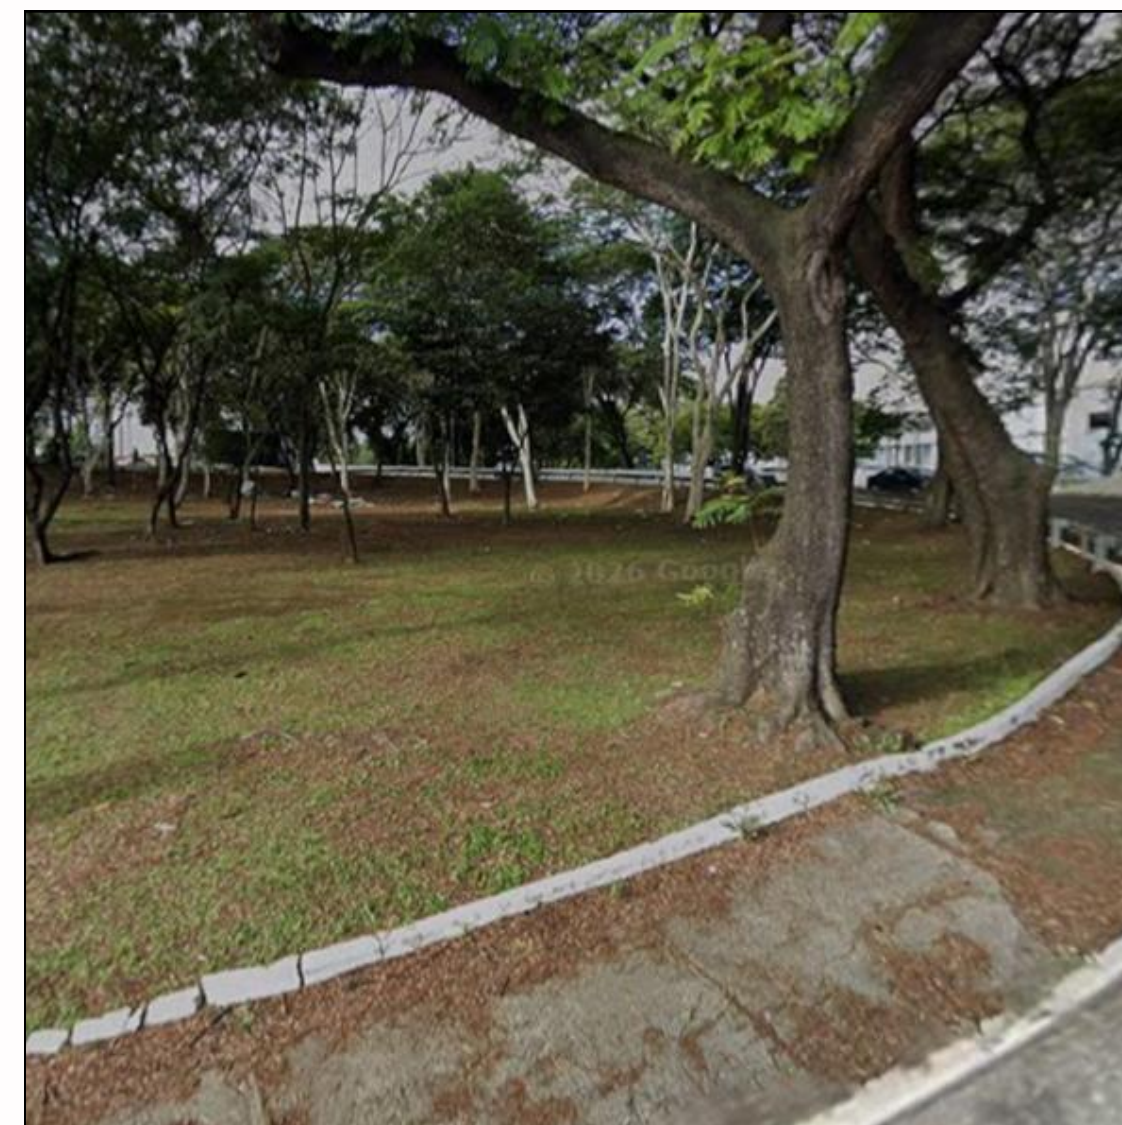

## IMPLANTAÇÃO DE BOSQUES URBANOS

Objeto	Bosque Bem-te-vi
Subprefeitura	Sé
Endereço	Rua Antônio de Sá
Nº do SEI	6012.2025/0022172-4
Situação	A executar

Valor aprovado 2026	R\$ 0,00
Valor reservado 2026	R\$ 955.184,12
Valor empenhado 2026	R\$ 955.184,12
Valor liquidado 2026	R\$ 0,00

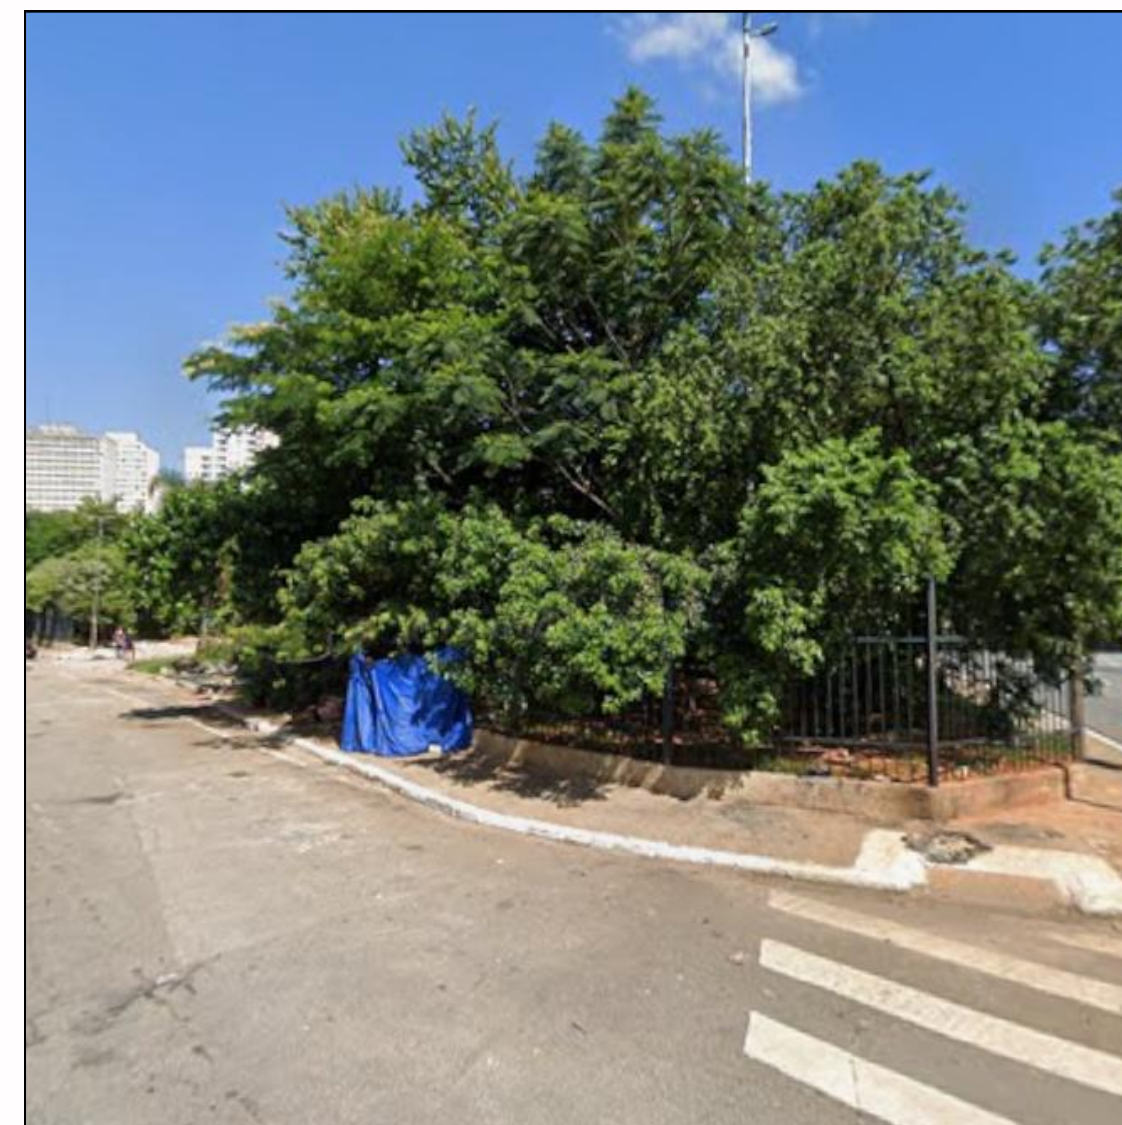

## IMPLANTAÇÃO DE BOSQUES URBANOS

Objeto	Bosque Suindara
Subprefeitura	Casa Verde
Endereço	Alça de acesso da Ponte da Casa Verde
Nº do SEI	6012.2025/0022640-8
Situação	Em execução

Valor aprovado 2026	R\$ 0,00
Valor reservado 2026	R\$ 955.184,12
Valor empenhado 2026	R\$ 955.184,12
Valor liquidado 2026	R\$ 0,00



## IMPLANTAÇÃO DE BOSQUES URBANOS

Objeto	Bosque Antiguaçu
Subprefeitura	Casa Verde
Endereço	Alça de acesso da Ponte do Limão
Nº do SEI	6012.2025/0022640-8
Situação	A executar


Valor aprovado 2026	R\$ 0,00
Valor reservado 2026	R\$ 457.149,80
Valor empenhado 2026	R\$ 457.149,80
Valor liquidado 2026	R\$ 0,00



## IMPLANTAÇÃO DE BOSQUES URBANOS

<b>Objeto</b>	Bosque João-de-Barro
<b>Subprefeitura</b>	Lapa
<b>Endereço</b>	Alça de acesso da Ponte do Limão
<b>Nº do SEI</b>	6012.2025/0022640-8
<b>Situação</b>	A executar


<b>Valor aprovado 2026</b>	R\$ 0,00
<b>Valor reservado 2026</b>	R\$ 452.904,70
<b>Valor empenhado 2026</b>	R\$ 452.904,70
<b>Valor liquidado 2026</b>	R\$ 0,00

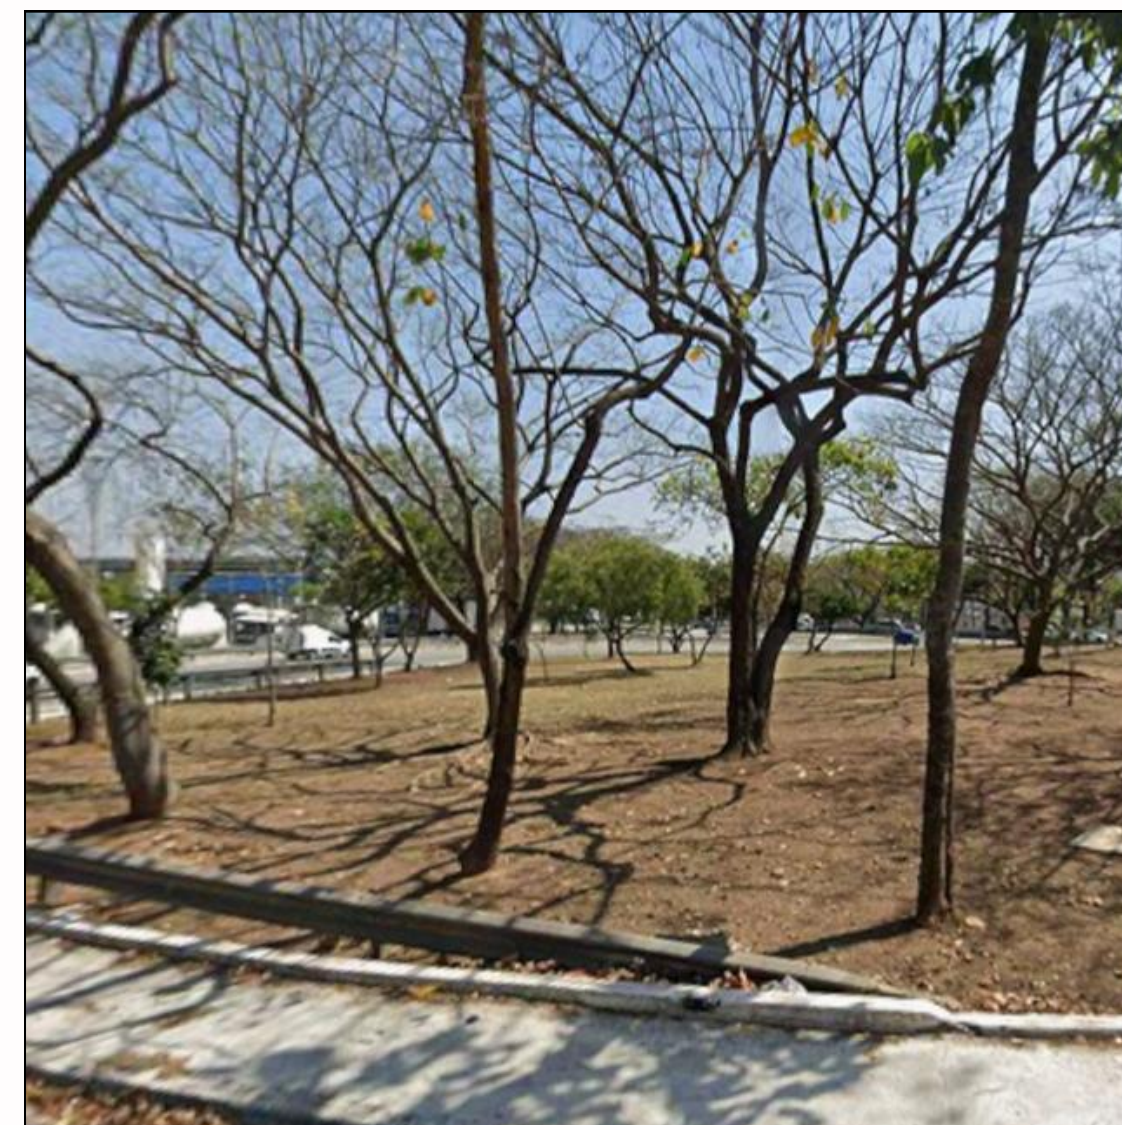

## IMPLANTAÇÃO DE BOSQUES URBANOS

<b>Objeto</b>	Bosque Papagaio
<b>Subprefeitura</b>	Vila Maria/ Vila Guilherme
<b>Endereço</b>	Alça de acesso Ponte Vila Guilherme
<b>Nº do SEI</b>	6012.2025/0022640-8
<b>Situação</b>	A executar

<b>Valor aprovado 2026</b>	R\$ 0,00
<b>Valor reservado 2026</b>	R\$ 480.277,90
<b>Valor empenhado 2026</b>	R\$ 480.277,90
<b>Valor liquidado 2026</b>	R\$ 0,00

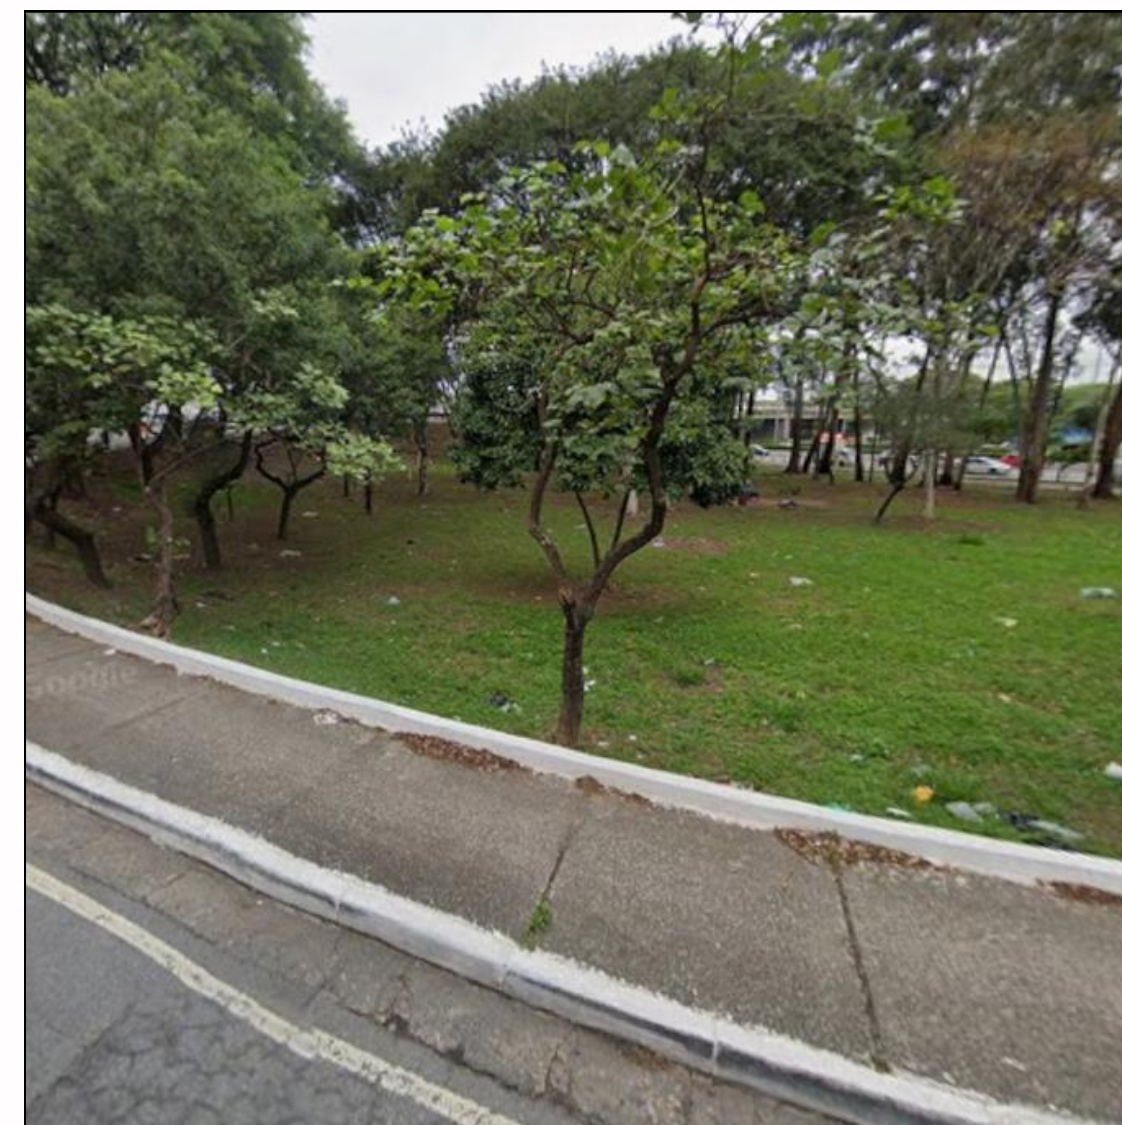

## IMPLANTAÇÃO DE BOSQUES URBANOS

Objeto	Bosque Sanhaço
Subprefeitura	Lapa
Endereço	Alça de acesso da Ponte da Casa Verde
Nº do SEI	6012.2025/0022641-6
Situação	Em execução

Valor aprovado 2026	R\$ 0,00
Valor reservado 2026	R\$ 436.166,57
Valor empenhado 2026	R\$ 582.245,50
Valor liquidado 2026	R\$ 87.748,36



## IMPLANTAÇÃO DE BOSQUES URBANOS

Objeto	Bosque Cardeal
Subprefeitura	Sé
Endereço	Alça de acesso da Ponte da Casa Verde
Nº do SEI	6012.2025/0022641-6
Situação	Em execução

Valor aprovado 2026	R\$ 0,00
Valor reservado 2026	R\$ 578.746,35
Valor empenhado 2026	R\$ 526.367,20
Valor liquidado 2026	R\$ 107.522,36



## IMPLANTAÇÃO DE BOSQUES URBANOS

Objeto	Bosque Ema
Subprefeitura	Sé
Endereço	Alça de acesso da Ponte da Casa Verde
Nº do SEI	6012.2025/0022641-6
Situação	Em execução


Valor aprovado 2026	R\$ 0,00
Valor reservado 2026	R\$ 605.612,08
Valor empenhado 2026	R\$ 620.335,71
Valor liquidado 2026	R\$ 115.839,99



## IMPLANTAÇÃO DE BOSQUES URBANOS

<b>Objeto</b>	Bosque Udu
<b>Subprefeitura</b>	Ipiranga
<b>Endereço</b>	Pç. Ary da Rocha
<b>Nº do SEI</b>	6012.2025/0022641-6
<b>Situação</b>	Em execução


<b>Valor aprovado 2026</b>	R\$ 0,00
<b>Valor reservado 2026</b>	R\$ 559.879,16
<b>Valor empenhado 2026</b>	R\$ 393.564,95
<b>Valor liquidado 2026</b>	R\$ 88.812,05

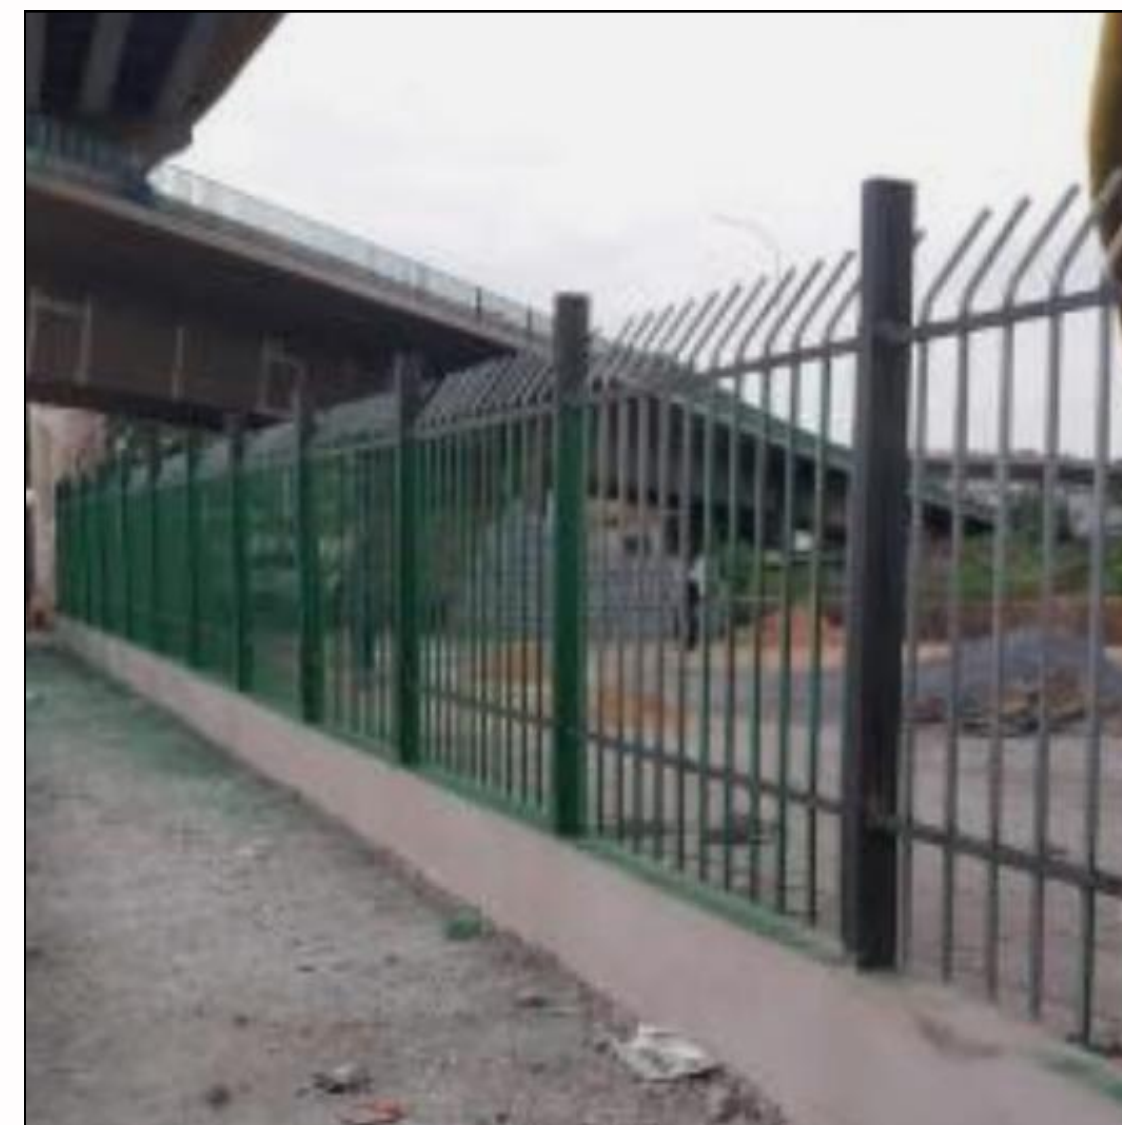

## IMPLANTAÇÃO DE BOSQUES URBANOS

Objeto	Bosque Mariquita
Subprefeitura	Sé
Endereço	Av. 23 de maio x Acesso ao Viaduto Dr. Manuel José Chaves
Nº do SEI	6012.2025/0022759-5
Situação	Em execução

Valor aprovado 2026	R\$ 0,00
Valor reservado 2026	R\$ 1.228.183,72
Valor empenhado 2026	R\$ 1.228.183,72
Valor liquidado 2026	R\$ 111.797,00

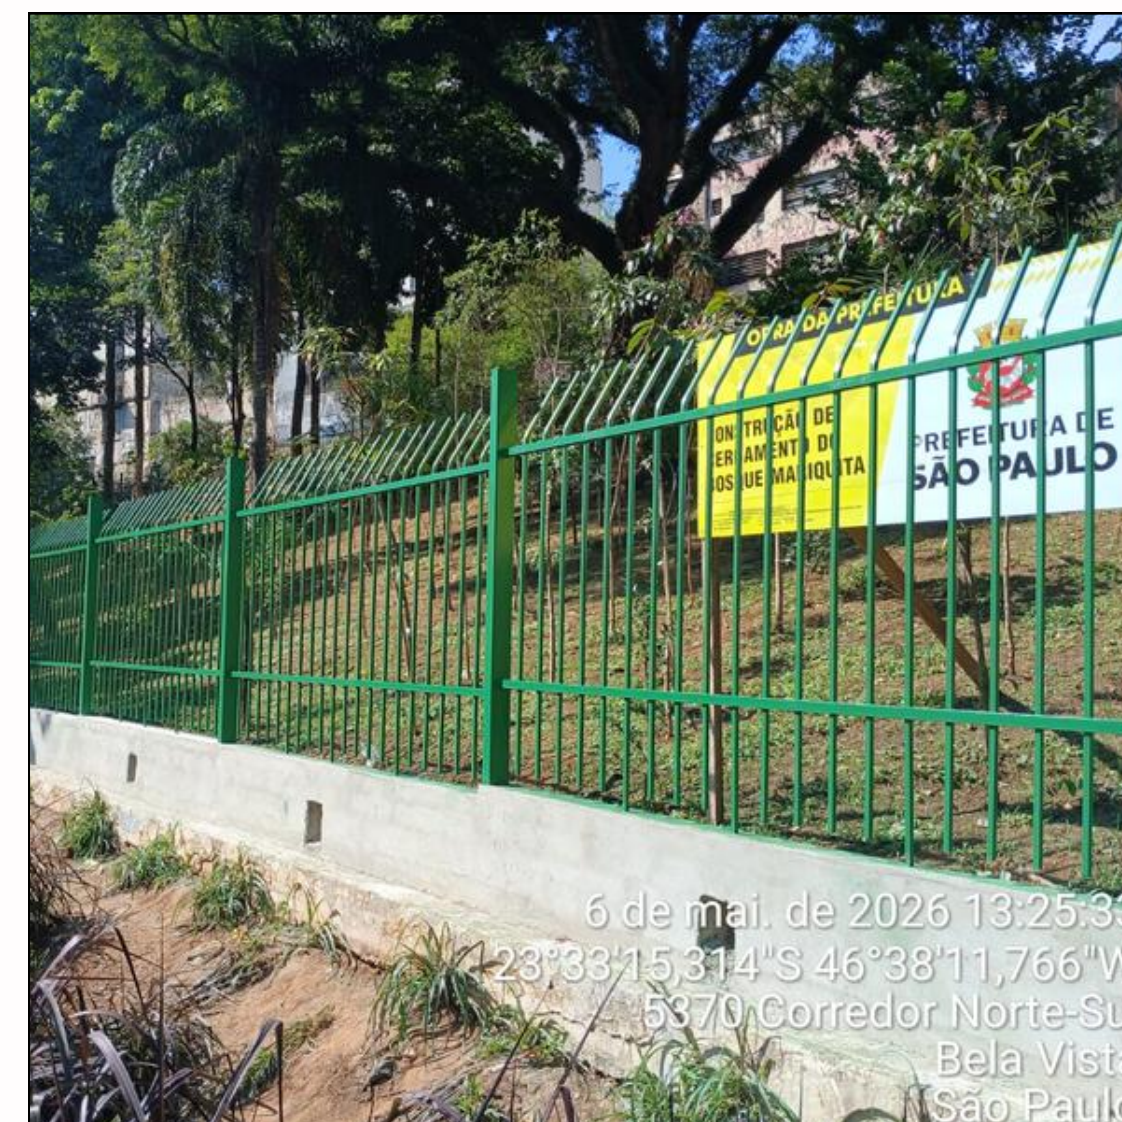

## IMPLANTAÇÃO DE BOSQUES URBANOS

Objeto	Bosque Tesourinha
Subprefeitura	Sé
Endereço	Av Santos Dummont x Av Tiradentes
Nº do SEI	6012.2025/0022759-5
Situação	Em execução

Valor aprovado 2026	R\$ 0,00
Valor reservado 2026	R\$ 1.318.952,54
Valor empenhado 2026	R\$ 1.318.952,54
Valor liquidado 2026	R\$ 1.154.673,14



## IMPLANTAÇÃO DE BOSQUES URBANOS

Objeto	Bosque Suiriri
Subprefeitura	Sé
Endereço	Vd. Santa Ifigênia x Av. Prestes Maia
Nº do SEI	6012.2025/0022760-9
Situação	Em execução

Valor aprovado 2026	R\$ 0,00
Valor reservado 2026	R\$ 1.118.691,10
Valor empenhado 2026	R\$ 1.118.691,10
Valor liquidado 2026	R\$ 0,00



## IMPLANTAÇÃO DE BOSQUES URBANOS

Objeto	Bosque Pardal
Subprefeitura	Sé
Endereço	Pq. Dom Pedro II x Rua Dr. Itapura de Miranda
Nº do SEI	6012.2025/0022760-9
Situação	Em execução


Valor aprovado 2026	R\$ 0,00
Valor reservado 2026	R\$ 707.294,88
Valor empenhado 2026	R\$ 707.294,88
Valor liquidado 2026	R\$ 361.525,22



## IMPLANTAÇÃO DE BOSQUES URBANOS

Objeto	Bosque Trica-Ferro
Subprefeitura	Mooca
Endereço	R. Sto. Antônio do Pinhal x R. Manoel Graça
Nº do SEI	6012.2025/0022761-7
Situação	Em execução

Valor aprovado 2026	R\$ 0,00
Valor reservado 2026	R\$ 1.644.273,69
Valor empenhado 2026	R\$ 1.644.273,69
Valor liquidado 2026	R\$ 0,00

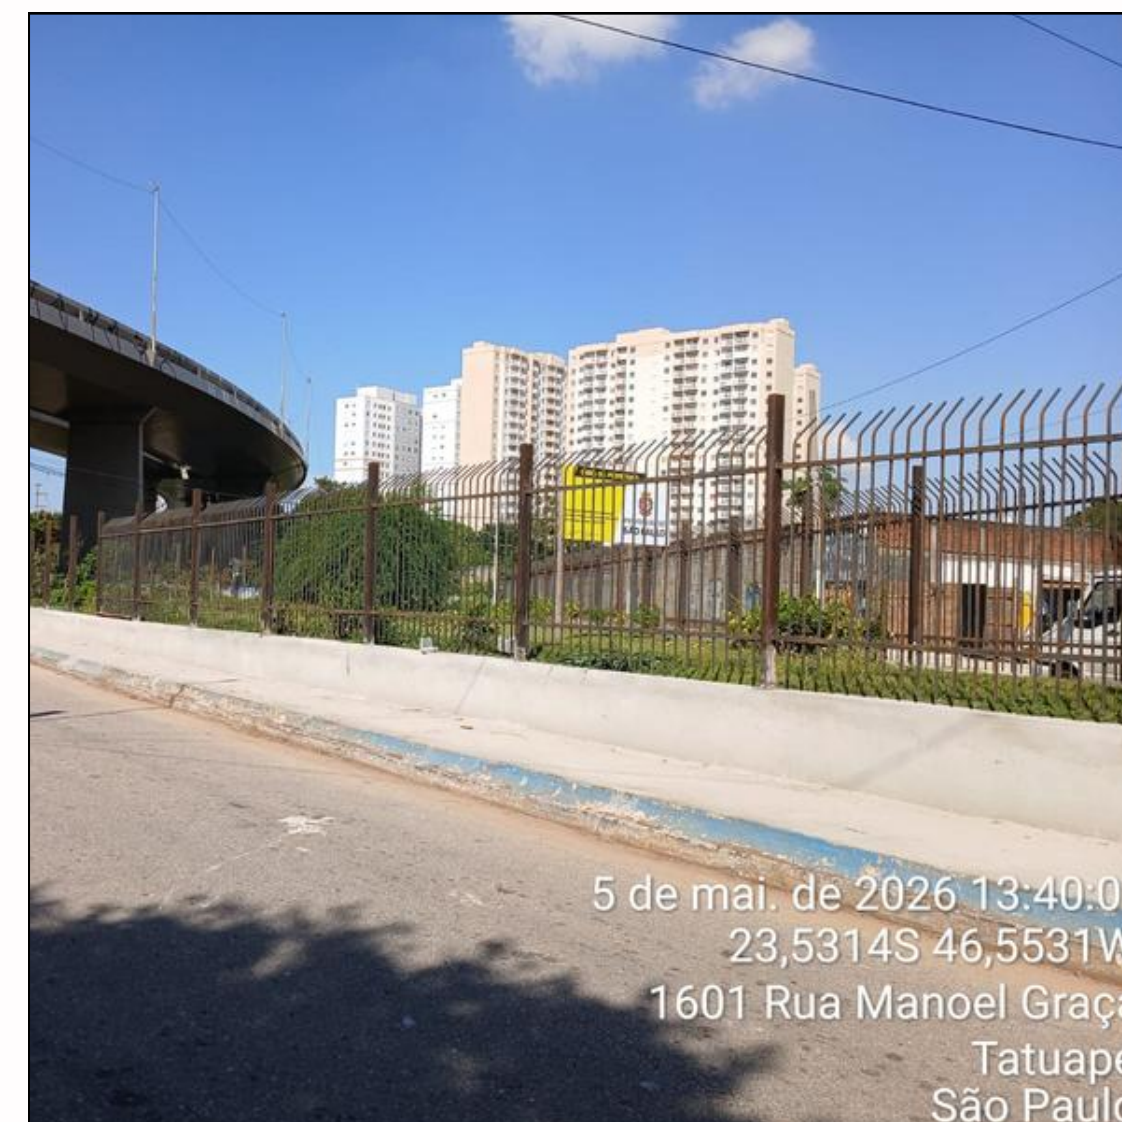

## IMPLANTAÇÃO DE BOSQUES URBANOS

Objeto	Bosque Pintassilgo (R. João Passalacqua, 66)
Subprefeitura	Sé
Endereço	R. João Passalacqua, 66
Nº do SEI	6012.2025/0022761-7
Situação	Em execução

Valor aprovado 2026	R\$ 0,00
Valor reservado 2026	R\$ 573.674,55
Valor empenhado 2026	R\$ 573.674,55
Valor liquidado 2026	R\$ 157.898,37



# PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL FUNDURB/ SMSUB 2026

## Plano de Aplicação FUNDURB 2026

Objeto e endereço	Valor aprovado	Valor reservado	Valor empenhado	Valor liquidado	Valor pago
<b>Melhorias de Bairro [LIVRE]</b>					
Requalificação de escadões e vielas - Diversos endereços	R\$6.053.249,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Requalificação de espaço público - Av. dos Ourives, alt. nº 785	R\$6.000.000,00	R\$5.766.501,54	R\$5.766.501,54	R\$0,00	R\$0,00
Revitalização da espaço público - Rua Ana Cintra, 225 - Santa Cecília	R\$1.300.000,00	R\$1.300.000,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Revitalização e acessibilidade no Beco do Batman	R\$1.000.000,00	R\$853.696,90	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Requalificação de espaço público - Av. Presidente Wilson x Rua da Mooca	R\$6.000.000,00	R\$6.000.000,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Requalificação de espaço público - Rua Reverendo João Euclides Pereira x Rua São Vicente de Minas - Jardim Matarazzo	R\$0,00	R\$1.564.940,83	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Requalificação de área pública - Rua Capitão Felisbino de Moraes	R\$0,00	R\$911.088,84	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Requalificação e promoção da ocupação dos espaços públicos - Campo Pirituba	R\$0,00	R\$1.500.000,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Requalificação de área pública - Rua Demóstenes, entre vias Rua Antônio de Macedo Soares e Rua Barão de Jaceguai	R\$0,00	R\$820.958,45	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
<b>Total</b>	<b>R\$20.353.249,00</b>	<b>R\$18.717.186,56</b>	<b>R\$5.766.501,54</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>

## REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO

<b>Objeto</b>	Requalificação de espaço público - Av. dos Ourives, alt. nº 785
<b>Subprefeitura</b>	Ipiranga
<b>Endereço</b>	Av. dos Ourives, alt. nº 785
<b>Nº do SEI</b>	6039.2025/0006571-1
<b>Situação</b>	A executar

<b>Valor aprovado 2026</b>	R\$ 6.000.000,00
<b>Valor reservado 2026</b>	R\$ 5.766.501,54
<b>Valor empenhado 2026</b>	R\$ 5.766.501,54
<b>Valor liquidado 2026</b>	R\$ 0,00



## REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO

Objeto	Revitalização da espaço público - Rua Ana Cintra, 225 - Santa Cecília
Subprefeitura	Sé
Endereço	Rua Ana Cintra, 225 - Santa Cecília
Nº do SEI	6012.2026/0001378-3
Situação	A licitar
Valor aprovado 2026	R\$ 1.300.000,00
Valor reservado 2026	R\$ 1.300.000,00
Valor empenhado 2026	R\$ 0,00
Valor liquidado 2026	R\$ 0,00



## REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO

Objeto	Revitalização e acessibilidade no Beco do Batman
Subprefeitura	Pinheiros
Endereço	Rua Gonçalo Afonso - Vila Madalena
Nº do SEI	6012.2026/0001380-5
Situação	Em licitação

Valor aprovado 2026	R\$ 1.000.000,00
Valor reservado 2026	R\$ 853.696,90
Valor empenhado 2026	R\$ 0,00
Valor liquidado 2026	R\$ 0,00



## REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO

<b>Objeto</b>	Requalificação de espaço público - Av. Presidente Wilson x Rua da Mooca
<b>Subprefeitura</b>	Sé
<b>Endereço</b>	Av. Presidente Wilson x Rua da Mooca
<b>Nº do SEI</b>	6012.2026/0004416-6
<b>Situação</b>	A licitar


<b>Valor aprovado 2026</b>	R\$ 6.000.000,00
<b>Valor reservado 2026</b>	R\$ 6.000.000,00
<b>Valor empenhado 2026</b>	R\$ 0,00
<b>Valor liquidado 2026</b>	R\$ 0,00



## REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO

<b>Objeto</b>	Requalificação de espaço público - Rua Reverendo João Euclides Pereira x Rua São Vicente de Minas - Jardim Matarazzo
<b>Subprefeitura</b>	Ermelino Matarazzo
<b>Endereço</b>	Rua Reverendo João Euclides Pereira x Rua São Vicente de Minas - Jardim Matarazzo
<b>Nº do SEI</b>	6012.2025/0018323-7
<b>Situação</b>	Licitação homologada

<b>Valor aprovado 2026</b>	R\$ 0,00
<b>Valor reservado 2026</b>	R\$ 1.564.940,83
<b>Valor empenhado 2026</b>	R\$ 0,00
<b>Valor liquidado 2026</b>	R\$ 0,00

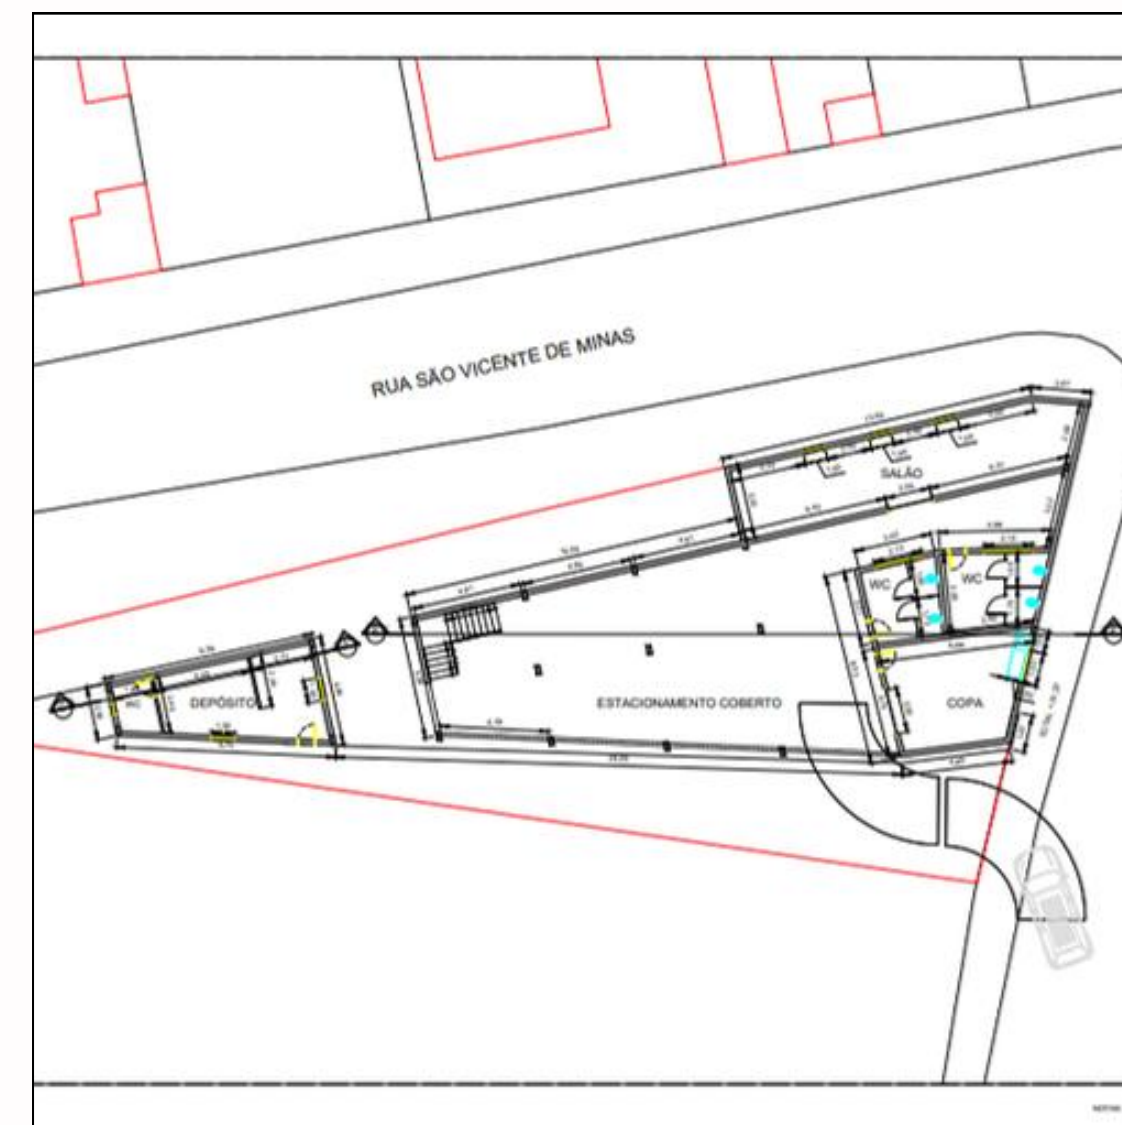

## REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO


<b>Objeto</b>	Drenagem - Rua Capitão Felisbino de Moraes
<b>Subprefeitura</b>	Santo Amaro
<b>Endereço</b>	Rua Capitão Felisbino de Moraes
<b>Nº do SEI</b>	6012.2025/0021676-3
<b>Situação</b>	Em licitação

<b>Valor aprovado 2026</b>	R\$ 0,00
<b>Valor reservado 2026</b>	R\$ 911.088,84
<b>Valor empenhado 2026</b>	R\$ 0,00
<b>Valor liquidado 2026</b>	R\$ 0,00



## REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO

<b>Objeto</b>	Requalificação e promoção da ocupação dos espaços públicos - Campo Pirituba
<b>Subprefeitura</b>	Pirituba/ Jaraguá
<b>Endereço</b>	Rua Oscar Pander
<b>Nº do SEI</b>	6012.2025/0023253-0
<b>Situação</b>	A licitar
<b>Valor aprovado 2026</b>	R\$ 0,00
<b>Valor reservado 2026</b>	R\$ 1.500.000,00
<b>Valor empenhado 2026</b>	R\$ 0,00
<b>Valor liquidado 2026</b>	R\$ 0,00

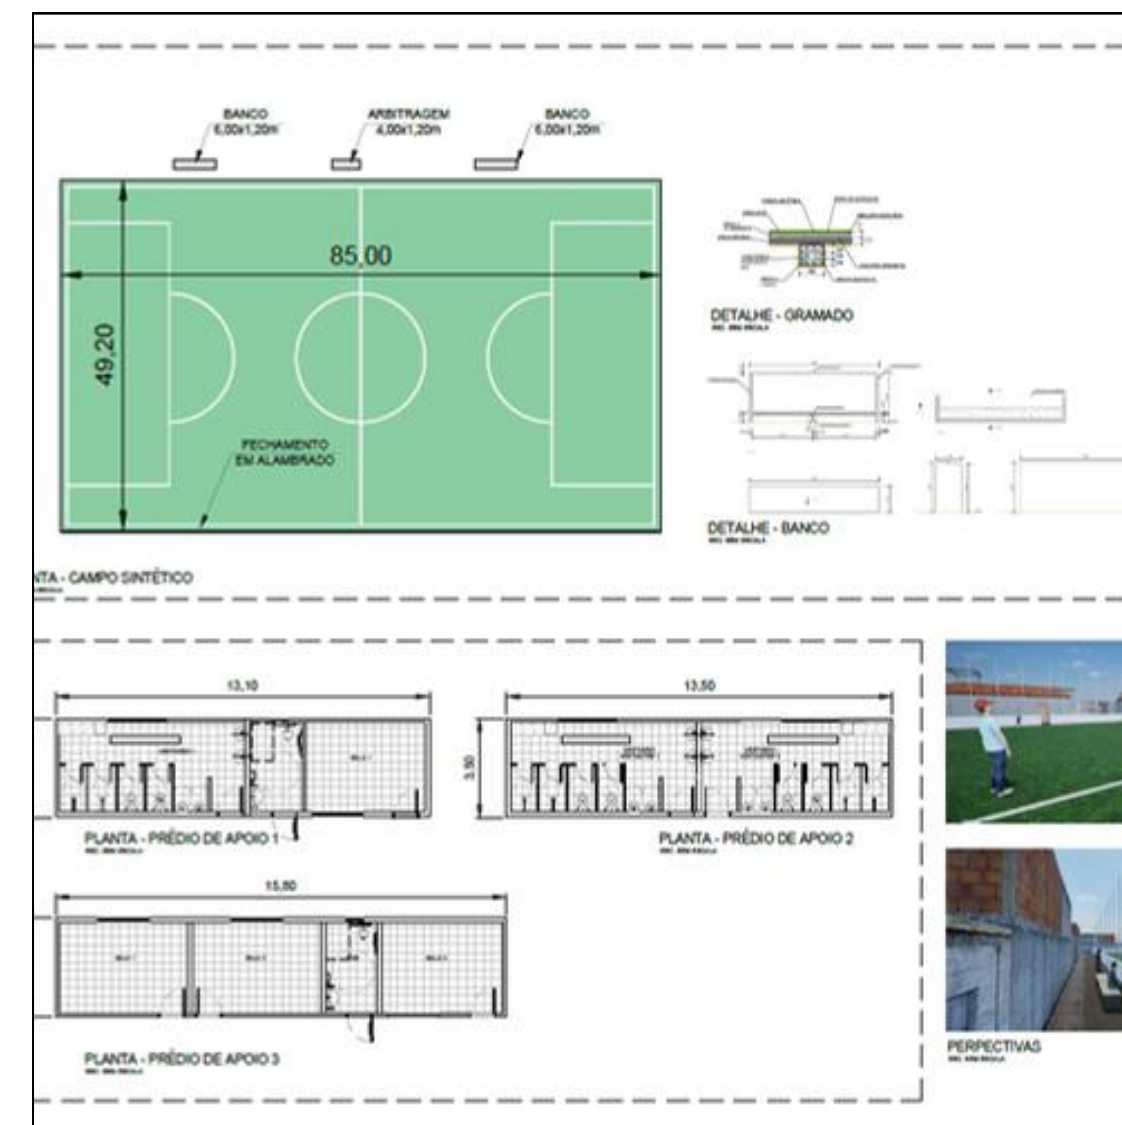

## REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO

<b>Objeto</b>	Requalificação de área pública - Rua Demóstenes, entre vias Rua Antônio de Macedo Soares e Rua Barão de Jaceguai
<b>Subprefeitura</b>	Santo Amaro
<b>Endereço</b>	Rua Demóstenes, entre vias Rua Antônio de Macedo Soares e Rua Barão de Jaceguai
<b>Nº do SEI</b>	6012.2026/0002281-2
<b>Situação</b>	Em licitação

<b>Valor aprovado 2026</b>	R\$ 0,00
<b>Valor reservado 2026</b>	R\$ 820.958,45
<b>Valor empenhado 2026</b>	R\$ 0,00
<b>Valor liquidado 2026</b>	R\$ 0,00



# EXECUÇÃO DE OBRAS EM ÁREAS DE RISCO - PREVENTIVA [LIVRE]

# PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL FUNDURB/ SMSUB 2026

<b>Plano de Aplicação FUNDURB 2026</b>			
<b>Objeto e endereço</b>	<b>Valor aprovado 2026</b>	<b>Valor proposto 2026</b>	<b>Situação</b>
<b>Execução de obras em áreas de risco - Preventiva [LIVRE]</b>			
Execução de obras civis para implantação de jardins de chuva - Diversos endereços	R\$2.183.650,82	R\$2.183.650,82	R\$2.000.000,00
Execução de obras de contenção de margem de córrego, com elaboração de projeto executivo - Córrego Ogum	R\$3.316.349,18	R\$3.316.349,18	R\$5.766.501,54
Elaboração de projeto executivo e obras civis de readequação de rede de águas pluviais na Praça Luigi Palma - Jardim Cidália	R\$20.000.000,00	R\$20.000.000,00	R\$1.300.000,00
Obras civis de drenagem no Corrego Ayrosa, proximo à rua João Frederico Agricola - Tremembé	R\$4.500.000,00	R\$4.500.000,00	R\$853.696,90
<b>Total SMSUB 2025</b>	<b>R\$30.000.000,00</b>	<b>R\$30.000.000,00</b>	

## REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO

<b>Objeto</b>	Execução de obras civis para implantação de jardins de chuva - Diversos endereços
<b>Subprefeitura</b>	Diversas
<b>Endereço</b>	Diversos endereços
<b>Nº do SEI</b>	6012.2025/0011708-0
<b>Situação</b>	Em execução

<b>Valor aprovado 2026</b>	R\$ 2.183.650,82
<b>Valor reservado 2026</b>	R\$ 2.134.119,08
<b>Valor empenhado 2026</b>	R\$ 2.134.119,08
<b>Valor liquidado 2026</b>	R\$ 362.962,09



## REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO

<b>Objeto</b>	Execução de obras de contenção de margem de córrego, com elaboração de projeto executivo - Córrego Ogum
<b>Subprefeitura</b>	Capela do Socorro
<b>Endereço</b>	Rua Oceano Pacífico até Tv. da Sereia
<b>Nº do SEI</b>	6012.2023/0012470-9
<b>Situação</b>	A licitar


<b>Valor aprovado 2026</b>	R\$ 3.316.349,18
<b>Valor reservado 2026</b>	R\$ 0,00
<b>Valor empenhado 2026</b>	R\$ 0,00
<b>Valor liquidado 2026</b>	R\$ 0,00



## REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO

<b>Objeto</b>	Elaboração de projeto executivo e obras civis de readequação de rede de águas pluviais na Praça Luigi Palma - Jardim Cidália
<b>Subprefeitura</b>	Cidade Ademar
<b>Endereço</b>	Praça Luigi Palma - Jardim Cidália
<b>Nº do SEI</b>	6012.2026/0003314-8
<b>Situação</b>	A licitar

<b>Valor aprovado 2026</b>	R\$ 20.000.000,00
<b>Valor reservado 2026</b>	R\$ 20.000.000,00
<b>Valor empenhado 2026</b>	R\$ 0,00
<b>Valor liquidado 2026</b>	R\$ 0,00

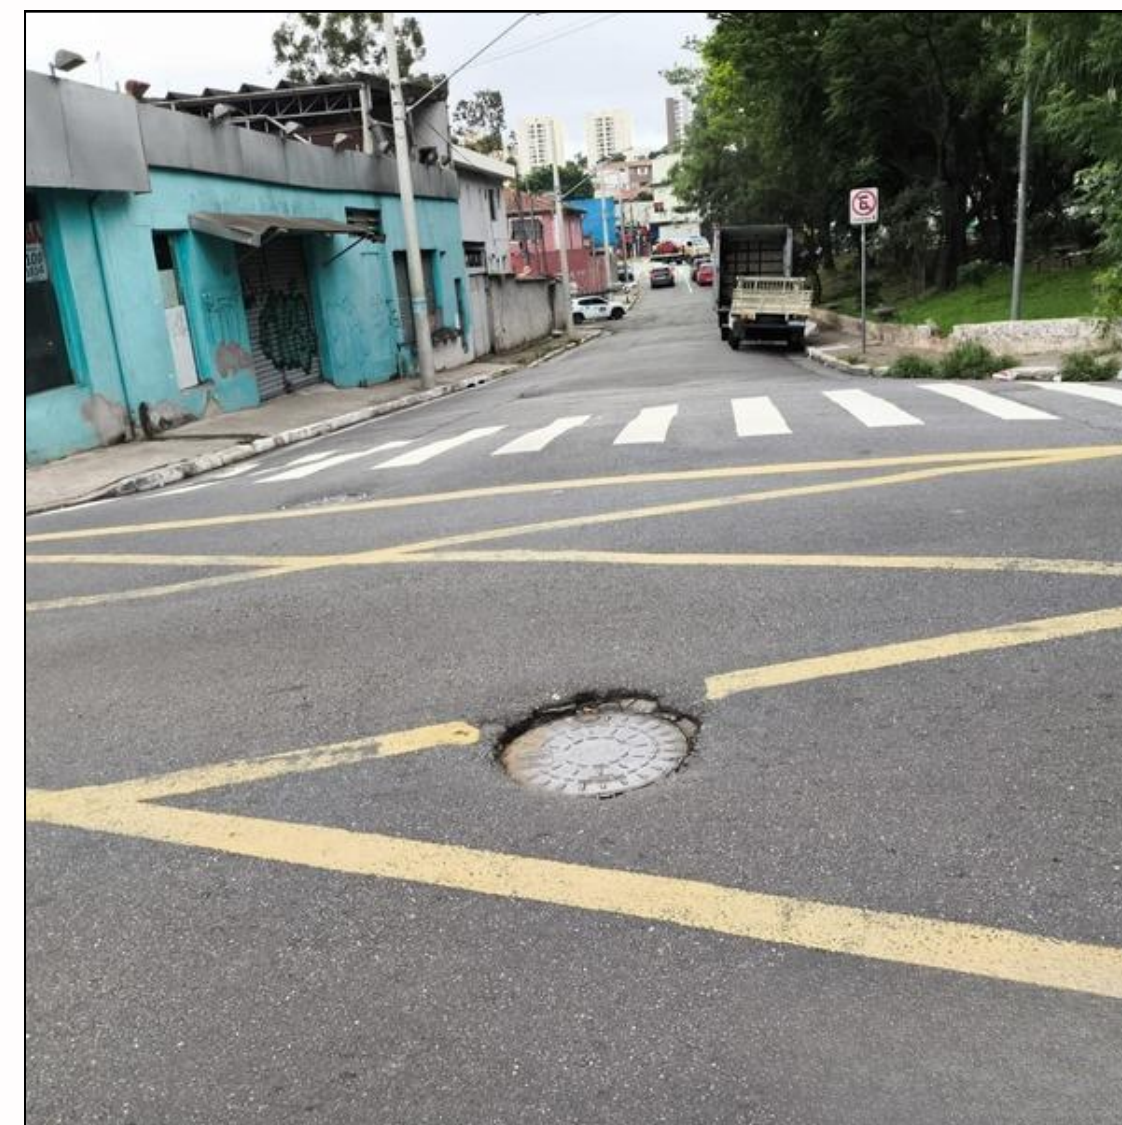

## REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO

<b>Objeto</b>	Obras civis de drenagem no Córrego Ayrosa, próximo à Rua João Frederico Agrícola - Tremembé
<b>Subprefeitura</b>	Diversas
<b>Endereço</b>	Córrego Ayrosa, próximo à Rua João Frederico Agrícola - Tremembé
<b>Nº do SEI</b>	6012.2026/0001356-2
<b>Situação</b>	A licitar
<b>Valor aprovado 2026</b>	R\$ 4.500.000,00
<b>Valor reservado 2026</b>	R\$ 4.500.000,00
<b>Valor empenhado 2026</b>	R\$ 0,00
<b>Valor liquidado 2026</b>	R\$ 0,00





**PREFEITURA DE  
SÃO PAULO**  
SECRETARIA DAS  
SUBPREFEITURAS

# OBRIGADO!

