



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
CULTURA

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO – FUNDURB

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2024

Planilha e Relatório Fotográfico

Prestação de contas do FUNDURB (98.25)

Execução orçamentária por item do plano aprovado

Prestação de contas do FUNDURB (98.25)

Execução orçamentária por dotação

DOTAÇÃO	Solicitado (R\$)	Execução orçamentária 2024			
		Reservado (R\$)	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)
98.25.13.391.3001.5.957.44903900.08.1.759.0402.0	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 17.997.739,22	R\$ 15.411.110,93	R\$ 15.411.110,93	R\$ 9.031.297,10	R\$ 8.906.423,43
98.25.13.391.3001.5.957.44909200.08.1.759.0402.1	R\$ 27.750,96	R\$ 27.750,96	R\$ 27.750,96	R\$ 27.750,96	R\$ 27.750,96
98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.1	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
98.25.13.392.3001.5.960.44903900.08.1.759.0402.0	R\$ 1.204.547,22	R\$ 603.838,31	R\$ 603.838,31	R\$ 603.838,31	R\$ 603.838,31
98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 11.191.184,84	R\$ 6.636.640,75	R\$ 6.636.640,75	R\$ 5.395.610,20	R\$ 4.457.597,68
98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.1	R\$ 11.412.301,58	R\$ 2.435.063,44	R\$ 2.435.063,44	R\$ 85.280,93	R\$ 85.280,93
98.25.13.392.3001.5.959.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
98.25.13.392.3001.5.400.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
98.25.13.391.3001.5.421.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 34.000,00	R\$ 34.000,00	R\$ 34.000,00	R\$ 34.000,00	R\$ 34.000,00
98.25.13.392.3001.5.425.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 5.359.782,00	R\$ 5.345.942,54	R\$ 5.345.942,54	R\$ 5.345.942,54	R\$ 5.345.942,54
98.25.13.392.3001.5.425.44905100.08.1.759.0402.1	R\$ 2.649.509,81	R\$ 2.259.134,25	R\$ 2.259.134,25	R\$ 1.640.823,50	R\$ 1.640.823,50
98.25.13.392.3020.5.426.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	R\$ 49.979.815,63	R\$ 32.753.481,18	R\$ 32.753.481,18	R\$ 22.164.543,54	R\$ 21.101.657,35
		65,53%	65,53%	44,35%	42,22%

*Os dados utilizados são referentes aos Relatórios de Empenho detalhado do SOF atualizados em 12/02/2025.

Atualizado em: 12/02/2025 às 15h28											
Item	Equipamento cultural	Ação	Processo	Status	Dotação orçamentária	Ação orçamentária	Valor	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	% do liquidado do valor aprovado no último plano da SMC
1	Centro Cultural São Paulo	Reforma das Fachadas	6025.2023/0002933-2	4. em execução/obra	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	5957	R\$ 3.875.840,51	R\$ 3.858.585,06	R\$ 3.008.063,66	R\$ 3.008.063,66	77,6%
1	Centro Cultural São Paulo	Reforma em imóvel tombado - Medidas de Segurança	6025.2021/0003800-1	1. em desenvolvimento	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	5957	R\$ 56.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
1	Centro Cultural São Paulo	Reforma de manutenção predial - cobertura zenital	6025.2024/0014937-2	3. aguardando autorizações/aprovações	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	5957	R\$ 750.000,00	R\$ 1.061.658,65	R\$ 511.658,65	R\$ 511.658,65	68,2%
1	Centro Cultural São Paulo	Reforma de manutenção predial - impermeabilizações	6025.2024/0014973-9	3. aguardando autorizações/aprovações	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	5957	R\$ 750.000,00	R\$ 1.120.542,07	R\$ 570.542,07	R\$ 570.542,07	76,1%
2	Casa de Cultura Cidade Ademar	Implantação da Casa de Cultura Cidade Ademar	6025.2022/0018097-7	4. em execução/obra	98.25.13.392.3001.5.425.44905100.08.1.759.0402.0	5425	R\$ 5.359.782,00	R\$ 5.345.942,54	R\$ 5.345.942,54	R\$ 5.345.942,54	99,7%
2	Casa de Cultura Cidade Ademar	Implantação da Casa de Cultura Cidade Ademar	6025.2022/0018097-7	4. em execução/obra	98.25.13.392.3001.5.425.44905100.08.1.759.0402.1	5425	R\$ 2.649.509,81	R\$ 2.259.134,25	R\$ 1.640.823,50	R\$ 1.640.823,50	61,9%
3	Sítio Mirim	Reconstrução da Casa-Sede	6025.2020/0016806-0	4. em execução/obra	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	5957	R\$ 800.000,00	R\$ 2.539.459,99	R\$ 95.872,80	R\$ 95.872,80	12,0%
4	Sítio Morrinhos	Restauero, segurança contra incêndio e acessibilidade	6025.2022/0022026-0	4. em execução/obra	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	5957	R\$ 200.000,00	R\$ 440.143,84	R\$ 440.143,84	R\$ 440.143,84	220,1%
5	Centro Cultural Penha	Serviços Corretivos para AVCB	6025.2018/0009114-4	4. em execução/obra	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	5960	R\$ 211.536,40	R\$ 211.536,40	R\$ 211.536,40	R\$ 211.536,40	100,0%
6	Teatro João Caetano	Reforma geral para Acessibilidade, Segurança contra incêndio, Conservação e Restauero.	6025.2022/0011336-6	4. em execução/obra	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	5957	R\$ 8.533.266,05	R\$ 4.719.658,21	R\$ 3.384.544,74	R\$ 3.384.544,74	39,7%
7	Edifício Sampaio Moreira	3ª Fase de Obras de restauro - Fase Piso Térreo	6025.2023/0016820-0	4. em execução/obra	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	5957	R\$ 585.775,61	R\$ 585.775,61	R\$ 453.611,55	R\$ 453.611,55	77,4%
8	Casa de Cultura Parelheiros	Manutenção Predial	6025.2023/0015198-7	4. em execução/obra	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	5960	R\$ 347.516,67	R\$ 346.827,11	R\$ 346.827,11	R\$ 346.827,11	99,8%
9	Praça das Artes	3ª fase - Obras complementares dos corpos artísticos	8510.2022/0000503-4	4. em execução/obra	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	5960	R\$ 3.803.543,67	R\$ 2.703.326,18	R\$ 2.289.743,44	R\$ 1.351.730,92	60,2%
9	Praça das Artes	3ª fase - Obras complementares dos corpos artísticos	8510.2022/0000503-4	4. em execução/obra	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.1	5960	R\$ 2.149.782,51	R\$ 2.149.782,51	R\$ -	R\$ -	0,0%
9	Praça das Artes	3ª fase - Gerenciamento e fiscalização de obra - Praça das Artes	8510.2022/0000503-4	4. em execução/obra	98.25.13.392.3001.5.960.44903900.08.1.759.0402.0	5960	R\$ 595.332,62	R\$ 603.838,31	R\$ 603.838,31	R\$ 603.838,31	101,4%
9	Praça das Artes	4ª fase - obras complementares do prédio dos corpos artísticos	8510.2024/0000577-1	0. em planejamento	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.1	5960	R\$ 6.125.888,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
9	Praça das Artes	4ª fase - gerenciamento e fiscalização das obras complementares do prédio dos corpos artísticos	8510.2023/0000696-2	0. em planejamento	98.25.13.392.3001.5.960.44903900.08.1.759.0402.0	5960	R\$ 609.214,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
10	Memorial dos Afliitos	Sondagem e Parecer de fundações para implantação de Edifício do Memorial dos Afliitos.	6025.2023/0014412-3	6. finalizado	98.25.13.391.3001.5.421.44905100.08.1.759.0402.0	5421	R\$ 34.000,00	R\$ 34.000,00	R\$ 34.000,00	R\$ 34.000,00	100,0%
11	Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso	Serviços Cívis de Adequação hidráulica e instalação de sala de dança	6025.2023/0005660-7	4. em execução/obra	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	5960	R\$ 398.445,44	R\$ 398.445,44	R\$ 367.358,67	R\$ 367.358,67	92,2%
11	Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso	Serviços corretivos de AVCB	6025.2022/0011088-0	6. finalizado	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	5960	R\$ 663.256,69	R\$ 663.256,69	R\$ 663.256,69	R\$ 663.256,69	100,0%
12	Biblioteca Chácara do Castelo	Requalificação	6025.2023/0017795-1	4. em execução/obra	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	5960	R\$ 1.100.205,62	R\$ 1.100.205,62	R\$ 732.596,38	R\$ 732.596,38	0,0%
13	Casa de Cultura São Mateus	Construção de Novo Edifício	6025.2024/0023689-5	0. em planejamento	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	5960	R\$ 700.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
14	Casa de Cultura Vila Guilherme	Obra de Restauero	Sem processo 2	0. em planejamento	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	5957	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%

Atualizado em: 12/02/2025 às 15h28											
Item	Equipamento cultural	Ação	Processo	Status	Dotação orçamentária	Ação orçamentária	Valor	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	% do liquidado do valor aprovado no último plano da SMC
14	Casa de Cultura Vila Guilherme	Projeto executivo de restauro	6025.2022/0003748-1	4. em execução/obra	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	5957	R\$ 359.149,67	R\$ 222.990,73	R\$ 133.535,38	R\$ 133.535,38	37,2%
15	Biblioteca Mário de Andrade	Projeto de AVCB	6025.2018/0015645-9	0. em planejamento	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	5957	R\$ 81.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
15	Biblioteca Mário de Andrade	Restauro da calçada	6025.2022/0023974-2	0. em planejamento	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	5957	R\$ 384.200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
16	Monumento	Restauro da Fonte Monumental	6025.2023/0037747-0	0. em planejamento	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	5960	R\$ 229.187,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
17	Monumento à Independência	Restauro	6025.2024/0013810-9	0. em planejamento	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.1	5957	R\$ 100.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
18	Arquivo Histórico Municipal	Serviços corretivos de AVCB - CMAR	6025.2023/0024465-9	4. em execução/obra	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	5957	R\$ 58.000,00	R\$ 48.789,39	R\$ 48.789,39	R\$ 48.789,39	84,1%
18	Arquivo Histórico Municipal	Instalação de linha de vida	6025.2023/0030077-0	6.finalizado	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	5957	R\$ 127.500,00	R\$ 127.500,00	R\$ 58.461,22	R\$ 58.461,22	45,9%
19	Sítio da Ressaca	Pagamento de Despesa do Exercício Anterior	6025.2023/0025407-7	4. em execução/obra	98.25.13.391.3001.5.957.44909200.08.1.759.0402.1	5957	R\$ 27.750,96	R\$ 27.750,96	R\$ 27.750,96	R\$ 27.750,96	100,0%
20	Centro Cultural Tendal da Lapa	Levantamento de edificações e terreno	6025.2023/0034072-0	0. em planejamento	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	5960	R\$ 52.250,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
21	Biblioteca Pedro Nava	Levantamento de edificações e terreno	6025.2023/0034072-0	0. em planejamento	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	5960	R\$ 27.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
22	Escola Municipal de Iniciação Artística - Perus	Levantamento de edificações e terreno	6025.2023/0034072-0	0. em planejamento	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	5960	R\$ 18.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
23	Casa de Cultura Itaim Paulista	Levantamento de edificações e terreno	6025.2023/0034072-0	0. em planejamento	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	5960	R\$ 12.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
24	Casa de Cultura Hip-Hop Sul	Levantamento de edificações e terreno	6025.2023/0034072-0	0. em planejamento	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	5960	R\$ 4.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
25	Casa do Caxingui	Levantamento de edificações e terreno	6025.2023/0034072-0	0. em planejamento	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	5960	R\$ 22.150,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
26	Biblioteca Ricardo Ramos	Levantamento de edificações e terreno	6025.2023/0034072-2	0. em planejamento	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	5960	R\$ 26.050,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
27	Biblioteca Brito Broca	Reforma e manutenção predial	6025.2024/0015470-8	3. aguardando autorizações/aprovações	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	5960	R\$ 722.942,96	R\$ 722.824,10	R\$ 722.824,10	R\$ 722.824,10	100,0%
28	Biblioteca Padre José de Anchieta	Levantamento de edificações e terreno	6025.2023/0034072-0	0. em planejamento	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	5960	R\$ 5.150,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
29	Biblioteca Sérgio Buarque de Holanda	Levantamento de edificações e terreno	6025.2023/0034072-0	0. em planejamento	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	5960	R\$ 76.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
29	Biblioteca Sérgio Buarque de Holanda	Reforma e manutenção predial	Sem processo 8	0. em planejamento	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	5957	R\$ 750.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%

Atualizado em: 12/02/2025 às 15h28											
Item	Equipamento cultural	Ação	Processo	Status	Dotação orçamentária	Ação orçamentária	Valor	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)	% do liquidado do valor aprovado no último plano da SMC
30	Biblioteca Roberto Santos	Reforma e manutenção predial	6025.2024/0017170-0	2. processo SEI iniciado	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	5957	R\$ 686.007,38	R\$ 686.007,38	R\$ 326.073,80	R\$ 201.200,13	47,5%
31	Biblioteca Castro Alves	Reforma e manutenção predial	6025.2024/0026619-0	0. em planejamento	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	5960	R\$ 1.040.974,00	R\$ 260.243,51	R\$ -	R\$ -	0,0%
32	Biblioteca Arnaldo Magalhães Giacomo	Reforma e manutenção predial	Sem processo 7	0. em planejamento	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	5960	R\$ 250.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
33	Biblioteca Aureliano Leite	Reforma e manutenção predial	6025.2024/0023990-8	0. em planejamento	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	5960	R\$ 229.975,70	R\$ 229.975,70	R\$ 61.467,41	R\$ 61.467,41	26,7%
34	Casa de Cultura da Brasilândia	Reforma e manutenção predial	6025.2024/0026807-0	0. em planejamento	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.1	5960	R\$ 1.236.630,58	R\$ 285.280,93	R\$ 85.280,93	R\$ 85.280,93	6,9%
35	Biblioteca Milton Santos	Reforma e manutenção predial	Sem processo 11	0. em planejamento	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	5960	R\$ 500.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
36	Biblioteca Vinicius de Moraes	Reforma e manutenção predial	Sem processo 12	0. em planejamento	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	5960	R\$ 500.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
37	Biblioteca Clarice Lispector	Reforma e manutenção predial	Sem processo 13	0. em planejamento	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	5960	R\$ 250.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
38	Casa de Cultura Perus	Projeto executivo para construção de Casa de Cultura em Perus	Sem processo 14	0. em planejamento	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.1	5960	R\$ 500.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
39	Casa de Cultura Pirituba	Construção de Casa de Cultura em Pirituba	Sem processo 15	0. em planejamento	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.1	5960	R\$ 1.400.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
40	Manutenção de dotação	Construção e Implantação de Espaços Lúdicos e Educativos	Sem processo 16	9. Pausado	98.25.13.392.3001.5.400.44905100.08.1.759.0402.0	5400	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
40	Manutenção de dotação	Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico	Sem processo 17	9. Pausado	98.25.13.391.3001.5.957.44903900.08.1.759.0402.0	5957	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
40	Manutenção de dotação	Construção de Equipamentos Culturais	Sem processo 18	9. Pausado	98.25.13.392.3001.5.959.44905100.08.1.759.0402.0	5959	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,0%
							R\$ 49.979.815,63	R\$ 32.753.481,18	R\$ 22.164.543,54	R\$ 21.101.657,35	44,35%

1. Centro Cultural São Paulo

Reforma das Fachadas

Ação: Reforma das Fachadas

Status: Em Execução/Obra

Processo: 6025.2023/0002933-2

Início da obra: 17/06/2024

Previsão de término: junho/2025

Valor: R\$ 3.875.840,51

Empenhado: R\$ 3.858.585,06

Liquidado: R\$ 3.008.063,66


Pago: R\$ 3.008.063,66

% de liquidação: 77,6%

Endereço: Rua Vergueiro, 1000

Distrito: Liberdade

Subprefeitura: Sé

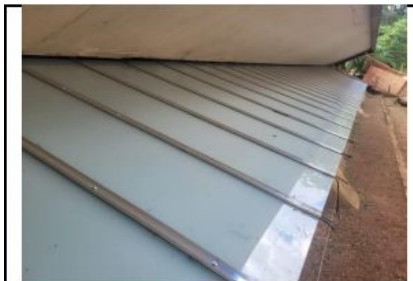

NOVOS VIDROS INSTALADOS



LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHO

Fotos: 21/01/2025



JARDINAGEM

1. Centro Cultural São Paulo

Reforma de manutenção predial - cobertura zenital

Ação: Reforma de manutenção predial

Status: Em Execução/Obra

Processo: 6025.2024/0014937-2

Início da obra: 07/10/2024

Previsão de término: 06/04/2025

Valor: R\$ 750.000,00

Empenhado: R\$ 1.061.658,65

Liquidado: R\$ 511.658,65

Pago: R\$ 511.658,65

% de liquidação: 68,2%


Endereço: Rua Vergueiro, 1000

Distrito: Liberdade

Subprefeitura: Sé



Fotos do período: 07/10/2024 até dia 04/02/2025

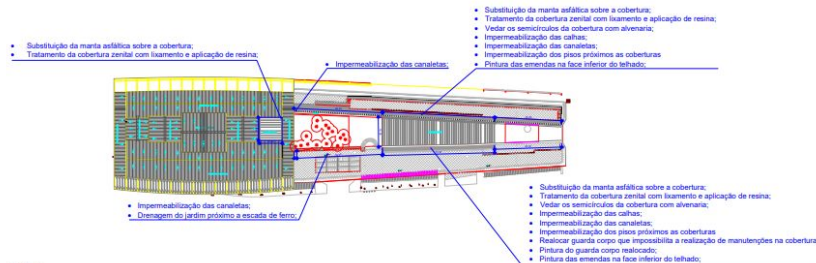

1. Centro Cultural São Paulo

Reforma de manutenção predial - impermeabilizações

Ação: Reforma de manutenção predial - impermeabilizações

Status: Em Execução/Obra

Processo: 6025.2024/0014973-9

Início da obra: 30/09/2024

Previsão de término: 15/03/2025

Valor: R\$ 750.000,00

Empenhado: R\$ 1.120.542,07

Liquidado: R\$ 570.542,07

Pago: R\$ 570.542,07

% de liquidação: 76,1%

Endereço: Rua Vergueiro, 1000

Distrito: Liberdade

Subprefeitura: Sé




Fotos: 31/01/2025

- BIBLIOTECA
- Revisão dos caixilhos inferiores;
- Impermeabilização das bases dos caixilhos inferiores;



SEM ESCALA

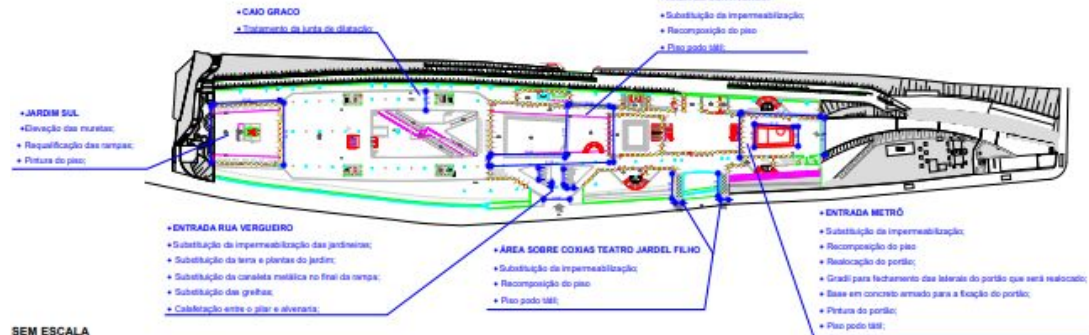

SEM ESCALA

2. Casa de Cultura Cidade Ademar

Implantação da Casa de Cultura Cidade Ademar

Ação: Implantação da Casa de Cultura Cidade Ademar

Status: Em Execução/Obra

Processo: 6025.2022/0018097-7

Início da obra: 19/12/2022

Previsão de término: março/2025

Valor: R\$ 8.113.388,27

Empenhado: R\$ 7.605.076,79

Liquidado: R\$ 6.986.766,04

Pago: R\$ 6.986.766,04

% de liquidação: 87,23%

Endereço: Avenida Durval Pinto Ferreira, 820

Distrito: Cidade Ademar

Subprefeitura: Cidade Ademar



Fotos do período: 13/09/2024 até 18/09/2024

3. Sítio Mirim

Reconstrução da Casa-Sede

Ação: Reconstrução da Casa-Sede

Status: Em Execução/Obra

Processo: 6025.2020/0016806-0

Início da obra: 03/06/2024

Previsão de término: fevereiro/2026

Valor: R\$ 800.000,00

Empenhado: R\$ 2.539.459,99

Liquidado: R\$ 95.872,80


Pago: R\$ 95.872,80

% de liquidação: 12,0%

Endereço: Estrada Assis Ribeiro, 10573

Distrito: Vila Jacuí

Subprefeitura: São Miguel Paulista

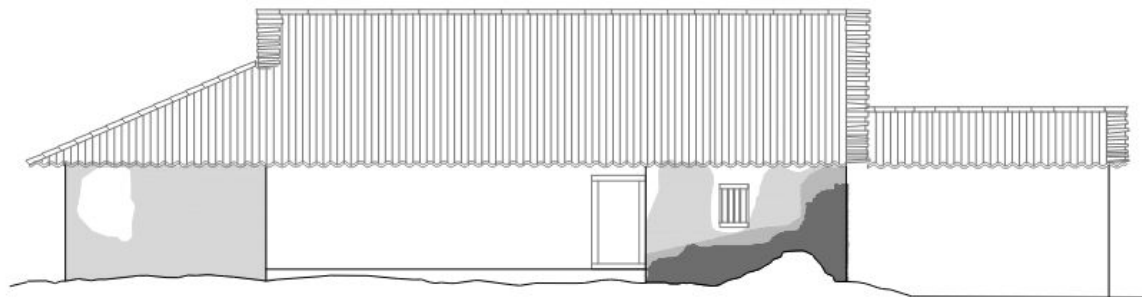

4. Sítio Morrinhos

Restauro, segurança contra incêndio e acessibilidade

Ação: Restauro, segurança contra incêndio e acessibilidade

Status: Em Execução/Obra

Processo: 6025.2022/0022026-0

Início da obra: 29/05/2024

Previsão de término: abril/2025

Valor: R\$ 200.000,00

Empenhado: R\$ 440.143,84

Liquidado: R\$ 440.143,84


Pago: R\$ 440.143,84

% de liquidação: 220,1%

Endereço: Rua Santo Anselmo, 101

Distrito: Casa Verde

Subprefeitura: Casa Verde/Cachoeirinha

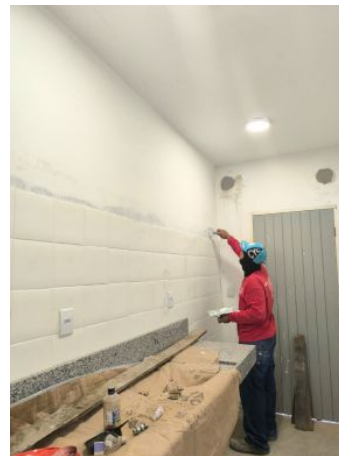

Fotos do período de 01/12/2024 até 30/12/2024.

5. Centro Cultural Penha

Serviços Corretivos para AVCB

Ação: Serviços Corretivos para AVCB

Status: Finalizado

Processo: 6025.2018/0009114-4

Valor: R\$ 211.536,40

Empenhado: R\$ 211.536,40

Liquidado: R\$ 211.536,40



Pago: R\$ 211.536,40

% de liquidação: 100,0%

Endereço: Largo do Rosário, 20, 3 andar

Distrito: Penha

Subprefeitura: Penha

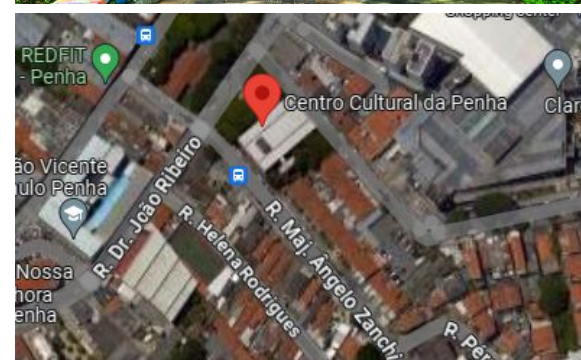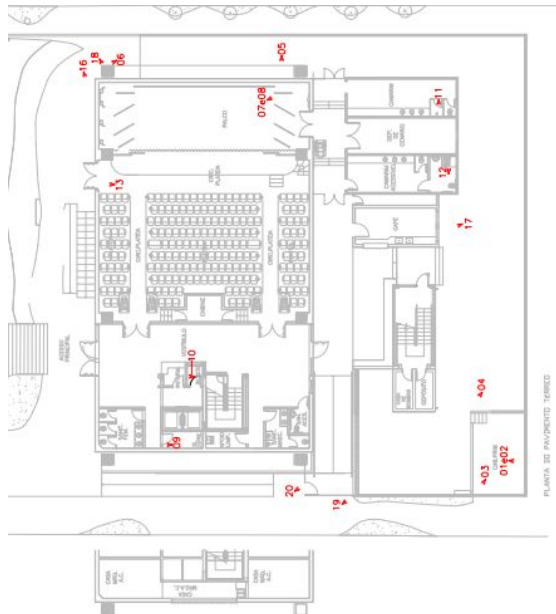

6. Teatro João Caetano

Reforma geral para Acessibilidade, Segurança contra incêndio,
Conservação e Restauro.

Ação: Reforma geral para Acessibilidade,
Segurança contra incêndio, Conservação e
Restauro

Status: Em Execução/Obra

Processo: 6025.2022/0011336-6

Início da obra: 19/12/2022

Previsão de término: junho/2025

Valor: R\$ 8.533.266,05

Empenhado: R\$ 4.719.658,21

Liquidado: R\$ 3.384.544,74


Pago: R\$ 3.384.544,74

% de liquidação: 39,7%

Endereço: Rua Borges Lagoa, 650

Distrito: Vila Mariana

Subprefeitura: Vila Mariana

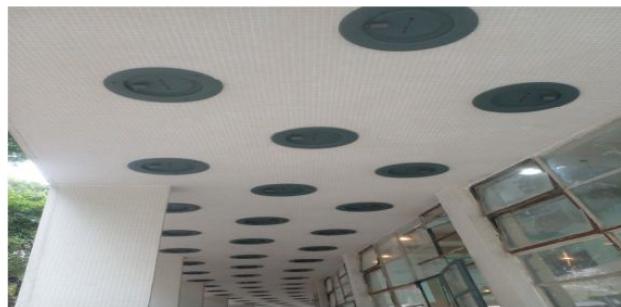

Fotos do período de 01/11/2024 até 30/11/2024

7. Edifício Sampaio Moreira

3ª Fase de Obras de restauro - Fase Piso Térreo

Ação: 3ª Fase de Obras de restauro -
Fase Piso Térreo

Status: Em Execução/Obra

Processo: 6025.2023/0016820-0

Início da obra: 02/10/2023

Previsão de término: 02/04/2025

Valor: R\$ 585.775,61

Empenhado: R\$ 585.775,61

Liquidado: R\$ 453.611,55

Pago: R\$ 453.611,55

% de liquidação: 77,4%

Endereço: R. Líbero Badaró, 346

Distrito: Sé

Subprefeitura: Sé



8. Casa de Cultura Parelheiros

Manutenção Predial

Ação: Manutenção Predial

Status: Finalizado

Processo: 6025.2023/0015198-7

Valor: R\$ 347.516,67

Empenhado: R\$ 346.827,11

Liquidado: R\$ 346.827,11


Pago: R\$ 346.827,11

% de liquidação: 99,8%

Endereço: Rua Nazle Mauad Lufti, 169

Distrito: Parelheiros

Subprefeitura: Parelheiros

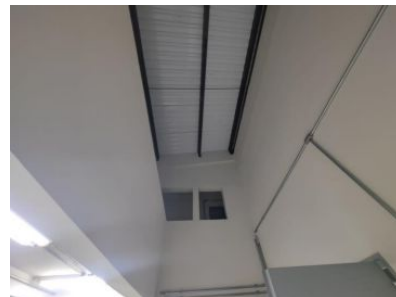

Fotos do período de 01/03/2024 a 02/05/2024

9. Praça das Artes

3ª fase - Obras complementares dos corpos artísticos

Ação: 3ª fase - Obras complementares dos corpos artísticos

Status: Em Execução/Obra

Processo: 8510.2022/0000503-4

Início da obra: 23/01/2023

Previsão de término: 31/12/2024

Valor: R\$ 5.953.326,18

Empenhado: R\$ 4.853.108,69

Liquidado: R\$ 2.289.743,44

Pago: R\$ 1.351.730,92

% de liquidação: 38,46%

Endereço: Avenida São João, 281

Distrito: República

Subprefeitura: Sé



Fotos tiradas em: 19/04/2023

9. Praça das Artes

3ª fase - Gerenciamento e fiscalização de obra - Praça das Artes

Ação: 3ª fase - Gerenciamento e fiscalização de obra - Praça das Artes

Status: Em Execução/Obra

Processo: 8510.2022/0000503-4

Início da obra: 23/01/2023

Previsão de término: 31/12/2024

Valor: R\$ 595.332,62

Empenhado: R\$ 603.838,31

Liquidado: R\$ 603.838,31

Pago: R\$ 603.838,31

% de liquidação: 101,4%

Endereço: Avenida São João, 281

Distrito: República

Subprefeitura: Sé



Fotos tiradas em: 19/04/2023

9. Praça das Artes

4ª fase - Gerenciamento e fiscalização de obra - Praça das Artes

Ação: 4ª fase - Gerenciamento e fiscalização de obra - Praça das Artes

Status: Em planejamento/licitação

Processo: 8510.2024/0000577-1

Valor: R\$ 609.214,60

Empenhado: R\$ 609.214,60

Liquidado: -

Pago: -

% de liquidação: -

Endereço: Avenida São João, 281

Distrito: República

Subprefeitura: Sé



Fotos tiradas em: 19/04/2023

10. Memorial dos Aflitos

Sondagem e Parecer de fundações para implantação de Edifício do Memorial dos Aflitos.

Ação: Implantação do Memorial

Status: Finalizado

Processo: 6025.2023/0014412-3

Valor: R\$ 34.000,00

Empenhado: R\$ 34.000,00

Liquidado: R\$ 34.000,00

Pago: R\$ 34.000,00

% de liquidação: 100%

Endereço: Rua dos Aflitos, 70 -
Traves. Rua dos Estudantes - alt. nº
52

Distrito: Liberdade

Subprefeitura: Sé



Fotos abril/2024.

11. Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso

Serviços Cíveis de Adequação hidráulica e instalação de sala de dança

Ação: Serviços Cíveis de Adequação hidráulica e instalação de sala de dança + Serviços corretivos de AVCB

Status: Em Execução/Obra

Processo: 6025.2023/0005660-7

Início dos serviços: 15/12/2023

Previsão de término: 14/12/2024

Valor: R\$ 398.445,44

Empenhado: R\$ 398.445,44

Liquidado: R\$ 367.358,67


Pago: R\$ 367.358,67

% de liquidação: 77,3%

Endereço: Av. Dep. Emílio Carlos, 3641 - Vila dos Andrades, São Paulo - SP, 02721-200

Distrito: Vila Nova Cachoeirinha

Subprefeitura: Casa Verde/Cachoeirinha

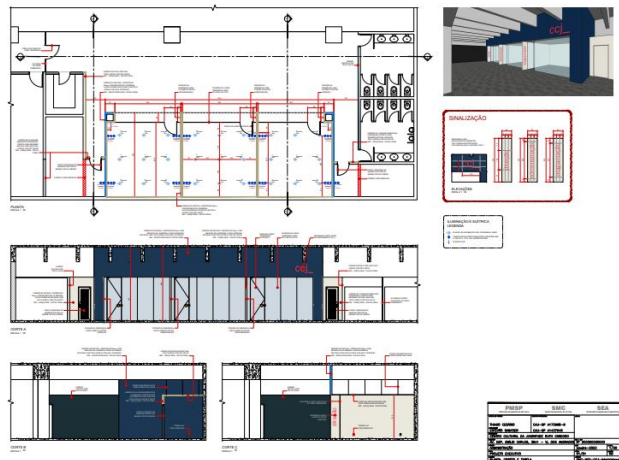

11. Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso

Serviços corretivos de AVCB - Aplicação de CMAR

Ação: Serviços corretivos de AVCB - Aplicação de CMAR

Status: Finalizado

Processo: 6025.2022/0011088-0

Valor: R\$ 663.256,69

Empenhado: R\$ 663.256,69

Liquidado: R\$ 663.256,69


Pago: R\$ 663.256,69

% de liquidação: 100%

Endereço: Av. Dep. Emílio Carlos, 3641 - Vila dos Andrades, São Paulo - SP, 02721-200

Distrito: Vila Nova Cachoeirinha

Subprefeitura: Casa Verde/Cachoeirinha

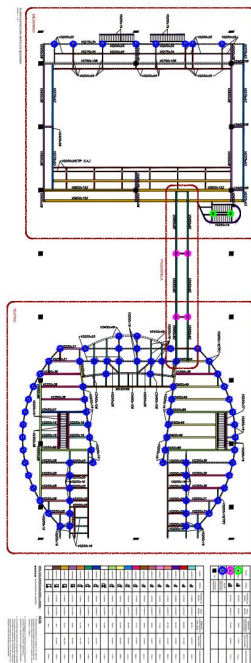

12. Biblioteca Chácara do Castelo

Requalificação

Ação: Requalificação

Status: Finalizado

Processo: 6025.2023/0017795-1

Valor: R\$ 1.100.205,62

Empenhado: R\$ 1.100.205,62

Liquidado: R\$ 732.596,38


Pago: R\$ 732.596,38

% de liquidação: 66,6%

Endereço: R. Brás Lourenço, 333 - Vila Mariana, São Paulo - SP, 04113-110

Distrito: Vila Mariana

Subprefeitura: Vila Mariana

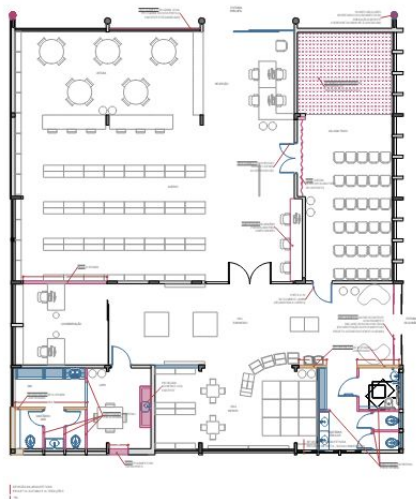

14. Casa de Cultura Vila Guilherme

Projeto Executivo de restauro

Ação: Projeto Executivo de restauro

Status: Finalizado

Processo: 6025.2022/0003748-1

Valor: R\$ 359.149,67

Empenhado: R\$ 222.990,73

Liquidado: R\$ 133.535,38



Pago: R\$ 133.535,38

% de liquidação: 37,2%

Endereço: Praça Oscar Silva, 110

Distrito: Vila Guilherme

Subprefeitura: Vila Maria/Vila Guilherme

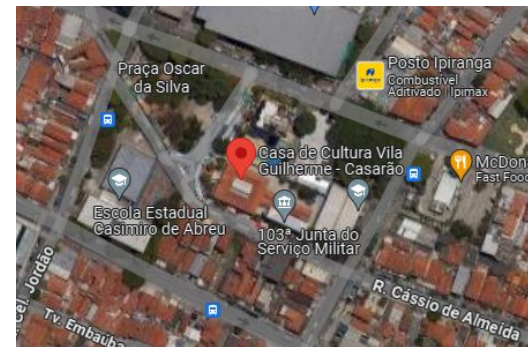

18. Arquivo Histórico Municipal

Serviços corretivos de AVCB - CMAR

Ação: Serviços corretivos de AVCB - CMAR

Status: Finalizado

Processo: 6025.2023/0024465-9

Valor: R\$ 58.000,00

Empenhado: R\$ 48.789,39

Liquidado: R\$ 48.789,39

Pago: R\$ 48.789,39

% de liquidação: 84,1%

Endereço: Praça Cel. Fernando Prestes, 152 -
Bom Retiro, São Paulo - SP, 01124-060

Distrito: Bom Retiro

Subprefeitura: Sé



18. Arquivo Histórico Municipal

Instalação de linha de vida

Ação: Instalação de linha de vida

Status: Finalizado

Processo: 6025.2023/0030077-0

Valor: R\$ 215.171,97

Empenhado: R\$ 127.500,00

Liquidado: R\$ 58.461,22

Pago: R\$ 58.461,22

% de liquidação: 45,9%

Endereço: Praça Cel. Fernando Prestes, 152 -
Bom Retiro, São Paulo - SP, 01124-060

Distrito: Bom Retiro

Subprefeitura: Sé



19. Sítio da Ressaca

Pagamento de Despesa do Exercício Anterior

Ação: Pagamento de Despesa do Exercício Anterior

Status: Finalizado

Processo: 6025.2023/0025407-7

Valor: R\$ 27.750,96

Empenhado: R\$ 27.750,96

Liquidado: R\$ 27.750,96

Pago: R\$ 27.750,96

% de liquidação: 100%

Endereço: Rua Nadra Raffoul Mokodsi, 3 -
Jabaquara, São Paulo - SP, 04321-020

Distrito: Jabaquara

Subprefeitura: Jabaquara



27. Biblioteca Brito Broca

Projeto executivo para requalificação

Ação: Projeto executivo para requalificação

Status: Finalizado

Processo: 6025.2024/0015470-8

Valor: R\$ 722.942,96

Empenhado: R\$ 722.824,10

Liquidado: R\$ 722.824,10



Pago: R\$ 722.824,10

% de liquidação: 100,0%

Endereço: Avenida Mutinga, 1425

Distrito: São Domingos

Subprefeitura: Pirituba/Jaraguá

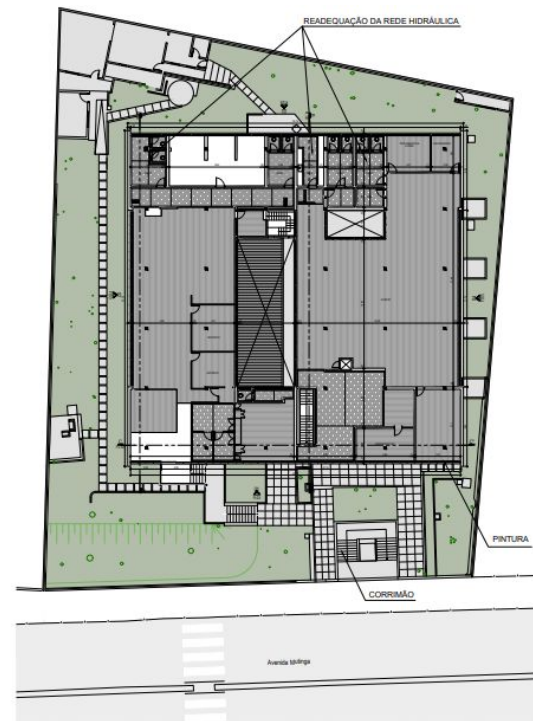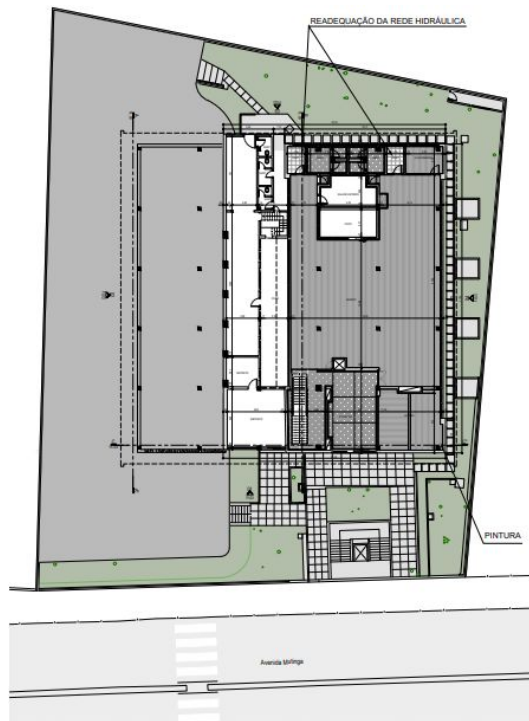

30. Biblioteca Roberto Santos

Reforma e manutenção predial

Ação: Reforma e manutenção predial

Status: Em Execução/Obra

Processo: 6025.2024/0017170-0

Início da obra: 27/09/2024

Previsão de término: 25/02/2025

Valor: R\$ 686.007,38

Empenhado: R\$ 686.007,38

Liquidado: R\$ 326.073,80

Pago: R\$ 201.200,13

% de liquidação: 47,5%

Endereço: Rua Cisplatina, 505

Distrito: Ipiranga

Subprefeitura: Ipiranga



Fotos do período de 01/12/2024 a 31/12/2024

31. Biblioteca Castro Alves

Reforma e manutenção predial

Ação: Reforma e manutenção predial

Status: Em Execução/Obra

Processo: 6025.2024/0026619-0

Início da obra: 14/11/2024

Previsão de término: 14/03/2025

Valor: R\$ 1.040.974,00

Empenhado: R\$ 260.243,51

Liquidado: -

Pago: -

% de liquidação: 00,00%

Endereço: Rua Abrahão Mussa, s/n - Jardim
Patente Novo

Distrito: Sacomã

Subprefeitura: Ipiranga



Fotos do período de 14/11/2024 a 31/12/2024

33. Biblioteca Aureliano Leite

Reforma e manutenção predial

Ação: Reforma e manutenção predial

Status: Em Execução/Obra

Processo: 6025.2024/0023990-8

Início da obra: 03/10/2024

Previsão de término: 02/04/2025

Valor: R\$ 500.000,00

Empenhado: R\$ 229.975,70

Liquidado: R\$ 61.467,41

Pago: R\$ 61.467,41

% de liquidação: 26,7%

Endereço: Rua Otto Shubart, 196 - Parque São Lucas

Distrito: São Lucas

Subprefeitura: Vila Prudente



34. Casa de Cultura da Brasilândia

Reforma e manutenção predial

Ação: Reforma e manutenção predial

Status: Em Execução/Obra

Processo: 6025.2024/0026807-0

Início da obra: 14/11/2024

Previsão de término: 14/03/2025

Valor: R\$ 1.236.630,58

Empenhado: R\$ 285.280,93

Liquidado: R\$ 85.280,93

Pago: R\$ 85.280,93

% de liquidação: 6,9%

Endereço: Praça Benedicta Cavalheiro, s/nº -
Freguesia do Ó

Distrito: Freguesia do Ó

Subprefeitura: Freguesia/Brasilândia



Fotos do período de 01/12/2024 até 31/12/2024
