



**CIDADE DE  
SÃO PAULO**

**CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA**

**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO – FUNDURB**

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2025**

---

**Planilha e Relatório Fotográfico**

# Prestação de contas do FUNDURB (98.25)

Execução orçamentária por dotação

DOTAÇÃO	Solicitado (R\$)	Execução orçamentária 2025			
		Reservado (R\$)	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)
98.25.13.391.3001.5.957.44903900.08.1.759.0402.0	R\$ 12.061.981,17	R\$ -	R\$ 72.799,68	R\$ -	R\$ -
98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 19.107.883,41	R\$ 12.329.528,53	R\$ 8.316.185,77	R\$ 3.772.903,32	R\$ 3.772.903,32
98.25.13.392.3001.5.960.44903900.08.1.759.0402.0	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 7.468.104,86	R\$ 10.098.106,33	R\$ 8.952.751,12	R\$ 2.481.179,97	R\$ 2.481.179,97
98.25.13.392.3001.5.959.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
98.25.13.392.3001.5.400.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 51.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
98.25.13.391.3001.5.421.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 675.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
98.25.13.392.3001.5.425.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
98.25.13.392.3001.5.425.44909200.08.1.759.0402.1	R\$ 390.375,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
98.25.13.392.3020.5.426.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
R\$ 39.756.345,00		R\$ 22.427.634,86	R\$ 17.341.736,57	R\$ 6.254.083,29	R\$ 6.254.083,29
		56,41%	43,62%	15,73%	15,73%

\*Os dados utilizados são referentes aos Relatórios de Empenho detalhado do SOF atualizados em 12/08/2025.

Item	Equipamento cultural	Processo	Ação	Status	Ação orçamentária	Dotação orçamentária	Valor aprovado JULHO/2025	Empenhado	Liquidado	Pago	% de liquidação do valor aprovado
1	Centro Cultural São Paulo	6025.2016/0008822-0	Reforma em imóvel tombado - Execução de projeto aprovado pelo CBPMESP	1. em desenvolvimento	5957	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1	Centro Cultural São Paulo	Sem processo	Reforma em imóvel tombado - Sinalização de emergência	1. em desenvolvimento	5957	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1	Centro Cultural São Paulo	Sem processo	Reforma em imóvel tombado - CMAR	1. em desenvolvimento	5957	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1	Centro Cultural São Paulo	Sem processo	Reforma em imóvel tombado - Plano de intervenção	1. em desenvolvimento	5957	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1	Centro Cultural São Paulo	Sem processo	Reforma em imóvel tombado - Instalações elétricas	1. em desenvolvimento	5957	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1	Centro Cultural São Paulo	6025.2024/0014973-9	Reforma de manutenção predial - Impermeabilizações	Finalizado	5957	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	262.557,23	262.423,71	262.423,71	262.423,71	99,95%
1	Centro Cultural São Paulo	6025.2023/0002933-2	Reforma das Fachadas	Finalizado	5957	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	1.907.702,67	1.907.702,67	1.804.726,67	1.804.726,67	94,60%
1	Centro Cultural São Paulo	6025.2024/0014937-2	Reforma de manutenção predial - Cobertura zenital	Finalizado	5957	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	368.282,84	368.282,84	368.278,86	368.278,86	100,00%
1	Centro Cultural São Paulo	Sem processo	Reforma de manutenção predial - Vidros	1. em desenvolvimento	5957	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1	Centro Cultural São Paulo	Sem processo	Reforma de manutenção predial e Drenagem	1. em desenvolvimento	5957	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	1.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	Sítio Mirim	6025.2020/0016806-0	Reconstrução da Casa-Sede	5. em execução/obra	5957	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	2.922.071,34	3.157.375,70	289.449,62	289.449,62	9,91%
3	Sítio Morrinhos	6025.2022/0022026-0	Restauo, segurança contra incêndio e acessibilidade	5. em execução/obra	5957	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	2.152.774,86	1.589.774,96	490.787,53	490.787,53	22,80%
4	Teatro João Caetano	6025.2022/0011336-6	Reforma geral para Acessibilidade, Segurança contra incêndio, Conservação e Restauo,	5. em execução/obra	5957	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	2.133.223,61	496.857,96	317.920,66	317.920,66	14,90%
5	Escola Municipal de Iniciação Artística - Jabaquara	6025.2023/0012495-5	Restauo e reforma da Casa 2	3. aguardando autorizações/aprovações	5957	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Memorial dos Afritos	Sem processo	Obras de requalificação e manutenção de sítio arqueológico	1. em desenvolvimento	5421	98.25.13.391.3001.5.421.44905100.08.1.759.0402.0	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Memorial dos Afritos	Sem processo	Bases técnicas do concurso	1. em desenvolvimento	5421	98.25.13.391.3001.5.421.44905100.08.1.759.0402.0	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Memorial dos Afritos	Sem processo	Concurso de arquitetura com ações afirmativas	1. em desenvolvimento	5421	98.25.13.391.3001.5.421.44905100.08.1.759.0402.0	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Teatro Cacilda Becker	6025.2021/0012695-4	Reforma e manutenção predial	1. em desenvolvimento	5960	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	Casa de Cultura São Mateus	6025.2024/0023689-5	Construção de Novo Edifício	4. em licitação	5960	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	2.663.220,05	6.700.000,00	460.389,10	460.389,10	17,29%
9	Casa de Cultura Vila Guilherme	6025.2025/0001101-1	Reforma e restauro em imóvel tombado	2. processo SEI iniciado	5957	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10	Biblioteca Mário de Andrade	6025.2018/0015645-9	Projeto de AVCB	0. em planejamento	5957	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10	Biblioteca Mário de Andrade	6025.2022/0023974-2	Restauo da calçada	0. em planejamento	5957	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10	Biblioteca Mário de Andrade	Sem processo	Projeto Básico e Executivo de Climatização para a Biblioteca Mário de Andrade e a Hemeroteca	0. em planejamento	5957	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	223.790,33	0,00	0,00	0,00	0,00%
11	Monumento	6025.2023/0037747-0	Restauo da Fonte Monumental	0. em planejamento	5960	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	588.007,17	0,00	0,00	0,00	0,00%



Item	Equipamento cultural	Processo	Ação	Status	Ação orçamentária	Dotação orçamentária	Valor aprovado JULHO/2025	Empenhado	Liquidado	Pago	% de liquidação do valor aprovado
12	Monumento à Independência	6025.2024/0013810-9	Restauo	0. em planejamento	5957	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13	Arquivo Histórico Municipal	6025.2024/0008869-1	Conservação e Restauo do Edifício Anexo	0. em planejamento	5957	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
14	Casa Amarela	6025.2023/0007211-4	Gerenciamento e fiscalização de projeto e obra de restauo e requalificação	0. em planejamento	5957	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
14	Casa Amarela	Sem processo 21	Projeto executivo e obra de restauo e requalificação	0. em planejamento	5957	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
15	Centro Cultural Tendal da Lapa	Sem processo 26	Projeto executivo de reforma e restauo	7. pausado	5957	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
15	Centro Cultural Tendal da Lapa	6025.2023/0034072-0	Levantamento de edificações e terreno	4. em licitação	5957	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	64.000,00	72.632,21	0,00	0,00	0,00%
16	Biblioteca Pedro Nava	6025.2023/0034072-0	Levantamento de edificações e terreno	4. em licitação	5960	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	34.000,00	38.585,86	0,00	0,00	0,00%
17	Escola Municipal de Iniciação Artística - Perus	6025.2023/0034072-0	Levantamento de edificações e terreno	4. em licitação	5960	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	22.000,00	24.967,32	0,00	0,00	0,00%
18	Casa de Cultura Itaim Paulista	6025.2023/0034072-0	Levantamento de edificações e terreno	4. em licitação	5960	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	16.000,00	18.158,05	0,00	0,00	0,00%
19	Casa de Cultura Hip-Hop Sul	6025.2023/0034072-0	Levantamento de edificações e terreno	4. em licitação	5960	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	6.000,00	6.809,27	0,00	0,00	0,00%
20	Casa do Caxingui	6025.2023/0034072-0	Levantamento de edificações e terreno	4. em licitação	5957	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	28.000,00	31.776,59	0,00	0,00	0,00%
21	Biblioteca Ricardo Ramos	6025.2023/0034072-2	Levantamento de edificações e terreno	4. em licitação	5960	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
22	Biblioteca Padre José de Anchieta	6025.2023/0034072-0	Levantamento de edificações e terreno	4. em licitação	5960	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	5.000,00	5.674,39	0,00	0,00	0,00%
23	Biblioteca Álvares de Azevedo	6025.2023/0034072-0	Levantamento de edificações e terreno	4. em licitação	5960	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	38.000,00	43.125,38	0,00	0,00	0,00%
24	Biblioteca Narbal Fontes	Sem processo	Levantamento de edificações e terreno	0. em planejamento	5957	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
25	Teatro Flávio Império	Sem processo	Projeto executivo estrutural e de drenagem	0. em planejamento	5960	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
26	Biblioteca Arnaldo Magalhães Glácomo	6025.2023/0034072-0	Levantamento de edificações e terreno	4. em licitação	5960	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	17.000,00	19.292,93	0,00	0,00	0,00%
27	Biblioteca Sérgio Buarque de Holanda	6025.2023/0034072-0	Levantamento de edificações e terreno	4. em licitação	5957	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	51.000,00	57.878,80	0,00	0,00	0,00%
27	Biblioteca Sérgio Buarque de Holanda	Sem processo 18	Reforma em imóvel tombado	1. em desenvolvimento	5957	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
27	Biblioteca Sérgio Buarque de Holanda	Sem processo 18	Reforma e manutenção da área externa	0. em planejamento	5957	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
28	Biblioteca Cassiano Ricardo	Sem processo 4	Projeto executivo de reforma	0. em planejamento	5960	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
29	Biblioteca Roberto Santos	6025.2024/0017170-0	Reforma e manutenção predial	Finalizado	5957	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	239.316,47	239.316,27	239.316,27	239.316,27	100,00%
30	Biblioteca Castro Alves	6025.2024/0026619-0	Reforma e manutenção predial	Finalizado	5960	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	932.053,26	932.053,26	932.053,26	932.053,26	100,00%

Item	Equipamento cultural	Processo	Ação	Status	Ação orçamentária	Dotação orçamentária	Valor aprovado JULHO/2025	Empenhado	Liquidado	Pago	% de liquidação do valor aprovado
31	Biblioteca Aureliano Leite	6025.2024/0023990-8	Reforma e manutenção predial	Finalizado	5960	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	137.387,97	137.387,97	137.387,97	137.387,97	100,00%
32	Casa de Cultura da Brasília	6025.2024/0026807-0	Reforma e manutenção predial	Finalizado	5960	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	951.349,64	951.349,65	951.349,64	951.349,64	100,00%
33	Bibliotecas Hans Christian Andersen	Sem processo 20	Projeto executivo de reforma	7. pausado	5960	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
34	Casa de Cultura Perus	Sem processo 14	Projeto executivo para construção de Casa de Cultura em Perus	0. em planejamento	5960	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
35	Casa de Cultura Pirituba	Sem processo 15	Construção de Casa de Cultura em Pirituba	0. em planejamento	5960	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
36	Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso	6025.2023/0005660-7	Serviços Cíveis de Adequação hidráulica e instalação de sala de dança	5. em execução/obra	5960	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	31.086,77	31.086,77	0,00	0,00	0,00%
37	Edifício Sampaio Moreira	6025.2023/0016820-0	3ª Fase de Obras de restauro - Fase Piso Térreo	4. em execução/obra	5957	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	132.164,06	132.164,06	0,00	0,00	0,00%
37	Edifício Sampaio Moreira	6025.2025/0008870-7	Instalação de divisórias de vidro no Edifício Sampaio Moreira	0. em planejamento	5957	98.25.13.391.3001.5.957.44903900.08.1.759.0402.0	75.981,17	72.799,68	0,00	0,00	0,00%
38	Centro Cultural Vila Iitororó	Sem processo	Reforço estrutural	0. em planejamento	5957	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
38	Centro Cultural Vila Iitororó	Sem processo	Projeto executivo para reforma e manutenção predial	0. em planejamento	5957	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
39	Biblioteca Nuto Sant'anna	6025.2023/0034072-0	Levantamento de edificações e terreno	4. em licitação	5960	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	39.000,00	44.260,26	0,00	0,00	0,00%
39	Biblioteca Nuto Sant'anna	Sem processo	Reforma e manutenção predial	1. em desenvolvimento	5960	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
40	Escola Municipal de Iniciação Artística - Cantinho do céu	Sem processo	Reforma e manutenção predial	0. em planejamento	5960	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
41	Centro de Culturas Negras	Sem processo	Projeto executivo de reforma	0. em planejamento	5960	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
42	Casa de Cultura Cidade Ademar	6025.2022/0018097-7	Despesa do Exercício Anterior 2024 - Implantação da Casa de Cultura Cidade Ademar	6. finalizado	5425	98.25.13.392.3001.5.425.44909200.08.1.759.0402.1	390.375,56	0,00	0,00	0,00	0,00%
43	Territórios Culturais para a Primeira Infância na Subprefeitura da Sé	Sem processo 27	Projetos Técnicos e Acompanhamento Executivo Complementar para implantação do projeto Territórios Culturais para a Primeira Infância	0. em planejamento	5400	98.25.13.392.3001.5.400.44905100.08.1.759.0402.0	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
44	Casa Modernista	Sem processo	Atualização do orçamento	0. em planejamento	5957	98.25.13.391.3001.5.957.44903900.08.1.759.0402.0	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
44	Casa Modernista	Sem processo	Imagens 3D do projeto	0. em planejamento	5957	98.25.13.391.3001.5.957.44903900.08.1.759.0402.0	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
45	Biblioteca Cora Coralina	Sem processo	Reforma e manutenção predial	0. em planejamento	5957	98.25.13.391.3001.5.957.44903900.08.1.759.0402.0	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
46	Biblioteca Menotti Del Pichia	Sem processo	Reforma e manutenção predial	0. em planejamento	5957	98.25.13.391.3001.5.957.44903900.08.1.759.0402.0	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
47	Biblioteca Gilberto Freyre	Sem processo	Reforma e manutenção predial	0. em planejamento	5957	98.25.13.391.3001.5.957.44903900.08.1.759.0402.0	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
48	Casa de Cultura Campo Limpo	Sem processo	Reforma e manutenção predial	0. em planejamento	5957	98.25.13.391.3001.5.957.44903900.08.1.759.0402.0	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
49	Casa de Cultura do Tremembé	Sem processo	Reforma e manutenção predial	0. em planejamento	5957	98.25.13.391.3001.5.957.44903900.08.1.759.0402.0	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
50	Centro Cultural/EMIA - Chácara do Jockey	Sem processo	Reforma e manutenção predial	0. em planejamento	5957	98.25.13.391.3001.5.957.44903900.08.1.759.0402.0	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Item	Equipamento cultural	Processo	Ação	Status	Ação orçamentária	Dotação orçamentária	Valor aprovado JULHO/2025	Empenhado	Liquidado	Pago	% de liquidação do valor aprovado
51	Biblioteca Affonso Taunay	Sem processo	Reforma e manutenção predial	0. em planejamento	5957	98.25.13.391.3001.5.957.44903900.08.1.759.0402.0	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
52	Teatro Paulo Eiró	Sem processo	Reforma e manutenção predial	0. em planejamento	5957	98.25.13.391.3001.5.957.44903900.08.1.759.0402.0	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
53	Centros Culturais, Casas de Cultura, Bibliotecas, Teatros e Museus	Sem processo	Elaboração de projetos técnicos e executivos para requalificações de equipamentos culturais	0. em planejamento	5957	98.25.13.391.3001.5.957.44903900.08.1.759.0402.0	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
54	Manutenção de dotação	Sem processo 30	Construção de Equipamentos Culturais	9. Pausado	5959	98.25.13.392.3001.5.959.44905100.08.1.759.0402.0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
54	Manutenção de dotação	Sem processo 29	Implantação de Distritos Criativos	9. Pausado	5426	98.25.13.392.3020.5.426.44905100.08.1.759.0402.0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
							39.756.345,00	17.341.736,57	6.254.083,29	6.254.083,29	15,73%

# 1. Centro Cultural São Paulo

## Reforma de manutenção predial - impermeabilizações

**Ação:** Reforma de manutenção predial - impermeabilizações

**Status:** Finalizado

**Processo:** 6025.2024/0014973-9

**Início da obra:** 30/09/2024

**Previsão de término:** 29/03/2025

**Valor:** R\$ 262.557,23

**Empenhado:** R\$ 262.425,15

**Liquidado:** R\$ 262.423,71

**Pago:** R\$ 262.423,71

**% de liquidação:** 99,95%

**Endereço:** Rua Vergueiro, 1000

**Distrito:** Liberdade

**Subprefeitura:** Sé





# 1. Centro Cultural São Paulo

## Reforma das Fachadas

**Ação:** Reforma das Fachadas

**Status:** Finalizado

**Processo:** 6025.2023/0002933-2

**Início da obra:** 17/06/2024

**Previsão de término:** junho/2025

**Valor:** R\$ 1.907.702,67

**Empenhado:** R\$ 1.907.702,67

**Liquidado:** R\$ 1.804.726,67


**Pago:** R\$ 1.804.726,67

**% de liquidação:** 94,60%

**Endereço:** Rua Vergueiro, 1000

**Distrito:** Liberdade

**Subprefeitura:** Sé

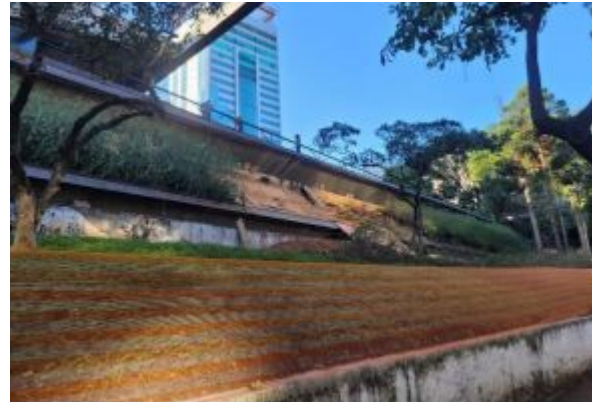

Fotos: 31/03/2025



# 1. Centro Cultural São Paulo

## Reforma de manutenção predial - cobertura zenital

**Ação:** Reforma de manutenção predial - cobertura zenital

**Status:** Finalizado

**Processo:** 6025.2024/0014937-2

**Início da obra:** 07/10/2024

**Previsão de término:** 05/04/2025

**Valor:** R\$ 368.282,84

**Empenhado:** R\$ 368.282,84

**Liquidado:** R\$ 368.278,86


**Pago:** R\$ 368.282,84

**% de liquidação:** 100,00%

**Endereço:** Rua Vergueiro, 1000

**Distrito:** Liberdade

**Subprefeitura:** Sé

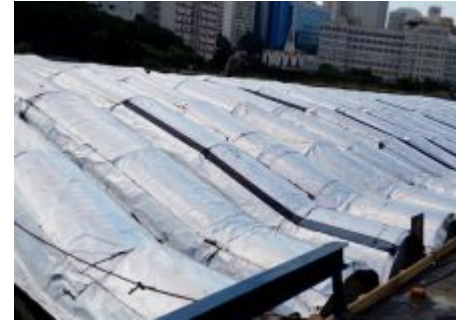

## 2. Sítio Mirim

### Reconstrução da Casa-Sede

**Ação:** Reconstrução da Casa-Sede

**Status:** Em Execução/Obra

**Processo:** 6025.2020/0016806-0

**Início da obra:** 03/06/2024

**Previsão de término:** fevereiro/2026

**Valor:** R\$ 2.922.071,34

**Empenhado:** R\$ 3.157.375,70

**Liquidado:** R\$ 289.449,62


**Pago:** R\$ 289.449,62

**% de liquidação:** 9,91%

**Endereço:** Estrada Assis Ribeiro, 10573

**Distrito:** Vila Jacuí

**Subprefeitura:** São Miguel Paulista

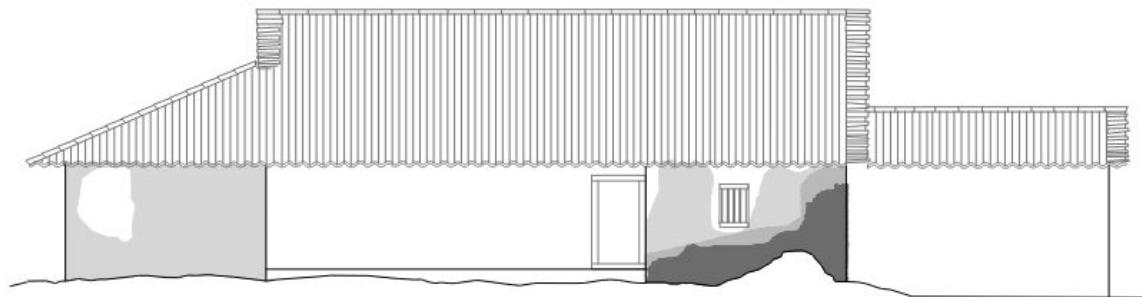

### 3. Sítio Morrinhos

Restauro, segurança contra incêndio e acessibilidade

**Ação:** Restauro, segurança contra incêndio e acessibilidade

**Status:** Em Execução/Obra

**Processo:** 6025.2022/0022026-0

**Início da obra:** 29/05/2024

**Previsão de término:** Termo Aditivo de prazo está sendo elaborado.

**Valor:** R\$ 2.152.774,86

**Empenhado:** R\$ 1.589.774,96

**Liquidado:** R\$ 490.787,53

**Pago:** R\$ 490.787,53

**% de liquidação:** 22,80%

**Endereço:** Rua Santo Anselmo, 101

**Distrito:** Casa Verde

**Subprefeitura:** Casa Verde/Cachoeirinha



Fotos 16/04/2025



## 4. Teatro João Caetano

Reforma geral para Acessibilidade, Segurança contra incêndio,  
Conservação e Restauro.

**Ação:** Reforma geral para Acessibilidade,  
Segurança contra incêndio, Conservação e  
Restauro

**Status:** Em Execução/Obra

**Processo:** 6025.2022/0011336-6

**Início da obra:** 19/12/2022

**Previsão de término:** 19/11/2025

**Valor:** R\$ 1.772.051,97

**Empenhado:** R\$ 496.857,96

**Liquidado:** R\$ 101.530,05

**Pago:** R\$ 47.982,75

**% de liquidação:** 5,73%

**Endereço:** Rua Borges Lagoa, 650

**Distrito:** Vila Mariana

**Subprefeitura:** Vila Mariana



Fotos do período de 09/02/2025 até 19/02/2025



## 8. Casa de Cultura São Mateus

### Construção de Novo Edifício

**Ação:** Construção de Novo Edifício

**Status:** Em licitação

**Processo:** 6025.2024/0023689-5

**Início da obra:** 31/03/2025

**Previsão de término:** junho/2026

**Valor:** R\$ 2.663.220,05

**Empenhado:** R\$ 6.700.000,00

**Liquidado:** R\$ 460.389,10


**Pago:** R\$ 460.389,10

**% de liquidação:** 17,29%

**Endereço:** Rua Monte Mandirá, 40



**Distrito:** São Mateus

**Subprefeitura:** São Mateus

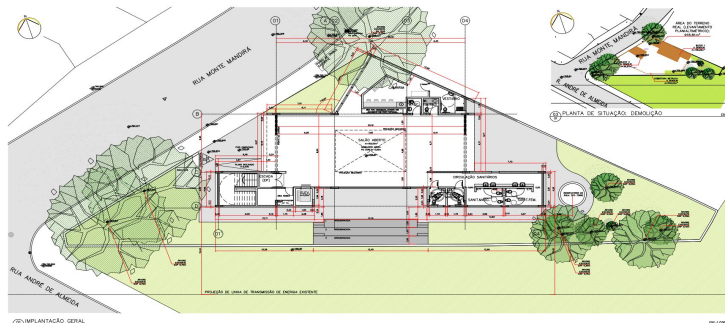

## Levantamento de edificações e terreno

**Subprefeitura: Lapa**

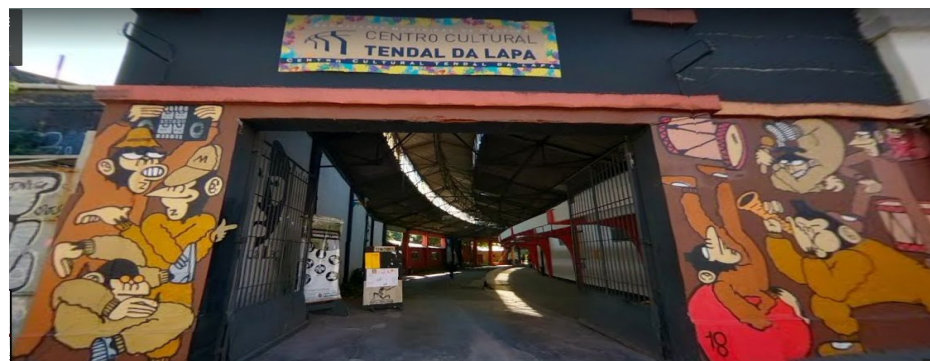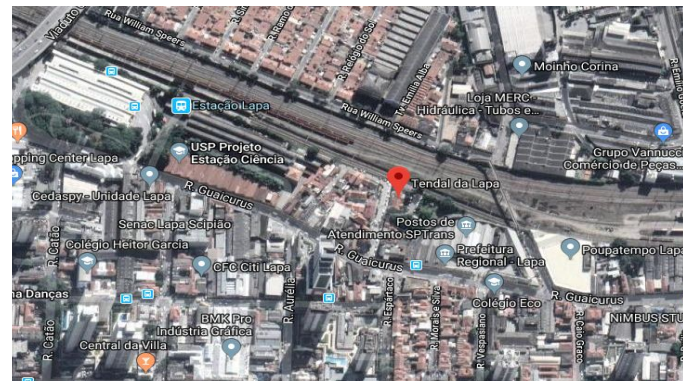

# 16. Biblioteca Pedro Nava

## Levantamento de edificações e terreno

**Ação:** Levantamento de edificações e terreno

**Status:** Em licitação

**Processo:** 6025.2023/0034072-0

**Início da obra:** 14/04/2025

**Previsão de término:** dezembro/2025

**Valor:** R\$ 34.000,00

**Empenhado:** R\$ 38.585,86

**Liquidado:** R\$ -


**Pago:** R\$ -

**% de liquidação:** 0,00%

**Endereço:** Av. Eng. Caetano Álvares, 5903 -  
Mandaqui, São Paulo - SP, 02413-100

**Distrito:** Mandaqui

**Subprefeitura:** Santana-Tucuruvi

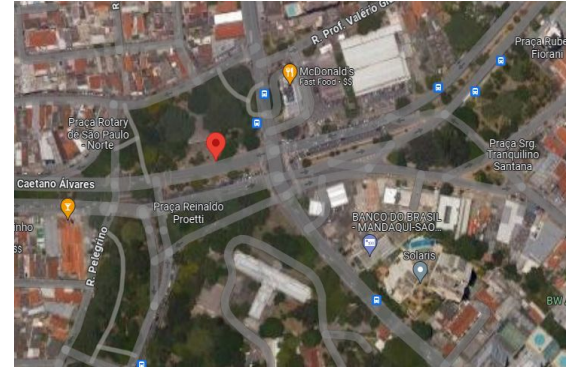



## 17. Escola Municipal de Iniciação Artística - Perus

## Levantamento de edificações e terreno

**Ação:** Levantamento de edificações e terreno

**Status:** Em licitação

**Processo:** 6025.2023/0034072-0

**Início da obra:** 14/04/2025

**Previsão de término: dezembro/2025**

**Valor: R\$ 22.000,00**

**Empenhado: R\$ 24.967,32**

**Liquidado: R\$ -**

**Pago: R\$ -**

**% de liquidação: 0,00%**

**Endereço:** Rua Joaquim Antonio Arruda, 74 -  
Perus

**Distrito:** Perus

**Subprefeitura:** Perus





# 18. Casa de Cultura Itaim Paulista

## Levantamento de edificações e terreno

**Ação:** Levantamento de edificações e terreno

**Status:** Em licitação

**Processo:** 6025.2023/0034072-0

**Início da obra:** 14/04/2025

**Previsão de término:** dezembro/2025

**Valor:** R\$ 16.000,00

**Empenhado:** R\$ 18.158,05

**Liquidado:** R\$ -


**Pago:** R\$ -

**% de liquidação:** 0,00%

**Endereço:** R. Monte Camberela, 490 - Vila Silva  
Teles, São Paulo - SP, 08142-444

**Distrito:** Itaim Paulista

**Subprefeitura:** Itaim Paulista

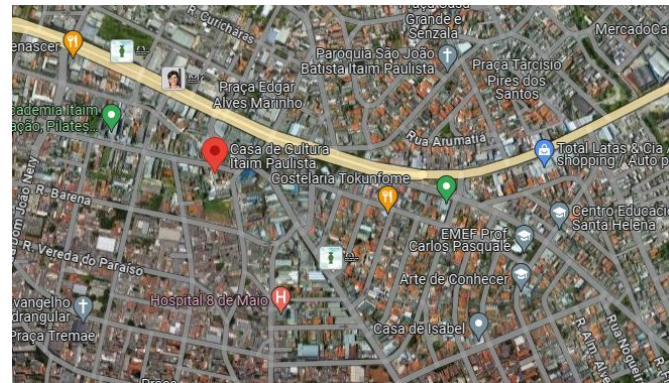

# 19. Casa de Cultura Hip-Hop Sul

## Levantamento de edificações e terreno

**Ação:** Levantamento de edificações e terreno

**Status:** Em licitação

**Processo:** 6025.2023/0034072-0

**Início da obra:** 14/04/2025

**Previsão de término:** dezembro/2025

**Valor:** R\$ 6.000,00

**Empenhado:** R\$ 6.809,27

**Liquidado:** R\$ -

**Pago:** R\$ -

**% de liquidação:** 0,00%

**Endereço:** Rua Sant'Ana, 201 - Vila Sao Pedro, São Paulo - SP, 04676-110

**Distrito:** Santo Amaro

**Subprefeitura:** Santo Amaro



# 20. Casa do Caxingui

## Levantamento de edificações e terreno

**Ação:** Levantamento de edificações e terreno

**Status:** Em licitação

**Processo:** 6025.2023/0034072-0

**Início da obra:** 14/04/2025

**Previsão de término:** dezembro/2025

**Valor:** R\$ 28.000,00

**Empenhado:** R\$ 31.776,59

**Liquidado:** R\$ -


**Pago:** R\$ -

**% de liquidação:** 0,00%

**Endereço:** Praça Ênio Barbato, s/n - Caxingui, São Paulo - SP, 05517-040

**Distrito:** Butantã

**Subprefeitura:** Butantã

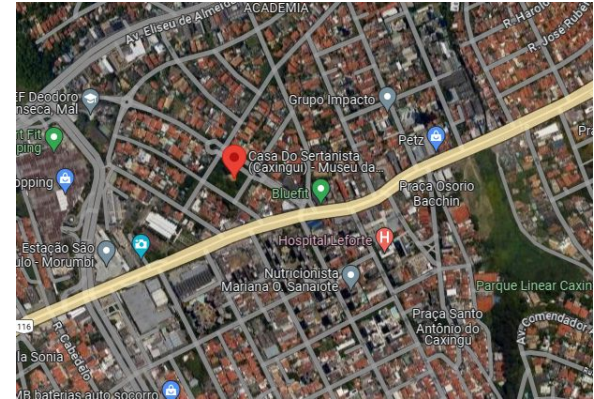



## 22. Biblioteca Padre José de Anchieta

### Levantamento de edificações e terreno

**Ação:** Levantamento de edificações e terreno

**Status:** Em licitação

**Processo:** 6025.2023/0034072-0

**Início da obra:** 14/04/2025

**Previsão de término:** dezembro/2025

**Valor:** R\$ 5.000,00

**Empenhado:** R\$ 5.674,39

**Liquidado:** R\$ -


**Pago:** R\$ -

**% de liquidação:** 0,00%

**Endereço:** R. Antônio Maia, 651 - Vila Perus, São Paulo - SP, 05204-110

**Distrito:** Perus

**Subprefeitura:** Perus

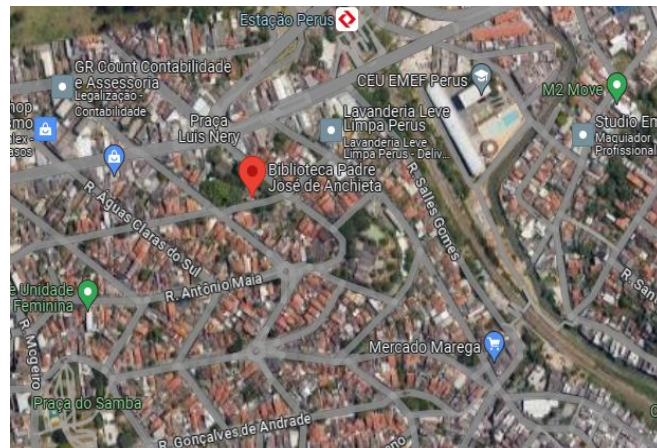



## 23. Biblioteca Álvares de Azevedo

### Levantamento de edificações e terreno

**Ação:** Levantamento de edificações e terreno

**Status:** Em licitação

**Processo:** 6025.2023/0034072-0

**Início da obra:** 14/04/2025

**Previsão de término:** dezembro/2025

**Valor:** R\$ 38.000,00

**Empenhado:** R\$ 43.125,38

**Liquidado:** R\$ -

**Pago:** R\$ -

**% de liquidação:** 0,00%

**Endereço:** Praça Joaquim José da Nova, s/n

**Distrito:** Vila Maria

**Subprefeitura:** Vila Maria / Vila Guilherme



# 26. Biblioteca Arnaldo Magalhães Giácomo

## Levantamento de edificações e terreno

**Ação:** Levantamento de edificações e terreno

**Status:** Em licitação

**Processo:** 6025.2023/0034072-0

**Início da obra:** 14/04/2025

**Previsão de término:** dezembro/2025

**Valor:** R\$ 17.000,00

**Empenhado:** R\$ 19.292,93

**Liquidado:** R\$ -

**Pago:** R\$ -

**% de liquidação:** 0,00%

**Endereço:** R. Restinga, 136 - Tatuapé, São Paulo - SP, 03065-020

**Distrito:** Tatuapé

**Subprefeitura:** Mooca



# 27. Biblioteca Sérgio Buarque de Holanda

## Levantamento de edificações e terreno

**Ação:** Levantamento de edificações e terreno

**Status:** Em licitação

**Processo:** 6025.2023/0034072-0

**Início da obra:** 14/04/2025

**Previsão de término:** dezembro/2025

**Valor:** R\$ 51.000,00

**Empenhado:** R\$ 57.878,80

**Liquidado:** R\$ -

**Pago:** R\$ -

**% de liquidação:** 0,00%

**Endereço:** R. Restinga, 136 - Tatuapé, São Paulo - SP, 03065-020

**Distrito:** Tatuapé

**Subprefeitura:** Mooca





## 29. Biblioteca Roberto Santos

### Reforma e manutenção predial

**Ação:** Reforma e manutenção predial

**Status:** Finalizado

**Processo:** 6025.2024/0017170-0

**Início da obra:** 27/09/2024

**Previsão de término:** 25/02/2025

**Valor:** R\$ 239.316,47

**Empenhado:** R\$ 239.316,27

**Liquidado:** R\$ 239.316,27

**Pago:** R\$ 239.316,27

**% de liquidação:** 100,00%

**Endereço:** Rua Cisplatina, 505

**Distrito:** Ipiranga

**Subprefeitura:** Ipiranga



Fotos do período de 01/12/2024 a 31/12/2024



## 30. Biblioteca Castro Alves

### Reforma e manutenção predial

**Ação:** Reforma e manutenção predial

**Status:** Finalizada

**Processo:** 6025.2024/0026619-0

**Início da obra:** 14/11/2024

**Previsão de término:** 14/03/2025

**Valor:** R\$ 932.053,26

**Empenhado:** R\$ 932.056,49

**Liquidado:** R\$ 932.053,26

**Pago:** R\$ 932.053,26

**% de liquidação:** 100,00%

**Endereço:** Rua Abrahão Mussa, s/n - Jardim  
Patente Novo

**Distrito:** Sacomã

**Subprefeitura:** Ipiranga



Fotos do período de 14/11/2024 a 31/12/2024

# 31. Biblioteca Aureliano Leite

## Reforma e manutenção predial

**Ação:** Reforma e manutenção predial

**Status:** Finalizado

**Processo:** 6025.2024/0023990-8

**Início da obra:** 03/10/2024

**Previsão de término:** 02/04/2025

**Valor:** R\$ 137.387,97

**Empenhado:** R\$ 137.387,97

**Liquidado:** R\$ 137.387,97


**Pago:** R\$ 137.387,97

**% de liquidação:** 100,00%

**Endereço:** Rua Otto Shubart, 196 - Parque São Lucas

**Distrito:** São Lucas

**Subprefeitura:** Vila Prudente

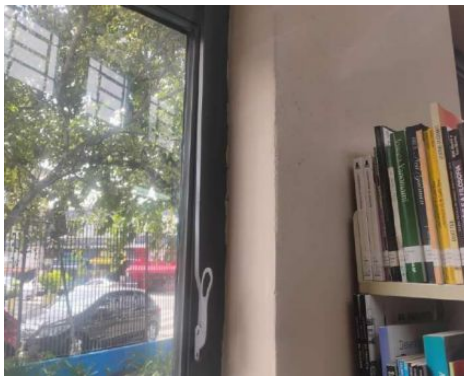

Fotos do período de 01/03/2025 a 02/04/2025

## 32. Casa de Cultura da Brasilândia

### Reforma e manutenção predial

**Ação:** Reforma e manutenção predial

**Status:** Finalizada

**Processo:** 6025.2024/0026807-0

**Início da obra:** 14/11/2024

**Término:** 13/03/2025

**Valor:** R\$ 951.349,64

**Empenhado:** R\$ 951.349,65

**Liquidado:** R\$ 951.349,65

**Pago:** R\$ 951.349,65

**% de liquidação:** 100,00%

**Endereço:** Praça Benedicta Cavalheiro, s/nº -  
Freguesia do Ó

**Distrito:** Freguesia do Ó

**Subprefeitura:** Freguesia/Brasilândia




Fotos do período de 01/12/2024 até 31/12/2024



## Serviços Cíveis de Adequação hidráulica e instalação de sala de dança

**Subprefeitura:** Casa Verde/Cachoeirinha

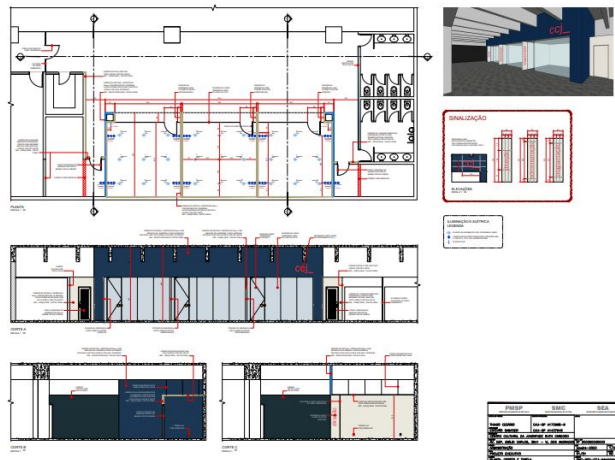

## 37. Edifício Sampaio Moreira

### 3ª Fase de Obras de restauro - Fase Piso Térreo

**Ação:** 3ª Fase de Obras de restauro -  
Fase Piso Térreo

**Status:** Em Execução/Obra

**Processo:** 6025.2023/0016820-0

**Início da obra:** 02/10/2023

**Previsão de término:** 02/11/2025

**Valor:** R\$ 132.164,06

**Empenhado:** R\$ 132.164,06

**Liquidado:** R\$ -


**Pago:** R\$ -

**% de liquidação:** 0,00%

**Endereço:** R. Líbero Badaró, 346

**Distrito:** Sé

**Subprefeitura:** Sé

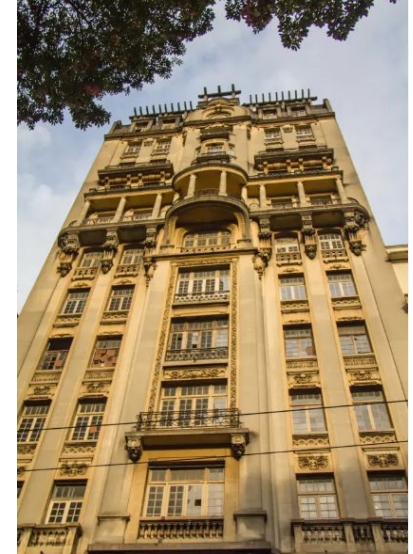

# 37. Edifício Sampaio Moreira

## Instalação de divisórias de vidro no Edifício Sampaio Moreira

**Ação:** Instalação de divisórias de vidro no Edifício Sampaio Moreira

**Status:** Em contratação

**Processo:** 6025.2025/0008870-7

**Início da obra:** -

**Previsão de término:** -

**Valor:** R\$ 75.981,17

**Empenhado:** R\$ 72.799,68

**Liquidado:** R\$ -

**Pago:** R\$ -

**% de liquidação:** 0,00%

**Endereço:** R. Líbero Badaró, 346

**Distrito:** Sé

**Subprefeitura:** Sé





# 39. Biblioteca Nuto Sant'anna

## Levantamento de edificações e terreno

**Ação:** Levantamento de edificações e terreno

**Status:** Em licitação

**Processo:** 6025.2023/0034072-0

**Início da obra:** 14/04/2025

**Previsão de término:** dezembro/2025

**Valor:** R\$ 39.000,00

**Empenhado:** R\$ 44.260,26

**Liquidado:** R\$ -

**Pago:** R\$ -

**% de liquidação:** 0,00%

**Endereço:** R. Restinga, 136 - Tatuapé, São Paulo - SP, 03065-020

**Distrito:** Tatuapé

**Subprefeitura:** Mooca

