

PLANO CICLOVIÁRIO

Cidade de São Paulo



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
MOBILIDADE
E TRÂNSITO

Maio/2025

NOVAS IMPLANTAÇÕES

de Estruturas Ciclovias



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
MOBILIDADE
E TRÂNSITO

Maio/2025

PPP da HABITAÇÃO



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
MOBILIDADE
E TRÂNSITO

SITUAÇÃO DOS LOTES - 1

Estrutura Ciclovial	Extensão (m)	Nº OIS	Status	Data da Conclusão
Projeto	-		Concluído	
Viaduto Grande São Paulo	1.200,00			
Av. Bandeirantes	9.852,00			
Av. Abraão de Moraes	3.159,00			
Rua Salvador Simões	910,00			
Rua Agostinho Gomes	1.221,00	47/23	Concluído	02/02/2024
Rua Cipriano Barata	650,00			
Rua Manifesto	1.760,00			
Rua Cisplatina	709,00			
Rua Antonio Carlos da Fonseca	2.720,00	73/24	Concluído	12/11/2024
Rua Dom Macario	1.540,00	99/24	Concluído	10/02/2025
Rua Nossa Senhora da Saúde - Trecho I	930,00	46/23	Concluído	01/12/2023
Rua Nossa Senhora da Saúde - Trecho II	627,00			
Rua José dos Reis	560,00	100/24	Concluído	29/11/2024
Rua Amparo	519,00			
Sub Total	26.357,00			

SITUAÇÃO DOS LOTES - 5

Estrutura Ciclovitaria	Extensão (m)	Nº OIS	Status	Data da Conclusão
Projeto	-		Concluido	
Rua Airton Pretini	645,00	139/24	Concluido	30/04/2025
Rua Apucarana	1.999,00	54/23	Concluido	02/05/2024
Av. Aricanduva	900,00			
Rua Adhemar Pereira de Barros	965,00	129/24	Concluido	30/04/2025
Rua Astarte	778,00	52/24	Concluido	02/05/2024
Av. Salim Farah Maluf	2.835,00	138/24	Em Obras	
Av. Capitão Pacheco Chaves	1.644,00	140/24	Em Obras	
Rua Carlos de Campos	706,00	53/24	Concluido	02/05/2024
Av. Estado	1.614,00			
Rua Joao Boemer	1.872,00	95/24	Concluido	20/01/2025
Pte Tatuapé	700,00	115/24	Concluido	30/04/2025
Av. Radial Leste	2.711,00			
Rua Ribeiro de Lima	430,00			
Sub Total	17.799,00			

SITUAÇÃO DOS LOTES - 7

Estrutura Ciclovitaria	Extensão (m)	N° OIS	Status	Data da Conclusão
Projeto	-		Concluido	
Av. Conceição	1.133,00			
Av. Guilherme	220,00			
Rua Maria Cândida	2.341,00	74/24	Concluido	04/09/2024
Rua Alberto Byington	3.311,00			
Av. Amaro Felicíssimo da Silveira	1.856,00			
Av. José Maria Fernandes	1.309,00	75.01/24	Concluido	21/10/2024
Rua Roland Garros	1.303,00			
Rua Jardim Japão	1.416,00			
Rua Gueixas	767,00			
Rua Maria José Barone Fernandes	2.420,00			
Sub Total	16.076,00			

SITUAÇÃO DOS LOTES - 9

Estrutura Ciclovitaria	Extensão (m)	Nº OIS	Status	Data da Conclusão
Projeto	-		Concluido	
Rua Benjamim Mansur	1.297,00	50/23	Concluido	02/01/2024
Av. Corifeu de Azevedo Marques - Trecho I	1.640,00	41/23	Concluido	01/11/2023
Av. Corifeu de Azevedo Marques - Trecho II	2.790,00			
Rua José Peres Campelo	3.594,00			
Rua Adherbal Stresser	114,00	132/24	Concluido	15/02/2025
Rua Camargo	532,00			
Rua Gal. Asdrúbal da Cunha-TRECHO 2/R. Maj. Walter Carlson	172,00	111/24	Concluido	15/02/2025
Rua Sapetuba	461,00			
Rua Waldemar Roberto - ligação	285,00			
Rua Santa Marina	770,00			
Av. Vital Brasil	1.230,00	42/23	Concluido	01/11/2023
Sub Total	12.885,00			

SITUAÇÃO DOS LOTES - 10

Estrutura Ciclovial	Extensão (m)	Nº OIS	Status	Data da Conclusão
Projeto	-		Em Obras	
Estrutura Ciclovial Forte do Leme	1.116,00			
Estrutura Ciclovial Satélite	1.445,00			
Estrutura Ciclovial André de Almeida	3.144,00			
Estrutura Ciclovial Luís Pires de Minas	1.697,00			
Estrutura Ciclovial Manuel dos Santos Braga	1.592,00			
Estrutura Ciclovial Riacho dos Machados	2.305,00			
Estrutura Ciclovial Adriano Bertozzi	2.880,00			
Estrutura Ciclovial Shinzaburo Mizutani	1.945,00			
Estrutura Ciclovial Serra de São Domingos	2.403,00			
Estrutura Ciclovial José Pinheiros Borges	8.450,00			
Sub Total	26.977,00			

SITUAÇÃO DOS LOTES - 11

Estrutura Ciclovitaria	Extensão (m)	Nº OIS	Status	Data da Conclusão
Projeto	-		Concluido	
Av Queiroz Filho	1.155,00	136/24	Em Obras	
Rua Potsdam	1.137,00			
Rua Guaipá	1.654,00			
Av Imperatriz Leopoldina	94,00			
Rua Major Paladino	373,00			
Viaduto da Lapa	697,00			
Ponte do Piqueri/Av. Ermano Marchetti	2.221,00			
Rua Dronsfield	1.381,00			
Av Gastão Vidigal - Mergenthaler	290,00			
Sub Total	9.002,00			

SITUAÇÃO DOS LOTES - 12

Estrutura Ciclovitaria	Extensão (m)	Nº OIS	Status	Data da Conclusão
Projeto	-		Concluido	
Rua Virgília Rodrigues Alves C. Pinto	1.500,00	108/24	Concluido	06/02/2025
Rua Santa Inês	1.886,00	133/24	Concluido	30/04/2025
Rua Maria Amália Lopes de Azevedo	4.703,00	106/24	Em Obras	
Rua Antonio Cesar Neto	780,00	109/24	Concluido	14/11/2024
Av. Benjamin Pereira	1.660,00			
Rua Manuel Gaya	1.842,00	48/23	Concluido	02/05/2024
Rua Antônio Maria de Laet	2.792,00			
Av. Capitão José Parada Gonçalves	916,00	107/24	Concluido	17/02/2025
Rua Duarte de Azevedo	1.020,00	49/24	Concluido	02/05/2024
Sub Total	17.099,00			

RESUMO POR LOTE

Resumo Executado Por Lote			
Lotes	Extensão Total (m)	Extensão Concluída (m)	Extensão Em Obras (m)
Lote 01	26.357,00	6.971,00	-
Lote 05	17.799,00	7.665,00	4.479,00
Lote 07	16.076,00	3.650,00	-
Lote 09	12.885,00	4.453,00	-
Lote 10	26.977,00	-	-
Lote 11	9.002,00	-	1.155,00
Lote 12	17.099,00	7.944,00	4.703,00
TOTAL PPP	126.195,00	30.683,00	10.337,00

Situação em 05/05/2025

REGISTROS FOTOGRÁFICOS

de Atividades




**CIDADE DE
SÃO PAULO**
MOBILIDADE
E TRÂNSITO

MARIA AMÁLIA LOPES AZEVEDO



MARIA AMÁLIA LOPES AZEVEDO

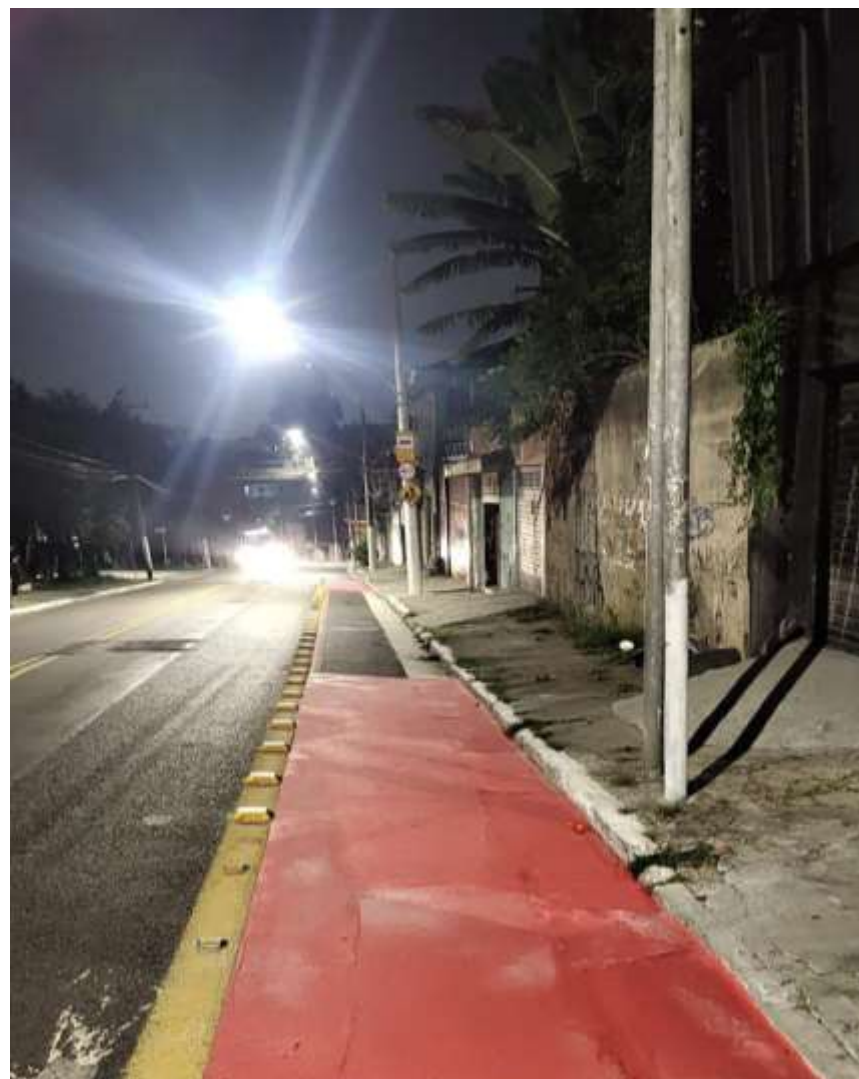

SANTA INÊS




SANTA INÊS



ADHEMAR PEREIRA DE BARROS



ADHEMAR PEREIRA DE BARROS

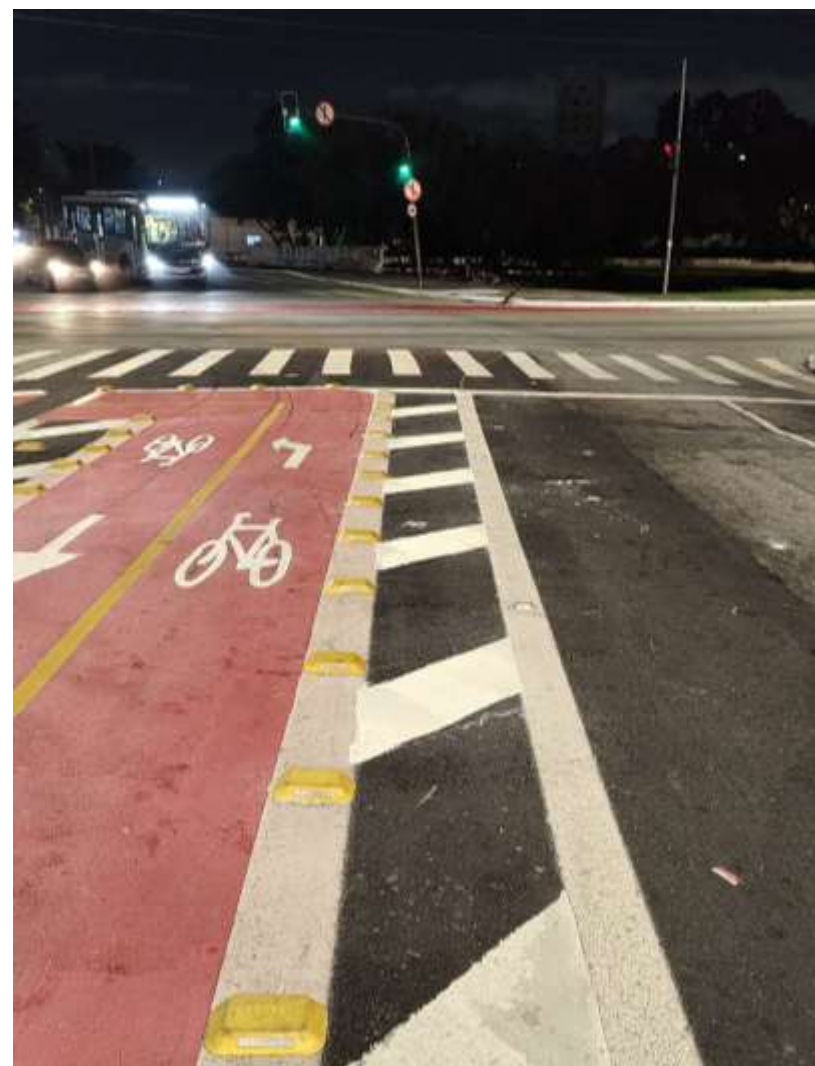

MANUTENÇÃO

das Estruturas Ciclovias



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
MOBILIDADE
E TRÂNSITO

Maio/2025

MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS CICLOVIÁRIAS

QUADRO RESUMO

	Contrato 01	Contrato 02	Total
Status	Extensão (m)	Extensão (m)	Extensão (m)
Estruturas Vistoriadas	580.050,00		580.050,00
OS Emitida + Manut. Concluída	120.585,55	5.929,00	126.514,55
Manutenção Iniciada	10.893,00	3.500,00	14.393,00
Manutenção Concluída	97.642,55	2.429,00	100.071,55
OS Emitida - não iniciada	2.747,00	-	2.747,00
OS Suspensa	9.303,00	-	9.303,00

Situação em 05/05/2025

MANUTENÇÃO FINALIZADA

Nome	Extensão
Ciclofaixa Jair Ribeiro	1722,0 m
Ciclovía Teôtonio Vilela	4105,0 m
Ciclofaixa Barão da Passagem	1356,0 m
Ciclovía Octalles / Zagottis	1123,0 m
Ciclovía Sumaré	3245,0 m
Ciclofaixa França Pinto	1536,0 m
Ciclovía Vd Antartica	1388,0 m
Ciclovía Luís Carlos Berrini	3331,0 m
Ciclofaixa Consolação	373,0 m
Ciclovía Santos Dumont - Trecho 1	522,0 m
Ciclofaixa Cecília Lotemberg	2018,0 m
Ciclofaixa Metalurgico	2624,0 m
Ciclofaixa Santa Eulália	392,0 m
Marquês de São Vicente	4035,0 m
Ciclofaixa Parque da Mooca	1446,0 m
Ciclofaixa Vila Prudente - T1	1295,0 m
Ciclofaixa Vila Prudente - T1 Complemento	971,0 m
Ciclofaixa Vila Prudente - T3	2068,0 m

Nome	Extensão
Jabaquara Trechos 1 e 2	4397,0 m
Jabaquara Trecho 3	627,0 m
Benjamim Constant	230,0 m
Ciclofaixa Jaguará	174,0 m
Ponte Vila Guilherme	695,0 m
Ponte Jânio Quadros	539,0 m
Vd. 9 de Julho	275,0 m
Aratãs	784,0 m
Ciclovía e Ciclofaixa Hebe Camargo	3553,0 m
Ciclofaixa Cambuci	45,0 m
Ciclofaixa Estado (Rua das Figueiras)	26,3 m
Ciclovía Ponte Aricanduva	791,0 m
Jacu-Pêssego	14810,0 m
Ciclofaixa Parque São Rafael	1655,0 m
Norma Pieruccini Giannotti	909,0 m
Ciclofaixa Jardim Helena / São Miguel - T2	1736,00
Martiniano de Carvalho	769,00
São João	768,00

MANUTENÇÃO FINALIZADA

Nome	Extensão
Tancredo Neves	2540,00
Ciclofaixa Patriotas	2158,00
José Alves da Cunha	1309,00
Ciclofaixa Chácara Santo Antônio	971,00
Jardim Cordeiro	909,00
Camargo	464,00
Parque Arariba T2	842,00
Freguesia do Ó	2556,00
Jaguaré	745,00
Vitória Speers	1208,00
Carioca Camumu	1197,00
Faria Lima - Conexões	1351,00
Agostinho Cantu	882,00
Caititu	2059,00
Passo da Pátria	1765,00
Eliseu de Almeida (parcial)	2363,00
Gabriel Migliori	1361,00
Vinte e um de Abril	1157,00

Nome	Extensão
Praça da República	402,00
Joaquina Ramalho	627,00
Nhambiquaras - Jurupis x Acoce x Maracatins	869,00
Visconde de Taunay	973,00
Mofarrej	61,30
Vieira da Carvalho	
Jardim Helena	
Figueira Rangel	986,00
Costa Carvalho - Natingui	96,00
Vila Carrão - Complementar	

Contrato 01

Total Finalizada: 97.642,55 Km

Nome	Extensão
Martiniano de Carvalho 2	1171,00
Torres de Oliveira	1258,00

Contrato 02

Total Finalizada: 2.429,00 Km

MANUTENÇÃO EM ANDAMENTO

Nome	Extensão
Paraciclos	
Faria Lima - T2	6759,00
Vila Carrão - R. João Vieira Prioste e outras	2120,00
Manoel da Nóbrega	224,00
Monotrilho Vila Prudente - LIAM	396,00
Arena Corinthians	1394,00

Contrato 1
Total de obras em andamento:
10.893,0 Km

Nome	Extensão
Abel Tavares	2532,00
Largo do Arouche	968,00
Reposição Geral de Gradis danificados	

Contrato 2
Total de obras em andamento:
3.500,0 Km

ORDENS DE SERVIÇO EMITIDAS

Nome
Ciclovía Inajar de Souza
Ciclovía Brás Leme
Ciclofaixa Brás Leme - Ligação
Nazaré - T2 (Tachões)
Nazaré - T2
Inajar de Souza
Hélio Pelegrino
Frederico Hermann Junior
São Miguel
Casper Líbero - Mauá
Dom José Gaspar
Gustavo Adolfo
Alameda Northmann
Condessa de São Joaquim
Sena Madureira
Manoel da Nóbrega



Suspensas para
ajuste de projeto.
9.303,00 Km

REGISTROS FOTOGRÁFICOS

de Atividades



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
MOBILIDADE
E TRÂNSITO

SENA MADUREIRA



BOM JARDIM



BOM JARDIM



OBRIGAD@!



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
MOBILIDADE
E TRÂNSITO
