

Prestação de Contas Parcial do Plano de Aplicação 2025

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E TRANSPORTE

Processo SEI 6020.2024/0058722-4



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**

**SECRETARIA
DE MOBILIDADE
URBANA E TRANSPORTE**

OBJETO DO GASTO	APROVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	REALIZADO	FONTES DOS RECURSOS
Obras de redesenho urbano para segurança viária (3757)	R\$ 28.534.979,19	R\$ 807.203,78	R\$ 0	0%	MOB 2025
Construção de Ciclovias (1097)	R\$ 81.466.071,41	R\$ 17.400.000,00	R\$ 10.405.096,28	12,77%	MOB 2023 e MOB 2025
Despesas de Exercícios Anteriores – Ciclovias (1097)	R\$ 135.254,40	R\$ 135.254,40	R\$ 135.254,40	100%	MOB 2025
Implantação de Corredores de Ônibus (1099)	R\$ 41.236.000,00	R\$ 12.002.000,00	R\$ 10.821.867,18	26,24%	MOB 2023 e MOB 2025
Implantação de Transporte Público Hidroviário (5362)	R\$ 10.987.156,50	R\$ 10.987.156,50	R\$ 5.982.000,50	54,45%	MOB 2025
Construção de Terminais de Ônibus (1095)	R\$ 26.017.148,50	R\$ 25.946.306,46	R\$ 6.734.191,94	25,88%	MOB 2025
Requalificação do Pavimento de Paradas de Ônibus (5394)	R\$ 6.892.000,00	R\$ 6.891.000,00	R\$ 5.489.196,11	79,64%	MOB 2025
Dotações a manter	R\$ 4.000,00	R\$ 0	R\$ 0	0 %	MOB 2025
TOTAL	R\$ 195.272.610,00	R\$ 74.168.921,14	R\$ 39.567.606,41		
<div> <div>  </div> <div>  </div> <div>  <div> PREFEITURA DE SÃO PAULO SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E TRANSPORTE </div> </div> </div>					

OBRAS DE REDESENHO URBANO PARA SEGURANÇA VIÁRIA

OBJETO DO GASTO	APROVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	REALIZADO	FONTES DOS RECURSOS
Obras de redesenho urbano para segurança viária (3757)	R\$ 28.534.979,19	R\$ 807.203,78	R\$ 0	0 %	MOB 2025

Mapa de São Paulo com áreas calmas, rotas com acessibilidade, rotas escolares e vias seguras. O mapa mostra a cidade de São Paulo com suas divisões administrativas e áreas de intervenção. As áreas calmas são destacadas em verde, as rotas com acessibilidade em amarelo, as rotas escolares em laranja e as vias seguras em azul. O mapa também mostra a rede de transporte público e as áreas de intervenção da Prefeitura de São Paulo.

LEGENDA

- ÁREAS CALMAS (PAQUETE 1)
- ÁREAS CALMAS (PAQUETE 2)
- ROTA COM ACESSIBILIDADE
- ROTA ESCOLAR (PAQUETE 1)
- ROTA ESCOLAR (PAQUETE 2)
- VIAS SEGUROS (PAQUETE 1)
- VIAS SEGUROS (PAQUETE 2)
- ÁREAS DE INTERVENÇÃO
- ÁREAS DE INTERVENÇÃO (PAQUETE 1)
- ÁREAS DE INTERVENÇÃO (PAQUETE 2)
- ÁREAS DE INTERVENÇÃO (PAQUETE 3)
- ÁREAS DE INTERVENÇÃO (PAQUETE 4)
- ÁREAS DE INTERVENÇÃO (PAQUETE 5)
- ÁREAS DE INTERVENÇÃO (PAQUETE 6)
- ÁREAS DE INTERVENÇÃO (PAQUETE 7)
- ÁREAS DE INTERVENÇÃO (PAQUETE 8)
- ÁREAS DE INTERVENÇÃO (PAQUETE 9)
- ÁREAS DE INTERVENÇÃO (PAQUETE 10)
- ÁREAS DE INTERVENÇÃO (PAQUETE 11)
- ÁREAS DE INTERVENÇÃO (PAQUETE 12)
- ÁREAS DE INTERVENÇÃO (PAQUETE 13)
- ÁREAS DE INTERVENÇÃO (PAQUETE 14)
- ÁREAS DE INTERVENÇÃO (PAQUETE 15)
- ÁREAS DE INTERVENÇÃO (PAQUETE 16)
- ÁREAS DE INTERVENÇÃO (PAQUETE 17)
- ÁREAS DE INTERVENÇÃO (PAQUETE 18)
- ÁREAS DE INTERVENÇÃO (PAQUETE 19)
- ÁREAS DE INTERVENÇÃO (PAQUETE 20)
- ÁREAS DE INTERVENÇÃO (PAQUETE 21)
- ÁREAS DE INTERVENÇÃO (PAQUETE 22)
- ÁREAS DE INTERVENÇÃO (PAQUETE 23)
- ÁREAS DE INTERVENÇÃO (PAQUETE 24)
- ÁREAS DE INTERVENÇÃO (PAQUETE 25)
- ÁREAS DE INTERVENÇÃO (PAQUETE 26)
- ÁREAS DE INTERVENÇÃO (PAQUETE 27)
- ÁREAS DE INTERVENÇÃO (PAQUETE 28)
- ÁREAS DE INTERVENÇÃO (PAQUETE 29)
- ÁREAS DE INTERVENÇÃO (PAQUETE 30)
- ÁREAS DE INTERVENÇÃO (PAQUETE 31)
- ÁREAS DE INTERVENÇÃO (PAQUETE 32)
- ÁREAS DE INTERVENÇÃO (PAQUETE 33)
- ÁREAS DE INTERVENÇÃO (PAQUETE 34)
- ÁREAS DE INTERVENÇÃO (PAQUETE 35)
- ÁREAS DE INTERVENÇÃO (PAQUETE 36)
- ÁREAS DE INTERVENÇÃO (PAQUETE 37)
- ÁREAS DE INTERVENÇÃO (PAQUETE 38)
- ÁREAS DE INTERVENÇÃO (PAQUETE 39)
- ÁREAS DE INTERVENÇÃO (PAQUETE 40)
- ÁREAS DE INTERVENÇÃO (PAQUETE 41)
- ÁREAS DE INTERVENÇÃO (PAQUETE 42)
- ÁREAS DE INTERVENÇÃO (PAQUETE 43)
- ÁREAS DE INTERVENÇÃO (PAQUETE 44)
- ÁREAS DE INTERVENÇÃO (PAQUETE 45)
- ÁREAS DE INTERVENÇÃO (PAQUETE 46)
- ÁREAS DE INTERVENÇÃO (PAQUETE 47)
- ÁREAS DE INTERVENÇÃO (PAQUETE 48)
- ÁREAS DE INTERVENÇÃO (PAQUETE 49)
- ÁREAS DE INTERVENÇÃO (PAQUETE 50)
- ÁREAS DE INTERVENÇÃO (PAQUETE 51)
- ÁREAS DE INTERVENÇÃO (PAQUETE 52)
- ÁREAS DE INTERVENÇÃO (PAQUETE 53)
- ÁREAS DE INTERVENÇÃO (PAQUETE 54)
- ÁREAS DE INTERVENÇÃO (PAQUETE 55)
- ÁREAS DE INTERVENÇÃO (PAQUETE 56)
- ÁREAS DE INTERVENÇÃO (PAQUETE 57)
- ÁREAS DE INTERVENÇÃO (PAQUETE 58)
- ÁREAS DE INTERVENÇÃO (PAQUETE 59)
- ÁREAS DE INTERVENÇÃO (PAQUETE 60)
- ÁREAS DE INTERVENÇÃO (PAQUETE 61)
- ÁREAS DE INTERVENÇÃO (PAQUETE 62)
- ÁREAS DE INTERVENÇÃO (PAQUETE 63)
- ÁREAS DE INTERVENÇÃO (PAQUETE 64)
- ÁREAS DE INTERVENÇÃO (PAQUETE 65)
- ÁREAS DE INTERVENÇÃO (PAQUETE 66)
- ÁREAS DE INTERVENÇÃO (PAQUETE 67)
- ÁREAS DE INTERVENÇÃO (PAQUETE 68)
- ÁREAS DE INTERVENÇÃO (PAQUETE 69)
- ÁREAS DE INTERVENÇÃO (PAQUETE 70)
- ÁREAS DE INTERVENÇÃO (PAQUETE 71)
- ÁREAS DE INTERVENÇÃO (PAQUETE 72)
- ÁREAS DE INTERVENÇÃO (PAQUETE 73)
- ÁREAS DE INTERVENÇÃO (PAQUETE 74)
- ÁREAS DE INTERVENÇÃO (PAQUETE 75)
- ÁREAS DE INTERVENÇÃO (PAQUETE 76)
- ÁREAS DE INTERVENÇÃO (PAQUETE 77)
- ÁREAS DE INTERVENÇÃO (PAQUETE 78)
- ÁREAS DE INTERVENÇÃO (PAQUETE 79)
- ÁREAS DE INTERVENÇÃO (PAQUETE 80)
- ÁREAS DE INTERVENÇÃO (PAQUETE 81)
- ÁREAS DE INTERVENÇÃO (PAQUETE 82)
- ÁREAS DE INTERVENÇÃO (PAQUETE 83)
- ÁREAS DE INTERVENÇÃO (PAQUETE 84)
- ÁREAS DE INTERVENÇÃO (PAQUETE 85)
- ÁREAS DE INTERVENÇÃO (PAQUETE 86)
- ÁREAS DE INTERVENÇÃO (PAQUETE 87)
- ÁREAS DE INTERVENÇÃO (PAQUETE 88)
- ÁREAS DE INTERVENÇÃO (PAQUETE 89)
- ÁREAS DE INTERVENÇÃO (PAQUETE 90)
- ÁREAS DE INTERVENÇÃO (PAQUETE 91)
- ÁREAS DE INTERVENÇÃO (PAQUETE 92)
- ÁREAS DE INTERVENÇÃO (PAQUETE 93)
- ÁREAS DE INTERVENÇÃO (PAQUETE 94)
- ÁREAS DE INTERVENÇÃO (PAQUETE 95)
- ÁREAS DE INTERVENÇÃO (PAQUETE 96)
- ÁREAS DE INTERVENÇÃO (PAQUETE 97)
- ÁREAS DE INTERVENÇÃO (PAQUETE 98)
- ÁREAS DE INTERVENÇÃO (PAQUETE 99)
- ÁREAS DE INTERVENÇÃO (PAQUETE 100)

OBRAS DE REDESENHO URBANO PARA SEGURANÇA VIÁRIA

VALOR APROVADO	NOME DA INFRAESTRUTURA	ENDEREÇO(S)	SUBPREFEITURA	ZONA
R\$ 807.203,78	Área Calma São Miguel Paulista - Obras	Área contida entre as seguintes vias: Praça Padre Aleixo Monteiro Mafra; Av. Nordestina; Av. Guilherme Eiras; Av. Marechal Tito; R. Arlindo Colaço; Rua Salvador de Medeiros	São Miguel Paulista	L
R\$ 807.364,82	Contratação de Obras de segurança viária: (1) Via Segura – Estado	Av. do Estado	SÉ, MOOCA, IPIRANGA	C, L, S
R\$ 807.364,82	Contratação de Obras de segurança viária: (2) Via Segura – Imperador	Avenida do Imperador	SÃO MIGUEL, ITAQUERA	L
R\$ 726.830,18	Contratação de Obras de segurança viária: (3) Área Calma Centro – República	Área contida entre as seguintes vias: Av. Ipiranga, r. da Consolação, av. Senador Queiroz, vd. Dona Paulina e o vale do Anhangabaú.	SÉ	C
R\$ 536.544,28	Contratação de Obras de segurança viária: (4) Rua Completa Cidade Tiradentes	Av. Souza Ramos, Av. Naylor de Oliveira, Rua Milagre dos Peixes, Rua Arroio Arapongas, Rua Barão Dinis de Samuel, Rua Cavaleiro de Jorge e Rua Sara Kubitschek.	CIDADE TIRADENTES	L
R\$ 536.544,28	Contratação de Obras de segurança viária: (5) Rua Completa Metalúrgicos	Av. Metalúrgicos, Av. Leandro, Rua Luís Jorge da Costa, Rua Rei Davi, Rua dos Pedreiros e Rua Francisco José Viana.	CIDADE TIRADENTES	L
R\$ 536.544,28	Contratação de Obras de segurança viária: (6) Rua Completa Brasilândia / Casa Verde.	Av. Itaberaba, Praça Manoel da Costa Negreiros (Largo do Japonês), Rua Marina Lemos de Abreu, Av. Deputado Cantídio Sampaio, Av. Inajar de Souza, Rua Francisco Calado, Rua Adolfo Kurt Boehm, Rua Julião Ferreira e Rua Félix Alves Pereira.	FREGUESIA-BRASILÂNDIA, CASA-VERDE-CACHOEIRINHA	N



OBRAS DE REDESENHO URBANO PARA SEGURANÇA VIÁRIA

VALORES	NOME DA INFRAESTRUTURA	ENDEREÇO(S)	SUBPREFEITURA	ZONA
---------	------------------------	-------------	---------------	------

VALOR APROVADO

R\$ 807.203,78

Obras de redesenho urbano para moderação de tráfego - São Miguel Paulista (Obras)

Área contida entre as seguintes vias: Praça Padre Aleixo Monteiro Mafra; Av. Nordestina; Av. Guilherme Eiras; Av. Marechal Tito; R. Arlindo Colaço; Rua Salvador de Medeiros

SÃO MIGUEL

L

VALOR LIQUIDADO

R\$ 0


Obras em andamento



Rua Dr. José Guilherme Eiras – Dez/2024



Rua Serra Dourada – Jan/2025

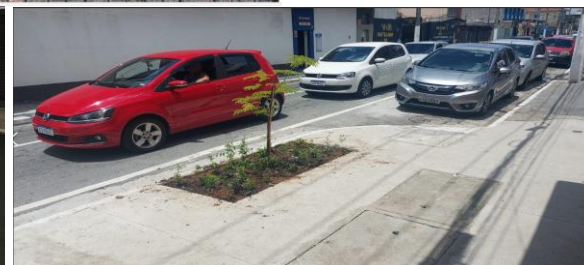

OBRAS DE REDESENHO URBANO PARA SEGURANÇA VIÁRIA

NOME DA INFRAESTRUTURA

Contratação de obras de segurança viária: (1) Via Segura - Estado




Contratação de obras de segurança viária: (2) Via Segura - Imperador

Contratação de obras de segurança viária: (3) Área Calma Centro - República

Contratação de obras de segurança viária: (4) Rua Completa Cidade Tiradentes

Contratação de obras de segurança viária: (5) Rua Completa Metalúrgicos

Contratação de obras de segurança viária: (6) Rua Completa Brasilândia / Casa Verde.

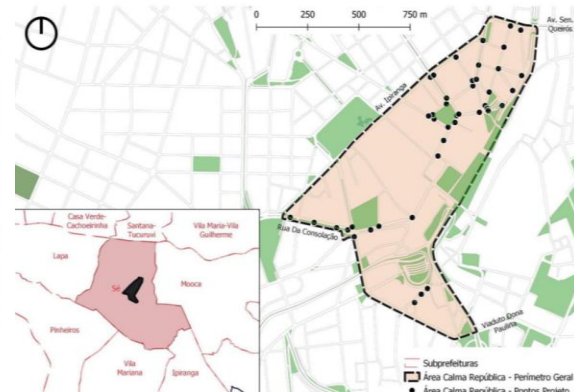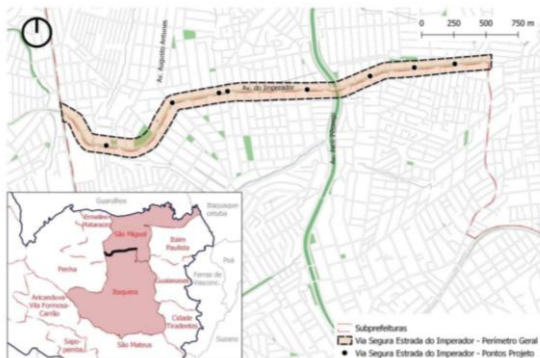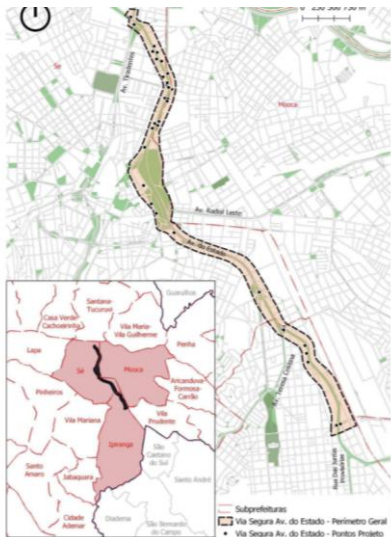

OBRAS DE REDESENHO URBANO PARA SEGURANÇA VIÁRIA

NOME DA INFRAESTRUTURA

Contratação de obras de segurança viária: (1) Via Segura - Estado



Contratação de obras de segurança viária: (2) Via Segura - Imperador

Contratação de obras de segurança viária: (3) Área Calma Centro - República

Contratação de obras de segurança viária: (4) Rua Completa Cidade Tiradentes

Contratação de obras de segurança viária: (5) Rua Completa Metalúrgicos

Contratação de obras de segurança viária: (6) Rua Completa Brasilândia / Casa Verde.

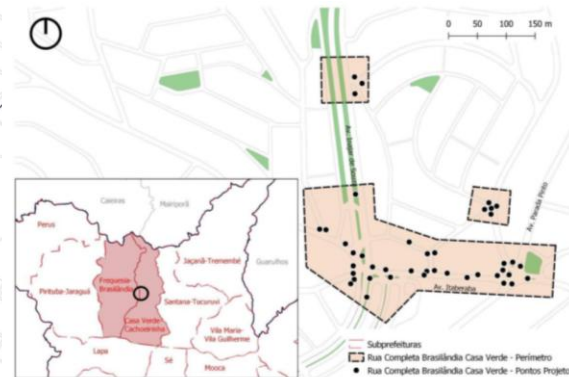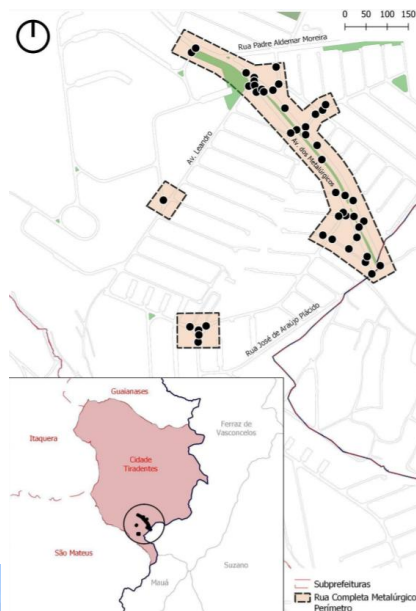

OBRAS DE REDESENHO URBANO PARA SEGURANÇA VIÁRIA

VALOR APROVADO	NOME DA INFRAESTRUTURA	ENDEREÇO(S)	SUBPREFEITURA	ZONA
R\$ 1.588.248,08	Contratação de Obras de segurança viária: (1) Área Calma Centro Sé	Área contida entre as seguintes vias: Boa Vista, Líbero Badaró, Benjamin Constant, incluindo também Rua 25 de Março, Rua Comen. Afonso Kherlakian, Rua da Cantareira, Rua Cav. Basílio Jafet, Ladeira General Carneiro e Parque Dom Pedro II, Florêncio de Abreu, Avenida Senador Queirós, Rua Carlos de Souza Nazareth, Rua Eurípedes Simões de Paula, Av. Mercúrio, Rua da Cantareira, Rua Cavalheiro Basílio Jafet, Ladeira Porto Geral, Rua Varnhagen.	SÉ	C
R\$ 654.488,89	Contratação de Obras de segurança viária: (2) Rota Escolar Segura Itaquera	Área compreendida no quadrilátero formado pela R. Luis Mateus, R. Jardim Tamoio, Av. Nagib Farah Maluf até próximo à R. Agrimensor Sugay	ITAQUERA	L
R\$ 308.413,36	Contratação de Obras de segurança viária: (3) Rota Escolar Segura São Rafael	R. Miguel Ferreira de Melo e Av. dos Sertanistas	SÃO MATEUS	L
R\$ 392.693,33	Contratação de Obras de segurança viária: (4) Rota Escolar Segura Pari	Av. Carlos de Campos, Pça Ilo Ottani, Ponte da Vila Guilherme. Av. Bom Jardim, R. Cachoeira, Av. Pedroso da Silveira, Av. Bom Jardim, R. Silva Teles, R. Joaquim Carlos, R. Cel. Emídio Piedade e R. Santa Rita	MOOCA	L
R\$ 209.326,29	Contratação de Obras de segurança viária: (5) Via Segura Belmira Marin	Av. Dona Belmira Marin	CAPELA DO SOCORRO	S
R\$ 817.097,60	Contratação de Obras de segurança viária: (6) Via Segura Estrada de Itapeperica	Estrada de Itapeperica	CAMPO LIMPO	S
R\$ 1.192.738,62	Contratação de Obras de segurança viária: (7) Via Segura Marechal Tito	Av. Mal Tito	SÃO MATEUS / ITAIM PAULISTA	L
R\$ 190.878,81	Contratação de Obras de segurança viária: (8) Via Segura Teotônio Vilela	Av Senador Teotônio Vilela	CAPELA DO SOCORRO	S
R\$ 4.226.176,18	Contratação de Obras de segurança viária: (9) Via Segura Raimundo Pereira de Magalhães	Av. Raimundo Pereira de Magalhães	PIRITUBA/PERUS	N

OBRAS DE REDESENHO URBANO PARA SEGURANÇA VIÁRIA

NOME DA INFRAESTRUTURA

Contratação de obras de segurança viária:

(1) Área Calma Centro Sé

Contratação de obras de segurança viária:

(2) Rota Escolar Segura Itaquera

Contratação de obras de segurança viária:

(3) Rota Escolar Segura São Rafael

Contratação de obras de segurança viária:

(4) Rota Escolar Segura Pari

Contratação de obras de segurança viária:

(5) Via Segura Belmira Marin

Contratação de obras de segurança viária:

(6) Via Segura Estrada de Itapecerica

Contratação de obras de segurança viária:


(7) Via Segura Marechal Tito

Contratação de obras de segurança viária:

(8) Via Segura Teotônio Vilela

Contratação de obras de segurança viária:


(9) Via Segura Raimundo Pereira de Magalhães

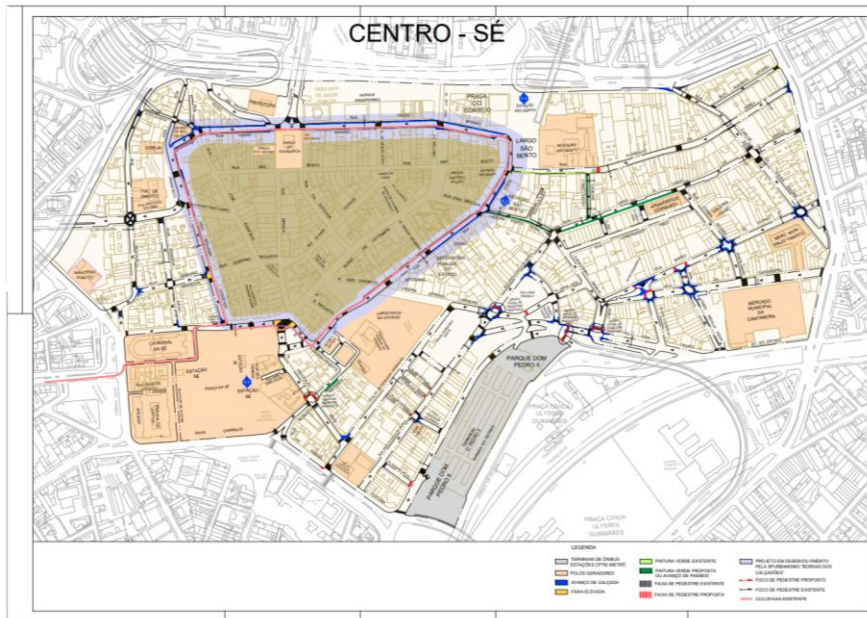

R. Libero Badaró x Av. São João



Atual



Proposto



Atua



Propost

Rua 25 de Março x Ladeira Porto Geral



Atual



Propost

OBRAS DE REDESENHO URBANO PARA SEGURANÇA VIÁRIA

NOME DA INFRAESTRUTURA

Contratação de obras de segurança viária:

(1) Área Calma Centro Sé

(2)

Contratação de obras de segurança viária:

(2) Rota Escolar Segura Itaquerá

Contratação de obras de segurança viária:

(3) Rota Escolar Segura São Rafael

Contratação de obras de segurança viária:

(4) Rota Escolar Segura Pari

Contratação de obras de segurança viária:

(5) Via Segura Belmira Marin

(3)

Contratação de obras de segurança viária:

(6) Via Segura Estrada de Itapecerica

Contratação de obras de segurança viária:

(7) Via Segura Marechal Tito


Contratação de obras de segurança viária:

(8) Via Segura Teotônio Vilela

Contratação de obras de segurança viária:

(9) Via Segura Raimundo Pereira de Magalhães

(4)

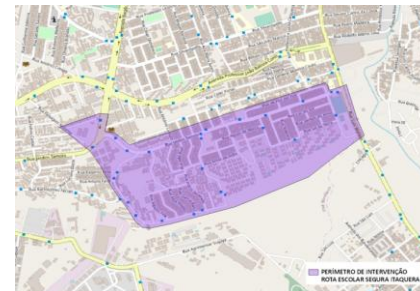

OBRAS DE REDESENHO URBANO PARA SEGURANÇA VIÁRIA

NOME DA INFRAESTRUTURA

Contratação de obras de segurança viária:

(1) Área Calma Centro Sé

(5)

Contratação de obras de segurança viária:

(2) Rota Escolar Segura Itaquera

Contratação de obras de segurança viária:

(3) Rota Escolar Segura São Rafael

Contratação de obras de segurança viária:

(4) Rota Escolar Segura Pari

Contratação de obras de segurança viária:

(5) Via Segura Belmira Marin

(6)

Contratação de obras de segurança viária:

(6) Via Segura Estrada de Itapecerica

Contratação de obras de segurança viária:

(7) Via Segura Marechal Tito

Contratação de obras de segurança viária:

(8) Via Segura Teotônio Vilela


Contratação de obras de segurança viária:

(9) Via Segura Raimundo Pereira de Magalhães


(7)



Foto 9- Local com canteiro estreito, conversão à esquerda e travessia em 2 estágios



Canteiro Central muito estreito para acomodar pedestres



OBRAS DE REDESENHO URBANO PARA SEGURANÇA VIÁRIA

NOME DA INFRAESTRUTURA

Contratação de obras de segurança viária:

(1) Área Calma Centro Sé

Contratação de obras de segurança viária:

(2) Rota Escolar Segura Itaquera

Contratação de obras de segurança viária:

(3) Rota Escolar Segura São Rafael

Contratação de obras de segurança viária:

(4) Rota Escolar Segura Pari

Contratação de obras de segurança viária:

(5) Via Segura Belmira Marin

Contratação de obras de segurança viária:

(6) Via Segura Estrada de Itapecerica

Contratação de obras de segurança viária:

(7) Via Segura Marechal Tito


Contratação de obras de segurança viária:

(8) Via Segura Teotônio Vilela


Contratação de obras de segurança viária:

(9) Via Segura Raimundo Pereira de Magalhães

(8)



(9)



OBRASDE REDESENHO URBANO PARA SEGURANÇA VIÁRIA

VALOR APROVADO	NOME DA INFRAESTRUTURA	ENDEREÇO(S)	SUBPREFEITURA	ZONA
R\$ 1.722.118,08	Contratação de Obras para Rotas Acessíveis para Pessoas com Deficiência: (1) Barra Funda	A rota acessível da Barra Funda ficará nas imediações da estação Barra Funda do Metrô e da CPTM, passando pelas vias Auro Soares de Moura Andrade, Deputado Salvador Julianelli, Francisco Matarazzo e Ministro Godoi.	LAPA	O
R\$ 1.800.916,78	Contratação de Obras para Rotas Acessíveis para Pessoas com Deficiência: (2) Ipiranga	A rota acessível do Ipiranga ficará nas imediações do Parque da Independência e compreenderá as vias Bom Pastor, dos Patriotas, Nazaré e Moreira de Godoi.	IPIRANGA	S
R\$ 1.523.114,78	Contratação de Obras para Rotas Acessíveis para Pessoas com Deficiência: (3) Marechal Deodoro	A rota acessível Marechal Deodoro estará localizada no entorno da estação de mesmo nome do Metrô. Compreenderá as vias Gal. Olímpio da Silveira, Lopes de Oliveira, Brigadeiro Galvão e Conselheiro Brotero.	SÉ	O
R\$ 3.270.446,40	Contratação de Obras para Rotas Acessíveis para Pessoas com Deficiência: (4) Vila Mariana / entorno da Linha Azul do Metrô	A rota acessível da Vila Mariana / entorno da Linha Azul do Metrô percorrerá área paralela a parte do trajeto da Linha Azul do Metrô, entre o Centro Cultural Vergueiro e o cruzamento com as Ruas Sena Madureira / Monsenhor Manuel Vicente, percorrendo as vias Domingos de Moraes; Professor Noé Azevedo; Vergueiro; Baltazar Lisboa; Dona Júlia; Machado de Assis; e Manuel de Paiva.	VILA MARIANA	S
R\$ 4.732.692,45	Contratação de Obras para Travessia Segura - 200 projetos de avanços de calçadas ou construção de ilhas de refúgios	Diversas vias	29 Subprefeituras	N, L, S, O, C
R\$ 1.147.233,10	Contratação de obras Rotas Acessíveis para Pessoas com Deficiência:(5) Vila Clementino	Rua Estado de Israel, Rua Prof Ascendino Reis, Rua José Magalhães, Rua dos Otonis, Rua Loefgreen, Rua Botucatu, Rua Marselhesa e Rua Domingos de Moraes.	VILA MARIANA	S

OBRAS DE REDESENHO URBANO PARA SEGURANÇA VIÁRIA

NOME DA INFRAESTRUTURA

Contratação de obras Rotas Acessíveis para Pessoas com Deficiência: (1) Barra Funda

Contratação de obras Rotas Acessíveis para Pessoas com Deficiência: (2) Ipiranga


Contratação de obras Rotas Acessíveis para Pessoas com Deficiência: (3) Marechal Deodoro

Contratação de obras Rotas Acessíveis para Pessoas com Deficiência: (4) Vila Mariana / entorno da Linha Azul do Metrô


Contratação de obras Travessia Segura - 200 projetos de avanços de calçadas ou construção de ilhas de refúgios

Contratação de obras Rotas Acessíveis para Pessoas com Deficiência: (5) Vila Clementino

4.1.1 ROTA ACESSÍVEL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA DA BARRA FUNDA

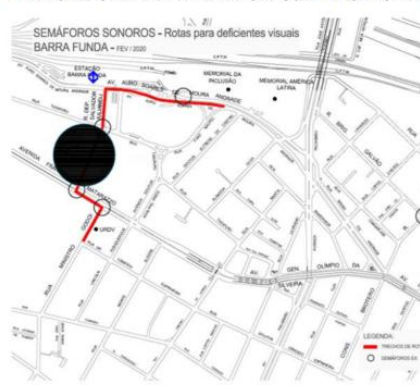

4.1.3 ROTA ACESSÍVEL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA DA MARECHAL DEODORO

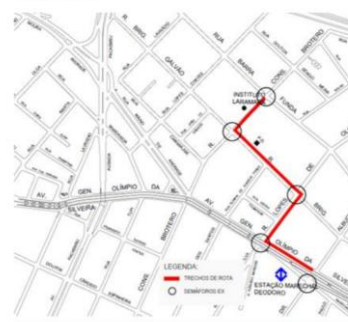

4.1.2 ROTA ACESSÍVEL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA DO IPIRANGA



4.1.4 ROTA ACESSÍVEL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA DA VILA MARIANA / ENTORNO DA LINHA AZUL DO METRÔ



OBRASDE REDESENHO URBANO PARA SEGURANÇA VIÁRIA

NOME DA INFRAESTRUTURA

Contratação de obras Rotas Acessíveis para Pessoas com Deficiência: (1) Barra Funda


Contratação de obras Rotas Acessíveis para Pessoas com Deficiência: (2) Ipiranga

Contratação de obras Rotas Acessíveis para Pessoas com Deficiência: (3) Marechal Deodoro

Contratação de obras Rotas Acessíveis para Pessoas com Deficiência: (4) Vila Mariana / entorno da Linha Azul do Metrô

Contratação de obras Travessia Segura - 200 projetos de avanços de calçadas ou construção de ilhas de refúgios

Contratação de obras Rotas Acessíveis para Pessoas com Deficiência: (5) Vila Clementino

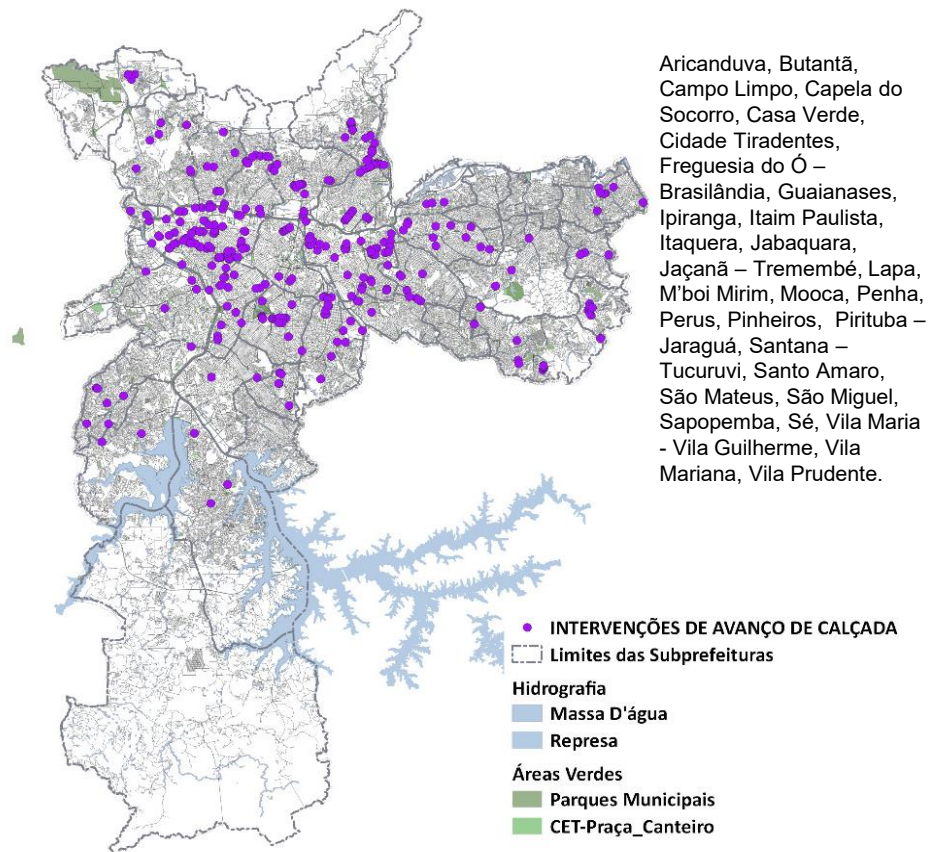

OBRAS DE REDESENHO URBANO PARA SEGURANÇA VIÁRIA

Contratação de obras travessia segura - 200 projetos de avanços de calçadas ou construção de ilhas de refúgios:

Praça Santo Atanásio; Av. Eduardo Cotching; Rua Acuruí; Av. Ver. Abel Ferreira; Rua Nebulosa; Praça Albino Foco. De Figueiredo; Rua Taubaté; Rua Edna Romanini; Rua Lucília de Queiroz; Av. Sapopemba; Praça Geraldo Mendes; Rua Rei Alberto da Bélgica; Rua Francisco Manuel Beranger; Rua Luiz F Silva; Travessa Rio Grande. Rua MMDC; Rua Alvarenga; Av. Afrânio Peixoto; Av. Morumbi; Rua Leonor Quadros; Rua Heitor Portugal; Praça Desembargador Vieira Neto Rua Antônio de Andrade Rebelo; Av. Morumbi; Estrada de Itapeceira; R. Domingos Peixoto da Silva; Av. Giovanni Gronchi; Rua Nelson Gama de Oliveira Av. Ipanema; Praça Lisboa; Av. Pres. João Goulart; Rua Nova Britânia; Rua Giovanni Bonancini Av. Inajar de Souza; Av. Cantídio Sampaio; Rua Marina Lemos de Abreu; Av. Itaberaba; Av. Parada Pinto; Rua dos Patís; Rua Felisberto Freire; Rua José Brito Broca; Rua Odass Nazzali; Av. Engenheiro Caetano Álvares; Av. Otaviano Alves de Lima; Rua Atílio Piffer; Rua Cel. Euclides Machado; Rua do Havre; Rua Maracaia; Rua José Amato Av. dos Metalúrgicos; Rua Edson Danilo Dotto; Rua Igarapé Água Azul; Rua Santo Rizzo; Av. Naylor de Oliveira; Rua dos Têxteis; Rua Ernesto Cerreti; Rua Ernesto Gould; Rua Jorge Rigueti; Rua Santa Adelaide; Rua São Valfredo Rua Firminópolis; Rua Itatiba do Sul; Av. Abílio Primo Nalim; Rua dos Morgados; Av. Padre Orlando Garcia da Silveira; Av. Dep. Cantídio Sampaio; Praça Itálico Ancona (Rua Hipólito de Camargo; Rua Saturnino Pereira; Rua Gaspar Sardinha; Rua Freitas de Azevedo; Rua Inácio de Oliveira Campos; Rua Agapito Maluf; Av. Lara Campos; Av. José Pinheiro Borges Estrada das Lágrimas; Rua Salvador Pires de Lima; Praça Do Monumento; Rua Leais Paulistanos; Rua Oliveira Alves; Rua Bom Pastor; Av. do Cursivo; Rua Maurice Denis; Av. Pres. Wilson; Rua Alcantis; Rua Almirante Mariath; Rua Freire Brayner; Rua Almirante Delamare; Rua Auriverde; Rua Vemag; Rua Dom Vilares; Rua Itálva; Rua Agostinho Gomes; Rua Viena; Via Anchieta; Rua Vicente da Costa; Rua Pe. Marchetti; Av. Ricardo Jafet; Rua Sorocabanos; Rua Xavier Curado; Rua Moreira de Godoi; Praça Leonor Kauppa Av. Barão de Alagoas; Praça Bernardo Ravasco; Av. Marechal Tito; Av. Itaim; Rua Manuel B da Fonseca; Estrada Dom João Nery; Rua Thyro Burgo Lopes; Av. Kemel Addas; Praça Major José Levy Sobrinho; Rua Rafael Correia da Silva; Rua Pascoal de Miranda; Rua Manuel de Castilho; Rua Ribeiro Escobar Av. Dr. Francisco Munhoz Filho; Rua Francisco Jorge da Silva; Rua Carolina Fonseca; Av. Pires do Rio Av. Dr. Luís Rocha Miranda; Av. Tulio Teodoro de Campos; Rua Jorge Duprat Figueiredo; Av. Eng. Armando de Arruda Pereira; Rua José Bonifácio; Rua Cidade de Bagdá; Rua Gustavo Silveira Av. Edu Chaves; Av. Antonio da Messina; Av. Roland Garros; Rua Gabriel Ribeiro; Av. Cabucu; Rua Pedro Tezin; Rua Vicente Luís Brito; Rua Lopes da Costa; Rua Tenente Sotomano; Rua Bacurizinho; Rua Mario Lago (Av. das Nações Unidas; Rua Custódio Serrão; Rua Paúva; Av. Embaixador Macedo Soares; Av. Ernesto Igel; Av. Queiroz Filho; Praça Cesar Washington A de Prouença; Praça Matauna; Rua Antonio Sarkis; Rua Camacam; Rua Cenzo Sbrighi; Rua Dr. Edgar T Santana; Av. Pres. Castelo Branco; Rua Fco. Corazza; Rua Luiz Gatti; Rua Pe. Penteado de Oliveira; Rua Policarpo da Cruz; Rua Majora Paladino; Rua Werner Siemens; Rua Zimion Leimer; Rua Cardoso de Almeida; Rua João Ramalho; Rua Alegrete; Rua Poconé; Rua Atalaia; Av. Paulo XI; Rua Cordilheiras; Praça Augusto Rusch; Rua Dr. Franco da Rocha; Rua Caluibi; Rua Duartina; Praça Joanópolis; Rua Jorge Americano; Rua Miron Whiteley; Rua Ministro de Godoi; Av. Sumaré; Rua Monte Alegre; Rua Vanderlei; Rua Pio XI; Av. Prof. Alfonso Bovero; Rua Saldanha da Gama; Rua Taboão; Rua Votuporanga; Rua Tibério; Rua Tremembé; Rua Frei Inácio Gau; Rua Macauba; Av. Dr. Paulo Vieira; Rua Cafelândia; Rua Apinajés; Rua Havai; Rua Artur Orlando; Rua Altamira do Paraná; Rua Camilo; Praça Weiszflog; Rua Canastra; Rua Adão Gonçalves; Rua Agamenon Magalhães; Rua Cerro Corá; Rua Costa Júnior; Av. Francisco Matarazzo; Rua Fábria; Rua Caio Graço; Rua Schilling; Rua Paulo Franco; Rua Sepatiba; Rua Ajuricaba; Rua Tito; Praça Cívica; Rua Luís Martins Rua Simão Caetano Nunes; Rua Gabriel Carozza Rua Bresser; Rua Pires do Rio; Largo São José do Belém; Rua Belém; Rua Cajuru; Rua Júlio de Castilhos; Rua Silva Jardim; Av. Celso Garcia; Rua Passos; Rua Mario Cássia; Praça Heitor Levi; Rua Prof. Sebastiana S Minhoto; R Avari; Rua Porto Alegre; Av. Presidente Castelo Branco; Av. Rangel Pestana; Av. Salim Farah Maluf; R Cel. Jose Teófilo Ramos; Largo São José do Maranhão; Rua do Oratório; Rua Guaimbé; Rua Joli; Rua Maria Marcolina; Rua Miller; Praça Visconde Sousa Fontes; R Vautier; Rua Vitor Hugo; Rua Hanneman; Rua Alexandrino Pedrosa; Rua Enta; Rua Rodrigues dos Santos; Rua João Teodoro; Rua Oriente; Rua Monsenhor Andrade; Rua Casemiro de Abreu; Rua Barão do Lendário; Rua Xavantes; Rua Cons. Belisário; Rua Paraiba; Praça República da Coreia; Ministro Firmino Whitaker; Rua Honório Maia; Rua Cesário Galeno; Rua Siqueira Bueno; Rua Silva Teles; Rua Padre Carlos da Silva; Praça Silvio Romero; Rua Coelho Lisboa. Rua Padre Adelino; Rua Amapá Grande; Rua João Teodoro) (Rua linguçu; Rua Dr. Bernardino Ribeiro; Rua Santo Henrique; Rua Nea; Rua Porto da Folha; Rua Cachoeira Paulista; Av. Cangaíba; Av. Alfredo Ribeiro de Castro; Rua Jacira Artacho; Rua Dona Maltide; Rua Eugénia de Carvalho; Rua Joaquim Marra; Av. Cd. de Frontin; Rua Almirante Falcão Viana; Praça Nossa Senhora da Penha; Rua Dr. João Ribeiro; Rua Equici; Av. Padre Olivetanos; Av. Penha de França; Rua Caquito; Rua Carlos Meira; Rua Padre João; Rua Henrique Souza de Queirós (Av. Dr. Sylvio de Campos; Rua Antônio Maia; Rua Mogeiro; Praça Vigarão João Gonçalves de Lima) (Rua Tabapuã; Rua Mario Ferraz; Rua Conceição de Monte Alegre; Rua Arizona; Rua Cerro Corá; Rua Ajuricaba; Rua Antônio Borba; Av. Arruda Botelho; Av. Nações Unidas; Av. 25 Queiroz Filho; Praça Apecatu; Rua Natingui; Rua Paulistânia; Rua Marinho Falcão; Praça Gastão Vidigal; Rua Teodoro Sampaio; Rua Mourato Coelho; Rua João Franco; Rua Clodomiro Amazonas; Rua Guarara; Rua Tapiratiba; Rua Florida; Rua Arandu; Rua Estados Unidos; Rua Ouro Branco; Rua Kansas; Rua Rosa Gaeta Lazara; Rua Medeiros de Albuquerque; Rua Henrique Moteiro; Rua Maria Carolina; Rua Bianchi Bertoldi; Alameda Campinas; Alameda França; Rua Harmonia; Rua Arthur de Azevedo; Rua Paulo G de Carvalho; Rua Ofélia; Rua Hungria; Rua Perequito; Av. Santo Amaro (Estrada e Taipas; Rua Philonilla Gonçalves dos Santos; Rua Tomás Ribeiro Colaço; Rua Galvão Bueno Trigueirinho; Rua Theofilo Azambuja; Rua Cecília Calovini; Estrada Turística do Jaraguá Av. General Ataliba Leonel; Rua Voluntários da Pátria; Rua Conselheiro Moreira de Barros; Rua Geroge Chaestian; Rua Estrela Altair; Rua Marrei Junior; Rua Henrique Braglia; Rua Inglesa; Rua Marechal Odílio Deny; Rua Padre Idelfonso; Rua Gabriel Prestes; Rua Conselheiro Saraiva) Av. Vereador José Diniz; Rua Marechal Deodoro; Av. Interlagos; Rua Barão do Rio Branco; Rua Amaro André; Rua Humboldt; Av. Pe. José Maria; Rua Isabel Schmidt; Rua Carlos Gomes; Rua Min José G R Alckmin; Rua da Paz; Rua Alberto Hodge; Rua Miranda Guerra; Av. Prof. Vicente Rao; Rua Vieira de Moraes; Rua Cristóvão Pereira; Rua Selma; Rua Visconde de Aguiar; Av. Washington Luís Av. Rodolfo Pirani; Rua Miguel Ferreira de Melo Rua Erva Andorinha; Rua Carlos Bibiena; Rua Erva de Santa Luzia; Rua Frei Fidelis Mota; Rua Maciel Viana; Rua Prof. Joaquim de Camargo; Rua Evangelina F Destro; Rua Rachid Aithi; Rua Arlindo Colaço; Praça Craveiro do Campo; Rua das Cactáceas; Rua José Oton Av. Sapopemba; Rua Augustin Luberti; Rua Castro Alves; Av. Dr. Paulo Colombo P Queiroz; Rua Vicente Franco Tolentino; Av. Egídio Martins; Av. Eng. Feijó Bittencourt; Rua Roland Rittmeister Av. Brig. Luís Antônio; Rua Santa Madalena; Av. Arno; Praça Alberto Lion; Av. Pres. Wilson; Av. Nove de Julho; Rua Rocha; Av. Rangel Pestana; Rua Dr. Bittencourt Rodrigues; Largo Padre Péricles; Elevado Pres. Arthur da Costa e Silva; Rua Antônio Prudente; Rua Tamandaré; Rua Siqueira Campos; Rua Benjamin Constant; Rua Quintino Bocaiuva; Rua Conde de Sarzedas; Rua Oscar Cintra Gordinho; Rua Conselheiro Crispiniano; Rua Frederico Alvarenga; Rua Lousada; Rua Glicério; Av. Radial Leste; Rua Galvão Bueno; Av. da Aclimação; Rua Urano; Av. Turmalina; Rua José Getúlio; Rua Esmeralda; Rua Safira; Rua Topázio Av. Cel. Dilermano Brisola; Av. Amadeu Poli; Praça Hugo Brandi; Rua Benedita Donerilas Claro; Rua Nilton Coelho de Andrade; Rua Severa; Av. Alberto Byington; Rua Orinduva; Rua Eurico Sodré; Av. Gustavo Adolfo; Rua Oscar Fernandes da Silva; Rua Serafim Poli; Rua Sara de Medeiros; Rua Nagasaki; Rua Kaneda; Av. Dr. Benedito Estevam dos Santos; Rua Andaraí; Rua Curuçá; Rua Diamantina; Rua Gavea; Rua Margarino Torres; Rua Prof. Maria José Barone Fernandes; Rua Dom Luis Felipe; Rua Eulício Sodré; Av. Gustavo Adolfo; Rua Francisco de Medeiros; Rua Sara de Medeiros; Rua José de Medeiros; Rua Roland Garros; Rua Antônio de Alencar; Rua Benficia; Rua Criciúma; Rua Edgar Ruzzant; Rua Francisco Alves Bezerra; Rua Francisco Peixoto Bizerra; Rua Santa Rita do Passo Quatro; Rua Tenente Sotomano; Rua Tosca Av. Pedro Álvares Cabral; Rua Abílio Soares; Av. Dr. Ricardo Jafet; Rua Vergueiro; Av. Moreira Guimarães; Rua Araguari; Rua Bertioga; Rua Caramuru; Rua Estado de Israel; Rua Osorio Duque Estrada; Rua Tutóia; Rua Correa Vasques; Rua Pedro de Toledo; Rua Dr. Diogo de Faria; Rua Botucatu; Rua Carlos Petit; Rua Manuel de Paiva; Rua das Rosas; Av. Jabaquara; Rua Otônias; Av. IV Centenário; Rua Comandante Ismael Guilherme; Rua Dom Henrique; Largo da Batalha; Rua Dr. Bacelar; Rua Ascendino Reis; Rua José de Magalhães; Rua Leandro Dupre; Rua Dr. Rafael de Barros; Rua Coronel Oscar Porto; Rua Visconde de Cachoeira Av. Brumado de Minas; Rua José Jeraissati; Rua Caetano Pimental do Vabo; Rua CB José Clemeneano de Carvalho; Av. Francisco Falzoni; Rua Joaquim M Dias; Av. Jacinto Menezes Palhares; Rua João Pedro Lecór; Av. José Nobrega Botelho; Rua Tamuanas; Av. Zelina

CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS

OBJETO DO GASTO	APROVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	REALIZADO	FONTES DOS RECURSOS
Construção de Ciclovias (1097)	R\$ 81.466.071,41	R\$ 17.400.000,40	R\$ 10.405.096,28	12,77 %	MOB 2023 e MOB 2025

CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS

OBJETO	APROVADO	VALOR LIQUIDADO
Ciclofaixa Aclimação	R\$ 221.238,72	R\$ 0
Ciclovía Atlântica/Olivia Guedes Penteado	R\$ 221.238,94	R\$ 0
Ciclovía Av. Atlântica	R\$ 221.238,94	R\$ 0
Ciclofaixa Av. Teotonio Vilela	R\$ 221.238,94	R\$ 0
Ciclofaixa Bosque da Saúde (Praça da Árvore)	R\$ 221.238,94	R\$ 0



CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS

OBJETO	APROVADO	VALOR LIQUIDADO
Ciclofaixa Carlos Pinto Alves	R\$ 221.238,94	R\$ 0
Ciclofaixa Interlagos Trecho 2	R\$ 221.238,94	R\$ 0
Ciclofaixa Emérico Richter – Mar Paulista	R\$ 221.238,94	R\$ 0
Ciclofaixa Estado de Israel	R\$ 221.238,94	R\$ 0
Ciclovía Estr. Ecoturística de Parelheiros	R\$ 221.238,94	R\$ 0
Calçada Estr. Engenheiro Marsilac	R\$ 221.238,94	R\$ 0
Calçada Estrada do Cipó	R\$ 221.238,94	R\$ 0
Ciclofaixa Fagundes Filho	R\$ 221.238,94	R\$ 0
Ciclorrota Fredrico Rene de Jaegher	R\$ 221.238,94	R\$ 0
Ciclofaixa Independência	R\$ 221.238,94	R\$ 0
Calçada Jaceguava	R\$ 221.238,94	R\$ 0
Ciclofaixa João de Luca-Cupeçê	R\$ 221.238,94	R\$ 0
Ciclofaixa José Queiroz Aranha	R\$ 221.238,94	R\$ 0
Ciclofaixa Lavapés	R\$ 221.238,94	R\$ 0
Ciclofaixa Leandro Dupret	R\$ 221.238,94	R\$ 0
Ciclofaixa Ligação Gonçalo Soares - Teotônio Vilela	R\$ 221.238,94	R\$ 0
Ciclofaixa Lino de Moraes	R\$ 221.238,94	R\$ 0

CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS

OBJETO	APROVADO	VALOR LIQUIDADO
Ciclofaixa Lins de Vasconcelos	R\$ 221.238,94	R\$ 0
Ciclofaixa Lourenço Cabreira - Manuel Alves Soares	R\$ 221.238,94	R\$ 0
Ciclofaixa Major Maragliano – Cel Lisboa	R\$ 221.238,94	R\$ 0
Ciclofaixa Muniz de Souza – Francisco Justino de Azevedo	R\$ 221.238,94	R\$ 0
Ciclofaixa Piratinis/Aratas	R\$ 221.238,94	R\$ 0
Ciclofaixa Quarto Centenário	R\$ 221.238,94	R\$ 0
Ciclofaixa Rua Ipiranga	R\$ 221.238,94	R\$ 0
Ciclofaixa República do Libano/Manoel da Nóbrega	R\$ 221.238,94	R\$ 0
Ciclofaixa São Paulo Expo – Terminal Jabaquara	R\$ 221.238,94	R\$ 0
Ciclofaixa Tamoios	R\$ 221.238,94	R\$ 0
Ciclofaixa Topázio	R\$ 221.238,94	R\$ 0
Ciclovía Turmalina	R\$ 221.238,94	R\$ 0
Ciclofaixa Abel Ferreira (entre Prof Sérgio Buarque de Hollanda e Montemagno)	R\$ 221.238,94	R\$ 0
Ciclofaixa Al 1 ° Sarg. Basílio Nogueira da Costa	R\$ 221.238,94	R\$ 0
Ciclofaixa Américo Brasiliense	R\$ 221.238,94	R\$ 0
Ciclofaixa Amparo – Pindamonhangaba – Francisco Mesquita	R\$ 221.238,94	R\$ 0
Ciclofaixa Antônio Alves Barril	R\$ 221.238,94	R\$ 0
Ciclofaixa Antônio de Macedo Soares/Al. Maracatins/Imarés	R\$ 221.238,94	R\$ 0
Ciclofaixa Araguari	R\$ 221.238,94	R\$ 0

CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS

OBJETO	APROVADO	VALOR LIQUIDADO
Ciclofaixa Aratãs – Anapurus	R\$ 221.238,94	R\$ 0
Ciclofaixa Augustin Luberti	R\$ 221.238,94	R\$ 0
Ciclofaixa Av. Ipiranga	R\$ 221.238,94	R\$ 0
Ciclofaixa Brasil	R\$ 221.238,94	R\$ 0
Ciclofaixa Butantã – Teodoro Sampaio	R\$ 221.238,94	R\$ 0
Ciclofaixa Camargo	R\$ 221.238,94	R\$ 0
Ciclofaixa Cancioneiro - Bela Vista - Est Borba Gato	R\$ 221.238,94	R\$ 0
Ciclofaixa Cantareira	R\$ 221.238,94	R\$ 0
Ciclofaixa Cap. Mor Pero de Gois - Av. Egídio Martins – Av. Francisco V. Bueno	R\$ 221.238,94	R\$ 0
Ciclofaixa Circular do Bosque	R\$ 221.238,94	R\$ 0
Ciclofaixa Cruzeiro do Sul	R\$ 221.238,94	R\$ 0
Ciclovía Darzan	R\$ 221.238,94	R\$ 0
Ciclovía Estado – Trecho II	R\$ 221.238,94	R\$ 0
Ciclofaixa Eugênio de Medeiros	R\$ 221.238,94	R\$ 0
Ciclofaixa Fazenda do Carmo	R\$ 221.238,94	R\$ 0
Ciclofaixa Fco Mesquita/São Raimundo	R\$ 221.238,94	R\$ 0
Ciclofaixa Francisco V. Bueno/Pça Frei Leandro do Sacramento	R\$ 221.238,94	R\$ 0

CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS

OBJETO	APROVADO	VALOR LIQUIDADO
Ciclofaixa Haroldo Veloso – Henrique Chamma	R\$ 221.238,94	R\$ 0
Ciclofaixa Itaquera – Lider	R\$ 221.238,94	R\$ 0
Ciclofaixa João Moura	R\$ 221.238,94	R\$ 0
Ciclofaixa João Teodoro	R\$ 221.238,94	R\$ 0
Ciclofaixa Ligação Consolação – Rebouças	R\$ 221.238,94	R\$ 0
Ciclofaixa Ligação Reboucinhas – Faria Lima	R\$ 221.238,94	R\$ 0
Ciclofaixa Manifesto/Tabor	R\$ 221.238,94	R\$ 0
Ciclofaixa Natingui-Corujas-Rosalvo-Nazaré Paulista	R\$ 221.238,94	R\$ 0
Ciclofaixa Padre Marchetti	R\$ 221.238,94	R\$ 0
Ciclofaixa Patriarca	R\$ 221.238,94	R\$ 0
Ciclofaixa Piauí	R\$ 221.238,94	R\$ 0
Ciclofaixa Presidente Wilson	R\$ 221.238,94	R\$ 0
Ciclofaixa Rua Capote Valente	R\$ 221.238,94	R\$ 0
Ciclofaixa Rua do Horto (até Parque Horto)	R\$ 221.238,94	R\$ 0
Ciclofaixa Romão Gomes	R\$ 221.238,94	R\$ 0
Ciclofaixa São Quirino	R\$ 221.238,94	R\$ 0
Ciclovía Sen. Queiroz	R\$ 221.238,94	R\$ 0

CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS

OBJETO	APROVADO	VALOR LIQUIDADO
Ciclofaixa Silva Bueno	R\$ 221.238,94	R\$ 0
Ciclofaixa Vicente Rao	R\$ 221.238,94	R\$ 0
Ciclovía Abraão Ribeiro Vd. Pacaembu – Av. Pacaembu	R\$ 221.238,94	R\$ 0
Ciclofaixa Águia de Haia	R\$ 221.238,94	R\$ 0
Ciclofaixa Anastácio	R\$ 221.238,94	R\$ 0
Ciclofaixa Arnolfo Azevedo	R\$ 221.238,94	R\$ 0
Ciclofaixa Av. dos Metalurgicos	R\$ 221.238,94	R\$ 0
Ciclofaixa Av. Dr. Sylvio de Campos	R\$ 221.238,94	R\$ 0
Ciclofaixa Av. Pompeia – Americo Jacomino – Estação Madalena do Metrô	R\$ 221.238,94	R\$ 0
Ciclofaixa Campanella	R\$ 221.238,94	R\$ 0
Ciclovía Cardeal Mota	R\$ 221.238,94	R\$ 0
Ciclofaixa Carlos Vicari – Rua Guaicurus – Melvin Jones	R\$ 221.238,94	R\$ 0
Ciclofaixa Carlos Weber	R\$ 221.238,94	R\$ 0
Ciclovía Comendador Feiz Zarzur	R\$ 221.238,94	R\$ 0
Ciclofaixa Curtume	R\$ 221.238,94	R\$ 0
Ciclofaixa Diogo Ortiz - Mercedes	R\$ 221.238,94	R\$ 0
Ciclofaixa Eduardo Prado	R\$ 221.238,94	R\$ 0
Ciclovía Eduardo Sabino	R\$ 221.238,94	R\$ 0

CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS

OBJETO	APROVADO	VALOR LIQUIDADO
Ciclofaixa Esperantina	R\$ 221.238,94	R\$ 0
Ciclovia Estrada de Perus	R\$ 221.238,94	R\$ 0
Ciclofaixa Gago Coutinho/ D.João V/John Harrison/R. Dronsfield/Martim Tenório/Cincinato Pamponet	R\$ 221.238,94	R\$ 0
Ciclofaixa João José de Queiroz – Severo- Aricá Mirim	R\$ 221.238,94	R\$ 0
Ciclofaixa João Tibiriçá – Barão de Itaúna - Belmonte	R\$ 221.238,94	R\$ 0
Ciclofaixa Joaquim Oliveira Freitas	R\$ 221.238,94	R\$ 0
Ciclofaixa Leopoldina	R\$ 221.238,94	R\$ 0
Ciclofaixa Maciel Monteiro	R\$ 221.238,94	R\$ 0
Ciclofaixa Major Otaviano – Cajuru – Herval – Rey Cajado - Catiguá	R\$ 221.238,94	R\$ 0
Ciclofaixa Nossa Sra. Do Ó	R\$ 221.238,94	R\$ 0
Ciclofaixa Novo Oriente do Piauí	R\$ 221.238,94	R\$ 0
Ciclofaixa Olavo Egídio de Souza Aranha	R\$ 221.238,94	R\$ 0
Ciclofaixa Pacheco e Silva	R\$ 221.238,94	R\$ 0
Ciclofaixa Padre Aníbal de Francia – Ademar Martins de Freitas	R\$ 221.238,94	R\$ 0
Ciclofaixa Raimundo Pereira de Magalhães	R\$ 221.238,94	R\$ 0
Ciclofaixa Rio Branco	R\$ 221.238,94	R\$ 0
Ciclofaixa Salomão de Vasconcelos	R\$ 221.238,94	R\$ 0
Ciclofaixa Santa Rita	R\$ 221.238,94	R\$ 0
Ciclofaixa Sumaré – Paulo VI (Alteração de Tipologia)	R\$ 221.238,94	R\$ 0
Ciclofaixa Turiassu	R\$ 221.238,94	R\$ 0

OBJETO	APROVADO	VALOR LIQUIDADO
Ciclovía, Ciclofaixa, Ciclorrota Cipriano Barata	R\$ 2.244.129,71	R\$ 0
Ciclovía, Ciclofaixa, Ciclorrota Antonio Carlos da Fonseca	R\$ 321.968,70	R\$ 0
Ciclovía, Ciclofaixa, Ciclorrota Dom Macario	R\$ 321.968,70	R\$ 0
Ciclovía, Ciclofaixa, Ciclorrota José dos Reis	R\$ 321.968,70	R\$ 0
Ciclovía, Ciclofaixa, Ciclorrota Viaduto Grande São Paulo	R\$ 2.244.129,65	R\$ 0
Ciclovía, Ciclofaixa, Ciclorrota Salvador Simões	R\$ 2.244.129,65	R\$ 0
Ciclovía, Ciclofaixa, Ciclorrota Manifesto	R\$ 2.244.129,65	R\$ 0
Ciclovía, Ciclofaixa, Ciclorrota Cisplatina	R\$ 2.244.129,65	R\$ 0
Ciclovía, Ciclofaixa, Ciclorrota Nossa Senhora da Saúde – Trecho II	R\$ 2.244.129,65	R\$ 0
Ciclovía, Ciclofaixa, Ciclorrota Amparo	R\$ 2.244.129,65	R\$ 0
Ciclovía, Ciclofaixa, Ciclorrota Bandeirantes	R\$ 2.244.129,65	R\$ 0
Ciclovía, Ciclofaixa, Ciclorrota Abraão de Moraes	R\$ 2.244.129,65	R\$ 0

OBJETO	APROVADO	VALOR LIQUIDADO
Ciclovía, Ciclofaixa, Ciclorrota Astarte	R\$ 321.968,70	R\$ 0,00
Ciclovía, Ciclofaixa, Ciclorrota Carlos de Campos	R\$ 321.968,70	R\$ 0,00
Ciclovía, Ciclofaixa, Ciclorrota Apucarana	R\$ 321.968,70	R\$ 0,00
Ciclovía, Ciclofaixa, Ciclorrota João Boemer	R\$ 321.968,70	R\$ 0,00
Ciclovía, Ciclofaixa, Ciclorrota Airton Pretini	R\$ 1.912.879,50	R\$ 0,00
Ciclovía, Ciclofaixa, Ciclorrota Aricanduva	R\$ 1.912.879,50	R\$ 0,00
Ciclovía, Ciclofaixa, Ciclorrota Adhemar Pereira de Barros	R\$ 1.912.879,50	R\$ 0,00
Ciclovía, Ciclofaixa, Ciclorrota Capitão Pacheco Chaves	R\$ 1.912.879,50	R\$ 3.506.174,97
Ciclovía, Ciclofaixa, Ciclorrota Ponte Tatuapé	R\$ 321.968,70	R\$ 0,00
Ciclovía, Ciclofaixa, Ciclorrota Ribeiro de Lima	R\$ 1.912.879,50	R\$ 0,00
Ciclovía, Ciclofaixa, Ciclorrota Estado	R\$ 1.912.879,50	R\$ 0,00
Ciclovía, Ciclofaixa, Ciclorrota Av. Salim Farah Maluf	R\$ 1.912.879,50	R\$ 6.895.065,46

CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS

OBJETO	APROVADO	VALOR LIQUIDADO
Ciclovía, Ciclofaixa, Ciclorrota Maria Cândida	R\$ 321.968,70	R\$ 0
Ciclovía, Ciclofaixa, Ciclorrota José Maria Fernandes	R\$ 321.968,70	R\$ 0
Ciclovía, Ciclofaixa, Ciclorrota Av. Guilherme	R\$ 321.968,70	R\$ 0
Ciclovía, Ciclofaixa, Ciclorrota Alberto Byington	R\$ 321.968,70	R\$ 0
Ciclovía, Ciclofaixa, Ciclorrota Amaro Felicíssimo da Silveira	R\$ 321.968,70	R\$ 0
Ciclovía, Ciclofaixa, Ciclorrota Jardim Japão	R\$ 321.968,70	R\$ 0
Ciclovía, Ciclofaixa, Ciclorrota Gueixas	R\$ 321.968,70	R\$ 0
Ciclovía, Ciclofaixa, Ciclorrota Maria José Barone Fernandes	R\$ 321.968,70	R\$ 0
Ciclovía, Ciclofaixa, Ciclorrota Conceição	R\$ 321.968,70	R\$ 0
Ciclovía, Ciclofaixa, Ciclorrota Roland Garros	R\$ 321.968,70	R\$ 0
Ciclovía, Ciclofaixa, Ciclorrota R. Camargo	R\$ 321.968,70	R\$ 0,00
Ciclovía, Ciclofaixa, Ciclorrota R. Gal. Asdrúbal da Cunha	R\$ 321.968,70	R\$ 0,00
Ciclovía, Ciclofaixa, Ciclorrota R. Adherbal Stresser	R\$ 321.968,70	R\$ 3.855,85
Ciclovía, Ciclofaixa, Ciclorrota R. Sapetuba	R\$ 321.968,70	R\$ 0,00
Ciclovía, Ciclofaixa, Ciclorrota Rua Waldemar Roberto	R\$ 321.968,70	R\$ 0,00
Ciclovía, Ciclofaixa, Ciclorrota Santa Marina	R\$ 321.968,70	R\$ 0,00

CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS

OBJETO	APROVADO	VALOR LIQUIDADO
Ciclovía, Ciclofaixa, Ciclorrota Queiroz Filho	R\$ 321.968,70	R\$ 0,00
Ciclovía, Ciclofaixa, Ciclorrota Imperatriz Leopoldina	R\$ 321.968,70	R\$ 0,00
Ciclovía, Ciclofaixa, Ciclorrota Major Paladino	R\$ 321.968,70	R\$ 0,00
Ciclovía, Ciclofaixa, Ciclorrota Gastão Vidigal - Mergenthaler	R\$ 321.968,70	R\$ 0,00
Ciclovía, Ciclofaixa, Ciclorrota Potsdam	R\$ 321.968,70	R\$ 0,00
Ciclovía, Ciclofaixa, Ciclorrota Viaduto da Lapa	R\$ 321.968,70	R\$ 0,00
Ciclovía, Ciclofaixa, Ciclorrota Dronsfield	R\$ 321.968,70	R\$ 0,00
Ciclovía, Ciclofaixa, Ciclorrota Guaipá	R\$ 321.968,70	R\$ 0,00
Ciclovía, Ciclofaixa, Ciclorrota Duarte de Azevedo	R\$ 321.968,70	R\$ 0,00
Ciclovía, Ciclofaixa, Ciclorrota Manuel Gaya	R\$ 321.968,70	R\$ 0,00
Ciclovía, Ciclofaixa, Ciclorrota Antonio Cesar Neto	R\$ 321.968,70	R\$ 0,00
Ciclovía, Ciclofaixa, Ciclorrota Benjamin Pereira	R\$ 321.968,70	R\$ 0,00
Ciclovía, Ciclofaixa, Ciclorrota Virgília Rodrigues Alves C. Pinto	R\$ 321.968,70	R\$ 0,00
Ciclovía, Ciclofaixa, Ciclorrota Santa Inês	R\$ 321.968,70	R\$ 0,00
Ciclovía, Ciclofaixa, Ciclorrota Av. Capitão José Parada Gonçalves	R\$ 321.968,70	R\$ 0,00
Ciclovía, Ciclofaixa, Ciclorrota Maria Amália Lopes de Azevedo	R\$ 321.968,70	R\$ 0,00

CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS

OBJETO	APROVADO	VALOR LIQUIDADO
Ciclovía, Ciclofaixa, Ciclorrota Forte do Leme	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0
Ciclovía, Ciclofaixa, Ciclorrota Av. Satélite/Cadência	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0
Ciclovía, Ciclofaixa, Ciclorrota André de Almeida	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0
Ciclovía, Ciclofaixa, Ciclorrota Av. Luis Pires de Minas	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0
Ciclovía, Ciclofaixa, Ciclorrota Augusto Antunes/Manoel dos Santos Braga	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0
Ciclovía, Ciclofaixa, Ciclorrota Riacho dos Machados	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0
Ciclovía, Ciclofaixa, Ciclorrota Av. Adriano Bertozzi	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0
Ciclovía, Ciclofaixa, Ciclorrota José Pinheiros Borges	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0
Ciclovía, Ciclofaixa, Ciclorrota Shinzaburo Mizutani	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0
Ciclovía, Ciclofaixa, Ciclorrota Serra de São Domingos	R\$ 1.000.000,00	R\$ 0

CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS



Ciclofaixa Asdrubal da Cunha



Ciclofaixa Adhemar Pereira de Barros



Ciclofaixa Adherbal Stresser

PPP COHAB



6020.2022/0038385-4;
6020.2022/0038488-5;

6020.2022/0038490-7;
6020.2022/0038491-5;

6020.2022/0038566-0;
6020.2022/0038571-7



CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS



Ciclofaixa Dom Macario



Ciclofaixa Maria Amalia



Ciclofaixa Virgilia Rodrigues

PPP COHAB



6020.2022/0038385-4;
6020.2022/0038488-5;

6020.2022/0038490-7;
6020.2022/0038491-5;

6020.2022/0038566-0;
6020.2022/0038571-7



CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS



Ciclofaixa Queiroz Filho



Ciclofaixa Asdrubal da Cunha



Ciclofaixa Dom Macario

PPP COHAB



6020.2022/0038385-4;
6020.2022/0038488-5;

6020.2022/0038490-7;
6020.2022/0038491-5;

6020.2022/0038566-0;
6020.2022/0038571-7



CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS



Ciclofaixa Queiroz Filho



Ciclofaixa Adhemar Pereira de Barros



Ciclofaixa Maria Amália

PPP COHAB



6020.2022/0038385-4;
6020.2022/0038488-5;

6020.2022/0038490-7;
6020.2022/0038491-5;

6020.2022/0038566-0;
6020.2022/0038571-7



CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS



Ciclofaixa Virgília Rodrigues

PPP COHAB



6020.2022/0038385-4;
6020.2022/0038488-5;

6020.2022/0038490-7;
6020.2022/0038491-5;

6020.2022/0038566-0;
6020.2022/0038571-7



IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES DE ÔNIBUS

OBJETO DO GASTO	APROVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	REALIZADO	FONTES DOS RECURSOS
Implantação de Corredores de Ônibus (1099)	R\$ 41.236.000,00	R\$ 12.002.000,00	R\$ 10.821.867,18	26,24%	MOB 2023 e MOB 2025

CORREDOR ITAQUERA-LÍDER



CORREDOR ITAQUERA – PARTE I:

Situação atual:

- Concluído: 07/2024
- % Execução: Trecho I - 100%

CORREDOR ITAQUERA – PARTE II:

Situação atual:

Elementos técnicos expropriatórios:

- Contrato nº 2022/0311-01-00 - 11/06/2022
- Processo: 5010.2022/0017022-5
- Concluído: 04/2023

Projetos básico, executivo e licenciamento ambiental:

- Contrato nº 2022/0185-01-00 - 22/07/2022
- Processo: 5010.2021/0010259-7
- Concluído: 03/2024

Obras:

- Previsão de início: 1º semestre de 2026
- % Execução: Trecho II - 0%

Número de beneficiados: 164.117 passageiros por dia

Valor aprovado:

R\$ 349.942,20

Valor liquidado:

R\$ 0

CORREDOR ITAQUERA-LÍDER (PARTE I)



PARADA E PRAÇA FRANCISCO
DANIEL LOPES



PARADA ALFREDO DE TOLEDO




PARADA ARICANDUVA



CRUZAMENTO - AV. ITAQUERA X
CÓRREGO GAMELINHA

Fotos Obras - Julho/2024

CORREDOR CELSO GARCIA

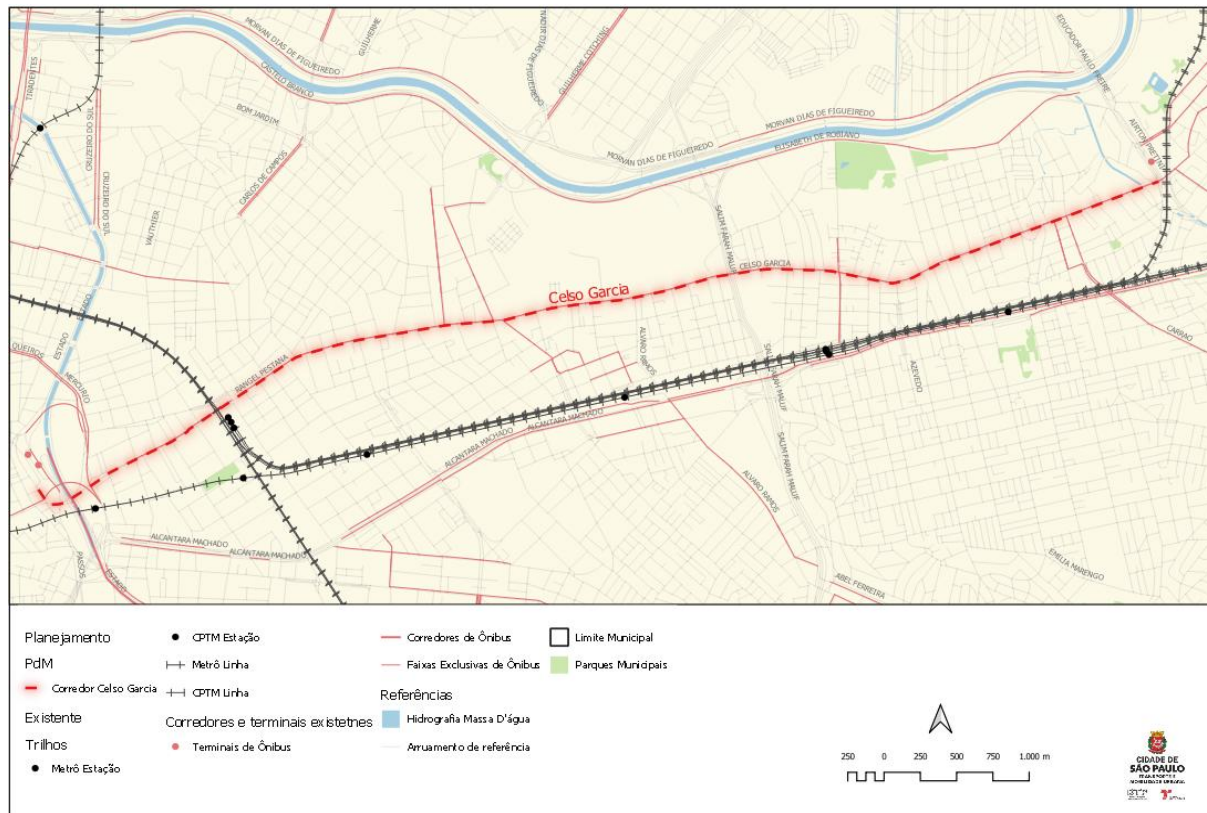

CORREDOR CELSO GARCIA:

Situação atual:

Projetos básico e executivo:

- Contrato nº 2021/0551-01-00 - 12/04/2022
- Processo: 5010.2021/0006795-3
- Concluído: 12/2023

Obras - Trecho 1:

- Contrato nº 2023/0461-01-00 - 06/11/2023
- Processo: 5010.2023/0018742-1
- Obra paralisa para adequações contratuais conforme plano de trabalho IPHAN. Fase de análise de recursos.
- % Execução: 24,83%

Supervisão Obras - Trecho 1:

- Contrato nº 2023/0484-01-00
- Processo: 5010.2023/0013653-3

Número de beneficiados: 131.101 passageiros por dia

Valor aprovado:

R\$ 29.600.000,00

Valor liquidado:

R\$ 4.362.469,97

CORREDOR CELSO GARCIA



Av. Rangel Pestana e Rua do Gasômetro

Fotos Obras - 1º Semestre/2025

CORREDOR MIGUEL YUNES



CORREDOR MIGUEL YUNES:

Situação atual:

Elementos técnicos expropriatórios:

- Contrato nº 2022/0238-01-00 - 04/05/2022
- Processo: 5010.2022/0003734-7
- Concluído: 06/2024

Projetos básico e executivo:

- Contrato nº 2022/0384-01-00 - 17/11/2022
- Processo: 5010.2022/0018820-5
- Concluído: 09/2024

Estudos ambientais e licenciamento:

- Contrato nº 2022/0639-01-00 - 29/03/2023
- Processo: 5010.2022/0016037-8
- Contrato suspenso - necessário readequações projetuais
- % Execução: 26,58%

Obras:

- Contrato nº 2024/0206-01-00. Sem ordem de serviço.
- Processo: 5010.2025/0001225-0
- Previsão de início: 2º semestre de 2025.

Número de beneficiados: 60.211 passageiros por dia

Valor aprovado:

R\$ 4.366.388,24

Valor liquidado:


R\$ 132.388,24

CORREDOR MIGUEL YUNES



Corredor Miguel Yunes - Projeto e Ortofoto - 1º Semestre/2024

CORREDOR NORTE-SUL

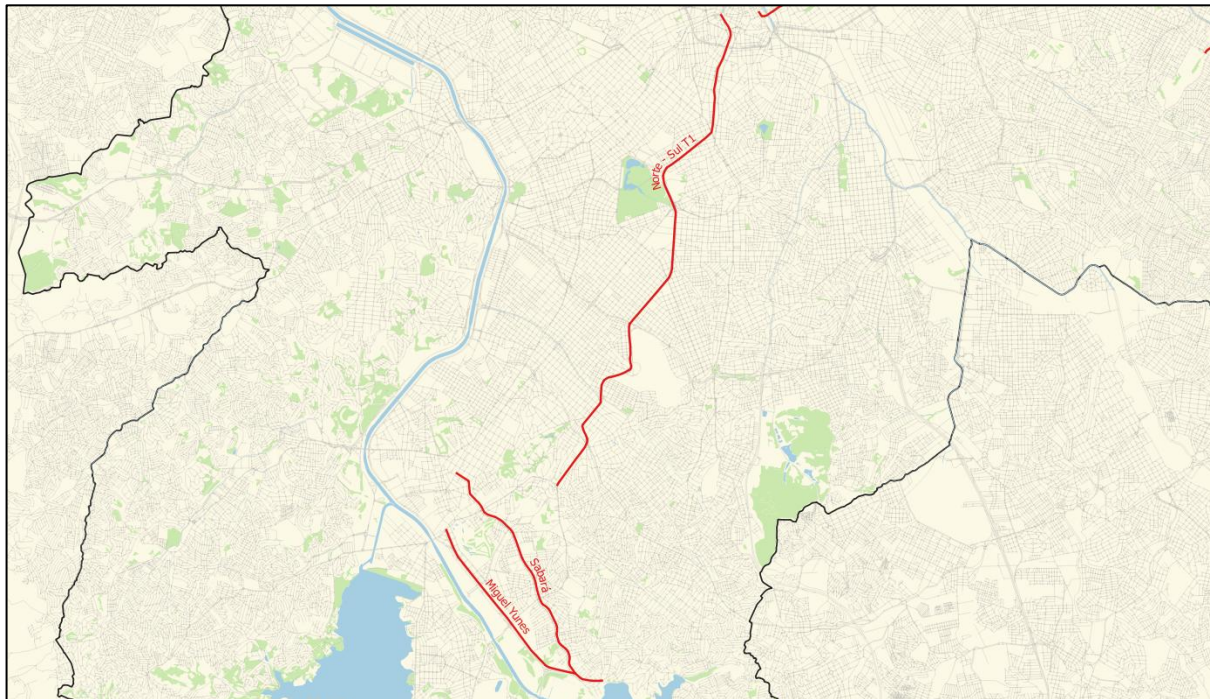

CORREDOR NORTE-SUL:

Situação atual:

Estudos ambientais e licenciamento:

- Contrato nº 2022/0639-01-00 – 29/03/2023
- Processo: 5010.2022/0016037-8
- Contrato suspenso - necessário readequações projetuais.
- % Execução: 26,58%

Projeto básico:

- Concluído: 2024

Projeto executivo e obras:

- Contrato Lote 1: nº 2023/0675-01-00 – 03/06/2024
- Processo: 5010.2024/0009168-0
- Contrato Lote 2: nº 2023/0675-02-00 – 25/06/2024
- Processo: 5010.2024/0009141-8

Supervisão de obras:

- Contrato Lote 1: nº 2024/0204-01-00 – 24/09/2024
- Processo: 5010.2024/0016927-1
- Contrato Lote 2: nº 2024/0204-02-00 – 24/09/2024
- Processo: 5010.2024/0016934-4

Número de beneficiados: 338.069 passageiros por dia.


Valor aprovado:

R\$ 6.919.669,56

Valor liquidado:

R\$ 6.327.008,97

CORREDOR NORTE-SUL

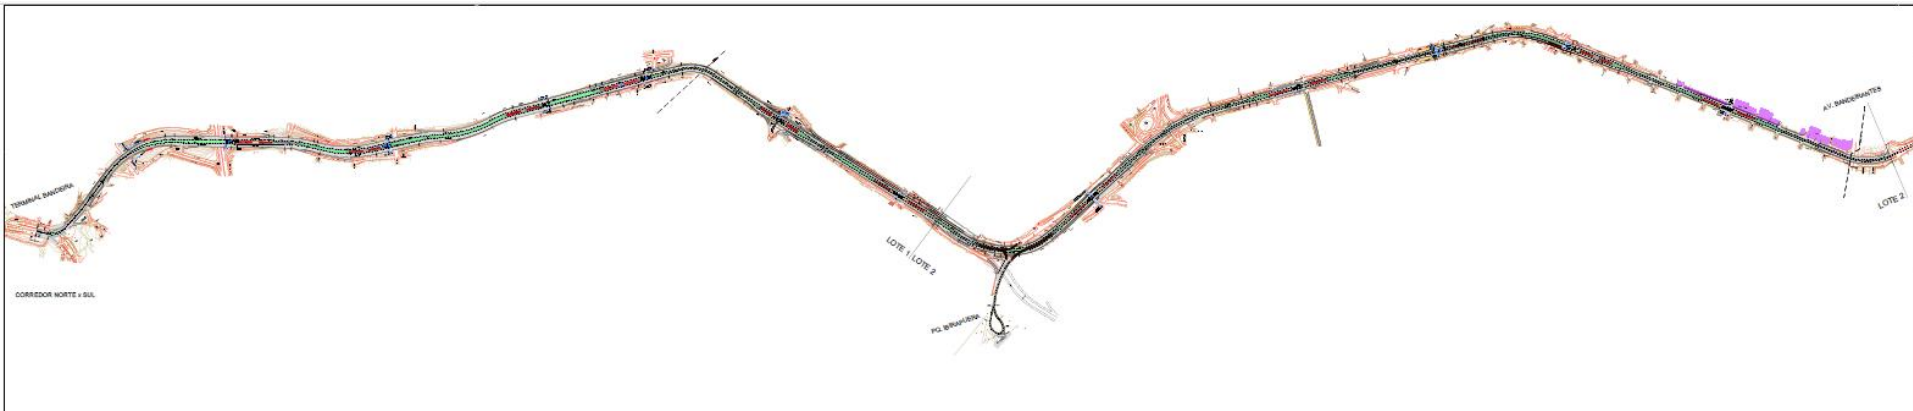


Corredor Norte-Sul - Lotes 1 e 2 - Projeto - 1º semestre/2024

IMPLANTAÇÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO HIDROVIÁRIO

OBJETO DO GASTO	APROVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	REALIZADO	FONTES DOS RECURSOS
Implantação de Transporte Público Hidroviário (5362)	R\$ 10.987.156,50	R\$ 10.987.156,50	R\$ 5.982.000,50	54,45%	MOB 2025

IMPLANTAÇÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO HIDROVIÁRIO

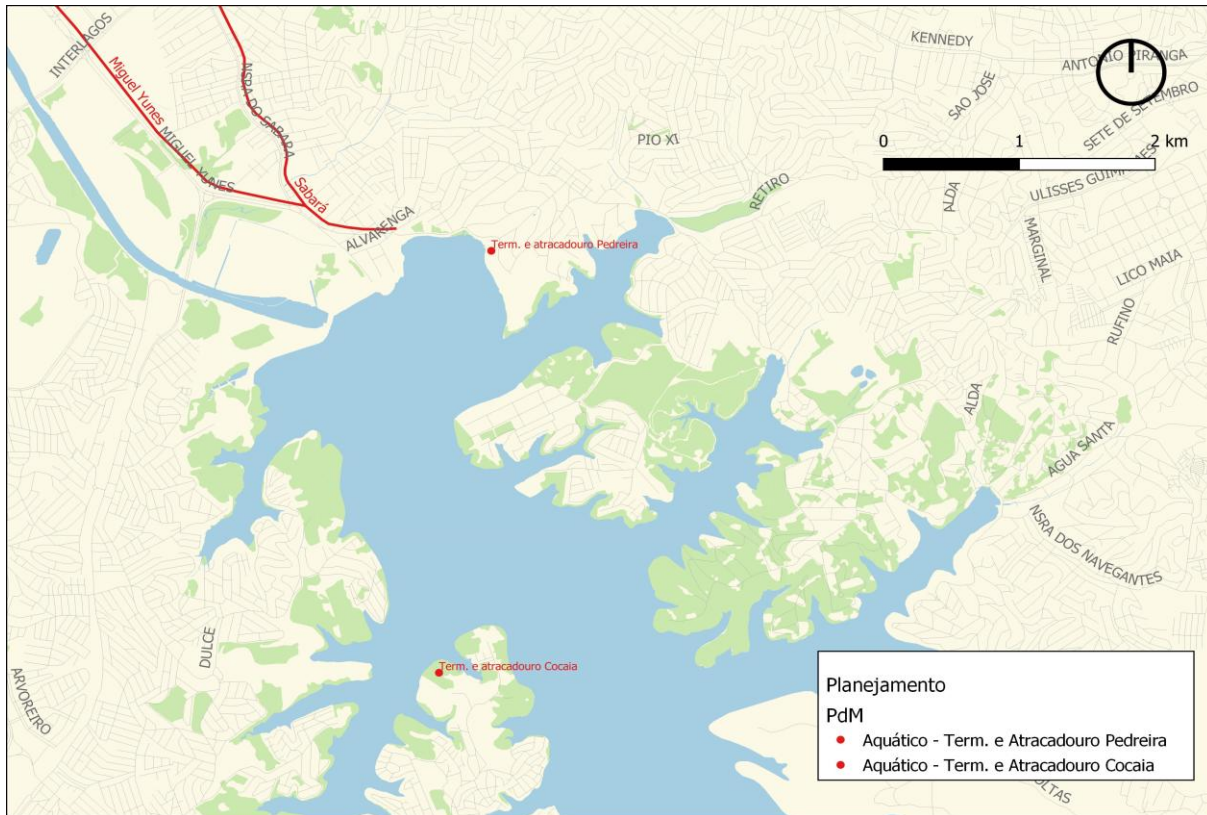

TRANSPORTE PÚBLICO HIDROVIÁRIO

Elementos Técnicos Expropriatórios - Terminal / Atracadouro Cocaia:

- Contrato nº 2022/0438-01-00 - 12/08/2022
- Processo: 5010.2022/0010925-9
- Concluído: 07/2023

Elementos Técnicos Expropriatórios – Terminal / Atracadouro Pedreira:

- Contrato nº 2022/0515-01-00 - 28/09/2022
- Processo: 5010.2022/0012715-0
- Concluído: 07/2023

Estudos ambientais, projeto funcional e básico dos terminais, atracadouros e viários de acessos:

- Contrato nº 2022/0502-01-00 - 11/01/2023
- Processo: 5010.2022/0013125-4
- Concluído: 08/2025

Levantamento Batimétrico:

- Contrato nº 2023/0009-01-00 - 29/03/2023
- Processo: 5010.2022/0019046-3
- Concluído: 10/2023

Desapropriações - Terminal / Atracadouro Pedreira:
% Execução: Imissão na posse - 63,64%

Número de beneficiados: 2,5 mil passageiros por dia

Valor aprovado:


R\$ 10.987.156,50

Valor liquidado:

R\$ 5.982.000,50



IMPLANTAÇÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO HIDROVIÁRIO

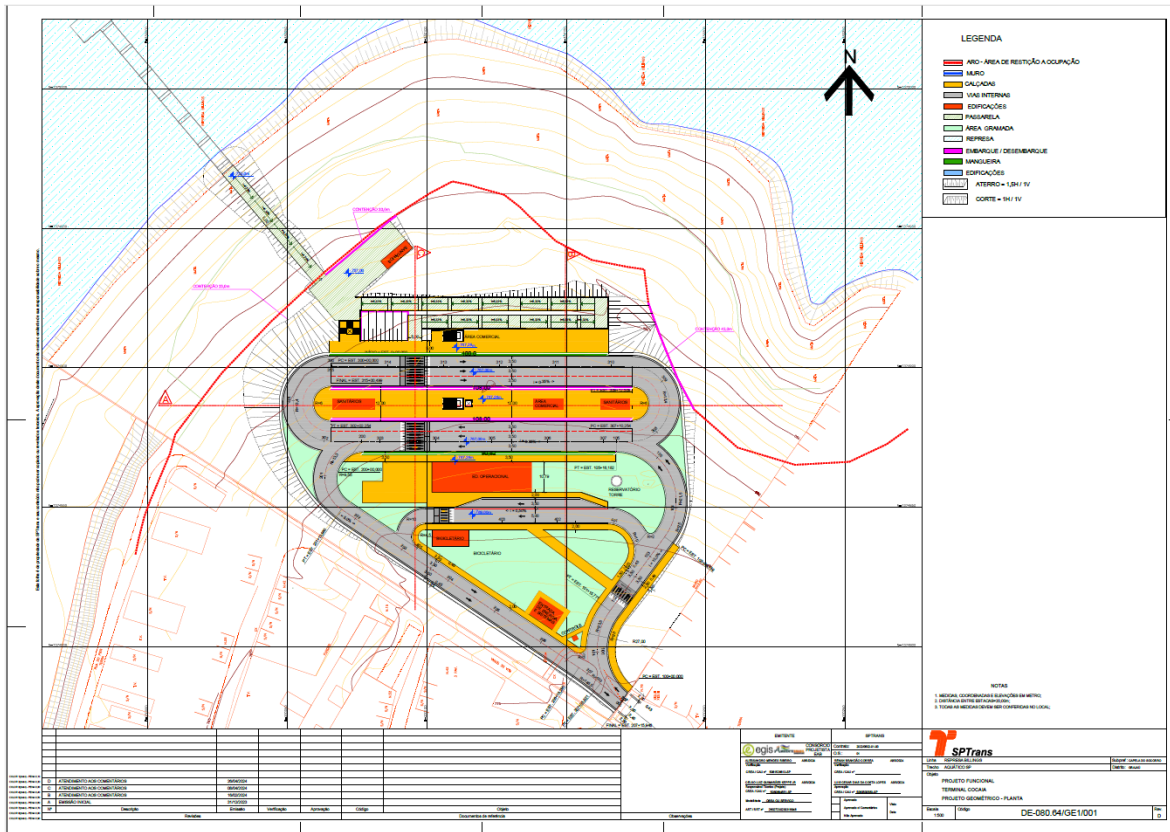

Terminal Cocaia - Projeto Funcional - 1º semestre 2024

VIDA SEGURA

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E TRANSPORTE




Diligências de imissão na
posse dos imóveis -
Terminal Pedreira (Rua
do Mar Paulista).

CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS DE ÔNIBUS

OBJETO DO GASTO	APROVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	REALIZADO	FONTES DOS RECURSOS
Construção de Terminais de Ônibus (1095)	R\$ 26.017.148,50	R\$ 25.946.306,46	R\$ 6.734.191,94	25,88%	MOB 2025

TERMINAIS JARDIM MIRIAM E SÃO MATEUS

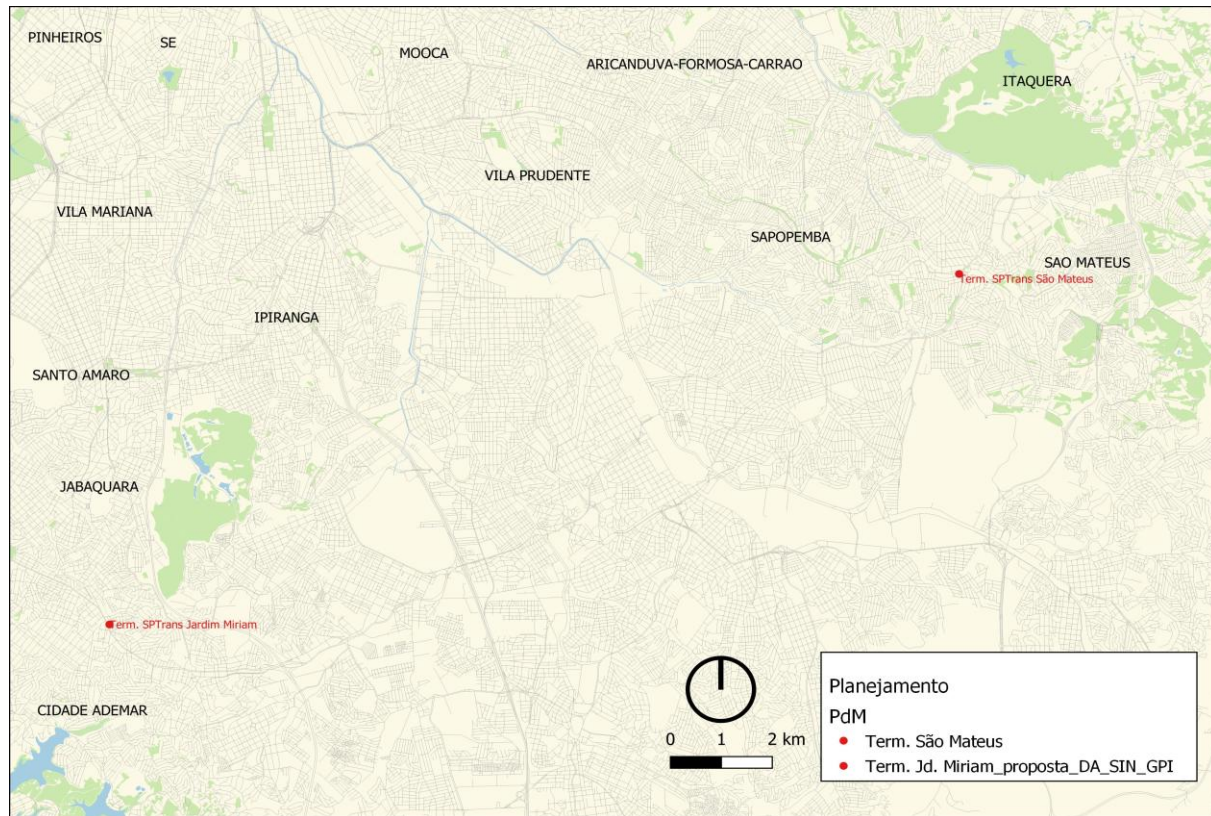

TERMINAL JARDIM MIRIAM:

Situação atual:

Procedimento licitatório para contratação do projeto funcional, projeto básico e elaboração de estudos ambientais e territoriais:

- Edital Licitação nº 023/2022 - 01/09/2022
- Cancelado – alteração da DUP

Estudos e projetos de realocação, contrato geral de gerenciamento e compatibilização de projetos:

- Contrato nº 2022/0156-01-00 – 17/09/2022
- Processo: 5010.2021/0012778-6
- Tratativas para definição do local da implantação / avaliação de necessidade.

Valor aprovado:

R\$ 603.683,00

Valor liquidado:

R\$ 0

TERMINAL SÃO MATEUS:

Situação atual:

Projetos básico, executivo e elaboração de estudos ambientais e territoriais:

- Contrato nº 2022/0329-01-00 - 06/10/2022
- Processo: 5010.2022/0016359-8
- Concluído: 02/2024

Demolição das áreas desapropriadas:

- Contrato nº 2024/0402-01-00 - 10/01/2025
- Processo: 5010.2024/0023816-8
- % Execução: Imóveis Expropriados - 97,80%
- Serviços de demolição: 59,94%

Valor aprovado:

R\$ 25.413.465,50

Valor liquidado:

R\$ 6.734.191,94



VIDA SEGURA

PREFEITURA DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E TRANSPORTE

TERMINAL SÃO MATEUS



Serviços de demolição - Setembro/2025

TERMINAL SÃO MATEUS




Diligências de imissão na posse - Outubro/2025

REQUALIFICAÇÃO DO PAVIMENTO DE PARADAS DE ÔNIBUS

OBJETO DO GASTO	APROVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	REALIZADO	FONTES DOS RECURSOS
Requalificação do Pavimento de Paradas de Ônibus (5394)	R\$ 6.892.000,00	R\$ 6.891.000,00	R\$ 5.489.196,11	79,64%	MOB 2025

REQUALIFICAÇÃO DO PAVIMENTO DE PARADAS DE ÔNIBUS

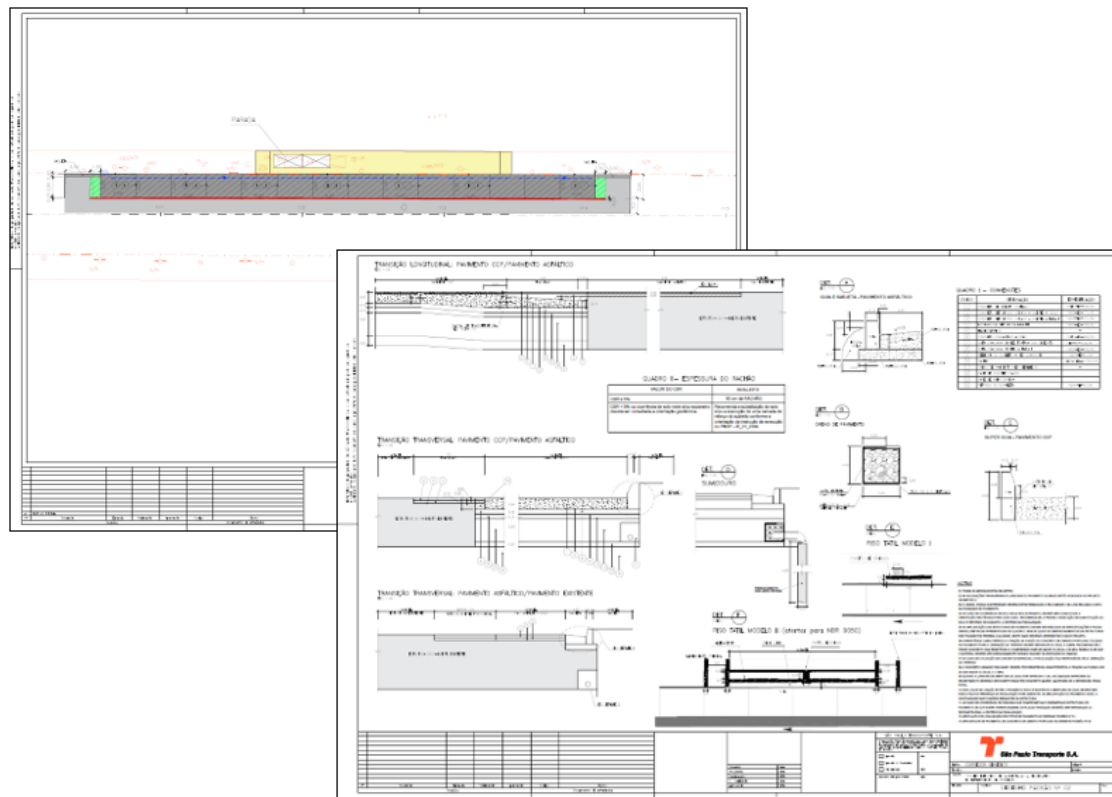

REQUALIFICAÇÃO DO PAVIMENTO DE PARADAS DE ÔNIBUS

Situação atual:

Paradas - Projetos e obras:

- Contrato nº 2022/0350-01-00
- Processo: 5010.2022/0017023-3
- Concluído: 2025

Paradas - Av. Nossa Sra. do Sabará:

- Contrato nº 2023/0432-01-00
- Processo: 5010.2023/0019807-5
- Concluído: 2025

Adequação - Parada 14 BIS

- Contrato nº 2024/0255-01-00
- Processo: 5010.2024/0014189-0
- Situação: Regularização da entrada de energia (Enel) concluída / Fase de testes e montagem do elevador.
- % Execução: 77,59%

Medição final em avaliação - Entrega de projeto (As Built)

Valor aprovado:
R\$ 6.892.000,00

Valor liquidado:
R\$ 5.489.196,11

REQUALIFICAÇÃO DO PAVIMENTO DE PARADAS DE ÔNIBUS

NOME DA INFRAESTRUTURA

VALOR LIQUIDADO

Requalificação de corredores e viários de ônibus. Requalificação do Pavimento de Paradas de Ônibus: Av. Rio das Pedras [MOB]	R\$ 106.356,16
Requalificação de corredores e viários de ônibus. Requalificação do Pavimento de Paradas de Ônibus: Av. Mateo Bei [MOB]	R\$ 204.271,86
Requalificação de corredores e viários de ônibus. Requalificação do Pavimento de Paradas de Ônibus: Av. Marechal Tito [MOB]	R\$ 429.906,61
Requalificação de corredores e viários de ônibus. Requalificação do Pavimento de Paradas de Ônibus: Av. Corifeu de Azevedo Marques [MOB]	R\$ 3.062.309,85
Requalificação de corredores e viários de ônibus. Requalificação do Pavimento de Paradas de Ônibus: Av. Vital Brasil [MOB]	R\$ 0,00
Requalificação de corredores e viários de ônibus. Requalificação do Pavimento de Paradas de Ônibus: Av. Dep. Emílio Carlos [MOB]	R\$ 139.081,11
Requalificação de corredores e viários de ônibus. Requalificação do Pavimento de Paradas de Ônibus: Av. Nossa Sra. Do Sabará [MOB]	R\$ 123.007,82
Requalificação de corredores e viários de ônibus. Requalificação do Pavimento de Paradas de Ônibus: Parada 14 Bis [MOB]	R\$ 1.424.262,70
TOTAL	R\$ 5.489.196,11

REQUALIFICAÇÃO DO PAVIMENTO DE PARADAS DE ÔNIBUS



Av. Rio das Pedras - 2025. Em operação.



Av. Mateo Bei - 2025. Em operação.



Av. Marechal Tito - 2025. Em operação.

REQUALIFICAÇÃO DO PAVIMENTO DE PARADAS DE ÔNIBUS



Av. Corifeu de Azevedo Marques - 2025. Em operação.



Av. Vital Brasil - 2025. Em operação.

REQUALIFICAÇÃO DO PAVIMENTO DE PARADAS DE ÔNIBUS



Av. Dep. Emílio Carlos - 2025. Em operação.



Av. Nossa Senhora do Sabará - 2025. Em operação.

REQUALIFICAÇÃO DO PAVIMENTO DE PARADAS DE ÔNIBUS

Parada 14 BIS



Foto 01 - Caixa de Medição tipo H



Foto 02 - Caixa de Medição tipo H



Foto 03 - Caixa de Medição tipo H



Foto 04 - Caixa de Medição tipo H



Foto 05 - Caixa de Medição tipo H



Foto 06 - Caixa de Medição tipo H

Quadros de distribuição - 2025



Foto 01 - Sinalização



Foto 02 - Sinalização



Foto 03 - Sinalização



Foto 04 - Sinalização



Foto 05 - Sinalização

Sinalização visual - 2025



Foto 01 - Câmeras



Foto 02 - Câmeras



Foto 03 - Câmeras



Foto 04 - Câmeras



Foto 05 - Câmeras



Foto 06 - Câmeras

Câmeras de segurança - 2025

DOTAÇÕES A MANTER

OBJETO DO GASTO	APROVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	REALIZADO	FONTES DOS RECURSOS
Ampliação, Reforma e Requalificação de Corredores de Ônibus 98.20.26.453.3009.1.100.44905100.08	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	MOB 2025
Implantação de Faixas Exclusivas de Ônibus 98.20.26.453.3009.5.391.44905100.08	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	MOB 2025
Ampliação, Reforma e Requalificação de Ciclovias, Ciclofaixas e Ciclorrotas 98.20.26.453.3009.1.098.44905100.08	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	MOB 2025
Intervenções no Sistema Viário 98.20.15.451.3009.5.100.44905100.08	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	MOB 2025
TOTAL	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%	



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**

**SECRETARIA
DE MOBILIDADE
URBANA E TRANSPORTE**
