CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL

Dados Gerais

Nome da Unidade:	EMEF HENRIQUE MELEGA, PROF		
Sequencial (U.E):	14	**Código da Unidade:**	95443

Endereço da Escola

Logradouro, número e complemento (se houver)	R. Chiquinha Gonzaga, 349 - Vila Primavera, São Paulo - SP, 03389-050

Descrição do Imóvel

Tipo de Construção (técnica construtiva predominante)	Alvenaria estrutural	Padrão:	12. EMEF PADRAO 072 12 SALAS	Nº de Pavimentos	3

Implantação

Área do Terreno (m²)	2.800,00			Área Edificada/ Construída (m²)	2.960,32
Área Pavimentada (m²)	2.500,00			Área Verde / Permeável (m²)	300,00
Área da projeção do(s) edifício(s) (m²)	1.250,00	Bloco salas	801,15	Quadra	448,85

Abastecimento

Água							
Forma de abastecimento (rede pública, poço artesiano, sem abastecimento etc.):	Rede pública, constatação visual						
Quantidade de reservatório de água	2						
Capacidade por reservatório (L)	10000	Constatação		Inf. Resp.	Projeto	PARCIAL	
Gás							
Encanado (Sim ou Não)	NÃO	Botijão de Gás (Sim ou Não)		SIM	Quantidade de Botijões de Gás	4	
Energia Elétrica							
Aparelho Ar condicionado (Sim ou Não)	SIM				Quantidade:	4	
Possui fonte de energia complementar (Sim ou Não)?	NÃO				Qual (por ex. Painel Solar ou outro)?	0	
Possui Gerador de Energia? (Sim ou Não)?	NÃO				Capacidade:	0	
Esgoto							
Rede Pública (Sim ou Não)	NÃO				Fossa Séptica (Sim ou Não)	NÃO	
Caixa de Gordura (Sim ou Não)	SIM				Caixa de Passagem (Sim ou Não)	SIM	

Informações sobre Prevenção de Incêndios (AVCB e SPDA)

Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro (Sim ou Não)	NÃO	Nº	N/A						
Extintor	SIM		10						
Hidrante	SIM		6						
Sinalização Emergência	SIM		20						
Iluminação Emergência	SIM		26						
Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) (Sim ou Não)	PARCIAL	Nº	Total (Sim ou N	PARCIAL	Parcial (Sim ou Não)	PARCIAL			

Acessibilidade

Elevador (Sim ou Não)	NÃO				Quantidade:	0	Quant. Ativos/Funcionais:	0
Plataforma Elevatória (Sim ou Não)	NÃO				Quantidade:	0	Quant. Ativos/Funcionais:	0
Rampa de Acesso a Unidade (Sim ou Não)	PARCIAL				Rampa de Acesso a outros espaços necessários (Sim ou Não)			NÃO
Tipo de sinalização	PARCIAL	Sonora (Sim ou Não)	SIM		Visual (Sim ou Não)	SIM	Tátil (Sim ou Não)	NÃO
Selo de Acessibilidade (Sim ou Não)	NÃO			Nº				
Vaga de estacionamento para deficientes (Sim ou Não)	NÃO				Quantidade:	0		

CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL

Ambientes da Escola

Administrativo e Apoio/Serviços

Ambiente	Comprimento (m)	Largura (m)	Pé Direito (m)	Área (m²)	Tipo de Construção	Revestimento de Piso	Revestimento de Parede	Possui Forro? Se sim, qual tipo?	Nível de Comprometimento do Ambiente	Observações
Sala dos Professores	5,36	4,84	3,44	25,94	Alvenaria Estrutural	Paviflex	Pintura	Laje	**0**	
Copa Professores	2,60	2,15	2,90	5,59	Alvenaria Estrutural	Paviflex	Azulejo	Laje	**0**	
Depósito Professores	2,15	2,05	2,90	4,41	Alvenaria Estrutural	Paviflex	Pintura	Laje	**0**	
Secretaria	4,00	4,00	3,15	16,00	Alvenaria Estrutural	Paviflex	Pintura	Laje	**0**	
Secretaria 2	4,00	2,15	3,15	8,60	Alvenaria Estrutural	Paviflex	Pintura	Laje	**3**	Desplacamento na parede. Foto: 18
Direção	4,18	4,07	3,15	17,01	Alvenaria Estrutural	Paviflex	Pintura	Laje	**0**	
Coordenação Pedagógica	4,12	4,00	3,15	16,48	Alvenaria Estrutural	Paviflex	Pintura	Laje	**0**	
Material Didático	4,00	1,90	3,15	7,60	Alvenaria Estrutural	Cerâmico	Pintura	Laje	**0**	
Assistente de Direção	4,18	3,90	3,15	16,30	Alvenaria Estrutural	Paviflex	Pintura	Laje	**0**	
Hall de Entrada	3,80	2,55	3,46	9,03	Alvenaria Estrutural	Paviflex	Pintura	Laje	**0**	
Almoxarifado	5,80	1,90	3,12	15,89	Alvenaria Estrutural	Granilite	Pintura	Laje	**2**	Mancha na parede. Foto: 39
Copa Funcionários	4,10	4,00	3,15	16,40	Alvenaria Estrutural	Paviflex	Pintura	Laje	**0**	
Refeitório	25,10	8,20	3,15	215,61	Alvenaria Estrutural	Granilite	Pintura	Laje	**3**	Fissura no piso. Foto: 46
Cozinha	5,90	4,80	3,17	28,32	Alvenaria Estrutural	Cerâmico	Azulejo	Laje	**0**	
Despensa	6,40	2,15	3,17	13,76	Alvenaria Estrutural	Cerâmico	Azulejo	Laje	**3**	Descamação no forro, quebra do azulejo. Foto: 56
Copa Funcionários	4,05	2,10	3,17	8,51	Alvenaria Estrutural	Granilite	Azulejo	Laje	**0**	
DML	4,05	2,80	3,17	11,34	Alvenaria Estrutural	Granilite	Pintura	Laje	**0**	
Grêmio Estudantil	4,05	2,95	3,17	11,95	Alvenaria Estrutural	Laminado	Pintura	Laje	**0**	
Depósito Educação Física	5,80	4,30	3,17	16,60	Alvenaria Estrutural	Cerâmico	Pintura	Laje	**0**	
Circulação Administração - Térreo	12,00	1,87	3,15	22,44	Alvenaria Estrutural	Granilite	Pintura	Laje	**0**	
Circulação Serviço - Térreo	6,00	1,00	3,17	6,00	Alvenaria Estrutural	Granilite	Pintura	Laje	**0**	
Escada 1º pav	5,80	4,00	3,45	23,20	Alvenaria Estrutural	Granilite	Pintura	Laje	**0**	
Sala de Leitura	8,20	8,15	3,35	66,83	Alvenaria Estrutural	Granilite	Pintura	Laje	**3**	Trinca na parede e piso. Foto: 83, 84
Depósito Sala de Leitura - 1° Pavimento	2,40	1,24	3,20	2,98	Alvenaria Estrutural	Granilite	Pintura	Laje	**0**	
Circulação - 1° Pavimento	43,50	2,10	3,20	91,35	Alvenaria Estrutural	Granilite	Pintura	Laje	**3**	Janela quebrada, fissura no forro, parede e piso. Foto: 89, 90, 91

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL										
Depósito de Livros	6,10	2,05	3,15	12,51	Alvenaria Estrutural	Cerâmico	Pintura	Laje	**0**	
Escada 2º pav	5,80	4,00	3,45	23,20	Alvenaria Estrutural	Granilite	Pintura	Laje	**0**	
Laboratório de Informática - 2° Pavimento	8,22	8,10	3,28	66,58	Alvenaria Estrutural	Granilite	Pintura	Laje	**3**	Infiltração e descamação. Foto: 106 ao 109
Depósito Informática - 2° Pavimento	2,40	1,24	2,95	2,98	Alvenaria Estrutural	Granilite	Pintura	Laje	**3**	Infiltração. Foto: 116
Circulação - 2° Pavimento	43,50	2,05	3,20	89,18	Alvenaria Estrutural	Granilite	Pintura	Laje	**3**	Infiltração e descamação. Foto: 120
Área Externa Lateral	52,20	4,90	0,00	255,78	Alvenaria Estrutural	Cimentado	Pintura	-	**0**	
Corredor Serviço - Externo	11,25	2,00	0,00	22,50	Alvenaria Estrutural	Cimentado	Pintura	-	**0**	
Pátio Externo	35,30	9,60	0,00	275,02	Alvenaria Estrutural	Cimentado	Pintura	-	**0**	
Quadra Coberta	23,50	19,10	7,00	448,85	Alvenaria Estrutural	Cimentado	Pintura	-	**0**	
Playground	23,95	10,70	0,00	180,00	Alvenaria Estrutural	Cimentado	Pintura	-	**0**	

CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL

CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL

Salas de Aula

Ambiente	Comprimento (m)	Largura (m)	Pé Direito (m)	Área (m²)	Tipo de Construção	Revestimento de Piso	Revestimento de Parede	Possui Forro? Se sim, qual tipo?	Nível de Comprometimento do Ambiente	Observações
Sala de Aula 01	8,28	6,00	3,12	49,68	Alvenaria Estrutural	Granilite	Pintura	Laje	**0**	
Sala de Aula 02	8,23	6,00	3,12	49,38	Alvenaria Estrutural	Granilite	Pintura	Laje	**0**	
Sala de Aula 03	8,23	6,00	3,12	49,38	Alvenaria Estrutural	Granilite	Pintura	Laje	**3**	Descamação na pintura. Foto: 93
Sala de Aula 04	8,28	6,00	3,12	49,68	Alvenaria Estrutural	Granilite	Pintura	Laje	**0**	
Sala de Aula 05	8,23	6,00	3,12	49,38	Alvenaria Estrutural	Granilite	Pintura	Laje	**0**	
Sala de Aula 06	8,30	6,00	3,12	49,80	Alvenaria Estrutural	Granilite	Pintura	Laje	**0**	
Sala de Aula 07 - Artes	8,25	6,00	3,12	49,50	Alvenaria Estrutural	Granilite	Pintura	Laje	**3**	Fissura no piso. Foto: 119
Sala de Aula 08	8,25	6,00	3,12	49,50	Alvenaria Estrutural	Granilite	Pintura	Laje	**0**	
Sala de Aula 09	8,25	6,00	3,12	49,50	Alvenaria Estrutural	Granilite	Pintura	Laje	**3**	Descamação. Foto: 125
Sala de Aula 10	8,25	6,00	3,12	49,50	Alvenaria Estrutural	Granilite	Pintura	Laje	**3**	Janela quebrada. Foto: 127
Sala de Aula 11	8,25	6,00	3,12	49,50	Alvenaria Estrutural	Granilite	Pintura	Laje	**3**	Infiltração e descamação. Foto: 129
Sala de Aula 12 - PAP	8,30	6,00	3,12	49,80	Alvenaria Estrutural	Granilite	Pintura	Laje	**0**	

Sanitários

Ambiente	Comprimento (m)	Largura (m)	Pé Direito (m)	Área (m²)	Revestimento de Piso	Revestimento de Parede	Possui Forro? Se sim, qual tipo?	Observações	Nível de Comprometimento do Ambiente	**Informações Complementares** Quant. Vasos Sanitários	Quant. Cubas e trocadores	Quant. Chuveiros
Banheiro Masculino	4,18	1,95	3,15	4,97	Cerâmico	Azulejo	Laje		**0**	1	1	0
Banheiro Feminino	4,18	3,10	3,15	11,69	Cerâmico	Azulejo	Laje		**0**	2	2	0
Banheiro Masculino Alunos	4,10	3,90	3,15	15,99	Cerâmico	Azulejo	Laje		**0**	3	3	0
Banheiro Feminino Alunos	4,10	3,90	3,15	15,99	Cerâmico	Azulejo	Laje	Sem maçaneta. Foto: 49	**3**	4	5	0
Banheiro Biblioteca	2,40	1,24	3,20	2,98	Cerâmico	Azulejo	Laje		**0**	1	1	0
Banheiro Sala de Informática	2,40	1,24	2,95	2,98	Granilite	Azulejo	Laje	Infiltração e descamação. Foto: 113	**3**	1	1	0
Banheiro PCD	6,10	2,05	3,15	12,51	Cerâmico	Azulejo	Laje		**0**	1	1	1

Informações Adicionais

Ambiente	Necessário adequar ou implantar? (SIM / NÃO / NÃO SE APLICA)	Informações Complementares							Observações
Fechamento do lote (muro, cerca, gradil, vegetação)	SIM	Muro		Área (m²)	576,00	Gradil	Área (m²)	288,00	Pintura do muro e das grades
Estacionamento(s)	SIM	Área (m²)		590,40					Demarcação de vagas com acessibilidade segundo a NBR 9050
Playground (Sim ou Não)	NÃO	Área (m²)		180,00					
Tanque de Areia (Sim ou Não)	NÃO	Área Cúbica (m³)		0,00					
Calçadas (Sim ou Não?)	SIM								Adequação das calçadas segundo a NBR 9050
Serralherias (Portões, travas e outros)	NÃO								
Alarmes e sensores (Sim ou Não?)	NÃO								
Câmeras de segurança (Sim ou Não?)	NÃO								

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL			
Rede de gás na testada? (Sim ou Não)	NÃO		
Observações Gerais:	**A edificação não possui Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB). É composta predominantemente por salas e ambientes administrativos. Durante a vistoria, constatou-se que alguns ambientes apresentam fissuras no piso e paredes, indicando a necessidade de manutenção corretiva. Verificou-se, ainda, não conformidade quanto às condições de acessibilidade, uma vez que o banheiro destinado a Pessoas com Deficiência (PCD) não atende aos requisitos normativos vigentes.**		

FICHA 4 - DIAGNÓSTICO DE ASPECTOS DE INFRAESTRUTURA PREDIAL DAS UNIDADES ESCOLARES			
Item	**Descrição dos Itens Avaliados**	**Necessidade de Intervenção**	**Observações**
1. Infraestrutura da Escola			
Condições das fundações, pilares, vigas, lajes, cobertura, estruturas metálicas, paredes, esquadrias e pisos			
1.1	Fundações: verificar se há rachaduras, trincas, fissuras, desplacamentos ou quaisquer sinais de falhas na fundação que possam comprometer a estabilidade do prédio	NÃO	
1.2	Pilares: verificar se há rachaduras, trincas, fissuras, desplacamentos ou quaisquer sinais de falhas nos pilares que possam comprometer a estabilidade do prédio	NÃO	
1.3	Vigas: verificar se há rachaduras, trincas, fissuras, desplacamentos ou quaisquer sinais de falhas nas vigas que possam comprometer a estabilidade do prédio	NÃO	
1.4	Lajes: verificar se há rachaduras, trincas, fissuras, desplacamentos ou quaisquer sinais de falhas nas lajes que possam comprometer a estabilidade do prédio	SIM	Necessário realizar reparo na laje, reconstituindo pontos de fissuras e infiltrações
1.5	Cobertura: verificar se há sinais de infiltração, vazamentos, telhas soltas ou outras falhas que possam causar danos à estrutura da escola	SIM	Necessário realizar reparo na cobertura, reconstituindo pontos de infiltrações e troca de telhas para termoacústica
1.6	Estruturas metálicas: verificar se há sinais de problemas nas estruturas metálicas, como corrosão ou deformação	NÃO	
1.7	Paredes: verificar se há sinais de problemas nas paredes, como rachaduras, infiltrações ou umidade excessiva	SIM	Necessário realizar reparo nas paredes, reconstituindo pontos de fissuras e desgaste de pintura
1.8	Esquadrias: verificar se há problemas nas esquadrias, tais como falta de peças, corrosão, vidros quebrados e dificuldade de manuseio	SIM	Realizar reparo em esquadrias
1.9	Pisos: verificar se há sinais de problemas nos pisos, como desníveis, rachaduras ou solturas de revestimento	SIM	Necessário realizar reparo no piso, reconstituindo pontos de fissuras e desgaste
2. Instalações Elétricas e Hidráulicas			
Condições das instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias			
2.1	Instalações elétricas: verificar se as instalações elétricas estão em conformidade com as normas de segurança, se há fios expostos, equipamentos com defeito ou outros problemas que possam representar risco de incêndio ou choque elétrico. verificar também se o quadro de energia está em bom estado e se as tomadas e interruptores estão funcionando corretamente	NÃO	
2.2	Instalações hidráulicas: verificar se as instalações hidráulicas estão em bom estado, sem vazamentos, rachaduras ou outros problemas que possam prejudicar o funcionamento do sistema. verificar também se as torneiras, registros e outros componentes estão em bom estado e se o sistema de esgoto está funcionando corretamente	NÃO	
2.3	Instalações sanitárias: verificar se as instalações sanitárias estão em bom estado, sem vazamentos, rachaduras ou outros problemas que possam prejudicar o funcionamento do sistema. verificar também se as louças sanitárias, como vasos e pias, estão em bom estado e se os ralos estão desobstruídos	NÃO	
2.4	Reservatórios de água: verificar se os reservatórios de água estão em bom estado, sem vazamentos ou outros problemas que possam prejudicar o funcionament do sistema de abastecimento	NÃO	

CAIXA

FICHA 4 - DIAGNÓSTICO DE ASPECTOS DE INFRAESTRUTURA PREDIAL DAS UNIDADES ESCOLARES			
Item	**Descrição dos Itens Avaliados**	**Necessidade de Intervenção**	**Observações**
3. Acessibilidade			
	Condições de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida		
3.1	Rampas de acesso: verificar se há rampas de acesso em bom estado e com inclinação adequada	SIM	Adaptar conforme NBR 9050
3.2	Elevadores: verificar se há elevadores em bom estado e se estão em conformidade com as normas de acessibilidade	SIM	Implantar elevador na edificação
3.3	Banheiros adaptados: verificar se há banheiros adaptados em bom estado e se estão em conformidade com as normas de acessibilidade	SIM	Adaptar conforme NBR 9050
4. Condições de Habitabilidade			
	Condições de ventilação e iluminação natural e artificial e conforto térmico dos ambientes		
4.1	Condições gerais de habitabilidade e conforto térmico por setor (salas de aulas, outros ambientes pedagógicos, ambientes administrativos, cozinha e refeitório, etc.)	SIM	Realizar a climatização dos ambientes da edificação
5. Áreas Externas/Paisagismo			
	Condições de adequabilidade das áreas externas da escola		
5.1	Condições Gerais do Paisagismo na Unidade Educacional	NÃO	
5.2	Drenagem: verificar se a drenagem da área externa da escola está funcionando corretamente, evitando acúmulo de água em dias de chuva	NÃO	
5.3	Pintura externa: verificar se a pintura externa da escola está em bom estado, sem descascamentos ou sinais de desgaste	SIM	Realizar pintura da fachada.

Profissional Responsável
Nome: Matheus Noronha Mendonça
Cargo/função: Engenheiro Civil
CREA/CAU: 5070897203

Responsável pela validação CAIXA
Nome: Decio de Souza Espindola
Cargo/função: Engenheiro Civil
CREA/CAU: 5062158870-SP

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEF HENRIQUE MELEGA, PROF

1 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Cód. Unidade	
95443	EMEF HENRIQUE MELEGA, PROF



Foto 01: Indentificação



Foto 02: Logradouro



Foto 03: Logradouro



Foto 04: Entrada

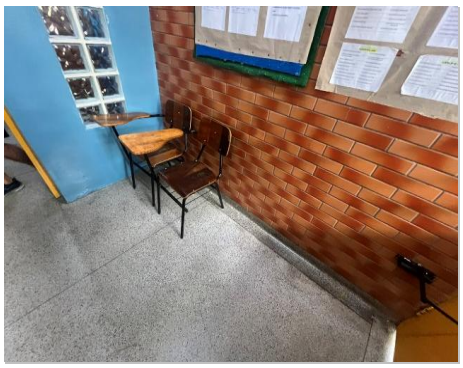


Foto 05: Hall da Secretaria



Foto 06: Hall da Secretaria

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEF HENRIQUE MELEGA, PROF



Foto 07: Circulação Administração - Térreo



Foto 08: Sala dos Professores



Foto 09: Copa



Foto 10: Copa



Foto 11: Depósito Professores



Foto 12: Circulação Administração - Térreo



Foto 13: Circulação Administração - Térreo



Foto 14: Secretaria

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEF HENRIQUE MELEGA, PROF



Foto 15: Secretaria



Foto 16: Secretaria 2

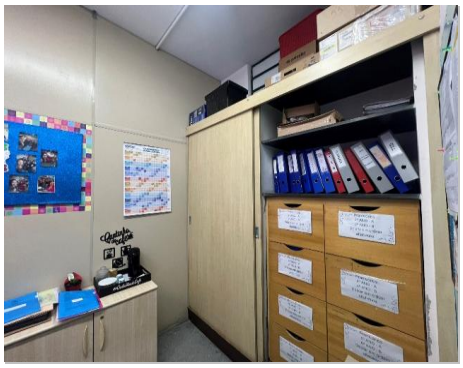


Foto 17: Secretaria 2



Foto 18: Secretaria 2
Desplacamento na parede



Foto 19: Circulação Administração - Térreo



Foto 20: Direção

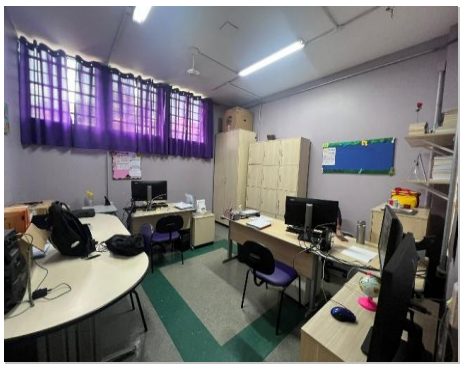


Foto 21: Direção



Foto 22: Banheiro Masculino

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEF HENRIQUE MELEGA, PROF

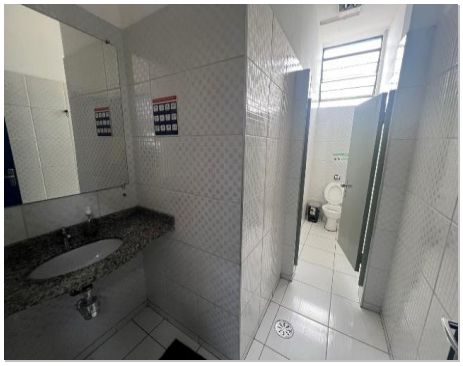


Foto 23: Banheiro Masculino



Foto 24: Banheiro Feminino



Foto 25: Banheiro Feminino

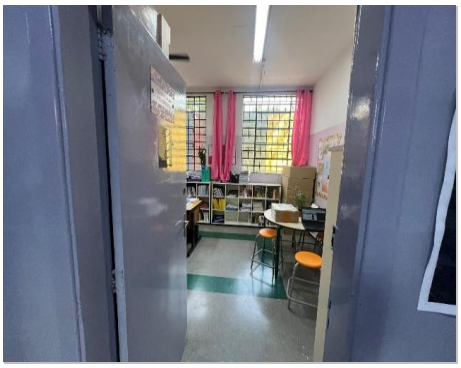


Foto 26: Coordenação Pedagógica



Foto 27: Coordenação Pedagógica

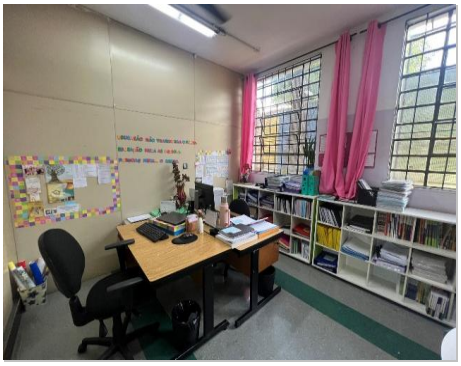


Foto 28: Coordenação Pedagógica



Foto 29: Mat. Didático



Foto 30: Mat. Didático

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEF HENRIQUE MELEGA, PROF

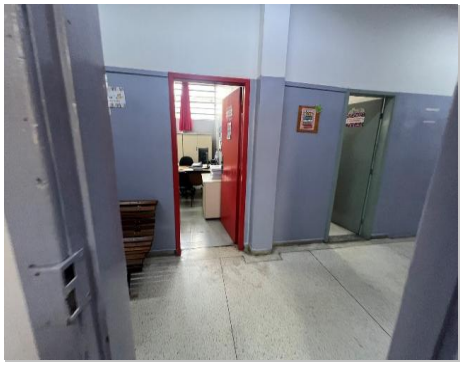


Foto 31: Circulação Administração - Térreo



Foto 32: Ass. Diretor

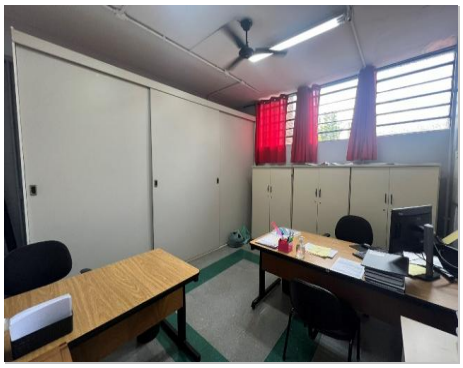


Foto 33: Ass. Diretor



Foto 34: Circulação Administração - Térreo



Foto 35: Refeitório

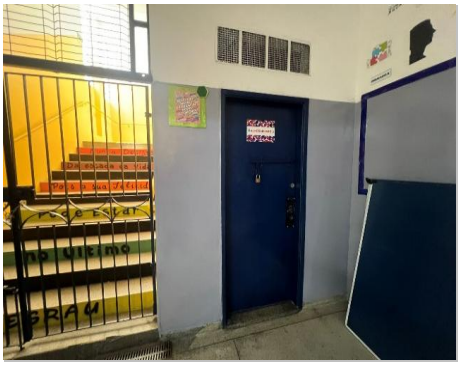


Foto 36: Refeitório



Foto 37: Almoxarifado




Foto 38: Almoxarifado

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEF HENRIQUE MELEGA, PROF



Foto 39: Almoxarifado
Mancha na parede



Foto 40: Copa Funcionários



Foto 41: Copa Funcionários

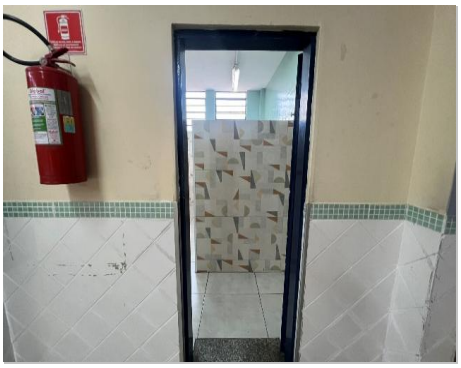


Foto 42: Banheiro Masculino Alunos



Foto 43: Banheiro Masculino Alunos



Foto 44: Banheiro Masculino Alunos



Foto 45: Refeitório



Foto 46: Refeitório
Fissura no piso

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEF HENRIQUE MELEGA, PROF



Foto 47: Refeitório



Foto 48: Banheiro Feminino Alunos



Foto 49: Banheiro Feminino Alunos
Sem maçaneta



Foto 50: Banheiro Feminino Alunos



Foto 51: Circulação Serviço - Térreo

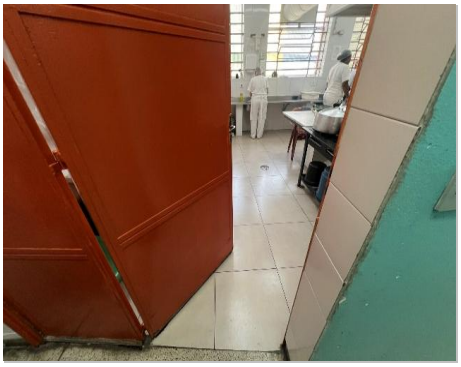


Foto 52: Cozinha



Foto 53: Cozinha



Foto 54: Despensa

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF HENRIQUE MELEGA, PROF



Foto 55: Despensa



Foto 56: Despensa
Descamação no forro, quebra do azulejo

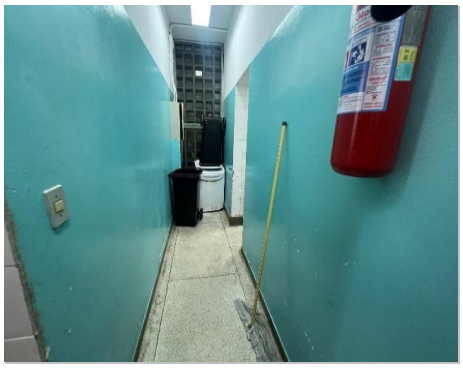


Foto 57: Circulação Serviço - Térreo

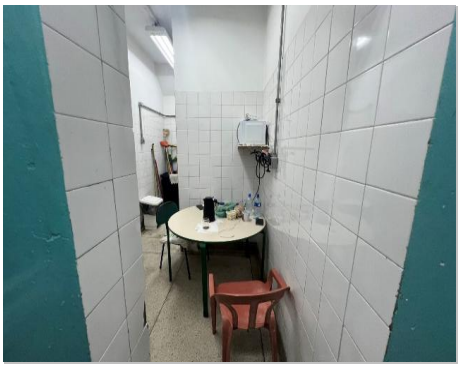


Foto 58: Copa Funcionários

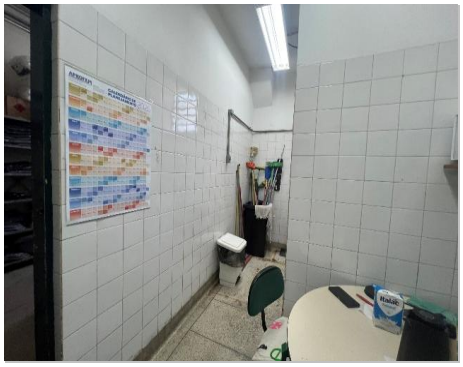


Foto 59: Copa Funcionários

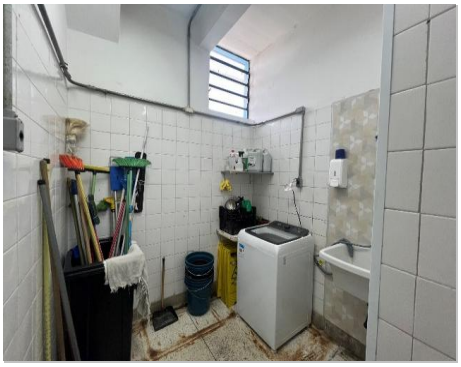


Foto 60: Copa Funcionários



Foto 61: Copa Funcionários
Mancha no piso



Foto 62: Copa Funcionários
Infiltração

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEF HENRIQUE MELEGA, PROF

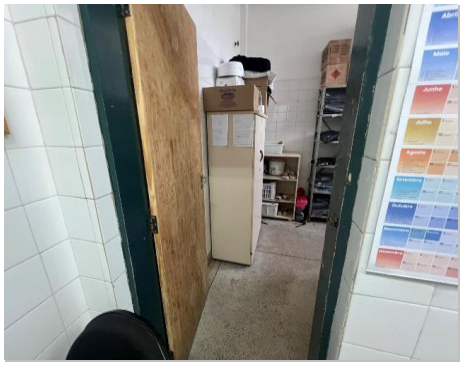


Foto 63: DML



Foto 64: DML



Foto 65: Refeitório



Foto 66: Grêmio



Foto 67: Grêmio



Foto 68: Sala de Ed. Física

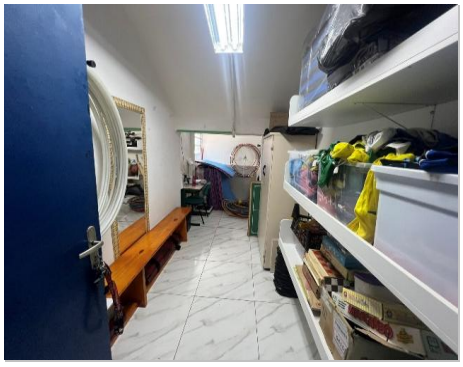


Foto 69: Sala de Ed. Física

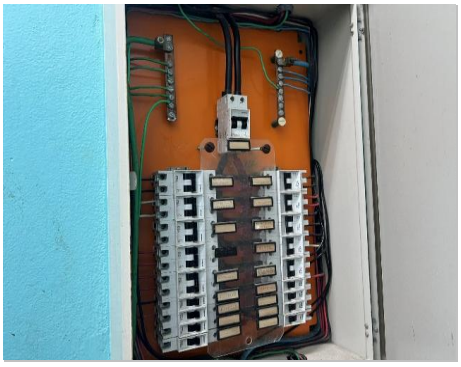


Foto 70: Circulação Serviço - Térreo

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEF HENRIQUE MELEGA, PROF

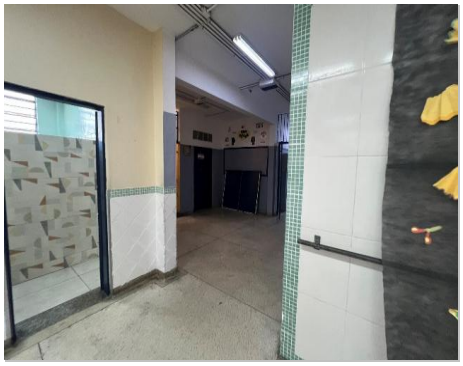


Foto 71: Refeitório

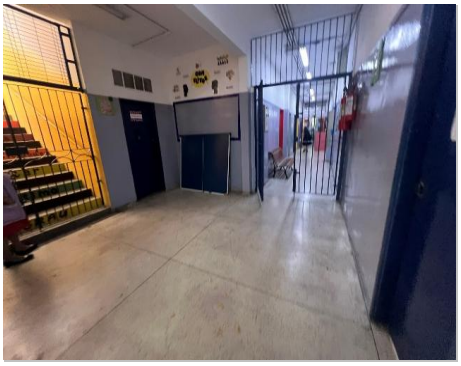


Foto 72: Refeitório



Foto 73: Escada 1º pav

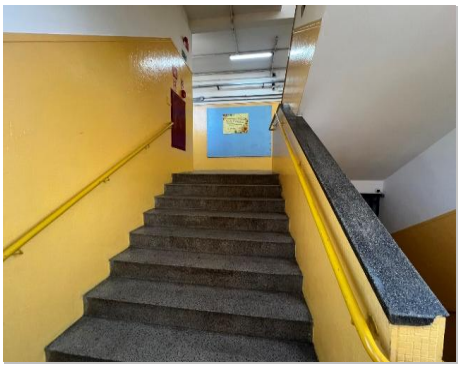


Foto 74: Escada 1º pav

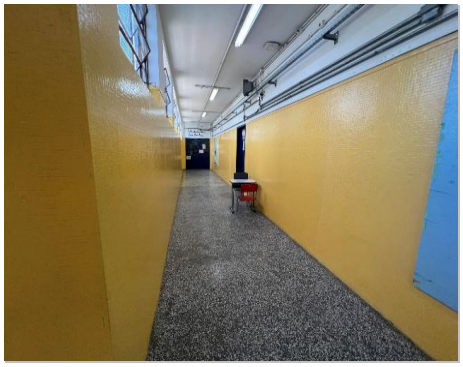


Foto 75: Circulação - 1° Pavimento



Foto 76: Sala de Leitura

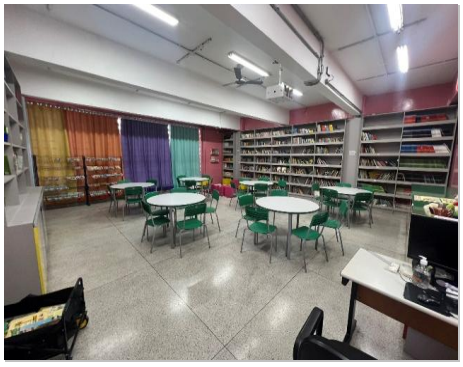


Foto 77: Sala de Leitura



Foto 78: Sala de Leitura

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEF HENRIQUE MELEGA, PROF



Foto 79: Sala de Leitura



Foto 80: Depósito Sala de Leitura - 1° Pavimento



Foto 81: Banheiro Biblioteca



Foto 82: Banheiro Biblioteca



Foto 83: Sala de Leitura
Trinca na parede



Foto 84: Sala de Leitura
Trinca no piso



Foto 85: Sala de Aula 01



Foto 86: Sala de Aula 01

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEF HENRIQUE MELEGA, PROF



Foto 87: Sala de Aula 02



Foto 88: Sala de Aula 02



Foto 89: Circulação - 1° Pavimento
Janela quebrada



Foto 90: Circulação - 1° Pavimento
Fissura no forro e parede



Foto 91: Circulação - 1° Pavimento
Fissura no piso



Foto 92: Sala de Aula 03



Foto 93: Sala de Aula 03
Descamação



Foto 94: Sala de Aula 04

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEF HENRIQUE MELEGA, PROF



Foto 95: Sala de Aula 05



Foto 96: Sala de Aula 06



Foto 97: Sala de Aula 06



Foto 98: Depósito de Livros

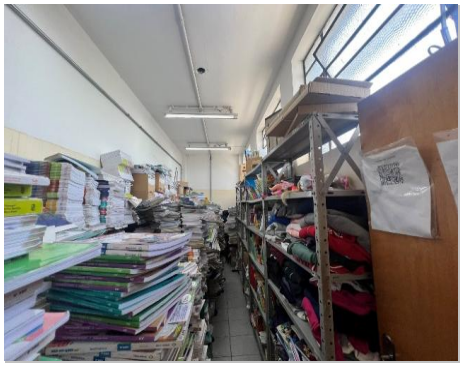


Foto 99: Depósito de Livros



Foto 100: Escada 2º pav

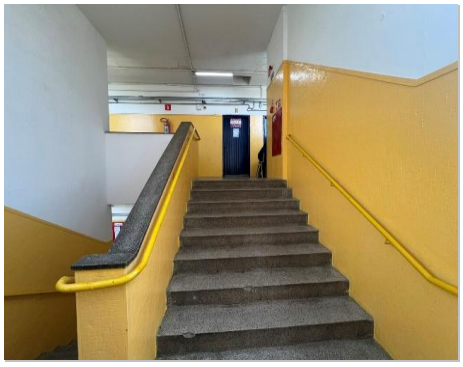


Foto 101: Escada 2º pav



Foto 102: Sala de Informática - 2° Pavimento



Foto 103: Sala de Informática - 2° Pavimento



Foto 104: Sala de Informática - 2° Pavimento



Foto 105: Sala de Informática - 2° Pavimento



Foto 106: Sala de Informática - 2° Pavimento
Infiltração



Foto 107: Sala de Informática - 2° Pavimento
Infiltração

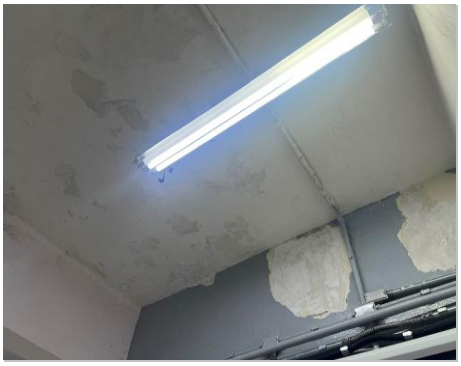


Foto 108: Sala de Informática - 2° Pavimento
Descamação



Foto 109: Sala de Informática - 2° Pavimento
Descamação



Foto 110: Sala de Informática - 2° Pavimento

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEF HENRIQUE MELEGA, PROF



Foto 111: Banheiro Sala de Informática

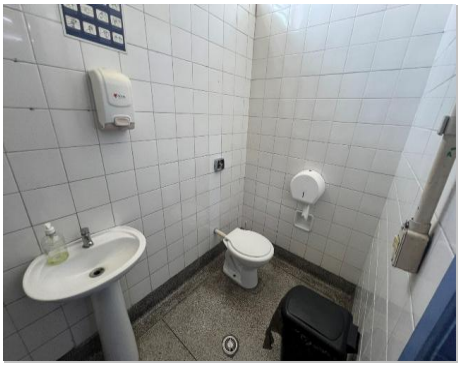


Foto 112: Banheiro Sala de Informática



Foto 113: Banheiro Sala de Informática
Infiltração e descamação



Foto 114: Depósito Informática - 2° Pavimento



Foto 115: Depósito Informática - 2° Pavimento



Foto 116: Depósito Informática - 2° Pavimento
Infiltração



Foto 117: Sala de Aula 07 - Artes



Foto 118: Sala de Aula 07 - Artes



Foto 119: Sala de Aula 07 - Artes
Fissura no piso

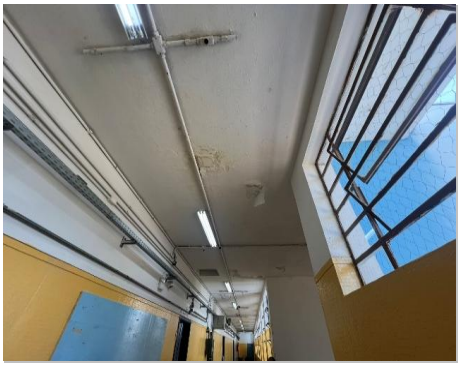


Foto 120: Circulação - 2° Pavimento
Infiltração e descamação



Foto 121: Sala de Aula 08



Foto 122: Sala de Aula 08



Foto 123: Circulação - 2° Pavimento
Fissura no piso



Foto 124: Sala de Aula 09



Foto 125: Sala de Aula 09
Descamação



Foto 126: Sala de Aula 10

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF HENRIQUE MELEGA, PROF



Foto 127: Sala de Aula 10
Janela quebrada



Foto 128: Sala de Aula 11



Foto 129: Sala de Aula 11
Infiltração e descamação



Foto 130: Sala de Aula 12 - PAP



Foto 131: Sala de Aula 12 - PAP



Foto 132: Banheiro PCD



Foto 133: Refeitório

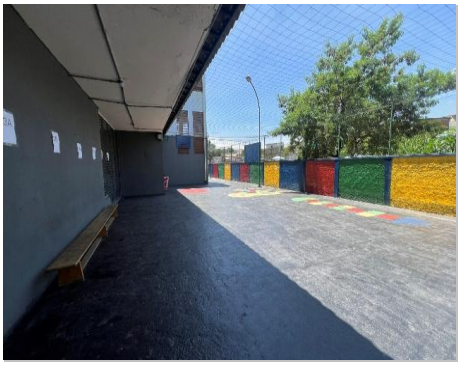


Foto 134: Área Externa

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF HENRIQUE MELEGA, PROF



Foto 135: Área Externa



Foto 136: Fachada



Foto 137: Fachada



Foto 138: Fachada
Mancha na fachada



Foto 139: Parquinho



Foto 140: Parquinho



Foto 141: Fachada



Foto 142: Área Externa

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEF HENRIQUE MELEGA, PROF



Foto 143: Área Externa
Infiltração

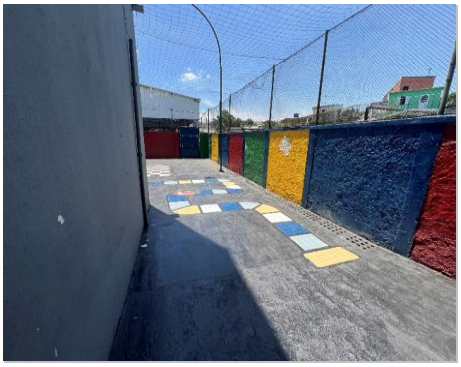


Foto 144: Área Externa

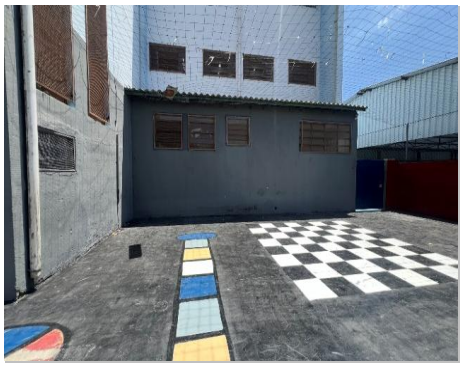


Foto 145: Área Externa



Foto 146: Área Externa
Infiltração e fissura



Foto 147: Área Externa



Foto 148: Área Externa



Foto 149: Quadra Coberto



Foto 150: Quadra Coberto

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEF HENRIQUE MELEGA, PROF



Foto 151: Área Externa



Foto 152: Área Externa



Foto 153: Área Externa



Foto 154: Refeitório

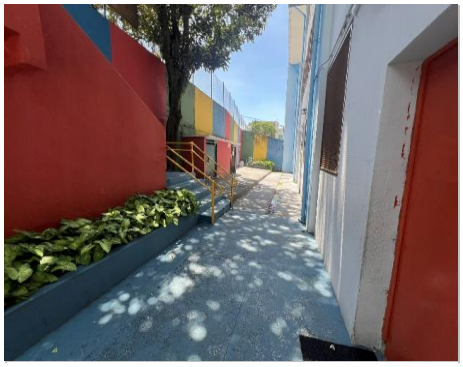


Foto 155: Área Externa



Foto 156: Área Externa



Foto 157: Área Externa



Foto 158: Área Externa

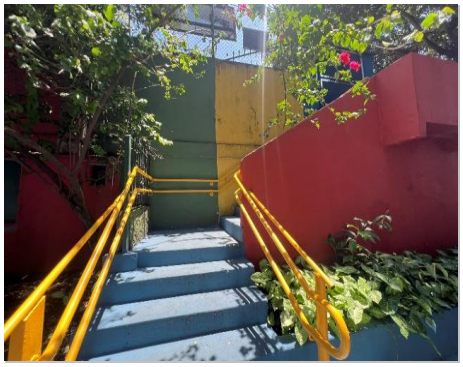


Foto 159: Área Externa



Foto 160: Área Externa



Foto 161: Área Externa
SPDA solto



Foto 162: Área Externa
SPDA solto



Foto 163: Entrada



Foto 164: Entrada



Foto 165: Entrada



Foto 166: Entrada

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEF HENRIQUE MELEGA, PROF



Foto 167: Estacionamento

Foto 168:
