CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL

Dados Gerais

Nome da Unidade:	EMEI ADEVALDO DE MORAES		
Sequencial (U.E):	22	**Código da Unidade:**	92606

Endereço da Escola

Logradouro, número e complemento (se houver)	Rua Oreste Damolin, 791

Descrição do Imóvel

Tipo de Construção (técnica construtiva predominante)	Pré-moldada	Padrão:	2. EMEI ADEVALDO DE MORAES CD 464	Nº de Pavimentos	2

Implantação

Área do Terreno (m²)	2.841,92			Área Edificada/ Construída (m²)	1.104,00
Área Pavimentada (m²)	726,40			Área Verde / Permeável (m²)	1.120,00
Área da projeção do(s) edifício(s) (m²)	527,92	Bloco salas	527,92	Quadra	467,60

Abastecimento

Água							
Forma de abastecimento (rede pública, poço artesiano, sem abastecimento etc.): rede pública							
Quantidade de reservatório de água	1						
Capacidade por reservatório (L)	20000	Constatação		Inf. Resp.	Projeto	PARCIAL	
Gás							
Encanado (Sim ou Não)	NÃO	Botijão de Gás (Sim ou Não)		SIM	Quantidade de Botijões de Gás	3	
Energia Elétrica							
Aparelho Ar condicionado (Sim ou Não)	NÃO				Quantidade:		
Possui fonte de energia complementar (Sim ou Não)?	NÃO				Qual (por ex. Painel Solar ou outro)?		
Possui Gerador de Energia? (Sim ou Não)?	NÃO				Capacidade:		
Esgoto							
Rede Pública (Sim ou Não)	SIM				Fossa Séptica (Sim ou Não)	NÃO	
Caixa de Gordura (Sim ou Não)	SIM				Caixa de Passagem (Sim ou Não)	SIM	

Informações sobre Prevenção de Incêndios (AVCB e SPDA)

Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro (Sim ou Não)	NÃO	Nº	N/A						
Extintor	SIM								
Hidrante	NÃO								
Sinalização Emergência	NÃO								
Iluminação Emergência	PARCIAL								
Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) (Sim ou Não)	SIM	Nº	Total (Sim ou Não)		Parcial (Sim ou Não)				

Acessibilidade

Elevador (Sim ou Não)	NÃO			Quantidade:		Quant. Ativos/Funcionais:		
Plataforma Elevatória (Sim ou Não)	NÃO			Quantidade:		Quant. Ativos/Funcionais:		
Rampa de Acesso a Unidade (Sim ou Não)	NÃO			Rampa de Acesso a outros espaços necessários (Sim ou Não)				
Tipo de sinalização	PARCIAL	Sonora (Sim ou Não)	PARCIAL	Visual (Sim ou Não)	PARCIAL	Tátil (Sim ou Não)	PARCIAL	
Selo de Acessibilidade (Sim ou Não)	NÃO		Nº					
Vaga de estacionamento para deficientes (Sim ou Não)	NÃO			Quantidade:	0			

CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL

Ambientes da Escola

Administrativo e Apoio/Serviços

Ambiente	Comprimento (m)	Largura (m)	Pé Direito (m)	Área (m²)	Tipo de Construção	Revestimento de Piso	Revestimento de Parede	Possui Forro? Se sim, qual tipo?	Nível de Comprometimento do Ambiente	Observações
Depósito Externo (não aparece nos projetos fornecidos)	6,20	3,23	3,00	20,03	Alvenaria	Cimentado	Pintura	N/A	**3**	Cobertura de fibrocimento necessitando reparos ou substituição (Fotos 4 e 5)
Varanda/Área Coberta 1 (Refeitório Exterior)	10,45	4,15	2,50	43,37	Madeira	Cerâmica	Pintura	N/A	**2**	Foto 6
Varanda/Área Coberta 2 (Recreação)	14,90	4,15	2,50	61,84	Madeira	Cimentado	Pintura	N/A	**2**	Foto 7
Quiosque	5,00	5,00	2,50	25,00	Alvenaria	Cimentado	N/A	N/A	**2**	Foto 8
Patio Descoberto	27,50	4,00	N/A	110,00	Alvenaria	Cimentado	N/A	N/A	**3**	Cimentado com muitos reparos merecendo uma recomposição e repintura (Foto 9)
Estacionamento	15,00	7,00	N/A	105,00	Alvenaria	Cimentado	N/A	N/A	**3**	O piso cimentado que ocupa o recuo frontal da escola precisa de reparos ou substituição com reforço devido ao acesso de veículos. (Fotos 10 e108)
Quadra Descoberta	28,00	16,70	N/A	467,60	Alvenaria	Cimentado	Pintura	N/A	**3**	O piso cimentado apresenta rachaduras devido às intemperies, sendo recomendada uma estucagem e pintura (Fotos 11, 12 e 15)
Arquibancadas	28,00	3,65	N/A	102,20	Alvenaria	Cimentado	Pintura	N/A	**0**	Fotos 11, 14, 15 e 110
Tanque de Areia	3,00	3,00	N/A	9,00	Alvenaria	Areia	N/A	N/A	**0**	Foto 16
Horta	14,00	2,70	N/A	37,80	Alambrado	Brita	N/A	N/A	**0**	Fotos 17
Àrea Ajardinada/Arborizada	33,47	33,47	N/A	1.120,24	N/A	Terra Batida	N/A	N/A	**2**	Área dispersa, comprimento e largura deduzidos por equivalência de área. Fotos 18 a 20
Marquise (Entrada)	8,00	7,00	2,40	56,00	Metálica	Cimentado	N/A	N/A	**0**	Fotos 21 e 22
Play Ground	8,00	8,00	N/A	64,00	N/A	Terra Batida	N/A	N/A	**2**	A àrea de play-ground está inserida na Área Ajardinada Permeável com seus brinquedos espalhados. Fotos 23 e 24
Pátio Interno Coberto/Refeitório/Átrio	12,65	12,50	6,50	158,13	Alvenaria	Cerâmica	Cerâmica e Pintura	Gesso	**2**	Este Ambiente tem parcialmente Pé Direito Duplo. Fotos 25 a 28
Hall de Distribuição das Salas Adm (Pav. Térreo)	3,15	3,10	3,40	9,77	Alvenaria	Cerâmica	Cerâmica e	Laje	**2**	Fotos 29, 30,50 e 60
Corredor do Mezanino (Pav. Superior Acesso às Salas de Aula)	8,70	1,85	2,96	16,10	Alvenaria	Cerâmica	Pintura	Gesso	**2**	Fotos 31 a 34
Caixa de Escadas	4,80	4,00	5,50	19,20	Alvenaria	Granilite	Cerâmica e Pintura	Laje	**0**	As paredes tem uma barra impermeável (1,00m) Fotos 35 a37
Armário sobre as Escadas (Barrilete)	4,80	4,00	1,50	19,20	Alvenaria	Cimentado	Pintura	Laje	**0**	Foto 38
Depósito sob as Escadas	4,80	2,00	1,65	9,60	Alvenaria	Cerâmica	Pintura	Laje	**0**	Fotos 39 e 40
Secretaria	5,10	3,15	3,40	16,07	Alvenaria	Cerâmica	Pintura	Laje	**0**	Fotos 41 a 43
Diretoria	4,00	3,00	3,40	12,00	Alvenaria	Cerâmica	Pintura	Laje	**0**	Fotos 44 e 45
Coordenação	3,05	2,90	3,40	8,85	Alvenaria	Cerâmica	Pintura	Laje	**0**	Fotos 46 e 47
Almoxarifado	3,00	1,90	3,40	5,70	Alvenaria	Cerâmica	Pintura	Laje	**0**	Fotos 48 e 49
Sala dos Professores	6,20	3,85	3,40	23,87	Alvenaria	Cerâmica	Pintura	Laje	**0**	Fotos 50 a 53
Corredor Interno da Administração (Pav. Térreo)	3,05	1,15	3,40	3,51	Alvenaria	Cerâmica	Pintura	Laje	**0**	
Copa dos Funcionários	9,50	2,00	3,00	19,00	Alvenaria	Cerâmica	Azulejos e Pintura	Laje e PVC	**0**	Fotos 75 a 79
Cozinha	7,35	4,05	3,40	29,77	Alvenaria	Cerâmica	Azulejos	Laje	**0**	Fotos 80 a 84
Despensa	3,00	1,95	3,40	5,85	Alvenaria	Cerâmica	Azulejos	Laje	**0**	Fotos 85 a 88
Área de Serviço/Lavanderia/Armários Embutidos Aparece em Planta do Térreo como "Corredor"	8,35	1,50	3,40	12,53	Alvenaria	Cerâmica	Azulejos e Pintura	Laje	**0**	Fotos 89 a 91
Vestiário	3,00	2,77	3,00	8,31	Alvenaria	Cerâmica	Pintura	PVC	**0**	

CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL

CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL

Salas de Aula

Ambiente	Comprimento (m)	Largura (m)	Pé Direito (m)	Área (m²)	Tipo de Construção	Revestimento de Piso	Revestimento de Parede	Possui Forro? Se sim, qual tipo?	Nível de Comprometimento do Ambiente	Observações
Sala de Aula 1	9,38	6,20	2,96	58,13	Alvenaria	Cerâmica	Pintura e Cerâmica	Gesso	**0**	Fotos 92 a 94
Sala de Aula 2	9,38	6,30	2,96	59,06	Alvenaria	Cerâmica	Pintura e Cerâmica	Gesso	**0**	Fotos 95 a 98
Sala de Aula 3	9,30	6,30	2,96	58,59	Alvenaria	Cerâmica	Pintura e Cerâmica	Gesso	**0**	Fotos 99 a 101
Sala de Aula 4	9,30	6,20	2,96	57,66	Alvenaria	Cerâmica	Pintura e Cerâmica	Gesso	**0**	Fotos 99 e 102 a 105

Sanitários

Ambiente	Comprimento (m)	Largura (m)	Pé Direito (m)	Área (m²)	Revestimento de Piso	Revestimento de Parede	Possui Forro? Se sim, qual tipo?	Observações	Nível de Comprometimento do Ambiente	Informações Complementares: Quant. Vasos Sanitários	Quant. Cubas e trocadores	Quant. Chuveiros
Sanitário dos Professores (Fotos 54 e 55)	3,00	2,15	3,10	6,45	Cerâmica	Azulejo	Laje		**0**			
Sanitário Feminino (Fotos 59 e 60) (Pavimento Térreo) em Manutenção	3,00	1,95	3,10	5,85	Cerâmica	Azulejo	Laje		**0**	2	2	0
Sanitário Masculino (Fotos 56 a 58) (Pavimento Térreo) em Manutenção	3,00	1,95	3,10	5,85	Cerâmica	Azulejo	Laje		**0**	2	2	0
Sanitário PCD Unissex (Pav. Térreo) (Fotos 61 e 62)	3,00	1,89	2,90	5,67	Cerâmica	Azulejo	PVC	Apesar de ser um sanitário que atende prioritáriamente crianças acompanhadas (AVE), itens de acessibilidade como barras de apoio, botoeira de emergência e metais sanitários com acionamento facilitado seriam adequados. (fotos 61 e62)	**3**	1	1	1
Sanitário Funcionário (Pavimento Térreo) (Fotos 63 e 64)	2,00	0,90	2,90	1,80	Cerâmica	Azulejo	PVC		**0**	3	3	1
Sanitário Aluno Fem. (Pavimento Superior) (Fotos 65 a 68)	4,30	2,79	2,96	12,00	Cerâmica	Azulejo	Gesso		**0**	3	3	1
Sanitário Aluno Masc. (Pavimento Superior) (Fotos (69 a 74)	4,30	2,79	2,96	12,00	Cerâmica	Azulejo	Gesso		**0**	3	3	1

Informações Adicionais

Ambiente	Necessário adequar ou implantar? (SIM / NÃO / NÃO SE APLICA)	Informações Complementares							Observações
Fechamento do lote (muro, cerca, gradil, vegetação)	NÃO	Muro		Área (m²)	440,00	Gradil	Área (m²)	80,00	O muro frontal conta com uma extensão de gradil metálico (1,00m) ao longo de todo o alinhamento.(Fotos 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 106 a 110, 114)
Estacionamento(s)	SIM	Área (m²)		105,00					O piso cimentado que ocupa o recuo frontal da escola precisa de reparos ou substituição com reforço devido ao acesso de veículos. (Fotos 10 e108)
Playground (Sim ou Não)	NÃO	Área (m²)		64,00					A àrea de play-ground está inserida na Área Ajardinada Permeável com seus brinquedos espalhados. (Fotos 23 e 24)
Tanque de Areia (Sim ou Não)	SIM	Área Cúbica (m³)		3,00					A Areia está contaminada por terra do entorno. Seria interssante substitui-la e revisar o dreno do tanque. (Fotos 16 e20)
Calçadas (Sim ou Não?)	SIM								As calçadas do entorno precisam de reparos (Fotos 111 a 114)

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL			
Serralherias (Portões, travas e outros)	NÃO		Fotos 21, 26, 27, 38, 40, 98, 107 e 108.
Alarmes e sensores (Sim ou Não?)	SIM		Não dispõe dessa instalação
Câmeras de segurança (Sim ou Não?)	SIM		Não dispõe dessa instalação
Rede de gás na testada? (Sim ou Não)	NÃO		Não disponivel no local
Observações Gerais:	Essa escola de pequeno porte apresenta Bom Estado Geral de Conservação, inclusive com pintura e reformas recentes.		

CAIXA

FICHA 4 - DIAGNÓSTICO DE ASPECTOS DE INFRAESTRUTURA PREDIAL DAS UNIDADES ESCOLARES			
Item	**Descrição dos Itens Avaliados**	**Necessidade de Intervenção**	**Observações**
1. Infraestrutura da Escola			
Condições das fundações, pilares, vigas, lajes, cobertura, estruturas metálicas, paredes, esquadrias e pisos			
1.1	Fundações: verificar se há rachaduras, trincas, fissuras, desplacamentos ou quaisquer sinais de falhas na fundação que possam comprometer a estabilidade do prédio	NÃO	
1.2	Pilares: verificar se há rachaduras, trincas, fissuras, desplacamentos ou quaisquer sinais de falhas nos pilares que possam comprometer a estabilidade do prédio	NÃO	
1.3	Vigas: verificar se há rachaduras, trincas, fissuras, desplacamentos ou quaisquer sinais de falhas nas vigas que possam comprometer a estabilidade do prédio	NÃO	
1.4	Lajes: verificar se há rachaduras, trincas, fissuras, desplacamentos ou quaisquer sinais de falhas nas lajes que possam comprometer a estabilidade do prédio	NÃO	
1.5	Cobertura: verificar se há sinais de infiltração, vazamentos, telhas soltas ou outras falhas que possam causar danos à estrutura da escola	SIM	O prédio principal da Escola é coberto com telhas metálicas tipo sanduíche em bom estado geral. Porém os Anexos no Pav. Térreo como as Varandas (Fotos 06 e 07) e na Lateral onde se localizam parte da Copa dos Funcionários, a Área de Serviço (Corredor) e Vestiário e Depósito Externo (Fotos 04 e 05) possuem cobertura de Calhetas de Fibrocimento necessitando reparos e Estrutura de Madeira.
1.6	Estruturas metálicas: verificar se há sinais de problemas nas estruturas metálicas, como corrosão ou deformação	NÃO	
1.7	Paredes: verificar se há sinais de problemas nas paredes, como rachaduras, infiltrações ou umidade excessiva	NÃO	
1.8	Esquadrias: verificar se há problemas nas esquadrias, tais como falta de peças, corrosão, vidros quebrados e dificuldade de manuseio	NÃO	
1.9	Pisos: verificar se há sinais de problemas nos pisos, como desníveis, rachaduras ou solturas de revestimento	SIM	O piso cimentado que ocupa o recuo frontal da escola precisa de reparos ou substituição com reforço devido ao acesso de veículos. (Fotos 10 e108)
2. Instalações Elétricas e Hidráulicas			
Condições das instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias			
2.1	Instalações elétricas: verificar se as instalações elétricas estão em conformidade com as normas de segurança, se há fios expostos, equipamentos com defeito ou outros problemas que possam representar risco de incêndio ou choque elétrico. verificar também se o quadro de energia está em bom estado e se as tomadas e interruptores estão funcionando corretamente	SIM	Os quadros elétricos apresentam irregularidades em relação às normas técnicas pertinentes (ABNT NBR 5410, NR-10 e NBR IEC 61439), entre elas a falta de dispositivos como DR, IDR ou DPS, desorganização e falta de presilhas ou canaletas para os fios e cabos. (Fotos 30, 34, 103)
2.2	Instalações hidráulicas: verificar se as instalações hidráulicas estão em bom estado, sem vazamentos, rachaduras ou outros problemas que possam prejudicar o funcionamento do sistema. verificar também se as torneiras, registros e outros componentes estão em bom estado e se o sistema de esgoto está funcionando corretamente	NÃO	
2.3	Instalações sanitárias: verificar se as instalações sanitárias estão em bom estado, sem vazamentos, rachaduras ou outros problemas que possam prejudicar o funcionamento do sistema. verificar também se as louças sanitárias, como vasos e pias, estão em bom estado e se os ralos estão desobstruídos	NÃO	

FICHA 4 - DIAGNÓSTICO DE ASPECTOS DE INFRAESTRUTURA PREDIAL DAS UNIDADES ESCOLARES			
Item	**Descrição dos Itens Avaliados**	**Necessidade de Intervenção**	**Observações**
2.4	Reservatórios de água: verificar se os reservatórios de água estão em bom estado, sem vazamentos ou outros problemas que possam prejudicar o funcionament do sistema de abastecimento	NÃO	

CAIXA

FICHA 4 - DIAGNÓSTICO DE ASPECTOS DE INFRAESTRUTURA PREDIAL DAS UNIDADES ESCOLARES			
Item	**Descrição dos Itens Avaliados**	**Necessidade de Intervenção**	**Observações**
3. Acessibilidade			
Condições de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida			
3.1	Rampas de acesso: verificar se há rampas de acesso em bom estado e com inclinação adequada	SIM	Não existe acessibilidade ao Pavimento Superior, algumas soleiras do Pav. Térreo não estão adequadas, além de não existir sinalizações táteis e podotáteis.
3.2	Elevadores: verificar se há elevadores em bom estado e se estão em conformidade com as normas de acessibilidade	SIM	Não existe elevador no edificio
3.3	Banheiros adaptados: verificar se há banheiros adaptados em bom estado e se estão em conformidade com as normas de acessibilidade	SIM	Apesar do bom estado geral necessita adaptar detalhes como barras de apoio, metais sanitários e sinalização.(Fotos 61 e62)
4. Condições de Habitabilidade			
Condições de ventilação e iluminação natural e artificial e conforto térmico dos ambientes			
4.1	Condições gerais de habitabilidade e conforto térmico por setor (salas de aulas, outros ambientes pedagógicos, ambientes administrativos, cozinha e refeitório, etc.)	NÃO	Os ventiladores de teto e de parede parecem estar atendendo a contento.
5. Áreas Externas/Paisagismo			
Condições de adequabilidade das áreas externas da escola			
5.1	Condições Gerais do Paisagismo na Unidade Educacional	SIM	As superficies de terra batida exposta ´poderiam receber algum tipo de recobrimento natural drenante e resistente à sombra das árvores existentes, tal como gramado, pedrisco, areia, etc. (Fotos 18 a 20)
5.2	Drenagem: verificar se a drenagem da área externa da escola está funcionando corretamente, evitando acúmulo de água em dias de chuva	SIM	A drenagem do Tanque de Areia necessita algum restauro e as Canaletas da Área Ajardinada requeirem manutenção periódica. (Fotos 16, 20 e 24)
5.3	Pintura externa: verificar se a pintura externa da escola está em bom estado, sem descascamentos ou sinais de desgaste	NÃO	

Profissional Responsável
Nome: Ubirajara Mazur S. Matheus
Cargo/função: Arquiteto
CREA/CAU: A 7574-4

Responsável pela validação CAIXA
Nome: Decio de Souza Espindola
Cargo/função: Engenheiro Civil
CREA/CAU: 5062158870-SP

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEI ADEVALDO DE MORAES

1 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Cód. Unidade	
92606	EMEI ADEVALDO DE MORAES



foto 01
Vista Aérea da Escola

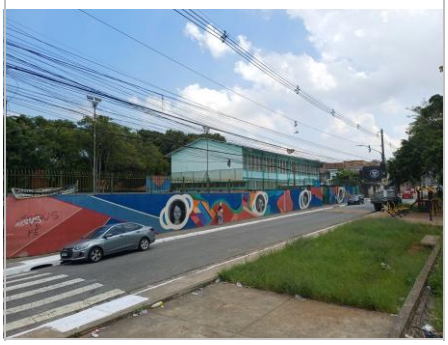


foto 02:
Panorâmica da Fachada Principal
Rua Oreste Damolin, 791



foto 03:
Vista da Esquina Rua Oreste Damolin X Rua Francisco Usper



foto 04:
Depósito com acesso externo
(Recuo lateral direito de quem olha a Escola de frente)



foto 05:
Beiral da Cobertura em Fibrocimento do Depósito Externo
(Lateral da Passagem Ferdinando Rondoni)



foto 06:
Varanda/Área Coberta 1 (Refeitório Exterior)

CAIXA

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI ADEVALDO DE MORAES



foto 07:

Varanda/Área Coberta 2 (Recreação)



foto 08:

Quiosque



foto 09:

Patio Descoberto



foto 10:

Estacionamento - Recuo Frontal



foto 11:

Quadra Descoberta - Vista na Direção do Prédio Escolar



foto 12:

Quadra Descoberta

Vista na Direção da Lateral com a Rua Francisco Uesper



foto 13:

Quadra - Alambrado



foto 14:

Arquibancada na extensão da Quadra

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI ADEVALDO DE MORAES



Foto 15:
Arquibancada no Fundo da Quadra e
Detalhe do Piso da Quadra



Foto 16:
Tanque de Areia



foto 17:
Horta/Canteiro



foto 18:
Área Arborizada Permeável



foto 19:
Área Arborizada Permeável



foto 20:
Área Arborizada Permeável



foto 21:
Marquise de entrada da Escola
pela Rua Oreste Damolin



foto 22:
Marquise de entrada da Escola

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI ADEVALDO DE MORAES



foto 23:
Play Ground



foto 24:
Play Ground



foto 25:
Pátio Interno Coberto/Refeitório/Átrio
Vista do fundo para frente



foto 26:
Pátio Interno Coberto/Refeitório/Átrio
Vista do Pé Direito Duplo



foto 27:
Pátio Interno Coberto/Refeitório/Átrio
Vista do Pé Direito Duplo



foto 28:
Pátio Interno Coberto/Refeitório/Átrio
Vista da frente para o fundo



foto 29:
Hall de Distribuição das Salas Adm (Pav. Térreo)



foto 30:
Hall de Distribuição das Salas Adm (Pav. Térreo)
Detalhe do quadro de Energia

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI ADEVALDO DE MORAES

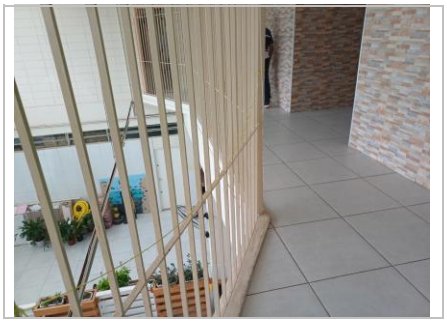


foto 31:
Corredor do Mezanino



foto 32:
Corredor do Mezanino
Vista a partir da Caixa de Escadas



foto 33:
Corredor do Mezanino
Entrada da Sala 04 em frente e do Sanitário à direita



foto 34:
Corredor do Mezanino
Quadro de Distribuição de Energia do Pav. Superior

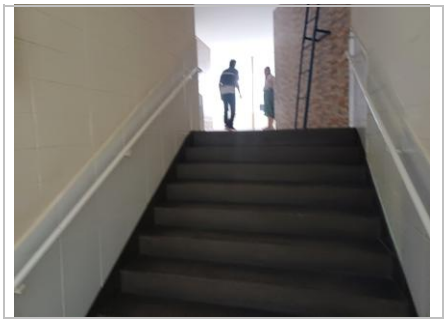


foto 35:
Escadas
Chegada ao Pav. Superior



foto 36:
Escadas
à partir do Pav. Térreo

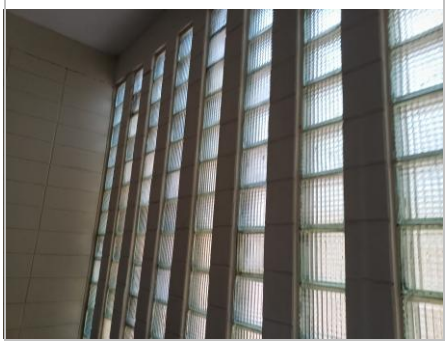


foto 37:
Caixa de escadas
Detalhe da Parede de Fechamento

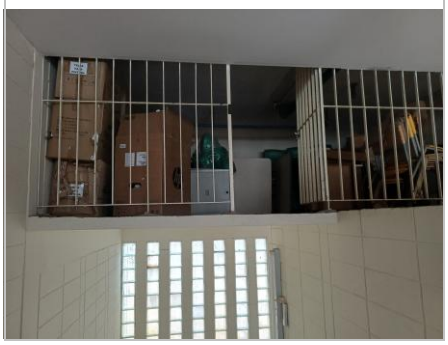


foto 38:
Armário sobre as Escadas (Barrilete)

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI ADEVALDO DE MORAES



foto 39:
Depósito sob as Escadas



foto 40:
Depósito sob as Escadas



foto 41:
Soleira da Secretaria



foto 42:
Teto da Secretaria



foto 43:
Secretaria - Detalhe do Rack de Lógica



foto 44:
Diretoria
Teto, Iluminação e gradis



foto 45:
Diretoria
Detalhe do Piso



foto 46:
Coordenação
Teto, Iluminação, Ventilação e Gradis

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI ADEVALDO DE MORAES



foto 47:
Coordenação Detalhe do Piso

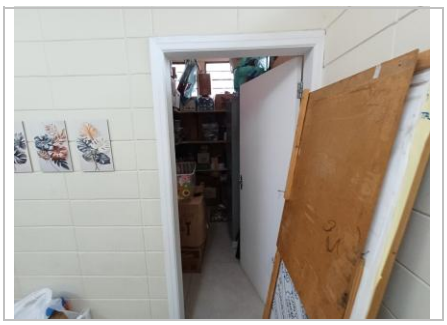


foto 48:
Acesso ao Almoxarifado à partir da Coordenação

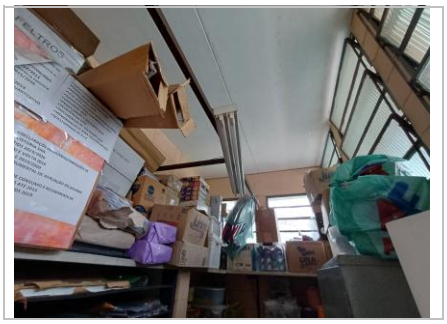


foto 49:
Almoxarifado



foto 50:
Acesso à sala dos Professores à partir do Átrio.
Detalhe do Hall de Distribuição das Salas Adm. `a direita



foto 51:
Sala dos Prefessores



foto 52:
Sala dos Professores . Instalações de teto (Roteador)

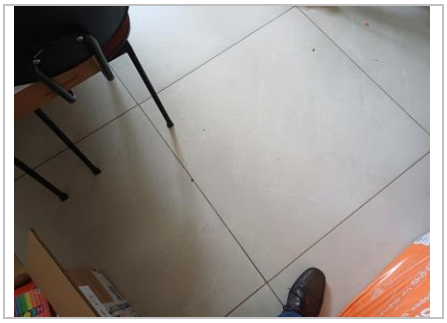


foto 53:
Sala dos Prefessores. Detalhe do Piso



foto 54:
Sanitário dos Professores

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI ADEVALDO DE MORAES



foto 55:
Sanitário dos Professores - Bancada Lavatório

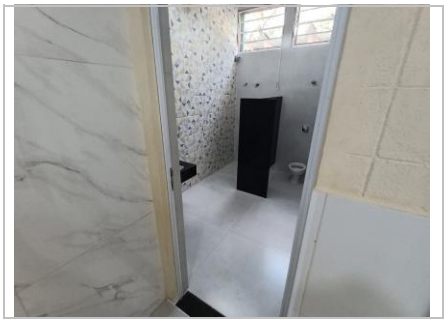


foto 56:
Sanitário Masculino (Pav. Térreo)



foto 57:
Sanitário Masculino (Pav. Térreo)



foto 58:
Sanitário Masculino (Pav. Térreo)



foto 59:
Acessos aos Sanitários Masc e Fem. do pavimento Térreo.
Detalhe da Porta de Saída para àrea Externa dos Fundos.



foto 60:
Sanitário Feminino (Pav. Térreo)
detalhe de Teto, iluminação e Esquadrias



foto 61:

Sanitário PCD Unissex (Pav. Térreo)



foto 62:
Sanitário PCD Unissex (Pav. Térreo)
Detalhe da Porta de Entrada, Lavatório e Trocador

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI ADEVALDO DE MORAES



foto 63:
Sanitário Funcionário (Pavimento Térreo)



foto 64:
Sanitário Funcionário (Pavimento Térreo)
Detalhe do Forro e Iluminação



foto 65:
Sanitário Aluno Fem. (Pavimento Superior)
Soleira e Porta de Acesso



foto 66:
Sanitário Aluno Fem. (Pavimento Superior)
Detalhe do Lavatório Inox



foto 67:
Sanitário Aluno Fem. (Pavimento Superior)
Detalhe dos Boxes de Bacias Sanitárias



foto 68:
Sanitário Aluno Fem. (Pavimento Superior)
Detalhe do Box de Chuveiro transformado em DML.



Foto 69
(Comentários, detalhes, etc.)



Foto 70
(Comentários, detalhes, etc.)

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI ADEVALDO DE MORAES

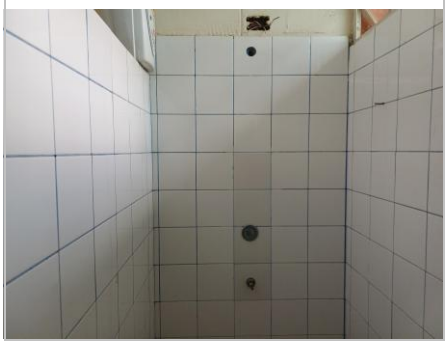


Foto 71
Sanitário Aluno Masc. (Pavimento Superior)
Detalhe do Box de Chuveiro Desativado



Foto 72
Sanitário Aluno Masc. (Pavimento Superior)
Detalhe do Lavatório Inox



Foto73
Sanitário Aluno Masc. (Pavimento Superior)
Detalhe do Box de Vaso Sanitário



Foto 74
Sanitário Aluno Masc. (Pavimento Superior)
Detalhe da Parede Divisória com vão livre até o teto.



Foto 75
Copa dos Funcionários - Soleira



Foto 76
Entrada da Copa dos Funcionários à partir do Pátio Coberto



Foto 77
Copa dos Funcionários



Foto 78
Copa dos Funcionários - Trecho com Rebaixo de Forro

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI ADEVALDO DE MORAES



Foto 79
Copa dos Funcionários - Detalhes de mobiliário e piso



Foto 80
Aceso da Cozinha à partir do Patio Coberto/Refeitório



Foto 81
Cozinha - Fogão e Coifa



Foto 82
Cozinha - Bancadas e Freezer



Foto 83
Cozinha - Detalhe dos Passa-Pratos



Foto 84
Cozinha - Detalhe de Caixa de Gordura sob Pia

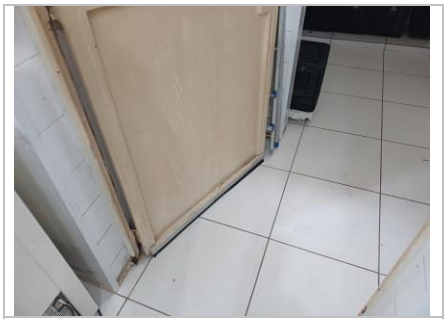


Foto 85
Acesso da Despensa à partir da Cozinha

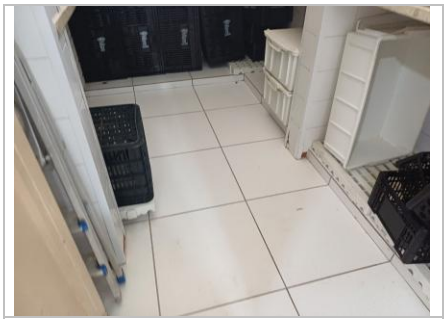


Foto 86
Despensa - Piso

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI ADEVALDO DE MORAES



Foto 87
Despensa - Prateleiras, Caixilhos, Teto



Foto 88
Despensa - Teto, Iluminação e Revestimento das Paresdes



Foto 89
Área de Serviço/Lavanderia/Armários Embutidos



Foto 90
Área de Serviço/Lavanderia/Armários Embutidos



Foto 91
Área de Serviço/Lavanderia/Armários Embutidos



foto 92
Sala 1



Foto 93
Sala 1



Foto 94
Sala 1

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI ADEVALDO DE MORAES

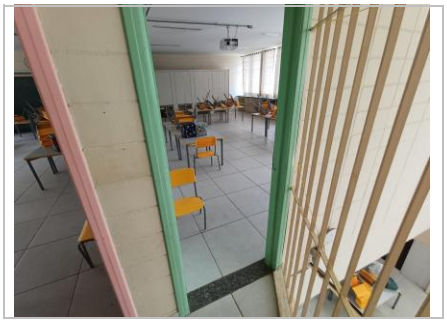


Foto 95
Sala 2 - Entrada



Foto 96
Sala 2



Foto 97
Sala 2 - Esquadrias, Cortinas, Bancada



Foto 98
Sala 2 - Vista pela Janela - Detalhe Tela de Proteção



Foto 99
Acesso às Salas 3 e 4

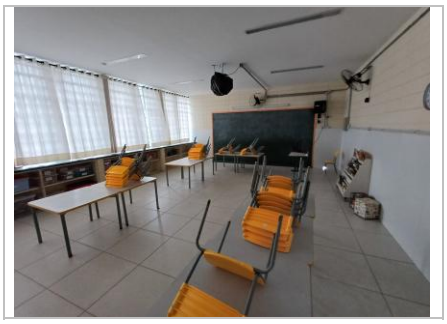


Foto 100
Sala 3



Foto 101
Sala 3



Foto 102
Entrada da Sala 4 e do Sanitário Masculino

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI ADEVALDO DE MORAES



Foto 103
Quadro de ´Distriubuição Elétrica do Pav. Superior

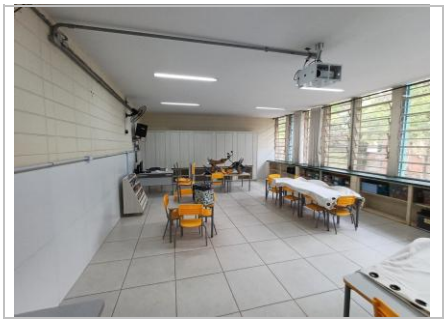


Foto 104
Sala 4



Foto 105
Sala 4



Foto 106
Vista Exterior do Muro de Divisa
com a Passagem Ferdinando Rondoni



Foto 107
Vista Exterior do Muro de Divisa
com a Passagem Ferdinando Rondoni



Foto 108
Estacionamento no Recuo Frontal
Detalhe Interno do Muro de Divisa

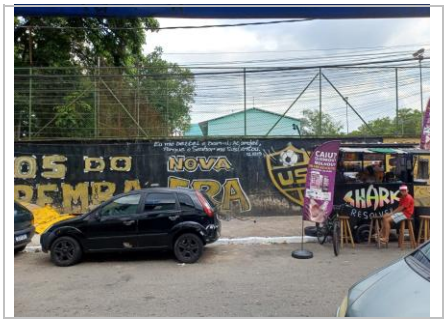


Foto 109
Vista Exterior do Muro de Divisa
com a Rua Francisco Usper



Foto 110
Vista interna do Muro de Divisa Frontal
e o Fundo da Arquibancada longitudinal à Quadra

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI ADEVALDO DE MORAES



Foto 111
Calçada e Muro na Passasgen Ferdinando Rondoni



Foto 112
Calçada na Confluencia da Rua Oreste Damolin com a Passasgen Ferdinando Rondoni



Foto 113
Calçada na Confluencia da Rua Oreste Damolin com a Passasgen Ferdinando Rondoni



Foto 114
Calçada no Alinhamento
com a Rua Francisco Usper

Foto 115

Foto 116

Foto 117

Foto 118
