CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL

Dados Gerais

Nome da Unidade:	EMEF ARLINDO CAETANO FILHO, PROFESSOR		
Sequencial (U.E):	39	**Código da Unidade:**	092622

Endereço da Escola

Logradouro, número e complemento (se houver)	RUA PALMEIRA BACABÁ, 39

Descrição do Imóvel

Tipo de Construção (técnica construtiva predominante)	Concreto armado	Padrão:	7. EMEI PADRAO 6-8 SALAS MODULADAS	Nº de Pavimentos	2

Implantação

Área do Terreno (m²)	3.086,64			Área Edificada/ Construída (m²)	2.251,61
Área Pavimentada (m²)	2.490,37			Área Verde / Permeável (m²)	596,27
Área da projeção do(s) edifício(s) (m²)	1.128,65	Bloco salas	1.128,65	Quadra	-

Abastecimento

Água							
Forma de abastecimento (rede pública, poço artesiano, sem abastecimento etc.):							
Quantidade de reservatório de água	2						
Capacidade por reservatório (L)	Não Informado	Constatação		Projeto	NÃO		
Gás							
Encanado (Sim ou Não)	NÃO	Botijão de Gás (Sim ou Não)		SIM	Quantidade de Botijões de Gás	4	
Energia Elétrica							
Aparelho Ar condicionado (Sim ou Não)	SIM				Quantidade:	1	
Possui fonte de energia complementar (Sim ou Não)?	NÃO				Qual (por ex. Painel Solar ou outro)?		
Possui Gerador de Energia? (Sim ou Não)?	NÃO				Capacidade:		
Esgoto							
Rede Pública (Sim ou Não)	SIM				Fossa Séptica (Sim ou Não)	NÃO	
Caixa de Gordura (Sim ou Não)	SIM				Caixa de Passagem (Sim ou Não)	SIM	

Informações sobre Prevenção de Incêndios (AVCB e SPDA)

Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro (Sim ou Não)	NÃO	Nº	N/A						
Extintor	SIM								
Hidrante	PARCIAL								
Sinalização Emergência	NÃO								
Iluminação Emergência	PARCIAL								
Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) (Sim ou Não)	PARCIAL	Nº	Total (Sim ou N	NÃO	Parcial (Sim ou Não)	NÃO			

Acessibilidade

Elevador (Sim ou Não)	SIM			Quantidade:	1	Quant. Ativos/Funcionais:	1
Plataforma Elevatória (Sim ou Não)	NÃO			Quantidade:	0	Quant. Ativos/Funcionais:	0
Rampa de Acesso a Unidade (Sim ou Não)	SIM	Existe rampa de acesso (Secretaria / Administração)		Rampa de Acesso a outros espaços necessários (Sim ou Não)			SIM
Tipo de sinalização	NÃO	Sonora (Sim ou Não)	NÃO	Visual (Sim ou Não)	NÃO	Tátil (Sim ou Não)	PARCIAL
Selo de Acessibilidade (Sim ou Não)	NÃO		Nº				
Vaga de estacionamento para deficientes (Sim ou Não)	NÃO			Quantidade:	0		

CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL

Ambientes da Escola

Administrativo e Apoio/Serviços

Ambiente	Comprimento (m)	Largura (m)	Pé Direito (m)	Área (m²)	Tipo de Construção	Revestimento de Piso	Revestimento de Parede	Possui Forro? Se sim, qual tipo?	Nível de Comprometimento do Ambiente	Observações
Estacionamento Coberto - Térro	23,60	9,60	3,00	226,56	Alvenaria	Cimentado	Pintura	Não	**2**	Paredes e Piso: Pintura. Caixilhos: Revitalização do sistema de abertura e fechamento, pintura e padronização de vidros. Estrutura Metálica Telhado: Restauração e Pintura. (Foto 04 A 07)
Hall Entrada - Térreo	10,60	2,50	3,00	26,50	Alvenaria	Granilite	Pintura	Não	**2**	Paredes e Teto: Pintura. Piso: Granilite, limpeza e enceramento. Caixilhos: Revitalização do sistema de abertura e fechamento, pintura e padronização de vidros. (Foto 08 A 11)
Circulação Administração - Térreo	VAR.	VAR.	3,00	68,91	Alvenaria	Granilite	Pintura	Não	**2**	Paredes e Teto: Pintura. Piso: Granilite, limpeza e enceramento. Caixilhos: Revitalização do sistema de abertura e fechamento, pintura e padronização de vidros. (Foto 12 A 20)
Refeitório Funcionários - Térreo	6,95	2,40	2,60	16,68	Alvenaria	Granilite	Cerâmica + Pintura	Não	**2**	Paredes: Substituição de azulejos quebrados. Teto: Correção de infiltrações, reparos no forro de gesso e pintura. Piso: Granilite, limpeza e enceramento. Porta: Revitalização de fechaduras, maçanetas e pintura. Caixilhos: Revitalização do sistema de abertura e fechamento, pintura e padronização de vidros. Revisão dos circuiitos elétricos e instalação de dispositivos de proteção. (Foto 21 A 29)
Secretaria - Térreo	7,00	4,95	3,00	34,65	Alvenaria	Porcelanato	Pintura	Não	**2**	Paredes e Teto: Pintura. Piso: Porcelanato, padronizar. Porta: Revitalização de fechaduras, maçanetas e pintura. Caixilhos: Revitalização do sistema de abertura e fechamento, pintura e padronização de vidros. Reestruturação distribuição de energia elétrica e revisão dos circuitos e dispositivos de proteção. (Foto 30 A 37)
Sala Assistentes Direção - Térreo	7,80	3,16	3,00	24,65	Alvenaria	Cerâmico	Pintura	Não	**2**	Paredes e Teto: Pintura, correção de infiltrações na parde e teto. Piso: Padronização, aplicação de porcelanato padronizado. Porta: Revitalização de fechaduras, maçanetas e pintura. Caixilhos: Revitalização do sistema de abertura e fechamento, pintura e padronização de vidros. Reestruturação distribuição de energia elétrica e revisão dos circuitos e dispositivos de proteção. (Foto 38 A 45)
Diretoria - Térreo	3,45	3,00	3,00	10,35	Alvenaria	Porcelanato	Pintura	Sim, Gesso.	**2**	Paredes e Teto: Pintura. Piso: Porcelanato, aplicar padronização. Porta: Revitalização de fechaduras, maçanetas e pintura. Caixilhos: Revitalização do sistema de abertura e fechamento, pintura e padronização de vidros. (Foto 46 A 49)

CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL										
Coordenação Pedagógica - Térreo.	2,90	3,00	3,00	8,70	Alvenaria	Paviflex	Pintura	Não	**2**	Paredes e Teto: Pintura. Piso: Padronização, aplicação de porcelanato padronizado. Porta: Revitalização de fechaduras, maçanetas e pintura. Caixilhos: Revitalização do sistema de abertura e fechamento, pintura e padronização de vidros. Reestruturação distribuição de energia elétrica. (Foto 50 A 57)
Sala dos Professores - Térreo	6,47	3,39	3,00	21,93	Alvenaria	Porcelanato	Pintura	Não	**2**	Paredes e Teto: Pintura. Piso: Porcelanato, Padronização. Porta: Revitalização de fechaduras, maçanetas e pintura. Caixilhos: Revitalização do sistema de abertura e fechamento, pintura e padronização de vidros. Reestruturação distribuição de energia elétrica. (Foto 58 A 63)
Sala de Recuperação Paralela (Térreo)	7,77	6,20	3,00	48,17	Alvenaria	Cerâmico	Pintura	Não	**2**	Paredes e Teto: Pintura. Piso: Padronização, aplicação de porcelanato padronizado. Porta: Revitalização de fechaduras, maçanetas e pintura. Caixilhos: Revitalização do sistema de abertura e fechamento, pintura e padronização de vidros. Reestruturação distribuição de energia elétrica. (Foto 64 A 67)
Sala Arquivo (Térreo)	5,80	2,50	3,00	14,50	Alvenaria	Cerâmico	Pintura	Não	**2**	Paredes e Teto: Pintura. Piso: Padronização, aplicação de porcelanato padronizado. Porta: Revitalização de fechaduras, maçanetas e pintura. Caixilhos: Revitalização do sistema de abertura e fechamento, pintura e padronização de vidros. (Foto 68 E 71)
Páteo Inteno - Térreo	VAR.	VAR.	3,00	49,96	Alvenaria	Granilite	Pintura	Telhas + Estrutura Metálica	**2**	Paredes: Pintura. Teto: Revitalização e pintura das estruturas metálicas. Piso: Granilite, limpeza e enceramento. Iluminação de Emergência: Revisão. Sinalização e Segurança: Instalação de lixas e sinalização de emergência. (Foto 72 A 80)
Escadas Páteo Interno	6,90	5,80	3,00	40,02	Alvenaria	Granilite	Pintura	Não	**2**	Paredes: Pintura. Piso: Granilite, limpeza e enceramento. Iluminação de Emergência: Revisão. Sinalização e Segurança: Instalação de lixas e sinalização de emergência. (Foto 81 E 82)
Refeitório Páteo Interno - Pavimento Inferior	VAR.	VAR.	3,00	243,58	Alvenaria	Cerâmico	Pintura + Cerâmica	Não	**3**	Paredes: Substituição dos azulejos. Piso: Padronização, aplicação de porcelanato padronizado. Caixilhos: Revitalização do sistema de abertura e fechamento, pintura e padronização de vidros. Revisão do sistema de distribuição de energia, dos circuitos elétricos e instalação de dispositivos de proteção. Revisão Instalações hidráulicas: Padronização de torneiras, grelhas e ralos. (Foto 83 A 89)
Depósito Instrumentos Musicais - Pav. Inferior	4,85	2,45	3,00	11,88	Alvenaria	Cerâmico	Pintura	Não	**3**	Paredes e Teto: Pintura, correção de infiltrações na parde e teto. Piso: Cerâmica, aplicação de porcelanato padronizado. Porta: Revitalização de fechaduras, maçanetas e pintura. Caixilhos: Revitalização porta de ferro, pintura e padronização de vidros. Reestruturação distribuição de energia elétrica. (Foto 90 A 94)

CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL										
Depósito Sob Escada - Páteo Inferior	VAR.	VAR.	VAR.	5,75	Alvenaria	Granilite	Pintura	Não	**2**	Paredes: Pintura. Piso: Granilite, limpeza e enceramento. Caixilhos: Retirada de grades que impedem acesso ao hidrante. Revitalização porta de ferro e pintura. (Foto 95 A 97)
Depósito Material de Limpeza - Pavimento Inferior	3,30	1,50	3,00	4,95	Alvenaria	Cerâmico	Pintura	Não	**3**	Paredes e Teto: Pintura. Piso: Padronização, aplicação de porcelanato padronizado. Porta: Revitalização de fechaduras, maçanetas e pintura. Caixilhos: Revitalização do sistema de abertura e fechamento, pintura e padronização de vidros.
Sala Educação Física - Pavimento inferior	3,75	2,25	3,00	8,44	Alvenaria + Portão	Cerâmico	Pintura	Não	**3**	Paredes e Teto: Pintura. Piso: Padronização, aplicação de porcelanato padronizado. Porta: Revitalização de fechaduras, maçanetas e pintura. Caixilhos: Revitalização do sistema de abertura e fechamento, pintura e padronização de vidros. Revisão geral da distribuição de energia elétrica. (Foto 98 A 101)
Lavanderia - Pavimento Inferior	3,30	1,00	3,00	3,30	Alvenaria	Cerâmico	Cerâmica + Pintura	Não	**3**	Paredes: Substituição dos azulejos. Piso: Padronização, aplicação de porcelanato padronizado. Porta: Revitalização de fechaduras, maçanetas e pintura. Caixilhos: Revitalização do sistema de abertura e fechamento, pintura e padronização de vidros. Revisão do sistema de distribuição de energia, dos circuitos elétricos e instalação de dispositivos de proteção. Revisão Instalações hidráulicas: Padronização de torneiras, grelhas e ralos. (Foto 94102 A 106)
Vestiário Funcionários - Pavimento Inferior	VAR.	VAR.	3,00	7,18	Alvenaria	Cerâmico	Cerâmica + Pintura	Não	**3**	Paredes: Colocação de azulejos (Demolição do trecho existente). Piso: Padronização, aplicação de porcelanato padronizado. Porta: Revitalização de fechaduras, maçanetas e pintura. Caixilhos: Revitalização do sistema de abertura e fechamento, pintura e padronização de vidros. Revisão do sistema de distribuição de energia, dos circuitos elétricos e instalação de dispositivos de proteção. Revisão Instalações hidráulicas: Padronização de torneiras, grelhas e ralos. (Foto 107 A 112)
Cozinha - Pavimento Inferior	VAR.	VAR.	3,00	43,90	Alvenaria	Cerâmico	Cerâmica + Pintura	Não	**3**	Paredes: Colocação de azulejos (Demolição do existente). Piso: Padronização, aplicação de porcelanato padronizado. Porta: Revitalização de fechaduras, maçanetas e pintura. Caixilhos: Revitalização do sistema de abertura e fechamento, pintura e padronização de vidros. Revisão do sistema de distribuição de energia, dos circuitos elétricos e instalação de dispositivos de proteção. Revisão Instalações hidráulicas: Padronização de torneiras, grelhas e ralos. (Foto 113 A 119)

CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL										
Despensa / Cozinha - Pavimento Inferior	VAR.	VAR.	3,00	16,56	Alvenaria	Cerâmico	Cerâmica + Pintura	Não	**3**	Paredes: Colocação de azulejos (Demolição do existente). Piso: Padronização, aplicação de porcelanato padronizado. Porta: Revitalização de fechaduras, maçanetas e pintura. Caixilhos: Revitalização do sistema de abertura e fechamento, pintura e padronização de vidros. Revisão do sistema de distribuição de energia elétrica. Revisão Instalações hidráulicas: Padronização de torneiras, grelhas e ralos. (Foto 120 A 124)
Depósito Sob Escada - Páteo Inferior	VAR.	VAR.	VAR.	5,75	Alvenaria	Granilite	Pintura	Não	**2**	Paredes: Pintura. Piso: Granilite, limpeza e enceramento. Caixilhos: Retirada de grades que impedem acesso ao hidrante. Revitalização porta de ferro e pintura. (Foto 95 A 97)
Palco - Pavimento Inferior.	VAR.	VAR.	3,00	19,08	Alvenaria	Cerâmica	Pintura	Não	**3**	Paredes: Colocação de azulejos. Piso: Padronização, aplicação de porcelanato padronizado. Caixilhos: Revitalização do sistema de abertura e fechamento, pintura e padronização de vidros. Revisão do sistema de distribuição de energia elétrica. Revisão Instalações hidráulicas: Padronização de torneiras, grelhas e ralos. (Foto 125 A 126)
Dep. Ed. Física Externo - Pavimento Inferior	4,40	1,90	3,00	8,36	Alvenaria	Granilite	Cerâmica	Não	**2**	Paredes e Teto: Correção de infiltrações (Parede e Teto) e pintura. Piso: Granilite, limpeza e enceramento. Porta: Revitalização de fechaduras, maçanetas e pintura. Caixilhos: Revitalização do sistema de abertura e fechamento, pintura e padronização de vidros. (Foto 127 A 130)
Depósito Material Didático - Pavimento Inferior	2,35	2,00	3,00	4,70	Alvenaria	Cerâmica	Pintura	Não	**3**	Paredes e Teto: Correção de infiltração e Pintura. Piso: Porcelanato, aplicar padronização. Porta: Revitalização de fechaduras, maçanetas e pintura. Caixilhos: Revitalização do sistema de abertura e fechamento, pintura e padronização de vidros. (Foto 131 A 134)
Depósito Mat. Pedagógico - Pavimento Inferior.	7,80	2,15	3,00	16,77	Alvenaria	Cerâmica	Pintura	Não	**3**	Paredes e Teto: Correção de trincas e Pintura. Piso: Porcelanato, aplicar padronização. Porta: Revitalização de fechaduras, maçanetas e pintura. Caixilhos: Revitalização do sistema de abertura e fechamento, pintura e padronização de vidros. (Foto 135 A 141)
Almoxarifado - Pavimento Inferior.	2,35	2,00	3,00	4,70	Alvenaria	Granilite	Pintura	Não	**2**	Paredes e Teto: Correção de infiltração no teto e Pintura. Piso: Granilite, limpeza e enceramento. Porta: Revitalização de fechaduras, maçanetas e pintura. Caixilhos: Revitalização do sistema de abertura e fechamento, pintura e padronização de vidros. (Foto 142 A 146)
Arquivo - Pavimento Inferior.	2,45	2,00	3,00	4,90	Alvenaria	Granilite	Pintura	Não	**2**	Paredes: Correção de trinca (Contraverga) e substituição dos azulejos danifcados. Teto: Pintura. Piso: Granilite, limpeza e enceramento. Porta: Revitalização de fechaduras, maçanetas e pintura. Caixilhos: Revitalização do sistema de abertura e fechamento, pintura e padronização de vidros. Instalações Elétricas: Revisão do sistema de distribuição (tubulação e condulete). (Foto 147 A 152)

CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL										
Entrada de Alunos - Pavimento Inferior.	VAR.	VAR.	-	27,86	Alvenaria	Cimentado + Cerâmica	Pintura	Não	**2**	Paredes: Revistalização da pintura das paredes externas (seladora e pintura). Piso: demolição do revestimento existente e aplicação de material padronizado antiderrapante. Caixilhos: Revitalização da porta de aço e gradil, pintura e padronização de vidros. (Foto 153 A 158)
Depósito sob Escada - Pavimento Inferior (Adm).	VAR.	VAR.	VAR.	10,98	Alvenaria	Granilite	Pintura	Não	**2**	Paredes e Teto: Pintura. Piso: Granilite, limpeza e enceramento. Porta: Revitalização de fechaduras, maçanetas e pintura. Caixilhos: Retirada de grades que impedem acesso ao hidrante. Revitalização porta de ferro e pintura. (Foto 159 A 161)
Depósito - Pavimento Inferior (Adm).	3,10	2,85	3,00	8,84	Alvenaria	Granilite	Pintura	Não	**2**	Paredes: Pintura. Piso: Granilite, limpeza e enceramento. Porta: Revitalização de fechaduras, maçanetas e pintura. Retirada de grades que impedem acesso ao hidrante. Revitalização porta de ferro e pintura. (Foto 162 A 165)
Circulação - Pavimento Inferior.	VAR.	VAR.	3,00	80,22	Alvenaria	Granilite	Pintura	Não	**2**	Paredes e Teto: Pintura. Piso: Granilite, limpeza e enceramento. Caixilhos e Grades: Revitalização do sistema de abertura e fechamento, pintura e padronização de vidros. (Foto 166 A 172)
Externo: Páteo e Circulação - Pavimento Inferior.	VAR.	VAR.	-	338,76	Alvenaria + Alambrado	Cimentado	Pintura	Não	**3**	Paredes, Muros e Muretas: Restauração de Total da Pintura (Artística e Monocromática). Piso: Pintura. Instalações elétricas: Revisão do sistema de distribuição, iluminação e circuitos (dispositivos de proteção). (Foto 173 A 1184)
Externo: Playgroud - Pavimento Inferior.	2,40	25,93	-	62,22	Alvenaria + Alambrado	Piso Emborrachado + Gramado	Pintura	Não	**2**	Paredes: Pintura artística nova. Piso: Emborrachado. Paredes áreas externas à escada: Pintura. Piso áreas externas à escada: Demolição e criação de jardim, área permeável. Alambrados: Revitalização e pintura (tubo de aço galvanizado - padronizar pintura). Instalações elétricas: Revisão do sistema de distribuição, iluminação e circuitos (dispositivos de proteção) (Foto 185 A 192)
Externo: Quadra Descoberta - Pav. Inferior.	28,40	19,10	-	542,44	Alvenaria + Alambrado	Cimentado	Pintura	Não	**3**	Paredes, Muros e Muretas: Restauração de Total da Pintura (Artística e Monocromática). Piso: Pintura. Alambrados: Revitalização e pintura (tubo de aço galvanizado - padronizar pintura). Instalações elétricas: Revisão do sistema de distribuição, iluminação e circuitos (dispositivos de proteção). (Foto 193 A 196)
Externo: Rampas de Acesso - Térreo.	VAR.	VAR.	-	60,10	Alvenaria	Cimentado	Pintura	Não	**3**	Paredes, Muros e Muretas: Restauração de Total da Pintura (Artística e Monocromática). Piso: Piso podotátil, sinalizaçção e pintura. Gradil: Revitalização e pintura (tubo de aço galvanizado - padronizar pintura). Instalações elétricas: Revisão do sistema de distribuição, iluminação e circuitos (dispositivos de proteção). (Foto 197 A 200)
Externo: Abrigo para Botijões (G.L.P.)	VAR.	VAR.	-	1,92	Alvenaria	Cimentado	Pintura	Não	**3**	Paredes: Restauração e pintura. Piso: Recomposição do piso de concreto. Gradil: Revitalização e pintura (tubo de aço galvanizado - padronizar pintura). (Foto 201 E 202)

CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL										
Telhado (Cobertura)	VAR.	VAR.	-	100,94		Fibrocimento + Termoacústica		Não	**3**	Telhado: Susbstituição completa. Substituição de telhas termoacústicas (mais resistentes) e das telhas de fibrocimento (Instalado: Canalete 49). (Foto 203 A 208)

CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL

CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL

Salas de Aula

Ambiente	Comprimento (m)	Largura (m)	Pé Direito (m)	Área (m²)	Tipo de Construção	Revestimento de Piso	Revestimento de Parede	Possui Forro? Se sim, qual tipo?	Nível de Comprometimento do Ambiente	Observações
Sala 01 (Térreo)	7,80	6,50	3,00	50,70	Alvenaria	Cerâmica	Pintura	Não	**3**	Paredes e Teto: Pintura. Piso: Cerâmica, aplicação de porcelanato padronizado. Porta: Revitalização de fechaduras, maçanetas e pintura. Caixilhose Gradil: Revitalização do sistema de abertura e fechamento, pintura e padronização de vidros. Reestruturação distribuição de energia elétrica. (Foto 209 A 213)
Sala 02 (Térreo)	7,85	6,85	3,00	53,77	Alvenaria	Cerâmica	Pintura	Não	**3**	Paredes e Teto: Correção de trincas nas pardes e pintura. Piso: Cerâmica, aplicação de porcelanato padronizado. Porta: Revitalização de fechaduras, maçanetas e pintura. Caixilhose Gradil: Revitalização do sistema de abertura e fechamento, pintura e padronização de vidros. Reestruturação distribuição de energia elétrica.(Foto 214 A 220)
Sala 03 (Térreo)	7,80	6,20	3,00	48,36	Alvenaria	Cerâmica	Pintura	Não	**3**	Paredes e Teto: Pintura. Piso: Cerâmica, aplicação de porcelanato padronizado. Porta: Revitalização de fechaduras, maçanetas e pintura. Caixilhose Gradil: Revitalização do sistema de abertura e fechamento, pintura e padronização de vidros. Reestruturação distribuição de energia elétrica. (Foto 221 A 226)
Sala Informática (Térreo)	8,85	7,80	3,00	69,03	Alvenaria	Paviflex	Pintura	Não	**3**	Paredes e Teto: Pintura. Piso: Cerâmica, aplicação de porcelanato padronizado. Porta: Revitalização de fechaduras, maçanetas e pintura. Caixilhose Gradil: Revitalização do sistema de abertura e fechamento, pintura e padronização de vidros. Reestruturação distribuição de energia e circuitos elétricos (Instalação de Dsipositivos de Segurança). (Foto 227 A 252)
Sala 04 (Térreo)	7,83	6,65	3,00	52,07	Alvenaria	Cerâmica	Pintura	Não	**3**	Paredes e Teto: Pintura. Piso: Cerâmica, aplicação de porcelanato padronizado. Porta: Revitalização de fechaduras, maçanetas e pintura. Caixilhose Gradil: Revitalização do sistema de abertura e fechamento, pintura e padronização de vidros. Reestruturação distribuição de energia elétrica. (Foto 253 A 260)
Sala 05 (Térreo)	7,83	6,65	3,00	52,07	Alvenaria	Cerâmica	Pintura	Não	**3**	Paredes e Teto: Pintura. Piso: Cerâmica, aplicação de porcelanato padronizado. Porta: Revitalização de fechaduras, maçanetas e pintura. Caixilhose Gradil: Revitalização do sistema de abertura e fechamento, pintura e padronização de vidros. Reestruturação distribuição de energia elétrica. (Foto 261 A 263)
Sala 06 (Térreo)	7,80	6,20	3,00	48,36	Alvenaria	Cerâmica	Pintura	Não	**3**	Paredes e Teto: Pintura. Piso: Cerâmica, aplicação de porcelanato padronizado. Porta: Revitalização de fechaduras, maçanetas e pintura. Caixilhose Gradil: Revitalização do sistema de abertura e fechamento, pintura e padronização de vidros. Reestruturação distribuição de energia elétrica. (Foto 264 A 266)

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL

Sala 07 (Pavimento Inferior)	7,80	7,50	3,00	58,50	Alvenaria	Cerâmica	Pintura	Não	**3**	Paredes e Teto: Pintura. Piso: Cerâmica, aplicação de porcelanato padronizado. Porta: Revitalização de fechaduras, maçanetas e pintura. Caixilhose Gradil: Revitalização do sistema de abertura e fechamento, pintura e padronização de vidros. Reestruturação distribuição de energia elétrica. (Foto 267 A 270)
Sala 08 (Pavimento Inferior)	7,80	7,50	3,00	58,50	Alvenaria	Paviflex	Pintura	Não	**3**	Paredes e Teto: Pintura. Piso: Paviflex, aplicação de porcelanato padronizado. Porta: Revitalização de fechaduras, maçanetas e pintura. Caixilhose Gradil: Revitalização do sistema de abertura e fechamento, pintura e padronização de vidros. Reestruturação distribuição de energia elétrica. (Foto 271 A 276)
Sala 09 (Pavimento Inferior)	7,25	6,50	3,00	47,13	Alvenaria	Cerâmica	Pintura	Não	**3**	Paredes e Teto: Pintura. Piso: Granilite, aplicação de porcelanato padronizado. Porta: Revitalização de fechaduras, maçanetas e pintura. Caixilhose Gradil: Revitalização do sistema de abertura e fechamento, pintura e padronização de vidros. Reestruturação distribuição de energia elétrica. (Foto 277 A 281)
Sala de Leitura (Pavimento Inferior)	7,80	7,50	3,00	58,50	Alvenaria	Porcelanato	Pintura	Não	**3**	Paredes e Teto: Pintura. Piso: Porcelanato, aplicação de porcelanato padronizado. Porta: Revitalização de fechaduras, maçanetas e pintura. Caixilhose Gradil: Revitalização do sistema de abertura e fechamento, pintura e padronização de vidros. Reestruturação distribuição de energia elétrica. (Foto 282 A 288)

Sanitários										**Informações Complementares**		
	Comprimento (m)	Largura (m)	Pé Direito (m)	Área (m²)	Revestimento de Piso	Revestimento de Parede	Possui Forro? Se sim, qual tipo?	Observações	Nível de Comprometimento do Ambiente	Quant. Vasos Sanitários	Quant. Cubas e trocadores	Quant. Chuveiros
Sanitário Acessível (Térreo)	2,86	1,47	3,00	4,20	Cerâmica	Pintura + Cerâmica + Div. Granilite	Não	Paredes: Padronizar Revestimento. Teto: Pintura. Piso: Cerâmica, aplicação de porcelanato padronizado. Porta: Revitalização de fechaduras, maçanetas e pintura. Caixilhos: Revitalização do sistema de abertura e fechamento, pintura e padronização de vidros. Instalações Elétricas: Padronização luminárias e adequação dos circuitos elétricos (Instalação de Dsipositivos de Segurança). Instalações Hidráulicas: Padronização de ralos e metais. Acessibilidade: Adequar à Norma. (Foto 289 A 290)	**2**	1	1	0

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL												
Sanitário Acessível (Térreo)	2,86	1,47	3,00	4,20	Cerâmica	Pintura + Cerâmica + Div. Granilite	Não	Paredes: Padronizar Revestimento. Teto: Pintura. Piso: Cerâmica, aplicação de porcelanato padronizado. Porta: Revitalização de fechaduras, maçanetas e pintura. Caixilhos: Revitalização do sistema de abertura e fechamento, pintura e padronização de vidros. Instalações Elétricas: Padronização luminárias e adequação dos circuitos elétricos (Instalação de Dsipositivos de Segurança). Instalações Hidráulicas: Padronização de ralos e metais. Acessibilidade: Adequar à Norma. (Foto 289 A 290)	**2**	1	1	0
Sanitário Feminino (Térreo)	2,50	1,80	3,00	4,50	Porcelanato	Cerâmica	Não	Paredes: Azulejos em bom estado. Teto: Pintura. Piso: Porcelanato, padronizadar. Porta: Revitalização de fechaduras, maçanetas e pintura. Caixilhos: Revitalização do sistema de abertura e fechamento, pintura e padronização de vidros. Instalações Elétricas: Padronização luminárias. (Foto 295 A 298)	**2**			
Sanitário Masculino (Térreo)	2,10	0,95	3,00	2,00	Porcelanato	Cerâmica	Não	Paredes: Azulejos em bom estado. Teto: Pintura. Piso: Porcelanato, padronizadar. Porta: Revitalização de fechaduras, maçanetas e pintura. Caixilhos: Revitalização do sistema de abertura e fechamento, pintura e padronização de vidros. Instalações Elétricas: Padronização luminárias. (Foto 299 A 301)	**2**	1	1	0

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL

Sanitário Feminino Alunas (Pav. Inferior)	1,68	1,77	3,00	2,97	Cerâmica	Cerâmica	Sim (Parcial), Gesso.	Paredes: Padronizar Revestimento (feminino e masculino). Teto: Pintura. Piso: Cerâmica, aplicação de porcelanato padronizado. Portas: Revitalização de fechaduras, maçanetas e pintura. Caixilhos: Revitalização do sistema de abertura e fechamento, pintura e padronização de vidros. Instalações Hidráulicas: Padronizar metais, acabamentos e ralos. Instalações Elétricas: Padronização luminárias. (Foto 299 A 301)	**2**	1	1	0
Sanitário Masculino Alunos (Pav. Inferior)	1,68	1,77	3,00	2,97	Cerâmica	Cerâmica	Sim (Parcial), Gesso.	Paredes: Padronizar Revestimento (feminino e masculino). Teto: Pintura. Piso: Cerâmica, aplicação de porcelanato padronizado. Portas: Revitalização de fechaduras, maçanetas e pintura. Caixilhos: Revitalização do sistema de abertura e fechamento, pintura e padronização de vidros. Instalações Hidráulicas: Padronizar metais, acabamentos e ralos. Instalações Elétricas: Padronização luminárias. (Foto 307 A 312)	**2**			
Sanitário Funcionário (Pavimento Inferior)	6,95	3,60	3,00	25,02	Cerâmica	Cerâmica	Não	Paredes: Padronizar Revestimento. Teto: Pintura. Piso: Cerâmica, aplicação de porcelanato padronizado	**2**	1	1	0

Informações Adicionais

Ambiente	Necessário adequar ou implantar? (SIM / NÃO / NÃO SE APLICA)	Informações Complementares							Observações
Fechamento do lote (muro, cerca, gradil, vegetação)	SIM	Muro		Área (m²):	573,25	Gradil	Área (m²):	229,30	Fechamento com Muro + Gradil, perímetro projeto 229,30m
Estacionamento(s)	SIM	Área (m²)		226,56					
Playground (Sim ou Não)	SIM	Área (m²)		665,37					Playground piso emborrachado, e fração em solo natural
Tanque de Areia (Sim ou Não)	NÃO	Área Cúbica (m³)							
Calçadas (Sim ou Não?)	SIM								Necessidade de refazimento do piso cimentado no acesso de veículos
Serralherias (Portões, travas e outros)	SIM								Substituição de chapas de aço e ajsutes em dobradiças e trincos.
Alarmes e sensores (Sim ou Não?)	NÃO								

CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL			
Câmeras de segurança (Sim ou Não?)	SIM		
Rede de gás na testada? (Sim ou Não)	NÃO		
Observações Gerais:	**A unidade apresenta condições gerais de funcionamento, sem indícios de comprometimento estrutural relevante dos elementos principais, porém com necessidade significativa de manutenção corretiva, adequação normativa e padronização. Destacam-se desgaste e corrosão em esquadrias; pisos e revestimentos internos deteriorados ou sem padronização; recorrência de infiltrações e trincas localizadas; necessidade de substituição de telhas, revisão de lajes impermeabilizadas, calhas, rufos e tubos pluviais; inconformidades importantes nas instalações elétricas; inadequações em sanitários e acessibilidade; necessidade de revitalização geral de fachadas, muros e áreas externas; reforma do abrigo de GLP; adequação do SPDA; e regularização dos sistemas de prevenção e combate a incêndio, considerando a ausência de AVCB.**	

CAIXA

FICHA 4 - DIAGNÓSTICO DE ASPECTOS DE INFRAESTRUTURA PREDIAL DAS UNIDADES ESCOLARES

Item	Descrição dos Itens Avaliados	Necessidade de Intervenção	Observações
1. Infraestrutura da Escola			
Condições das fundações, pilares, vigas, lajes, cobertura, estruturas metálicas, paredes, esquadrias e pisos			
1.1	Fundações: verificar se há rachaduras, trincas, fissuras, desplacamentos ou quaisquer sinais de falhas na fundação que possam comprometer a estabilidade do prédio	NÃO	
1.2	Pilares: verificar se há rachaduras, trincas, fissuras, desplacamentos ou quaisquer sinais de falhas nos pilares que possam comprometer a estabilidade do prédio	NÃO	
1.3	Vigas: verificar se há rachaduras, trincas, fissuras, desplacamentos ou quaisquer sinais de falhas nas vigas que possam comprometer a estabilidade do prédio	NÃO	
1.4	Lajes: verificar se há rachaduras, trincas, fissuras, desplacamentos ou quaisquer sinais de falhas nas lajes que possam comprometer a estabilidade do prédio	NÃO	
1.5	Cobertura: verificar se há sinais de infiltração, vazamentos, telhas soltas ou outras falhas que possam causar danos à estrutura da escola	NÃO	
1.6	Estruturas metálicas: verificar se há sinais de problemas nas estruturas metálicas, como corrosão ou deformação	NÃO	
1.7	Paredes: verificar se há sinais de problemas nas paredes, como rachaduras, infiltrações ou umidade excessiva	NÃO	
1.8	Esquadrias: verificar se há problemas nas esquadrias, tais como falta de peças, corrosão, vidros quebrados e dificuldade de manuseio	SIM	Esquadrias com desgaste de componentes, presença de partes soltas ou danificadas, além de sinais de corrosão nos elementos metálicos. Também foram observadas dificuldades de manuseio na totalidade das janelas da escola, indicando a necessidade de revisão geral, regulagem, recuperação ou substituição de ferragens. Diante das condições verificadas, recomenda-se a realização de manutenção corretiva para assegurar o adequado funcionamento das esquadrias e evitar riscos aos usuários.
1.9	Pisos: verificar se há sinais de problemas nos pisos, como desníveis, rachaduras ou solturas de revestimento	SIM	Os revestimentos cerâmicos em geral, pisos e paredes, estão bastante desgastados, necessária reforma para substituição.

CAIXA

FICHA 4 - DIAGNÓSTICO DE ASPECTOS DE INFRAESTRUTURA PREDIAL DAS UNIDADES ESCOLARES

Item	Descrição dos Itens Avaliados	Necessidade de Intervenção	Observações
2. Instalações Elétricas e Hidráulicas			
	Condições das instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias		
2.1	Instalações elétricas: verificar se as instalações elétricas estão em conformidade com as normas de segurança, se há fios expostos, equipamentos com defeito ou outros problemas que possam representar risco de incêndio ou choque elétrico. verificar também se o quadro de energia está em bom estado e se as tomadas e interruptores estão funcionando corretamente	SIM	Os quadros elétricos apresentam inconformidades, identificação dos circuítos, calhas para organização dos cabos, "jumpers nas fases" (ausência de barramento de cobre ou tipo pente), ausência de dispositivos de segurança quando obrigatório (DR ou DPS), barramentos de terra e neutro, modernização dos disjuntores, instalação dos disjuntores sobre trilho, ausência de barreira física (partes vivas - barramentos - fases / neutro / terra). A montagem dos quadros de distribuição de iluminação e força devem atender aos requisitos preconizados pelas normas ABNT NBR 5410 / NBR IEC 61439 e a Norma Regulamentadora NR-10 (condições de Segurança para Serviços em Instalações Elétricas). A inobservância às normas potencializa os riscos de choque elétrico e incêndio, comprometendo o uso da instalação e da edificação com segurança.
2.2	Instalações hidráulicas: verificar se as instalações hidráulicas estão em bom estado, sem vazamentos, rachaduras ou outros problemas que possam prejudicar o funcionamento do sistema. verificar também se as torneiras, registros e outros componentes estão em bom estado e se o sistema de esgoto está funcionando corretamente	SIM	Padronizar metais sanitários. Principalmente no pavimento inferior em virtude da maior necessidade de reformas.
2.3	Instalações sanitárias: verificar se as instalações sanitárias estão em bom estado, sem vazamentos, rachaduras ou outros problemas que possam prejudicar o funcionamento do sistema. verificar também se as louças sanitárias, como vasos e pias, estão em bom estado e se os ralos estão desobstruídos	SIM	Padronizar ralos e grelhas coletoras, principalmente no pavimento inferior.
2.4	Reservatórios de água: verificar se os reservatórios de água estão em bom estado, sem vazamentos ou outros problemas que possam prejudicar o funcionament do sistema de abastecimento	NÃO	

CAIXA

FICHA 4 - DIAGNÓSTICO DE ASPECTOS DE INFRAESTRUTURA PREDIAL DAS UNIDADES ESCOLARES

Item	Descrição dos Itens Avaliados	Necessidade de Intervenção	Observações
3. Acessibilidade			
	Condições de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida		
3.1	Rampas de acesso: verificar se há rampas de acesso em bom estado e com inclinação adequada	SIM	Existe rampa para acessibilidade, porem precisam ser melhoradas, pintura de piso e muretas, pintura corrimãos e sinalização (Piso e Parede).
3.2	Elevadores: verificar se há elevadores em bom estado e se estão em conformidade com as normas de acessibilidade	NÃO	Elevador existente em pleno funcionamento.
3.3	Banheiros adaptados: verificar se há banheiros adaptados em bom estado e se estão em conformidade com as normas de acessibilidade	SIM	Os sanitários apresentam não conformidades com a NBR 9050:2020, como ausência da barra lateral/articulada, possível altura inadequada do vaso, obstrução e possível insuficiência do espaço de transferência, lavatório sem área livre inferior e com torneira não acessível, papeleira fora da faixa de alcance, piso possivelmente escorregadio, falta de sinalização e contraste, janela acima da faixa manual de alcance e ausência do botão de acionamento de emergência.
4. Condições de Habitabilidade			
	Condições de ventilação e iluminação natural e artificial e conforto térmico dos ambientes		
4.1	Condições gerais de habitabilidade e conforto térmico por setor (salas de aulas, outros ambientes pedagógicos, ambientes administrativos, cozinha e refeitório, etc.)	SIM	Os revestimentos cerâmicos em geral, pisos e paredes, estão bastante desgastados, necessária reforma para substituição.
5. Áreas Externas/Paisagismo			
	Condições de adequabilidade das áreas externas da escola		
5.1	Condições Gerais do Paisagismo na Unidade Educacional	não se aplica	
5.2	Drenagem: verificar se a drenagem da área externa da escola está funcionando corretamente, evitando acúmulo de água em dias de chuva	NÃO	
5.3	Pintura externa: verificar se a pintura externa da escola está em bom estado, sem descascamentos ou sinais de desgaste	SIM	Verificou-se a necessidade de regularização e pintura de todas as paredes da fachada

Profissional Responsável
Nome: Marineusa Sizue Ogusku Nakandakare
Cargo/função: Arquiteta
CREA/CAU: A20216-9

Responsável pela validação CAIXA
Nome: Decio de Souza Espindola
Cargo/função: Engenheiro Civil
CREA/CAU: 5062158870-SP

1 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Cód. Unidade	
092622	EMEF ARLINDO CAETANO FILHO, PROFESSOR

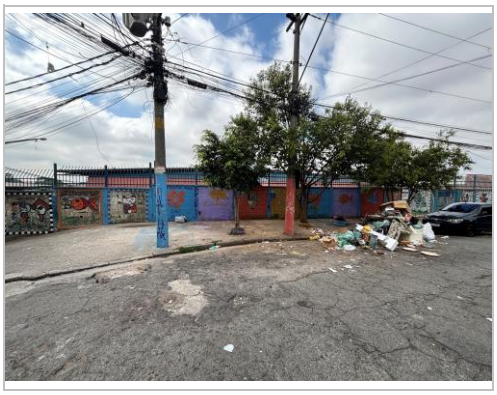


FOTO 01 EMEF Professor Arlindo Caetano Filho

Rua Palmeira Bacabá, 39 - Jardim Elba - São Paulo - SP



FOTO 02 EMEF Professor Arlindo Caetano Filho

Rua Palmeira Bacabá, 39 - Jardim Elba - São Paulo - SP



FOTO 03 EMEF Professor Arlindo Caetano Filho

Rua Palmeira Bacabá, 39 - Jardim Elba - São Paulo - SP



FOTO 04 EMEF Professor Arlindo Caetano Filho

Rua Palmeira Bacabá, 39 - Jardim Elba - São Paulo - SP

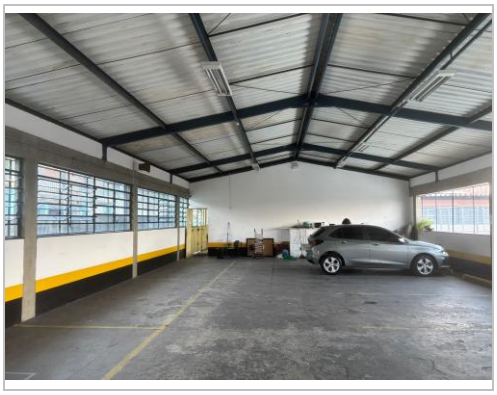


FOTO 05 Estacionamento Coberto - Térro

Paredes e Piso: Pintura das Paredes e Recuperação do Piso e Pintura.

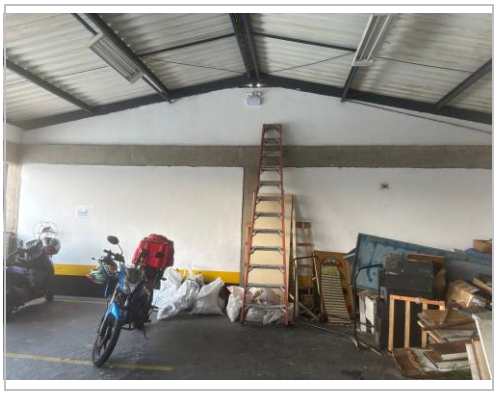


FOTO 06 Estacionamento Coberto - Térro

Cobertura: Pintira estrutura metálica.

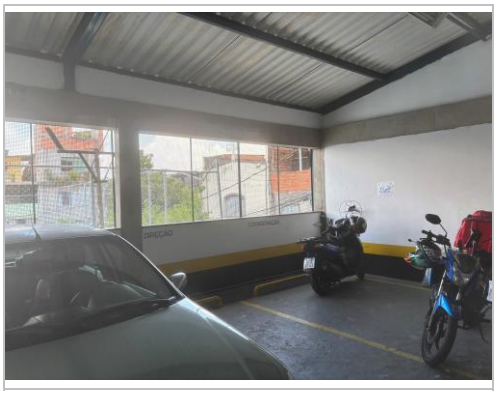


FOTO 07 Estacionamento Coberto - Térro

Cobertura: Pintira estrutura metálica.



FOTO 08 Hall de Entrada - Térreo

Paredes e Teto: Pintura das Paredes e Recuperação do Piso e Pintura. Caixilhos: Restauração sistema de abertura e fechamento, pintura e



FOTO 09 Hall de Entrada - Térreo

Piso: Granilite (Padronização). Possível limpeza e polimento.



FOTO 10 Hall de Entrada - Térreo

Teto: Restauração pintura.



FOTO 11 Hall de Entrada - Térreo

Teto: Restauração pintura.

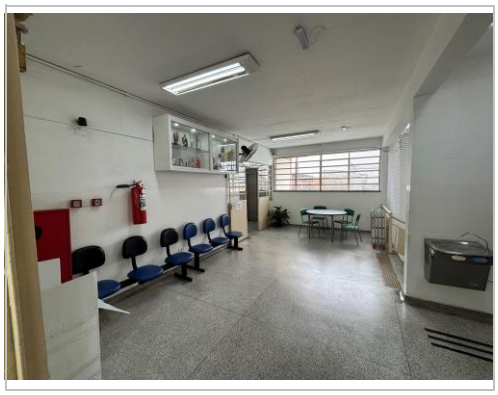


FOTO 12 Hall da Administração - Térreo

Paredes e Teto: Restauração da Pintura. Piso: Granilite (Padronização). Possível limpeza e polimento.

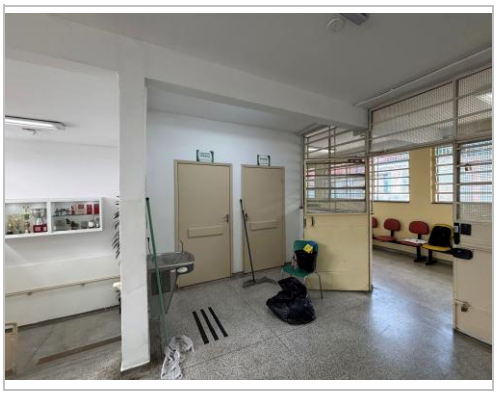


FOTO 13 Hall da Administração - Térreo

Porta Madeira e Aço: Pintura e Revisão de Maçanetas e Fechaduras. Caixilhos: Restauração sistema de abertura e fechamento, pintura e



FOTO 14 Hall da Administração - Térreo

Piso: Granilite (Padronização). Possível limpeza e polimento. Instalação de lixa antiderrapante.



FOTO 15 Hall da Administração - Térreo
Paredes: Revisão de vazamentos no banheiro e restauração da pintura.



FOTO 16 Hall da Administração - Térreo
Hidrantes: Revisão de Equipamentos de Combate a Incêndios (Mangueira, Chave Storz, Esquicho Regulável e Jato Sólido).



FOTO 17 Hall da Administração - Térreo
Hidrantes: Revisão de Equipamentos de Combate a Incêndios (Mangueira, Chave Storz, Esquicho Regulável e Jato Sólido).



FOTO 18 Hall da Administração - Térreo
Paredes e Teto: Restauração da Pintura. Piso: Granilite (Padronização). Possível limpeza e polimento.



FOTO 19 Hall da Administração - Térreo
Porta de Aço: Pintura e Revisão de Maçanetas e Fechaduras. Caixilhos: Restauração sistema de abertura e fechamento, pintura e



FOTO 20 Hall da Administração - Térreo
Paredes e Teto: Restauração da Pintura. Piso: Granilite (Padronização). Possível limpeza e polimento.

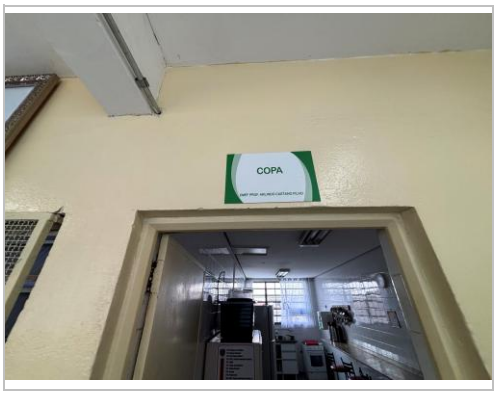


FOTO 21 Refeitório Funcionários - Térreo
Paredes: Azuleijo. Teto: Forro de Gesso.



FOTO 22 Refeitório Funcionários - Térreo
Piso: Granilite (Padronização). Possível limpeza e polimento.



FOTO 23 Refeitório Funcionários - Térreo
Teto: Revistalização do forro de gesso e pintura.



FOTO 24 Refeitório Funcionários - Térreo
Caixilhos: Restauração sistema de abertura e fechamento, pintura e padronização dos vidros. Instalações Elétricas: Revisão do Sistema de



FOTO 25 Refeitório Funcionários - Térreo
Reforma do Sistema de Iluminação Externa (Propositura de Técnica Diferente)



FOTO 26 Refeitório Funcionários - Térreo
Teto: Revistalização do forro de gesso e pintura.



FOTO 27 Refeitório Funcionários - Térreo
Teto: Revistalização do forro de gesso e pintura. Diagóstico e correção da origem da umidade.



FOTO 28 Refeitório Funcionários - Térreo
Paredes: Substituição de Azuleijos (Peça). Instalações Elétricas: Revisão do Sistema de Distribuição e Padronização de Tomadas e



FOTO 29 Refeitório Funcionários - Térreo
Paredes: Substituição de Azuleijos (Peça). Instalações Elétricas: Revisão do Sistema de Distribuição e Padronização de Tomadas e



FOTO 30 Secretaria - Térreo
Identificação



FOTO 31 Secretaria - Térreo
Piso: Porcelanato (Padrão Madeira) - Padronização

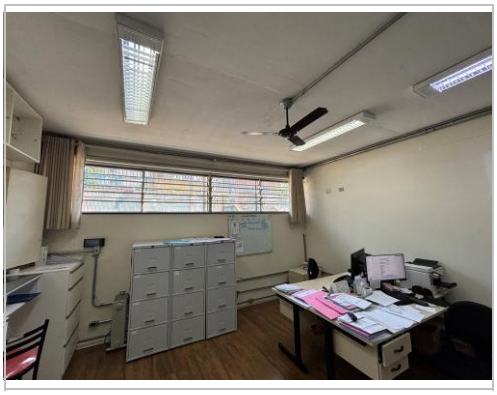


FOTO 32 Secretaria - Térreo
Paredes e Teto: Restauração Pintura. Teto: Massa corrida para eliminação de imperfeições. Caixilhos: Restauração sistema de

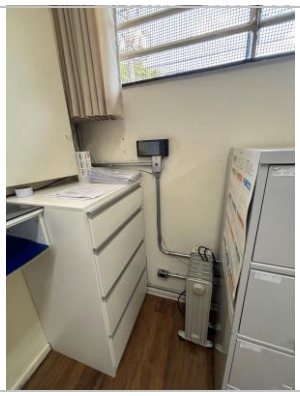


FOTO 33 Secretaria - Térreo
Instalações Eletricas: Revisão sistema de distribuição e conduletes. Padronização Tomadas e Interruptores.



FOTO 34 Secretaria - Térreo
Instalações Eletricas: Revisão sistema de distribuição e conduletes. Padronização Tomadas e Interruptores.



FOTO 35 Secretaria - Térreo
Instalações Eletricas: Revisão sistema de distribuição e conduletes. Padronização Tomadas e Interruptores.



FOTO 36 Secretaria - Térreo
Instalações Eletricas: Revisão sistema de distribuição e conduletes. Padronização Tomadas e Interruptores.



FOTO 37 Secretaria - Térreo
Sistema de Monitoramento



FOTO 38 Sala Assistente de Direção - Térreo.
Identificação

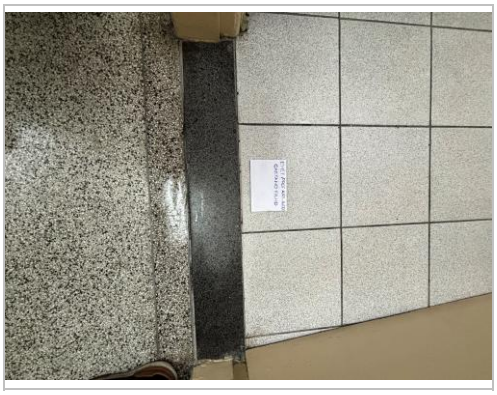


FOTO 39 Sala Assistente de Direção - Térreo.
Piso: Padronização - Porcelanato com grau de dureza adequada.



FOTO 40 Sala Assistente de Direção - Térreo.
Piso: Padronização - Porcelanato com grau de dureza adequado.



FOTO 41 Sala Assistente de Direção - Térreo.
Paredes e Teto: Restauração Pintura. Caixilhos: Restauração sistema de abertura e fechamento, pintura e padronização dos vidros.

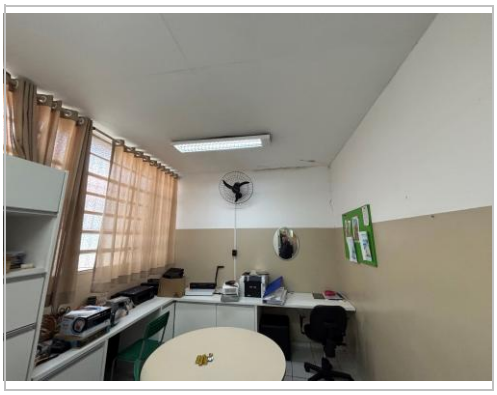


FOTO 42 Sala Assistente de Direção - Térreo.
Paredes e Teto: Restauração Pintura. Caixilhos: Restauração sistema de abertura e fechamento, pintura e padronização dos vidros.



FOTO 43 Sala Assistente de Direção - Térreo.
Paredes: Recuperação de Trinas de infiltrações. Diagóstico e correção da origem da umidade.



FOTO 44 Sala Assistente de Direção - Térreo.
Paredes: Recuperação de Trinas de infiltrações. Diagóstico e correção da origem da umidade.



FOTO 45 Sala Assistente de Direção - Térreo.
Drywall: Correção da parede divisória. Instalações Elétricas: Redistribuição das calhas de iluminação.



FOTO 46 Diretoria - Térreo
Piso: Porcelanato (Padrão Madeira) - Padronização

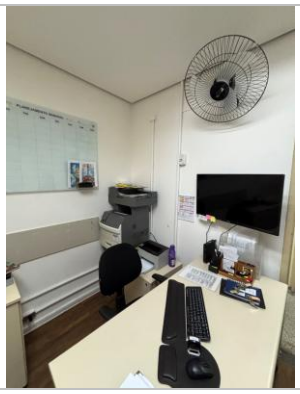


FOTO 47 Diretoria - Térreo
Paredes e Forro: Restauração Pintura. Caixilhos: Restauração sistema de abertura e fechamento, pintura e padronização dos vidros.



FOTO 48 Diretoria - Térreo
Paredes e Forro: Restauração Pintura. Caixilhos: Restauração sistema de abertura e fechamento, pintura e padronização dos vidros.



FOTO 49 Diretoria - Térreo
Paredes e Forro: Restauração Pintura.



FOTO 50 Coordenação Pedagógica - Térreo.
Identificação



FOTO 51 Coordenação Pedagógica - Térreo.
Piso: Paviflex - Porcelanato com grau de dureza adequada.

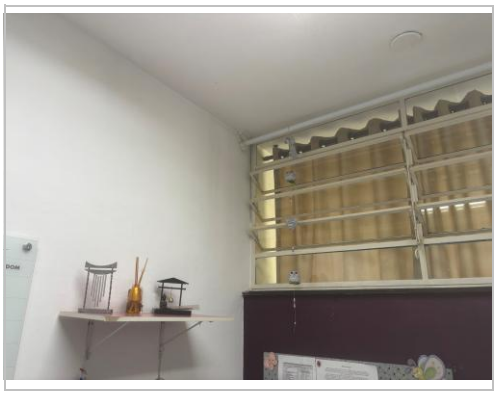


FOTO 52 Coordenação Pedagógica - Térreo.
Paredes e Teto: Pintura. Restauração sistema de abertura e fechamento, pintura e padronização dos vidros.



FOTO 53 Coordenação Pedagógica - Térreo.
Paredes e Teto: Restauração Pintura. Caixilho: Restauração sistema de abertura e fechamento, pintura e padronização dos vidros.

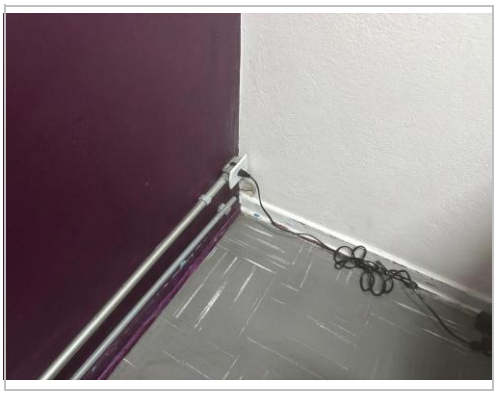


FOTO 54 Coordenação Pedagógica - Térreo.
Instalações Elétrica: Revisão de Tomadas e Interruptores (Padronização).



FOTO 55 Coordenação Pedagógica - Térreo.
Instalações Elétrica: Revisão de Tomadas e Interruptores (Padronização).



FOTO 56 Coordenação Pedagógica - Térreo.
Instalações Elétricas: Colocação de Acabamento Caixa Sextavada.



FOTO 57 Coordenação Pedagógica - Térreo.
Instalações Elétricas: Colocação de Acabamento Caixa Sextavada.

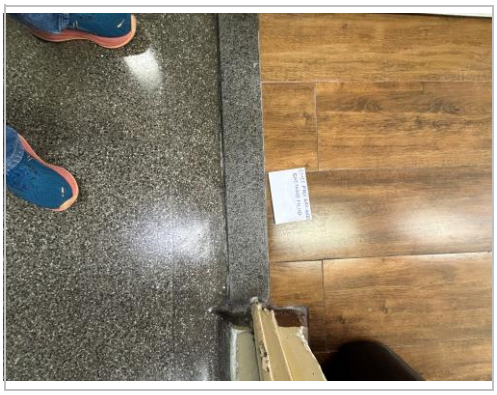


FOTO 58 Sala dos Professores - Térreo.
Piso: Porcelanato (Padrão Madeira) - Padronização



FOTO 59 Sala dos Professores - Térreo.
Piso: Porcelanato (Padrão Madeira) - Padronização. Porta: Restauração e Pintura, Revisão maçaneta e fechaduras.

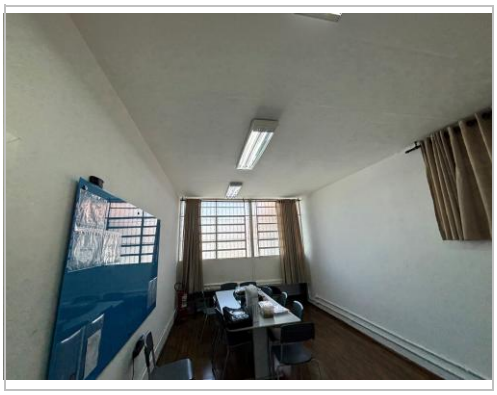


FOTO 60 Sala dos Professores - Térreo.
Paredes e Teto: Restauração Pintura. Caixilho: Restauração sistema de abertura e fechamento, pintura e padronização dos vidros. Portas:

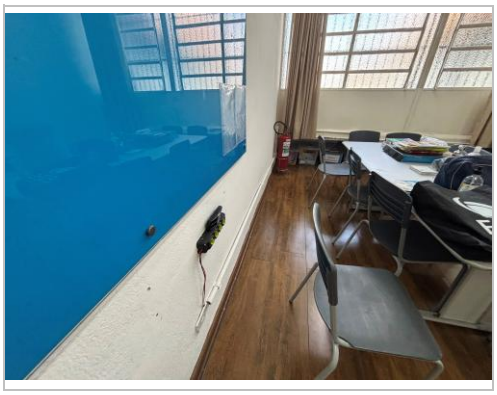


FOTO 61 Sala dos Professores - Térreo.
Instalação Elétrica: Revisão do Sistema de distribuição de energia e padronizar tomadas.



FOTO 62 Sala dos Professores - Térreo.
Instalação Elétrica: Revisão do Sistema de distribuição de energia e padronizar tomadas.

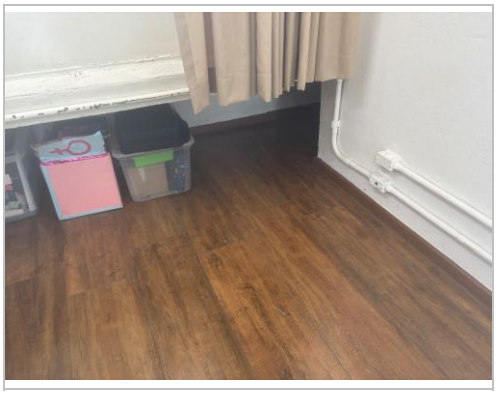


FOTO 63 Sala dos Professores - Térreo.
Piso: Porcelanato (Padrão Madeira) - Padronização. Estabelecer padrão para rodapé.



FOTO 64 Sala de Recuperação Paralela (Térreo)
Indentificação.



FOTO 65 Sala de Recuperação Paralela (Térreo)

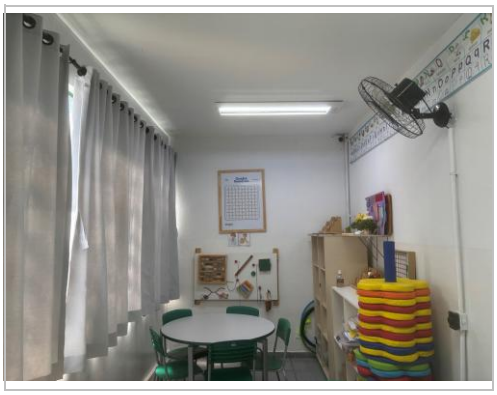


FOTO 66 Sala de Recuperação Paralela (Térreo)

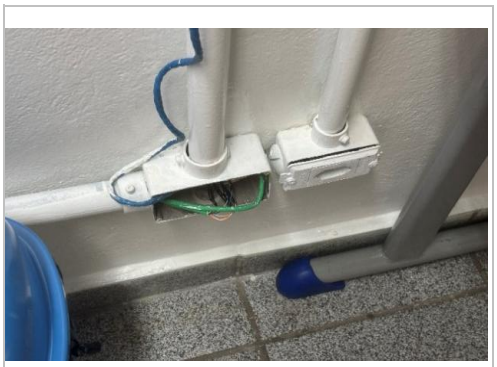


FOTO 67 Sala de Recuperação Paralela (Térreo)

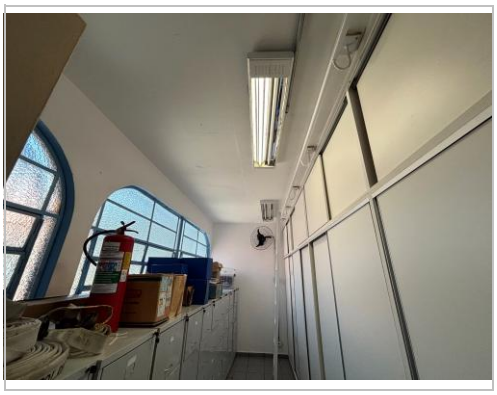


FOTO 68 Sala Arquivo (Térreo)



FOTO 69 Sala Arquivo (Térreo)



FOTO 70 Sala Arquivo (Térreo)



FOTO 71 Sala Arquivo (Térreo)



FOTO 72 Páteo Interno - Térreo
Paredes e Teto: Pintura. Piso: Granilite (Padronização). Piso: Granilite (Padronização). Instalação de lixa antiderrapante. Execução de nova



FOTO 73 Páteo Interno - Térreo
Piso: Granilite (Padronização). Possível limpeza e polimento. Instalação de lixa antiderrapante. Execução de nova da sinalização de



FOTO 74 Páteo Interno - Térreo
Hidrantes: Revisão de Equipamentos de Combate a Incêndios (Mangueira, Chave Storz, Esquicho Regulável e Jato Sólido).



FOTO 75 Páteo Interno - Térreo
Cobertura: Telhas Termo acústicas. Pintura estrutura metálica. Substituição da Telhas Translúcidas e dela de "isolamento contra



FOTO 76 Páteo Interno - Térreo
Cobertura: Telhas Termo acústicas. Pintura estrutura metálica. Substituição da Telhas Translúcidas e dela de "isolamento contra



FOTO 77 Páteo Interno - Térreo
Guarda-corpo: Pintura. Corrimãos: Pintura.

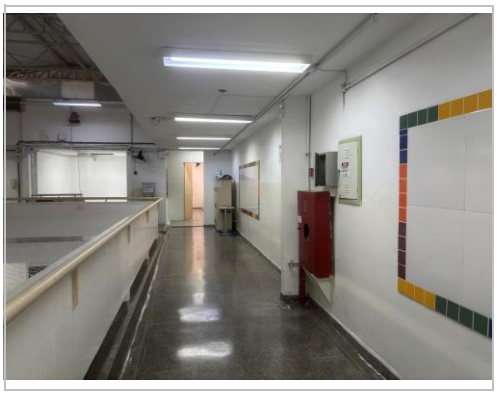


FOTO 78 Páteo Interno - Térreo
Paredes e Teto: Pintura. Piso: Granilite (Padronização). Piso: Granilite (Padronização). Instalação de lixa antiderrapante. Execução de nova



FOTO 79 Páteo Interno - Térreo
Hidrantes: Revisão de Equipamentos de Combate a Incêndios (Mangueira, Chave Storz, Esquicho Regulável e Jato Sólido).



FOTO 80 Páteo Interno - Térreo
Intsalações Elétricas: Restruturas Sistema de Distribuição de Energia Elétrica.

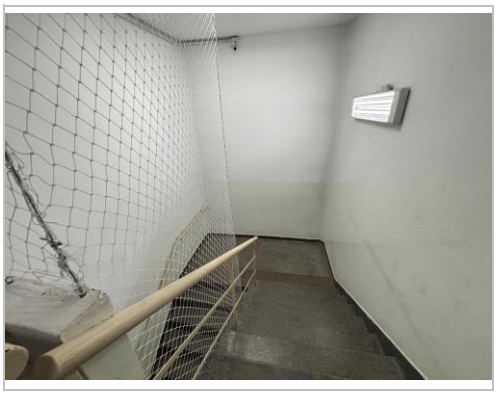


FOTO 81
Paredes e Teto: Pintura. Piso: Granilite (Padronização). Possível limpeza e polimento. Instalação de lixa antiderrapante. Execução de

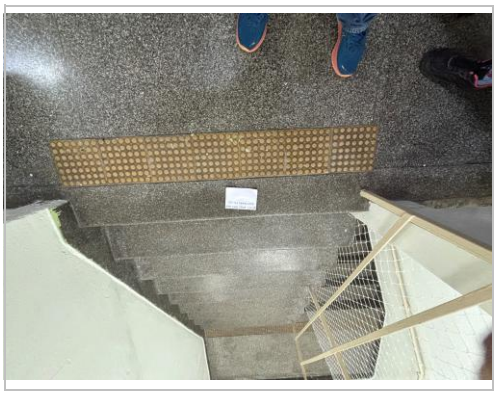


FOTO 82 Escadas Páteo Interno
Paredes e Teto: Pintura. Piso: Granilite (Padronização). Possível limpeza e polimento. Instalação de lixa antiderrapante. Execução de



FOTO 83 Refeitório Páteo Interno - Pav. Inferior
Reforma Geral. Paredes: Substituição dos azulejos e revitalização pintura. Teto: Revitalizar Pintura. Piso: Cerâmico - Padronização

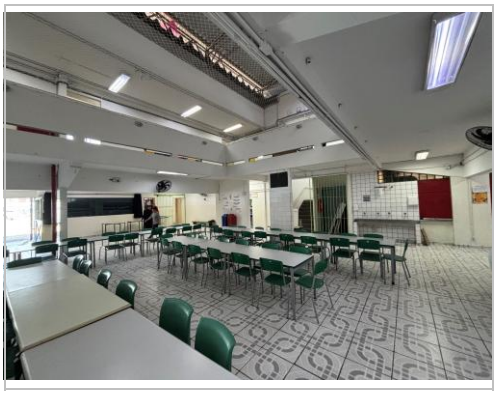


FOTO 84 Refeitório Páteo Interno - Pav. Inferior
Reforma Geral. Paredes: Substituição dos azulejos e revitalização pintura. Teto: Revitalizar Pintura. Piso: Cerâmico - Padronização



FOTO 85 Refeitório Páteo Interno - Pav. Inferior
Refeitório: Reforma Geral



FOTO 86 Refeitório Páteo Interno - Pav. Inferior
Intslações Hidráulica: Readequação das prumadas.



FOTO 87 Refeitório Páteo Interno - Pav. Inferior

Piso: Padronização. Intslações Hidráulica: Revisão e Troca de Grelhas.



FOTO 88 Refeitório Páteo Interno - Pav. Inferior

Piso: Padronização. Intslações Hidráulica: Revisão e Troca de Grelhas.



FOTO 89 Refeitório Páteo Interno - Pav. Inferior

Intslações Elétrica: Revisão sistema de distribuição de energia (Eletrodutos e Conduletes), padronização de tomadas, interruptores e



FOTO 90 Dep. Instrumentos Musicais - Pav. Inferior

Piso: Cerâmico - Padronização (Porcelanato com grau de dureza adequada).

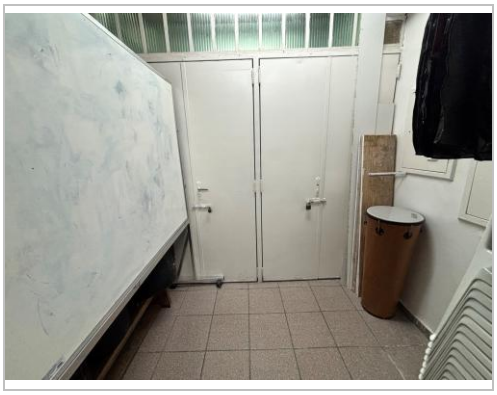


FOTO 91 Dep. Instrumentos Musicais - Pav. Inferior

Paredes e Teto: Revitalização Pintura. Portas: Revitalização pintura e revisão de trincos, maçanetas e fechaduras.



FOTO 92 Dep. Instrumentos Musicais - Pav. Inferior

Paredes e Teto: Revitalização Pintura. Portas: Revitalização pintura e revisão de trincos, maçanetas e fechaduras.



FOTO 93 Dep. Instrumentos Musicais - Pav. Inferior

Instalações elétricas: Pequenos ajustes.



FOTO 94 Dep. Instrumentos Musicais - Pav. Inferior

Instalações elétricas: Pequenos ajustes.



FOTO 95 Depósito Sob Escada - Pavimento Inferior

Reforma Geral: Extenção do Refeitório.



FOTO 96 Depósito Sob Escada - Pavimento Inferior

Grades: Retirada acesso ao Hidrantes. Hidrantes: Revisão de Equipamentos de Combate a Incêndios (Mangueira, Chave Storz,



FOTO 97 Depósito Sob Escada - Pavimento Inferior

Hidrantes: Revisão de Equipamentos de Combate a Incêndios (Mangueira, Chave Storz, Esquicho Regulável e Jato Sólido).



FOTO 98 Sala Educação Física - Pavimento Inferior

Identificação.



FOTO 99 Sala Educação Física - Pavimento Inferior

Piso: Cerâmico - Padronização (Porcelanato com grau de dureza adequada).

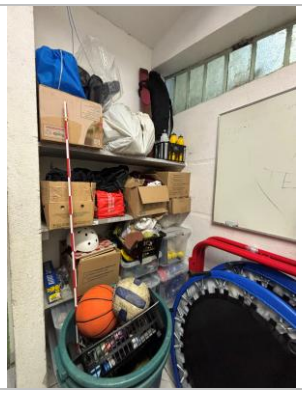


FOTO 100 Sala Educação Física - Pavimento Inferior

Paredes e Teto: Pintura. Piso: Cerâmico - Padronização (Porcelanato com grau de dureza adequada). Portas: Pintura e Revitalização de



FOTO 101 Sala Educação Física - Pavimento Inferior

Paredes e Teto: Pintura. Piso: Cerâmico - Padronização (Porcelanato com grau de dureza adequada). Portas: Pintura e Revitalização de



FOTO 102 Área de Serviço - Pavimento Inferior

Identificação.



FOTO 103 Área de Serviço - Pavimento Inferior
Piso: Cerâmico - Padronização (Porcelanato com grau de dureza adequada).

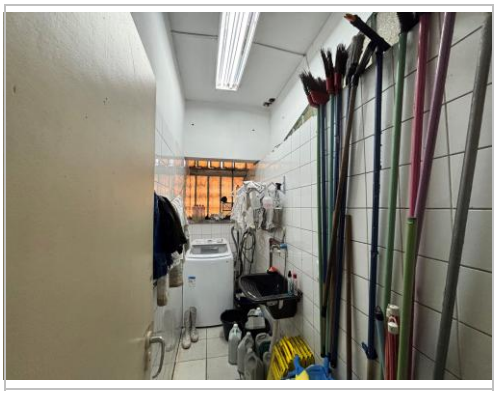


FOTO 104 Área de Serviço - Pavimento Inferior
Reforma Geral. Paredes: Substituição dos azulejos e revitalização pintura. Teto: Revitalizar Pintura. Piso: Cerâmico - Padronização

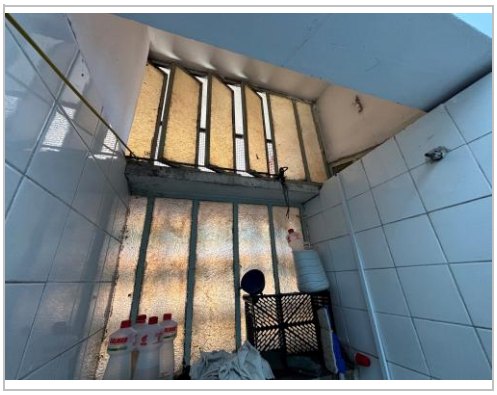


FOTO 105 Área de Serviço - Pavimento Inferior
Reforma Geral. Paredes: Substituição dos azulejos e revitalização pintura. Teto: Revitalizar Pintura. Piso: Cerâmico - Padronização

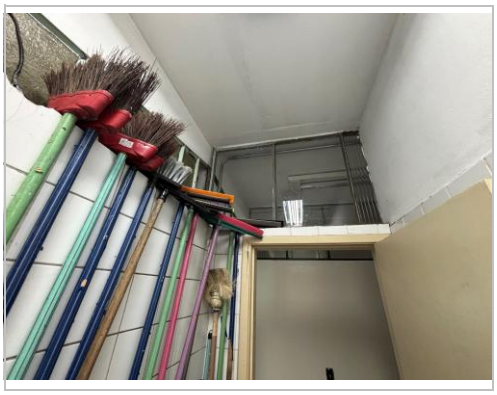


FOTO 106 Área de Serviço - Pavimento Inferior
Porta: Pintura e Revistalização de maçaneta e fechadura. Caixilho: Pintura e colocação de vidros novos.



FOTO 107 Vestiário Funcionários - Pavimento Inferior
Piso: Cerâmico - Padronização (Porcelanato com grau de dureza adequada).



FOTO 108 Vestiário Funcionários - Pavimento Inferior
Reforma Geral. Paredes: Substituição dos azulejos e revitalização pintura. Teto: Revitalizar Pintura. Piso: Cerâmico - Padronização



FOTO 109 Vestiário Funcionários - Pavimento Inferior
Porta: Pintura e Revistalização de maçaneta e fechadura. Colocação de guarnições e pintura.

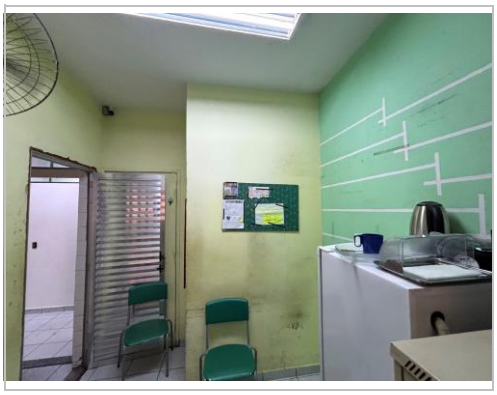


FOTO 110 Vestiário Funcionários - Pavimento Inferior
Reforma Geral. Paredes: Revitalização pintura. Teto: Revitalizar Pintura. Piso: Cerâmico - Padronização (Porcelanato com grau de



FOTO 111 Vestiário Funcionários - Pavimento Inferior
Caixilho e Grade: Pintura, revitalização do sistema de abertura e colocação de vidros novos.



FOTO 112 Vestiário Funcionários - Pavimento Inferior
Porta Aluminio: Revistalização de maçaneta e fechadura. Colocação de guarnições.

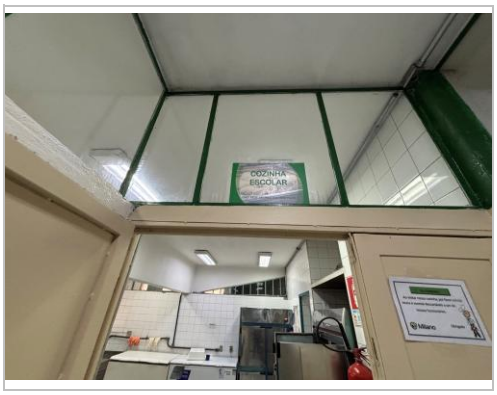


FOTO 113 Cozinha - Pavimento Inferior
Identificação.



FOTO 114 Cozinha - Pavimento Inferior
Revitalização completa das instalações: Revestimentos (Pisos e Paredes), Revisão e pintura caixilhos (Portas e Janelas). Instalações



FOTO 115 Cozinha - Pavimento Inferior
Revitalização completa das instalações: Revestimentos (Pisos e Paredes), Revisão e pintura caixilhos (Portas e Janelas). Instalações

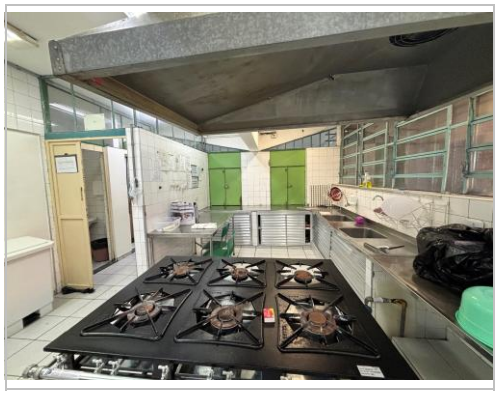


FOTO 116 Cozinha - Pavimento Inferior
Revitalização completa das instalações: Revestimentos (Pisos e Paredes), Revisão e pintura caixilhos (Portas e Janelas). Instalações



FOTO 117 Cozinha - Pavimento Inferior
Revitalização completa das instalações: Revestimentos (Pisos e Paredes), Revisão e pintura caixilhos (Portas e Janelas). Instalações

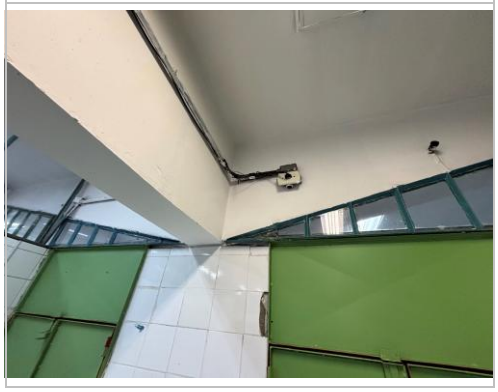


FOTO 118 Cozinha - Pavimento Inferior
Revitalização completa das instalações: Revestimentos (Pisos e Paredes), Revisão e pintura caixilhos (Portas e Janelas). Instalações



FOTO 119 Cozinha - Pavimento Inferior
Revitalização completa das instalações: Revestimentos (Pisos e Paredes), Revisão e pintura caixilhos (Portas e Janelas). Instalações



FOTO 120 Despensa / Cozinha - Pavimento Inferior
Revitalização completa das instalações: Revestimentos (Pisos e Paredes), Revisão e pintura caixilhos (Portas e Janelas). Instalações



FOTO 121 Despensa / Cozinha - Pavimento Inferior
Revitalização completa das instalações: Revestimentos (Pisos e Paredes), Revisão e pintura caixilhos (Portas e Janelas). Instalações



FOTO 122 Despensa / Cozinha - Pavimento Inferior
Revitalização completa das instalações: Revestimentos (Pisos e Paredes), Revisão e pintura caixilhos (Portas e Janelas). Instalações



FOTO 123 Despensa / Cozinha - Pavimento Inferior
Revitalização completa das instalações: Revestimentos (Pisos e Paredes), Revisão e pintura caixilhos (Portas e Janelas). Instalações



FOTO 124 Despensa / Cozinha - Pavimento Inferior
Revitalização completa das instalações: Revestimentos (Pisos e Paredes), Revisão e pintura caixilhos (Portas e Janelas). Instalações

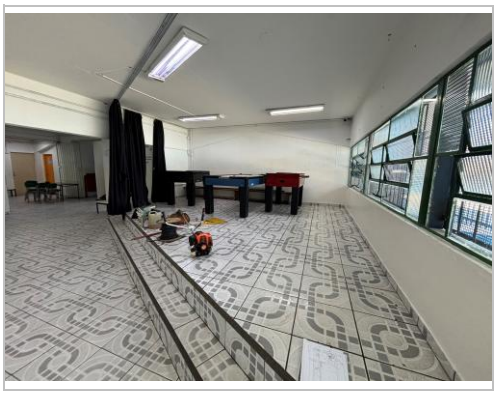


FOTO 125 Palco - Pavimento Inferior
Reforma Geral: Extenção do Refeitório.

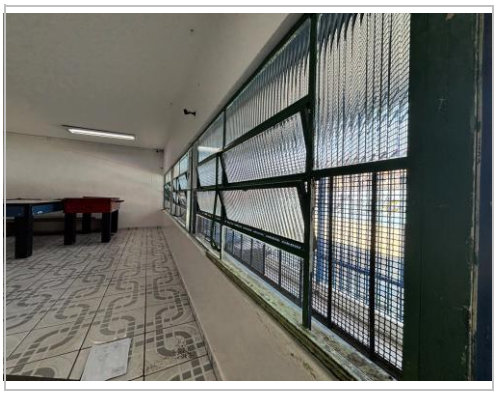


FOTO 126 Palco - Pavimento Inferior
Caixilho e Grade: Pintura, revitalização do sistema de abertura e colocação de vidros novos.



FOTO 127 Dep. Ed. Física Externo - Pavimento Inferior
Identificação.



FOTO 128 Dep. Ed. Física Externo - Pavimento Inferior
Piso: Granilite - Padronização (Porcelanato com grau de dureza adequada).

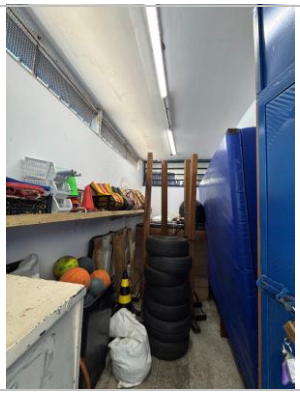


FOTO 129 Dep. Ed. Física Externo - Pavimento Inferior
Paredes e Teto: Revitalização Pintura. Piso: Granilite - Padronização (Porcelanato com grau de dureza adequada). Porta: Pintura e

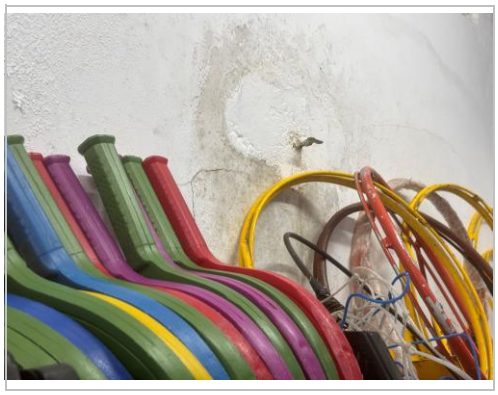


FOTO 130 Dep. Ed. Física Externo - Pavimento Inferior
Paredes: Corrigir Infiltração. Revitalização Pintura.



FOTO 131 Depósito Material Didático - Pav. Inferior
Identificação.



FOTO 132 Depósito Material Didático - Pav. Inferior
Piso: Cerâmico - Padronização (Porcelanato com grau de dureza adequada).



FOTO 133 Depósito Material Didático - Pav. Inferior
Paredes e Teto: Revitalização Pintura. Piso: Granilite (Padronização). Piso: Cerâmico - Padronização (Porcelanato com grau de dureza



FOTO 134 Depósito Material Didático - Pav. Inferior
Teto: Recuperação e pintura - Emassamento. Diagóstico e correção da origem da umidade.



FOTO 135 Dep. Material Pedagógico - Pav. Inferior
Identificação.



FOTO 136 Dep. Material Pedagógico - Pav. Inferior
Piso: Cerâmico - Padronização (Porcelanato com grau de dureza adequada).

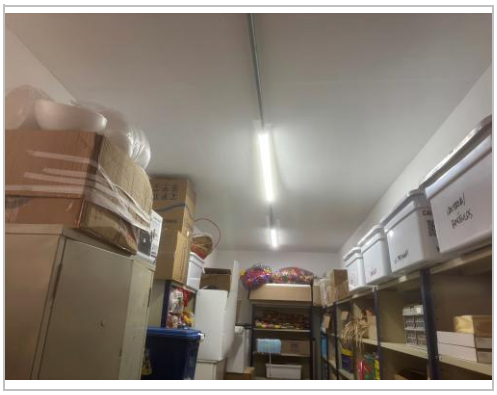


FOTO 137 Dep. Material Pedagógico - Pav. Inferior
Paredes e Teto: Restauração Pintura. Caixilhos e Grades: Restauração sistema de abertura e fechamento, pintura e padronização dos vidros.



FOTO 138 Dep. Material Pedagógico - Pav. Inferior
Paredes: Correção de trincas e revitalização da pintura. Execução de reforço (contraverga).



FOTO 139 Dep. Material Pedagógico - Pav. Inferior
Paredes: Correção de trincas e revitalização da pintura.
Descascamento do revestimento, verificação da causa, reforço e

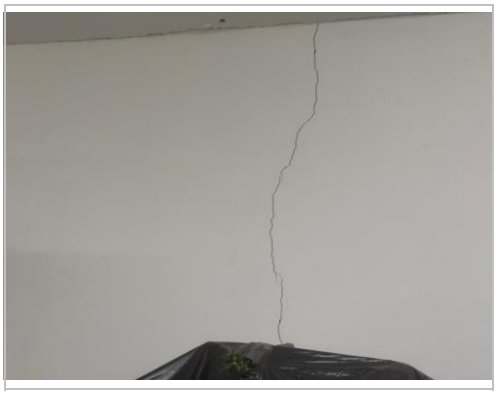


FOTO 140 Dep. Material Pedagógico - Pav. Inferior
Paredes: Correção de trincas e revitalização da pintura.
Descascamento do revestimento, verificação da causa, reforço e



FOTO 141 Dep. Material Pedagógico - Pav. Inferior
Paredes: Correção de trincas e revitalização da pintura.
Descascamento do revestimento, verificação da causa, reforço e



FOTO 142 Almoxarifado - Pavimento Inferior.
Identificação.



FOTO 143 Almoxarifado - Pavimento Inferior.
Piso: Granilite (Padronização). Possível limpeza e polimento.



FOTO 144 Almoxarifado - Pavimento Inferior.
Paredes e Teto: Restauração Pintura. Teto: Correção de Infiltração. Caixilhos: Restauração sistema de abertura e fechamento, pintura e

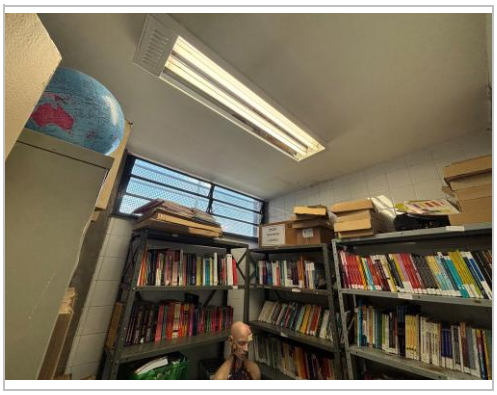


FOTO 145 Almoxarifado - Pavimento Inferior.
Teto: Investigação origem infiltração, correção e revitalização da pintura.



FOTO 146 Almoxarifado - Pavimento Inferior.
Teto: Investigação origem infiltração, correção e revitalização da pintura.



FOTO 147 Arquivo - Pavimento Inferior.
Piso: Granilite (Padronização). Possível limpeza e polimento.

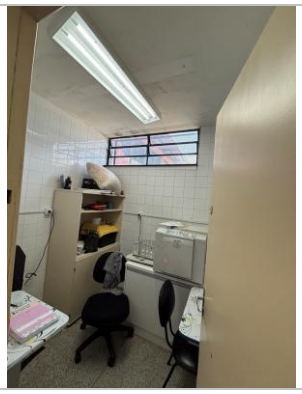


FOTO 148 Arquivo - Pavimento Inferior.
Paredes: Substituição do rvestimento cerâmico, ou substituição das peças danificadas. Teto: Restauração Pintura. Caixilhos e Grade:

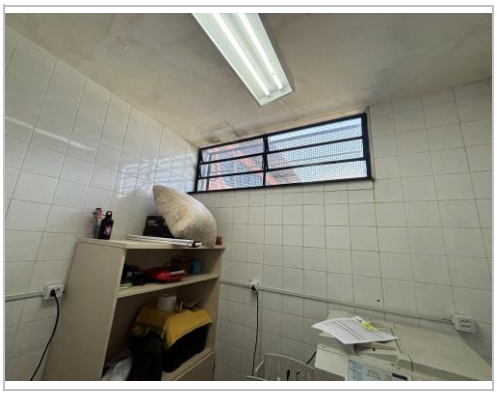


FOTO 149 Arquivo - Pavimento Inferior.
Instalações Elétricas: Padronização do sistema de distribuição de energia (condulete / eletroduto galvanizado). Com a substituição do



FOTO 150 Arquivo - Pavimento Inferior.
Parede: Remover trecho do revestimento, estudar origem da patologia e recompor.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF ARLINDO CAETANO FILHO, PROFESSOR

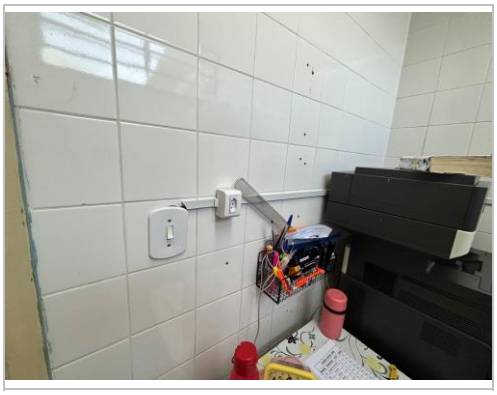


FOTO 151 Sala 05 (Segundo Piso)
Instalações Elétricas: Padronização do sistema de distribuição de energia (condulete / eletroduto galvanizado). Com a substituição do



FOTO 152 Sala 04 (Segundo Piso)
Instalações Elétricas: Padronização do sistema de distribuição de energia (condulete / eletroduto galvanizado). Com a substituição do



FOTO 153 Entrada de Alunos - Pavimento Inferior
Paredes: Restauração da Pintura Externa. Indícios de umidade, demolir, impermeabilizar e recompor revestimento (Calhas de



FOTO 154 Entrada de Alunos - Pavimento Inferior
Intalações Hidráulicas: Revisão do sistema de drenagem.

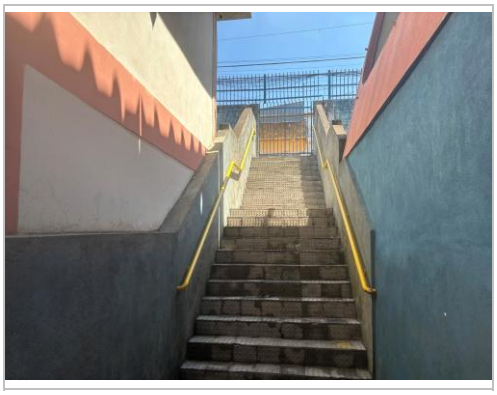


FOTO 155 Entrada de Alunos - Pavimento Inferior
Piso: Susbistituição do piso antiderrapante (piso desgastado).
Corrimãos: Revitalização Pintura.



FOTO 156 Entrada de Alunos - Pavimento Inferior
Paredes: Restauração da Pintura Externa.



FOTO 157 Entrada de Alunos - Pavimento Inferior
Porta de Ferro: Restaurar porta, batentes, maçanetas e fechadura.
Revitalização da pintura (com aplicação de primer).



FOTO 158 Entrada de Alunos - Pavimento Inferior
Porta de Ferro: Restaurar porta, batentes, maçanetas e fechadura.
Revitalização da pintura (com aplicação de primer).



FOTO 159 Depósito Sob Escada - Pav. Inferior (Adm)

Identificação.



FOTO 160 Depósito Sob Escada - Pav. Inferior (Adm)

Piso: Granilite (Padronização). Possível limpeza e polimento.

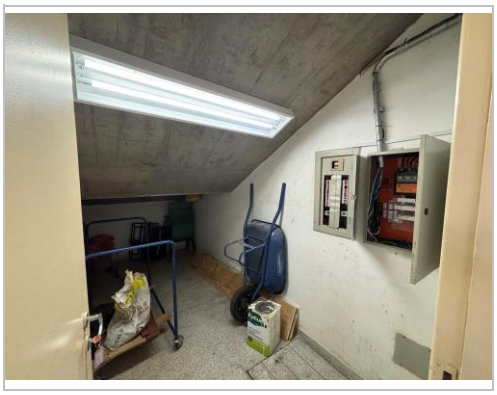


FOTO 161 Depósito Sob Escada - Pav. Inferior (Adm)

Paredes: Restauração da Pintura. Instações Elétricas: Remanejamento de eletrodutos.



FOTO 162 Depósito - Pavimento Inferior (Adm)

Piso: Granilite (Padronização). Em obras.



FOTO 163 Depósito - Pavimento Inferior (Adm)

Piso: Granilite (Padronização). Em obras.

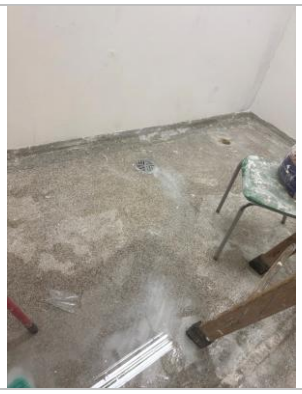


FOTO 164 Depósito - Pavimento Inferior (Adm)

Piso: Granilite (Padronização). Em obras.

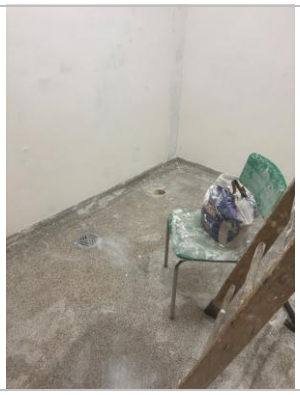


FOTO 165 Depósito - Pavimento Inferior (Adm)

Pardes e Teto: Em obras.



FOTO 166 Circulação - Pavimento Inferior.

Paredes e Teto: Restauração Pintura. Portass: Revitalização pintura, substituição maçametas e fechaduras.



FOTO 167 Circulação - Pavimento Inferior.

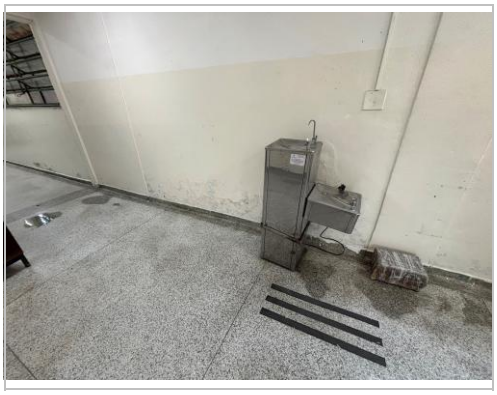


FOTO 168 Circulação - Pavimento Inferior.
Paredes: Muitos sinais de umidade. Patologia de difícil correção. Demolição do revestimento externo, impermeabilização e execução



FOTO 169 Circulação - Pavimento Inferior.
Paredes: Muitos sinais de umidade. Patologia de difícil correção. Demolição do revestimento externo, impermeabilização e execução



FOTO 170 Circulação - Pavimento Inferior.
Caixilho: Pintura, Revitalização de Sistema de Abertura e Padronização dos Vidros. Grades de Proteção: Revitalização e Pintura.



FOTO 171 Circulação - Pavimento Inferior.
Paredes: Muitos sinais de umidade. Patologia de difícil correção. Demolição do revestimento externo, impermeabilização e execução



FOTO 172 Circulação - Pavimento Inferior.
Paredes: Revisão inclinação e calafetação dos peitoris. Revitalização pintura.



FOTO 173 Externo: Páteo e Circulação - Pav. Inferior.
Paredes: Restauração da Pintura Externa. Piso: Granilite (Padronização). Possível limpeza e polimento.



FOTO 174 Externo: Páteo e Circulação - Pav. Inferior.
Piso Páteo Externo: Restauração da Pintura Externa. Instalações Hidráulicas: Verificação do sistema de drenagem.



FOTO 175 Externo: Páteo e Circulação - Pav. Inferior.
Paredes: Restauração da Pintura Externa. Piso Páteo Externo: Restauração da Pintura Externa. Gradil: Revitalização e pintura.



FOTO 176 Externo: Páteo e Circulação - Pav. Inferior.
Paredes: Restauração das pinturas artisticas (Grafite).



FOTO 177 Externo: Páteo e Circulação - Pav. Inferior.
Paredes: Restauração da Pintura Externa. Piso: Recomposição do piso cimentado (Demolição e recosntrução).

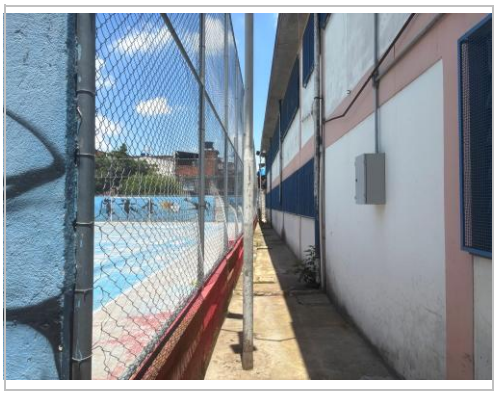


FOTO 178 Externo: Páteo e Circulação - Pav. Inferior.
Paredes: Restauração da Pintura Externa. Mureta: Revitalização da pintura. Piso: Recomposição do piso cimentado (Demolição e



FOTO 179 Externo: Páteo e Circulação - Pav. Inferior.
Paredes: Restauração da Pintura Externa. Mureta: Revitalização da pintura. Piso: Recomposição do piso cimentado (Demolição e

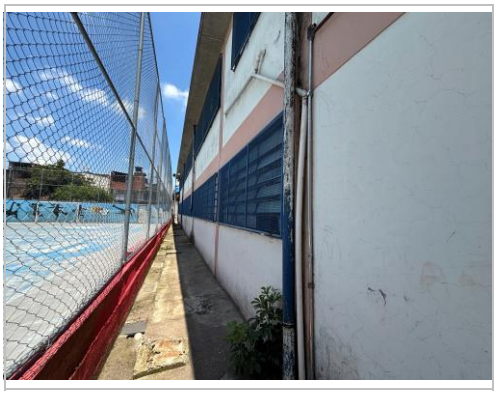


FOTO 180 Externo: Páteo e Circulação - Pav. Inferior.
Paredes: Restauração da Pintura Externa. Mureta: Revitalização da pintura. Piso: Recomposição do piso cimentado (Demolição e



FOTO 181 Externo: Páteo e Circulação - Pav. Inferior.
Grades: Restauração e Pintura. Instalações Hidráulicas: Substituição das tubos de queda (Drenagem). Embutimento das esgoto expostas.

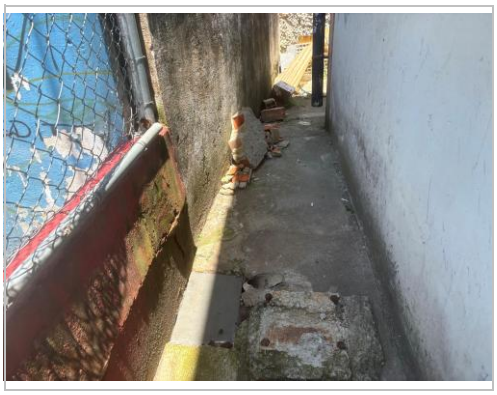


FOTO 182 Externo: Páteo e Circulação - Pav. Inferior.
Paredes: Restauração da Pintura Externa. Mureta: Revitalização da pintura. Piso: Recomposição do piso cimentado (Demolição e



FOTO 183 Externo: Páteo e Circulação - Pav. Inferior.
Grades: Restauração e Pintura.



FOTO 184 Externo: Páteo e Circulação - Pav. Inferior.
Porta de Ferro: Reparos na fixação, Revitalização pintura e revisão da maçaneta e fechadura. Paredes: Restauração da Pintura Externa.

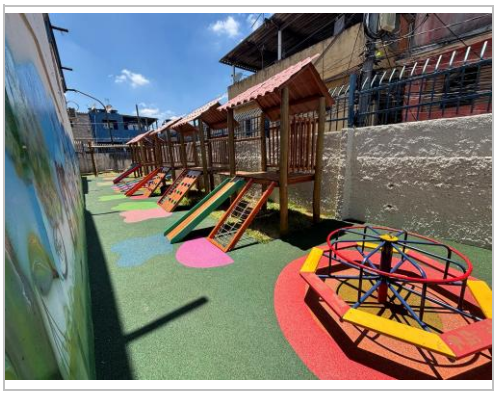


FOTO 185 Externo: Playgroud - Pavimento Inferior.
Pintura Artistica (Grafite): Novo. Piso: Emborrachado Novo. Brinquedos: Com aparencia de novo.



FOTO 186 Externo: Playgroud - Pavimento Inferior.
Pintura Artistica (Grafite): Novo. Piso: Emborrachado Novo. Brinquedos: Com aparencia de novo.



FOTO 187 Externo: Playgroud - Pavimento Inferior.
Pintura Artistica (Grafite): Novo. Piso: Emborrachado Novo. Brinquedos: Com aparencia de novo.



FOTO 188 Externo: Playgroud - Pavimento Inferior.
Recuo Lateral: Grama aparada, boa zeladoria. Paaredes: Reastauração da Pintura. Gradil: Restauração da Pintura: Grades: Revitalização e



FOTO 189 Externo: Playgroud - Pavimento Inferior.
Area Isolada (Caixa de Escada). Paredes: Recomposição dos revestimentos e Pintura. Piso: Demolição com possibilidade de plantil



FOTO 190 Externo: Playgroud - Pavimento Inferior.
Area Isolada (Caixa de Escada). Paredes: Recomposição dos revestimentos e Pintura. Piso: Demolição com possibilidade de plantil



FOTO 191 Externo: Playgroud - Pavimento Inferior.
Area Isolada (Caixa de Escada). Paredes: Recomposição dos revestimentos e Pintura. Piso: Demolição com possibilidade de plantil



FOTO 192 Externo: Playgroud - Pavimento Inferior.
Area Isolada (Caixa de Escada). Paredes: Recomposição dos revestimentos e Pintura. Piso: Demolição com possibilidade de plantil



FOTO 193 Externo: Quadra Descoberta - Pav. Inferior.
Muros: Restauração pinturas artísticas (Grafite). Muetas: Restauração pintura. Piso Quadra: Restauração da Pintura. Gradil: Revitalização e



FOTO 194 Externo: Quadra Descoberta - Pav. Inferior.
Muros: Restauração pinturas artísticas (Grafite). Muetas: Restauração pintura. Piso Quadra: Restauração da Pintura. Gradil: Revitalização e

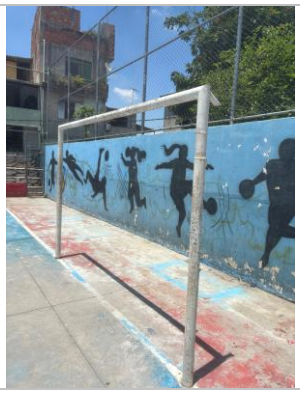


FOTO 195 Externo: Quadra Descoberta - Pav. Inferior.
Muros: Restauração pinturas artísticas (Grafite). Muetas: Restauração pintura. Piso Quadra: Restauração da Pintura. Gradil: Revitalização e



FOTO 196 Externo: Quadra Descoberta - Pav. Inferior.
Muros: Restauração pinturas artísticas (Grafite). Muetas: Restauração pintura. Piso Quadra: Restauração da Pintura. Gradil: Revitalização e



FOTO 197 Externo: Rampas de Acesso - Térreo.
Muros: Revitalização pinturas artisticas (Grafite). Gradil e Portão: Restauração e pintura.



FOTO 198 Externo: Rampas de Acesso - Térreo.
Muros e Piso: Revitalização da pintura. Alicação de sinalização e piso podotátil. Gradil e Portão: Restauração e pintura. Corrimãos:



FOTO 199 Externo: Rampas de Acesso - Térreo.
Lixeira: Paredes: Revitalização pintura. Portões de ferro: Revitalização dos portões, revisão fechaduras e pintura.



FOTO 200 Externo: Rampas de Acesso - Térreo.
Muros e Piso: Revitalização da pintura. Alicação de sinalização e piso podotátil. Gradil e Portão: Restauração e pintura. Corrimãos:



FOTO 201 Externo: Abrigo para Botijões (G.L.P.)
Abrigo Botijões: Paredes: Revitalização pintura. Gradil: Revitalização dos portões, revisão fechaduras e pintura. Piso: Demolição percial,



FOTO 202 Externo: Abrigo para Botijões (G.L.P.)
Abrigo Botijões: Paredes: Revitalização pintura. Gradil: Revitalização dos portões, revisão fechaduras e pintura. Piso: Demolição percial,



FOTO 203 Telhado (Cobertura)
Cobertura: Substituição de telhas termo acusticas (Padronizar pela resistência do sistema). Instalações Elétricas: Instalação do Sistema

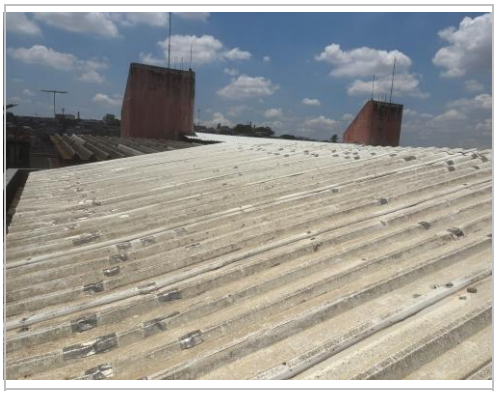


FOTO 204 Telhado (Cobertura)
Paredes: Revitalização da pintura. Cobertura: Substituição de telhas termo acusticas (Padronizar pela resistência do sistema). Instalações



FOTO 205 Telhado (Cobertura)
Paredes: Revitalização da pintura. Cobertura: Substituição das telhas de fibrocimento (Padronizar telha termoacústica pela resistência do



FOTO 206 Telhado (Cobertura)
Paredes: Revitalização da pintura. Cobertura: Substituição das telhas de fibrocimento (Padronizar telha termoacústica pela resistência do

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEF ARLINDO CAETANO FILHO, PROFESSOR

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF ARLINDO CAETANO FILHO, PROFESSOR



FOTO 207 Telhado (Cobertura)
Paredes: Revitalização da pintura. Cobertura: Substituição das telhas de fibrocimento (Padronizar telha termoacústica pela resistência do



FOTO 208 Telhado (Cobertura)
Paredes: Revitalização da pintura. Grades: Revitalização pintura.



FOTO 209 Sala 01 (Térreo)
Identificação



FOTO 210 Sala 01 (Térreo)
Piso: Cerâmica - Padronização - Porcelanato com Resistência Adequada



FOTO 211 Sala 01 (Térreo)

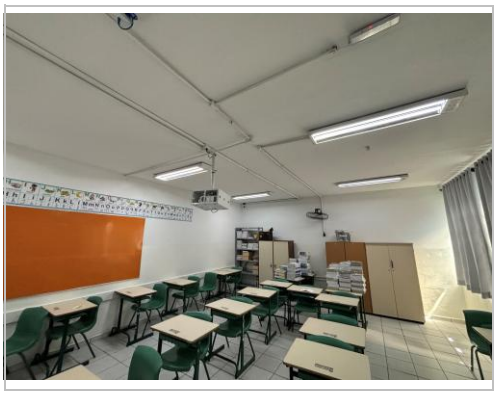


FOTO 212 Sala 01 (Térreo)



FOTO 213 Sala 01 (Térreo)



FOTO 214 Sala 02 (Térreo)
Piso: Cerâmica - Padronização - Porcelanato com Resistência Adequada



FOTO 215 Sala 02 (Térreo)

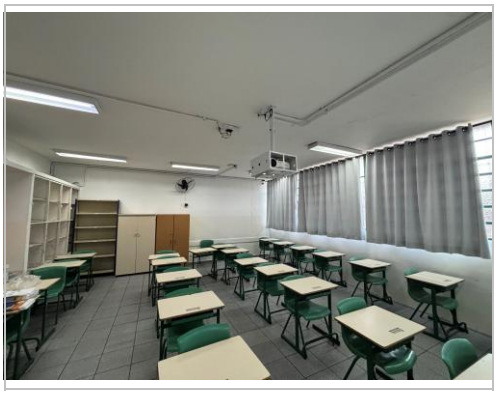


FOTO 216 Sala 02 (Térreo)



FOTO 217 Sala 02 (Térreo)



FOTO 218 Sala 02 (Térreo)



FOTO 219 Sala 02 (Térreo)



FOTO 220 Sala 02 (Térreo)



FOTO 221 Sala 3 (Térreo)



FOTO 222 Sala 3 (Térreo)
Piso: Cerâmica - Padronização - Porcelanato com Resistência Adequada



FOTO 223 Sala 3 (Térreo)



FOTO 224 Sala 3 (Térreo)
Piso: Cerâmica - Padronização - Porcelanato com Resistência Adequada



FOTO 225 Sala 3 (Térreo)



FOTO 226 Sala 3 (Térreo)



FOTO 227 Sala Informática (Térreo)



FOTO 228 Sala Informática (Térreo)
Piso: Paviflex - Padronização - Porcelanato com Resistência Adequada



FOTO 229 Sala Informática (Térreo)

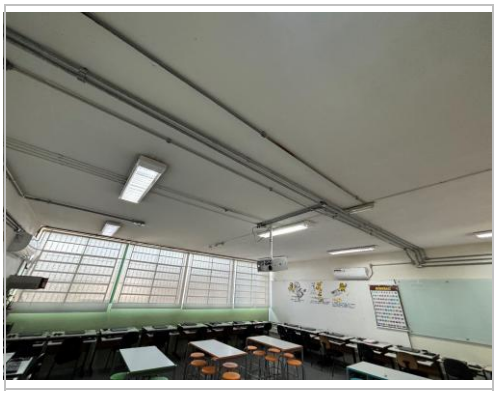


FOTO 230 Sala Informática (Térreo)



FOTO 240 Sala Informática (Térreo)

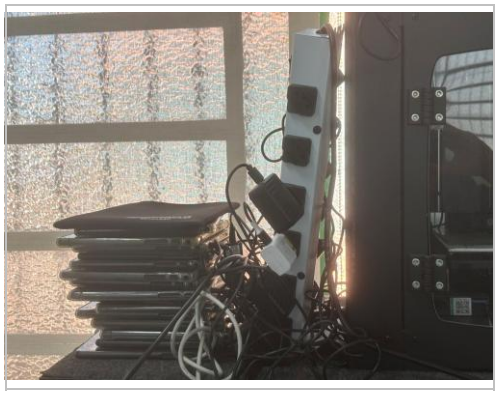


FOTO 250 Sala Informática (Térreo)



FOTO 251 Sala Informática (Térreo)



FOTO 252 Sala Informática (Térreo)



FOTO 253 Sala 04 (Térreo)



FOTO 254 Sala 04 (Térreo)
Piso: Cerâmica - Padronização - Porcelanato com Resistência Adequada




FOTO 255 Sala 04 (Térreo)



FOTO 256 Sala 04 (Térreo)



FOTO 257 Sala 04 (Térreo)



FOTO 258 Sala 04 (Térreo)



FOTO 259 Sala 04 (Térreo)



FOTO 260 Sala 04 (Térreo)



FOTO 261 Sala 05 (Térreo)

Piso: Granilite de boa qualidade. Padronizar com demais salas.



FOTO 262 Sala 05 (Térreo)

Piso: Cerâmica - Padronização - Porcelanato com Resistência Adequada



FOTO 263 Sala 05 (Térreo)



FOTO 264 Sala 06 (Térreo)

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF ARLINDO CAETANO FILHO, PROFESSOR



FOTO 265 Sala 06 (Térreo)
Piso: Cerâmica - Padronização - Porcelanato com Resistência Adequada



FOTO 266 Sala 06 (Térreo)



FOTO 267 Sala 07 (Pavimento Inferior)



FOTO 268 Sala 07 (Pavimento Inferior)
Piso: Cerâmica - Padronização - Porcelanato com Resistência Adequada



FOTO 269 Sala 07 (Pavimento Inferior)



FOTO 270 Sala 07 (Pavimento Inferior)



FOTO 271 Sala 08 (Pavimento Inferior)



FOTO 272 Sala 08 (Pavimento Inferior)
Piso: Paviflex - Padronização - Porcelanato com Resistência Adequada



FOTO 273 Sala 08 (Pavimento Inferior)

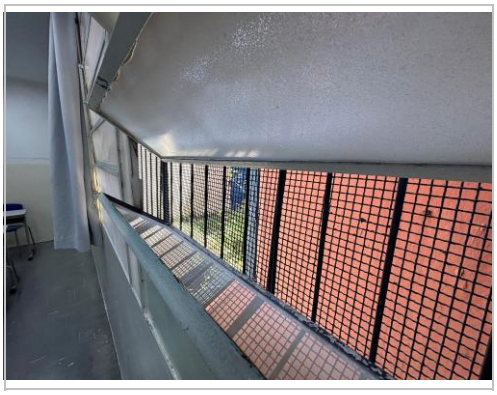


FOTO 274 Sala 08 (Pavimento Inferior)



FOTO 275 Sala 08 (Pavimento Inferior)

Piso: Paviflex - Padronização - Porcelanato com Resistência Adequada



FOTO 276 Sala 08 (Pavimento Inferior)



FOTO 277 Sala 09 (Pavimento Inferior)



FOTO 278 Sala 09 (Pavimento Inferior)



FOTO 279 Sala 09 (Pavimento Inferior)



FOTO 280 Sala 09 (Pavimento Inferior)

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF ARLINDO CAETANO FILHO, PROFESSOR



FOTO 281 Sala 09 (Pavimento Inferior)



FOTO 282 Sala de Leitura (Pavimento Inferior)



FOTO 283 Sala de Leitura (Pavimento Inferior)



FOTO 284 Sala de Leitura (Pavimento Inferior)



FOTO 285 Sala de Leitura (Pavimento Inferior)



FOTO 286 Sala de Leitura (Pavimento Inferior)



FOTO 287 Sala de Leitura (Pavimento Inferior)



FOTO 288 Sala de Leitura (Pavimento Inferior)

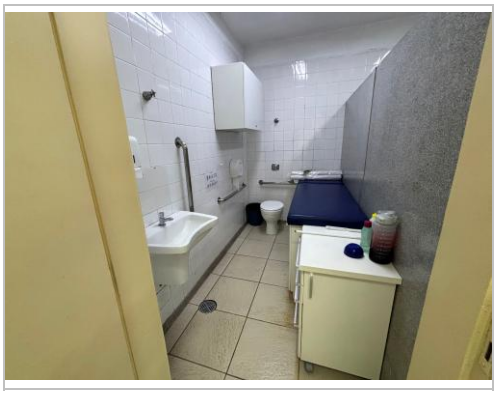


FOTO 289 Sanitário Acessível (Térreo)



FOTO 290 Sanitário Acessível (Térreo)

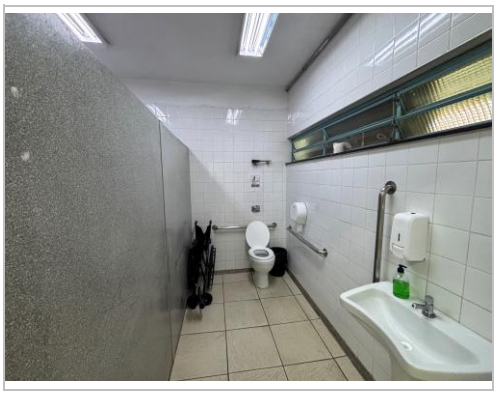


FOTO 291 Sanitário Acessível (Térreo)

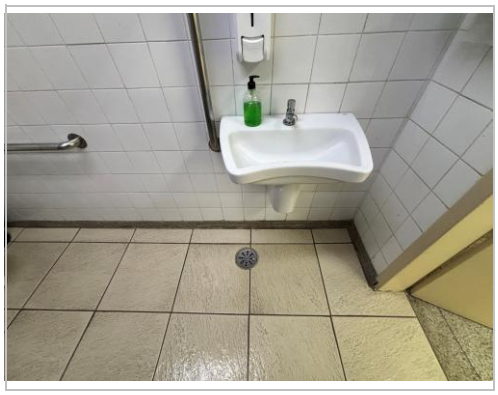


FOTO 292 Sanitário Acessível (Térreo)

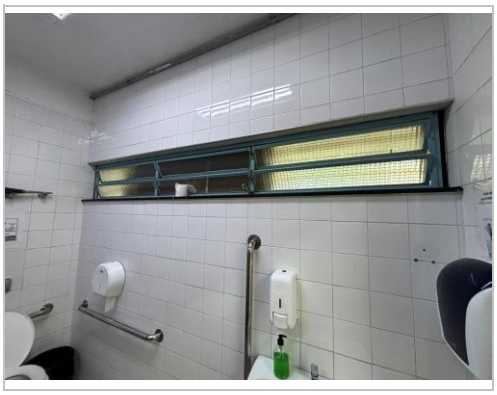


FOTO 293 Sanitário Acessível (Térreo)

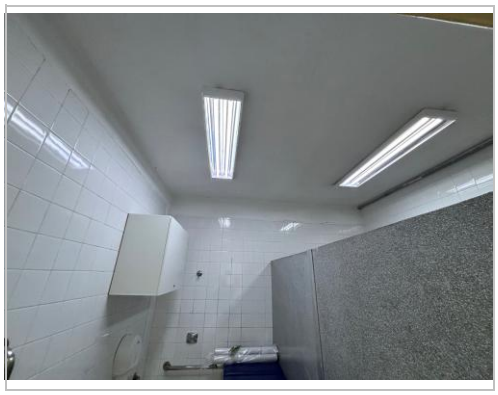


FOTO 294 Sanitário Acessível (Térreo)



FOTO 295 Sanitário Feminino (Térreo)

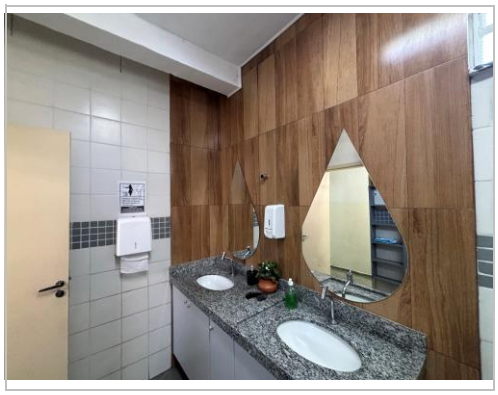


FOTO 296 Sanitário Feminino (Térreo)

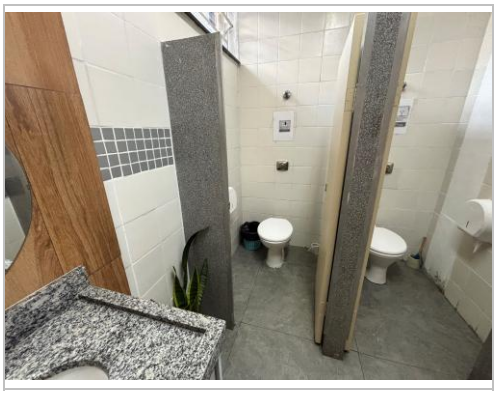


FOTO 297 Sanitário Feminino (Térreo)



FOTO 298 Sanitário Feminino (Térreo)



FOTO 299 Sanitário Masculino (Térreo)

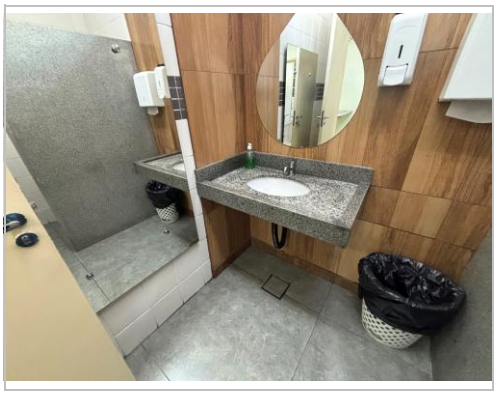


FOTO 300 Sanitário Masculino (Térreo)



FOTO 301 Sanitário Masculino (Térreo)

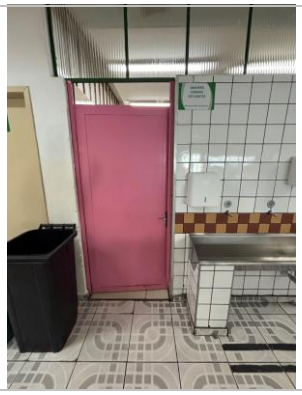


FOTO 302 Sanitário Feminino Alunas (Pav. Inferior)



FOTO 303 Sanitário Feminino Alunas (Pav. Inferior)

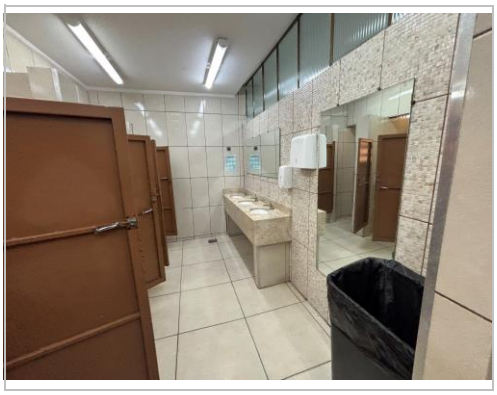


FOTO 304 Sanitário Feminino Alunas (Pav. Inferior)



FOTO 305 Sanitário Feminino Alunas (Pav. Inferior)

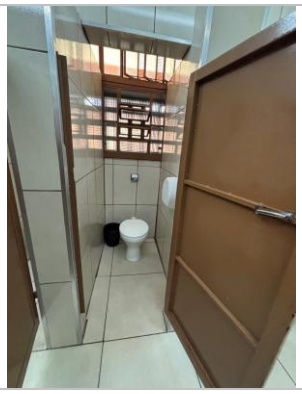


FOTO 306 Sanitário Feminino Alunas (Pav. Inferior)



FOTO 307 Sanitário Masculino Alunos (Pav. Inferior)



FOTO 308 Sanitário Masculino Alunos (Pav. Inferior)



FOTO 309 Sanitário Masculino Alunos (Pav. Inferior)



FOTO 310 Sanitário Masculino Alunos (Pav. Inferior)



FOTO 311 Sanitário Masculino Alunos (Pav. Inferior)

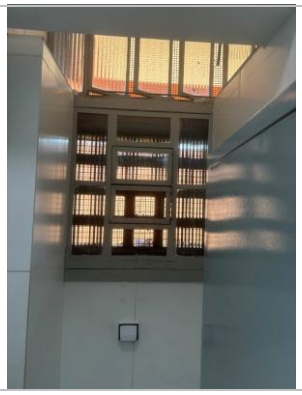


FOTO 312 Sanitário Masculino Alunos (Pav. Inferior)



FOTO 313 QDLF - Administração (Térreo)



FOTO 314 QDLF - Administração (Térreo)



FOTO 315 QUADROS - Circulação (Térreo)



FOTO 316 Comando Iluminação - Circulação (Térreo)



FOTO 317 QDLF - Circulação (Térreo)



FOTO 318 QDLF - Circulação (Térreo)



FOTO 319 QDLF - Sala Informática (Térreo)



FOTO 320 QDLF - Sala Informática (Térreo)

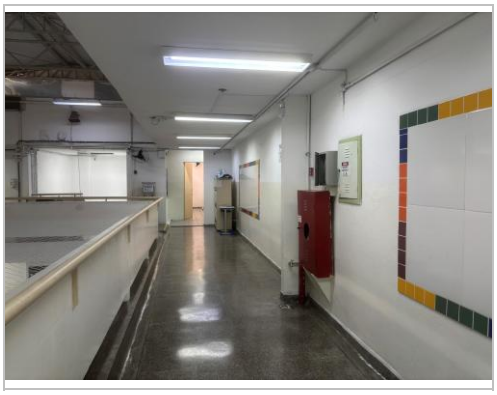


FOTO 321 QUADROS - Circulação (Térreo)



FOTO 322 Comando Iluminação - Circulação (Térreo)



FOTO 323 QDLF - Circulação (Térreo)

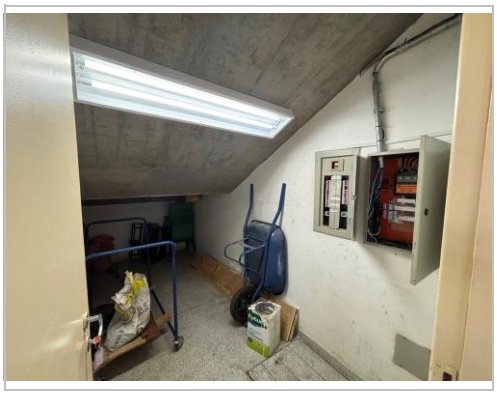


FOTO 324 QUADROS - Sob Escada Administração

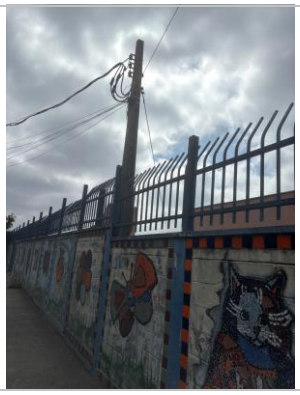


FOTO 325 Entrada de Energia Elétrica - Rua



FOTO 326 Entrada de Energia Elétrica - Rua



FOTO 327 Quadro Entrada - Sob Escada Administração



FOTO 328 QDLF - Sob Escada Administração



FOTO 329 QUADRO - Circulação (Pavimento Inferior)



FOTO 330 QUADRO - Circulação (Pavimento Inferior)

FOTO 331

FOTO 332

FOTO 333

FOTO 334

FOTO 335

FOTO 336
