CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL

Dados Gerais

Nome da Unidade:	EMEI ANTONIO CARLOS BRASILEIRO DE ALMEIDA JOBIM - TOM		
Sequencial (U.E):	46	**Código da Unidade:**	18350

Endereço da Escola

Logradouro, número e complemento (se houver)	RUA GIOVANNI ALBERONI, 132

Descrição do Imóvel

Tipo de Construção (técnica construtiva predominante)	Concreto armado	Padrão:	NÃO LOCALIZADO	Nº de Pavimentos	2

Implantação

Área do Terreno (m²)	3.134,00			Área Edificada/ Construída (m²)	1.144,00
Área Pavimentada (m²)	330,00			Área Verde / Permeável (m²)	2.232,00
Área da projeção do(s) edifício(s) (m²)	572,00	Bloco salas	531,99	Quadra	184,80

Abastecimento

Água										
Forma de abastecimento (rede pública, poço artesiano, sem abastecimento etc.):			REDE PÚBLICA							
Quantidade de reservatório de água										
Capacidade por reservatório (L)	50.000	Constatação		Inf. Resp.	Projeto	NÃO				
Gás										
Encanado (Sim ou Não)	NÃO	Botijão de Gás (Sim ou Não)		SIM		Quantidade de Botijões de Gás	5			
Energia Elétrica										
Aparelho Ar condicionado (Sim ou Não)	NÃO					Quantidade:				
Possui fonte de energia complementar (Sim ou Não)?	NÃO					Qual (por ex. Painel Solar ou outro)?				
Possui Gerador de Energia? (Sim ou Não)?	NÃO					Capacidade:				
Esgoto										
Rede Pública (Sim ou Não)	SIM					Fossa Séptica (Sim ou Não)	NÃO			
Caixa de Gordura (Sim ou Não)	SIM					Caixa de Passagem (Sim ou Não)	NÃO			

Informações sobre Prevenção de Incêndios (AVCB e SPDA)

Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro (Sim ou Não)	NÃO	Nº	N/A							
Extintor	SIM									
Hidrante	SIM									
Sinalização Emergência	SIM									
Iluminação Emergência	NÃO									
Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) (Sim ou Não)	PARCIAL	Nº	Total (Sim ou N	NÃO	Parcial (Sim ou Não)	SIM				

Acessibilidade

Elevador (Sim ou Não)	NÃO				Quantidade:		Quant. Ativos/Funcionais:		
Plataforma Elevatória (Sim ou Não)	NÃO				Quantidade:		Quant. Ativos/Funcionais:		
Rampa de Acesso a Unidade (Sim ou Não)	SIM				Rampa de Acesso a outros espaços necessários (Sim ou Não)				NÃO
Tipo de sinalização	PARCIAL	Sonora (Sim ou Não)	NÃO		Visual (Sim ou Não)	SIM	Tátil (Sim ou Não)		NÃO
Selo de Acessibilidade (Sim ou Não)	NÃO			Nº					
Vaga de estacionamento para deficientes (Sim ou Não)	NÃO					Quantidade:	0		

CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL

Ambientes da Escola

Administrativo e Apoio/Serviços

Ambiente	Comprimento (m)	Largura (m)	Pé Direito (m)	Área (m²)	Tipo de Construção	Revestimento de Piso	Revestimento de Parede	Possui Forro? Se sim, qual tipo?	Nível de Comprometimento do Ambiente	Observações
Ateliê	4,50	9,80	2,90	44,10	Alvenaria	Cerâmico	Cerâmica	não	**2**	Necessita de pintura e padronização da cobertura. (Fotos 3 e 4)
Circulação			2,90	77,39	Alvenaria	Granilite	Pintura	não	**0**	
Escada			2,90	0,00	Alvenaria	Granilite			**2**	Apresenta um degrau com buraco (Foto 34)
Sala dos Professores	6,30	3,40	2,90	21,42	Alvenaria	Cerâmico	Pintura	não	**0**	Trinca na parede (Foto 36)
Coordenação	3,60	3,50	2,90	12,60	Alvenaria	Cerâmico	Pintura	não	**2**	Apresenta afofamento da parede embaixo da janela (Foto 40)
Secretaria			2,90	25,83	Alvenaria	Cerâmico	Pintura	não	**2**	Mesmo ambiente com pisos diferentes. Fissuras entre Pilar/Viga e parede. (Fotos 41 e 42)
Almoxarifado	2,00	3,15	2,90	6,30	Alvenaria	Cerâmico	Pintura	não	**0**	
Direção	2,60	3,95	2,90	10,27	Alvenaria	Cerâmico	Pintura	não	**0**	
Assistente do diretor			2,90	12,55	Alvenaria	Cerâmico	Pintura	não	**0**	
Copa			2,90	14,98	Alvenaria	Cerâmico	Pintura	não	**2**	Espelho de tomada danificado (Foto 48)
Lavanderia			2,90	7,13	Alvenaria	Granilite	azulejo	não	**0**	
Almoxarifado	5,70	0,80	2,90	4,56	Alvenaria	Cerâmico	Pintura	não	**0**	
Deposito			2,90	6,90	Alvenaria	Granilite	azulejo	não	**0**	
Circulação	6,30	1,20	2,90	7,56	Alvenaria	Cerâmico	Pintura	não	**0**	
Cozinha	4,35	7,30	2,90	31,76	Alvenaria	Granilite	azulejo	não	**0**	Trinca na bancada próximo à pia (Foto 58)
Despensa	2,00	4,35	2,90	8,70	Alvenaria	Granilite	azulejo	não	**0**	Sem ventilação (Foto 61)
Depósito	3,00	4,45	2,90	13,35	Alvenaria	Cerâmico	Pintura	não	**0**	
Refeitório				148,68	Alvenaria	granilite	Pintura	não	**3**	Vidro da esquadria quebrado, quadro de energia necessitando de revisão, circuitos elétricos sem acabamento e necessitando de revisão (Fotos 68, 69, 70 e 72)

CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL

CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL

Salas de Aula

Ambiente	Comprimento (m)	Largura (m)	Pé Direito (m)	Área (m²)	Tipo de Construção	Revestimento de Piso	Revestimento de Parede	Possui Forro? Se sim, qual tipo?	Nível de Comprometimento do Ambiente	Observações
Sala de Aula 1 - 1o andar	7,10	7,10	2,90	50,41	Alvenaria	Cerâmico	Pintura	não	**2**	Bancada com pias inutilizadas, esquadrias com corrosão e emperradas (Foto 14)
Sala de Aula 2 - 1o andar	7,10	7,10	2,90	50,41	Alvenaria	Cerâmico	Pintura	não	**2**	Bancada com pias inutilizadas, esquadrias com corrosão e emperradas (Fotos 7 e 8)
Sala de Aula 3 - 1o andar	7,10	7,10	2,90	50,41	Alvenaria	Cerâmico	Pintura	não	**2**	Bancada com pias inutilizadas, esquadrias com corrosão e emperradas, manchas de umidade no teto e fissura entre a viga e a alvenaria. Desnível na entrada. (Fotos 9 e 10)
Sala de Aula 4 - 1o andar	7,10	7,10	2,90	50,41	Alvenaria	Cerâmico	Pintura	não	**2**	Bancada com pias inutilizadas, esquadrias com corrosão e emperradas, manchas de umidade no teto (Foto 12)
Sala de Aula 5 - 1o andar	7,10	7,10	2,90	50,41	Alvenaria	Cerâmico	Pintura	não	**2**	Bancada com pias inutilizadas, esquadrias com corrosão e emperradas, manchas de umidade no teto. Necessidade de revisão dos circuitos elétricos. (Fotos 15 e 16)
Sala de Aula 6 - 1o andar	7,10	7,10	2,90	50,41	Alvenaria	Cerâmico	Pintura	não	**2**	Bancada com pias inutilizadas, esquadrias com corrosão e emperradas, manchas de umidade no teto, tomada sem espelho, falta pedaço de rodapé (Fotos 18, 19, 20 e 21)
Brinquedoteca	7,10	7,10	2,90	50,41	Alvenaria	Cerâmico	Pintura	não	**2**	Bancada com pias inutilizadas, esquadrias com corrosão e emperradas, manchas de umidade no teto (Foto 22)
Sala de Bolinhas	7,10	7,10	2,90	50,41	Alvenaria	Cerâmico	Pintura	não	**0**	

Sanitários

Informações Complementares

Ambiente	Comprimento (m)	Largura (m)	Pé Direito (m)	Área (m²)	Revestimento de Piso	Revestimento de Parede	Possui Forro? Se sim, qual tipo?	Observações	Nível de Comprometimento do Ambiente	Quant. Vasos Sanitários	Quant. Cubas e trocadores	Quant. Chuveiros
WC 01 Fem - 1o andar	2,80	1,65	2,90	4,62	cerâmico	azulejo	não	Banheiro sem ventilação (Foto 25)	**2**	3	0	0
WC 01 Masc. - 1o andar	2,80	1,65	2,90	4,62	cerâmico	azulejo	não	Banheiro sem ventilação (Foto 27)	**2**	3	0	0
WC 02 Fem - 1o andar	2,80	1,92	2,90	5,38	cerâmico	azulejo	não		**0**	3	0	0
WC 02 Masc. - 1o andar	2,80	1,38	2,90	3,86	cerâmico	azulejo	não	Divisória de granilite com furo (Foto 30)	**2**	3	0	0
WC Fem - Térreo	2,00	6,30	2,90	12,60	cerâmico	cerâmica	não	Trinca no revestimento cerâmico da parece, válvula de descarga sem tampa (Fotos 50 e 51)	**2**	3	2	1
WC Térreo	1,20	1,70	2,90	2,04	cerâmico	azulejo	não		**0**	1	1	0
WC PCD			2,90	3,51	cerâmico	azulejo	não	Fiação fora do condulete. (Foto 64)	**2**	1	1	1
WC Térreo meninos	1,40	0,90	2,90	1,26	cerâmico	azulejo	sim		**0**	1	0	0
WC Térreo meninas	2,10	0,80	2,90	1,68	cerâmico	azulejo	sim	Forro de gesso sem pintura (Foto 66)	**2**	1	0	1

Informações Adicionais

CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL								
Ambiente	Necessário adequar ou implantar? (SIM/NÃO/NÃO SE APLICA)	Informações Complementares						Observações
Fechamento do lote (muro, cerca, gradil, vegetação)	SIM	Muro		Área (m²)	377,46	Gradil	Área (m²)	
Estacionamento(s)	SIM	Área (m²)						Destinar vaga de deficiente
Playground (Sim ou Não)	NÃO	Área (m²)						
Tanque de Areia (Sim ou Não)	NÃO	Área Cúbica (m³)						
Calçadas (Sim ou Não?)	NÃO							
Serralherias (Portões, travas e outros)	NÃO							
Alarmes e sensores (Sim ou Não?)	NÃO							
Câmeras de segurança (Sim ou Não?)	SIM							Deverá ser substiuído, considerando a diretriz para padronização em todas as unidades
Rede de gás na testada? (Sim ou Não)	NÃO							NÃO VERIFICADO/NÃO INFORMADO

Observações Gerais:	**A escola apresenta uma estrutura boa, sendo necessária atenção para as esquadrias que apresentam corrosão e estão emperradas. A escola não tem AVCB.**

FICHA 4 - DIAGNÓSTICO DE ASPECTOS DE INFRAESTRUTURA PREDIAL DAS UNIDADES ESCOLARES			
Item	**Descrição dos Itens Avaliados**	**Necessidade de Intervenção**	**Observações**
1. Infraestrutura da Escola			
Condições das fundações, pilares, vigas, lajes, cobertura, estruturas metálicas, paredes, esquadrias e pisos			
1.1	Fundações: verificar se há rachaduras, trincas, fissuras, desplacamentos ou quaisquer sinais de falhas na fundação que possam comprometer a estabilidade do prédio	NÃO	
1.2	Pilares: verificar se há rachaduras, trincas, fissuras, desplacamentos ou quaisquer sinais de falhas nos pilares que possam comprometer a estabilidade do prédio	NÃO	
1.3	Vigas: verificar se há rachaduras, trincas, fissuras, desplacamentos ou quaisquer sinais de falhas nas vigas que possam comprometer a estabilidade do prédio	NÃO	
1.4	Lajes: verificar se há rachaduras, trincas, fissuras, desplacamentos ou quaisquer sinais de falhas nas lajes que possam comprometer a estabilidade do prédio	NÃO	
1.5	Cobertura: verificar se há sinais de infiltração, vazamentos, telhas soltas ou outras falhas que possam causar danos à estrutura da escola	SIM	Considerando a existência de manchas de umidade em algumas salas há necessidade de revisão das coberturas para correção do problema identificado
1.6	Estruturas metálicas: verificar se há sinais de problemas nas estruturas metálicas, como corrosão ou deformação	NÃO	
1.7	Paredes: verificar se há sinais de problemas nas paredes, como rachaduras, infiltrações ou umidade excessiva	SIM	Foi verificado problemas de umidade; Verificada a ocorrência de manchas na base da fachada (foto 75) compatíveis com umidade superficial decorrente do 'repique' de água de chuva, associada à ausência de tratamento adequado do barrado da edificação.
1.8	Esquadrias: verificar se há problemas nas esquadrias, tais como falta de peças, corrosão, vidros quebrados e dificuldade de manuseio	SIM	Verificou-se que esquadrias com de sinais de corrosão nos elementos metálicos. Também foram observadas dificuldades de manuseio em grande parte das janelas da escola, indicando a necessidade de revisão geral, regulagem, recuperação ou substituição de ferragens. Diante das condições verificadas, recomenda-se a realização de manutenção corretiva para assegurar o adequado funcionamento das esquadrias e evitar riscos aos usuários.
1.9	Pisos: verificar se há sinais de problemas nos pisos, como desníveis, rachaduras ou solturas de revestimento	SIM	Foram verificados pisos com padrões variados. Recomendamos a padronização dos pisos.
2. Instalações Elétricas e Hidráulicas			
Condições das instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias			

FICHA 4 - DIAGNÓSTICO DE ASPECTOS DE INFRAESTRUTURA PREDIAL DAS UNIDADES ESCOLARES			
Item	**Descrição dos Itens Avaliados**	**Necessidade de Intervenção**	**Observações**
2.1	Instalações elétricas: verificar se as instalações elétricas estão em conformidade com as normas de segurança, se há fios expostos, equipamentos com defeito ou outros problemas que possam representar risco de incêndio ou choque elétrico. verificar também se o quadro de energia está em bom estado e se as tomadas e interruptores estão funcionando corretamente	SIM	Os quadros elétricos apresentam diversas não conformidades significativas, incluindo cabos desorganizados e excesso de condutores sem guiamento adequado, emendas internas irregulares dentro dos painéis, ausência de dispositivos obrigatórios como DR e DPS, barramentos de fases expostos sem isolação, falta de prensa-cabos nas entradas dos condutores, disjuntores antigos e obsoletos ainda em operação, identificação deficiente ou deteriorada dos circuitos, componentes montados de forma improvisada sem trilho DIN, tampas internas ausentes permitindo acesso a partes vivas, além de condutores com isolação desgastada. Tais condições não atendem aos requisitos essenciais da ABNT NBR 5410, NR-10 e NBR IEC 61439, representando risco elevado de choque elétrico, falhas de proteção e comprometimento da segurança operacional da instalação.
2.2	Instalações hidráulicas: verificar se as instalações hidráulicas estão em bom estado, sem vazamentos, rachaduras ou outros problemas que possam prejudicar o funcionamento do sistema. verificar também se as torneiras, registros e outros componentes estão em bom estado e se o sistema de esgoto está funcionando corretamente	NÃO	
2.3	Instalações sanitárias: verificar se as instalações sanitárias estão em bom estado, sem vazamentos, rachaduras ou outros problemas que possam prejudicar o funcionamento do sistema. verificar também se as louças sanitárias, como vasos e pias, estão em bom estado e se os ralos estão desobstruídos	SIM	Verificou-se válvula de descarga sem tampa.
2.4	Reservatórios de água: verificar se os reservatórios de água estão em bom estado, sem vazamentos ou outros problemas que possam prejudicar o funcionament do sistema de abastecimento	NÃO	

FICHA 4 - DIAGNÓSTICO DE ASPECTOS DE INFRAESTRUTURA PREDIAL DAS UNIDADES ESCOLARES			
Item	**Descrição dos Itens Avaliados**	**Necessidade de Intervenção**	**Observações**
3. Acessibilidade			
Condições de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida			
3.1	Rampas de acesso: verificar se há rampas de acesso em bom estado e com inclinação adequada	NÃO	
3.2	Elevadores: verificar se há elevadores em bom estado e se estão em conformidade com as normas de acessibilidade	SIM	Necessidade de implantação de elevador de modo a permitir a acessibilidade da escola.
3.3	Banheiros adaptados: verificar se há banheiros adaptados em bom estado e se estão em conformidade com as normas de acessibilidade	NÃO	
4. Condições de Habitabilidade			
Condições de ventilação e iluminação natural e artificial e conforto térmico dos ambientes			
4.1	Condições gerais de habitabilidade e conforto térmico por setor (salas de aulas, outros ambientes pedagógicos, ambientes administrativos, cozinha e refeitório, etc.)	NÃO	
5. Áreas Externas/Paisagismo			
Condições de adequabilidade das áreas externas da escola			
5.1	Condições Gerais do Paisagismo na Unidade Educacional	NÃO	
5.2	Drenagem: verificar se a drenagem da área externa da escola está funcionando corretamente, evitando acúmulo de água em dias de chuva	NÃO	
5.3	Pintura externa: verificar se a pintura externa da escola está em bom estado, sem descascamentos ou sinais de desgaste	SIM	Necessário pintura.

Profissional Responsável
Nome: Karenina Carolina da Silva Fumis
Cargo/função: Engenheira Civil
CREA/CAU: 5063134086-SP

Responsável pela validação CAIXA
Nome: Decio de Souza Espindola
Cargo/função: Engenheiro Civil
CREA/CAU: 5062158870-SP

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEI ANTONIO CARLOS BRASILEIRO DE ALMEIDA JOBIM - TOM

1 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Cód. Unidade	
18350	EMEI ANTONIO CARLOS BRASILEIRO DE ALMEIDA JOBIM - TOM



foto 01: Fachada da escola



foto 02: Ateliê



foto 03: Ateliê
Coberturas diferentes. Necessário padronizar.



foto 04: Ateliê
Janela reformada. Necessário pintar.



foto 05: Salas de aula 01 e 02
Salas com pisos cerâmicos diferentes



foto 06: Sala de aula 02

Vista geral

CAIXA

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI ANTONIO CARLOS BRASILEIRO DE ALMEIDA JOBIM - TOM



foto 07: Sala de aula 02

Bancada com pias inutilizadas



foto 08: Sala de aula 02

Esquadrias com corrosão e emperradas



foto 09: Sala de aula 03

Desnível entre ambientes



foto 10: Sala de aula 03

Manchas de umidade no teto e fissura entre a viga e a alvenaria



foto 11: Sala de aula 04



foto 12: Sala de aula 04

Manchas de umidade no teto



foto 13: Sala de aula 01



foto 14: Sala de aula 01

Esquadrias com corrosão e emperradas, pias inutilizadas

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI ANTONIO CARLOS BRASILEIRO DE ALMEIDA JOBIM - TOM



foto 15: Sala de aula 05
Manchas de umidade no teto



foto 16: Sala de aula 05
Necessidade de revisao dos circuitos elétricos



foto 17: Salas de aula 05 e 06
Salas com pisos cerâmicos diferentes



foto 18: Sala de aula 06
Esquadrias com corrosão e emperradas, pias inutilizadas



foto 19: Sala de aula 06
Manchas de umidade no teto



foto 20: Sala de aula 06
Tomada sem espelho



foto 21: Sala de aula 06
Trecho sem rodapé



foto 22: Sala de aula 07 - Brinquedoteca
Manchas de umidade no teto

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI ANTONIO CARLOS BRASILEIRO DE ALMEIDA JOBIM - TOM



foto 23: Sala de bolinhas



foto 24: WC 01 Fem 1o andar



foto 25: WC 01 Fem 1o andar

Elementos vazadoss fechados deixando o banheiro sem ventilação

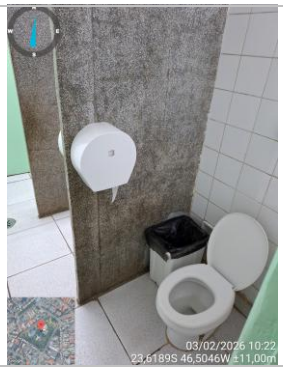


foto 26: WC 01 Masc 1o andar



foto 27: WC 01 Masc 1o andar

Elementos vazadoss fechados deixando o banheiro sem ventilação



foto 28: Circulação



foto 29: WC 02 Masc 1o andar



foto 30: WC 02 Masc 1o andar

Detalhe de furos na divisória de granilite

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI ANTONIO CARLOS BRASILEIRO DE ALMEIDA JOBIM - TOM

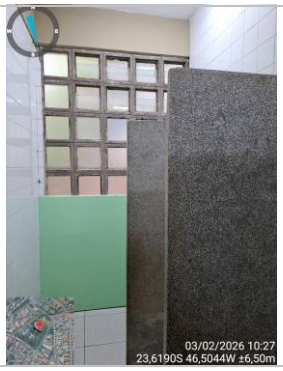


foto 31: WC 02 Fem 1o andar



foto 32: WC 02 Fem 1o andar



foto 33: Escada



foto 34: Escada
Furo no degrau



foto 35: Sala dos professores



foto 36: Sala dos professores
Trinca na parede entre a viga e a alvenaria



foto 37: Coordenação



foto 38: Coordenação e Sala dos professores
Pisos diferentes

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI ANTONIO CARLOS BRASILEIRO DE ALMEIDA JOBIM - TOM

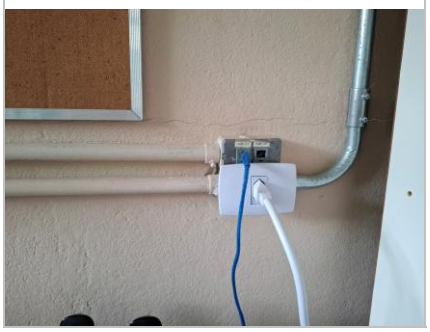


foto 39: Coordenação
Pequenas fissuras e diferentes padrões de elétrica



foto 40: Coordenação
Afofamento da alvenaria



foto 41: Secretaria
Pisos diferentes

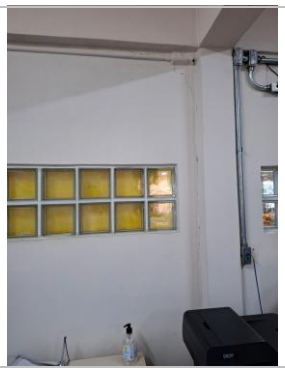


foto 42: Secretaria
Fissuras entre o pilar /viga e a parede



foto 43: Almoxarifado

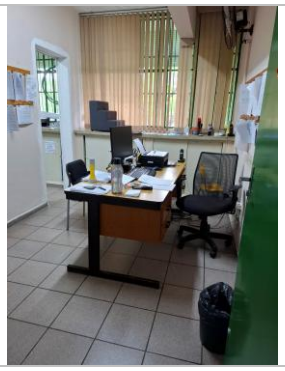


foto 44: Direção



foto 45: Direção
Padrões diferentes de acabamentos elétricos

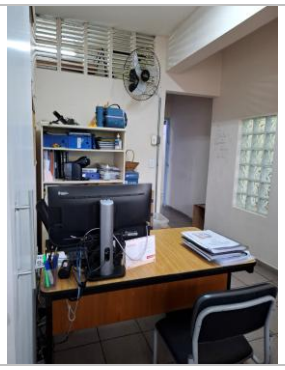


foto 46: Sala da Assistente do Diretor

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI ANTONIO CARLOS BRASILEIRO DE ALMEIDA JOBIM - TOM



foto 47: Copa



foto 48: Copa
Espelho danificado de tomada



foto 49: WC Fem Térreo



foto 50: WC Fem Térreo
Válvula de descarga sem tampa



foto 51: WC Fem Térreo
Trinca no azulejo



foto 52: Lavanderia

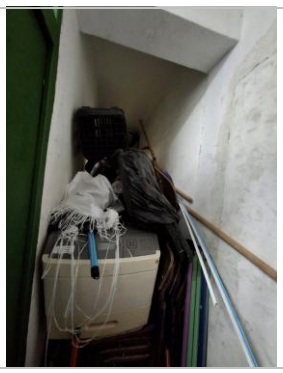


foto 53: Almoxarifado



foto 54: WC Térreo

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI ANTONIO CARLOS BRASILEIRO DE ALMEIDA JOBIM - TOM

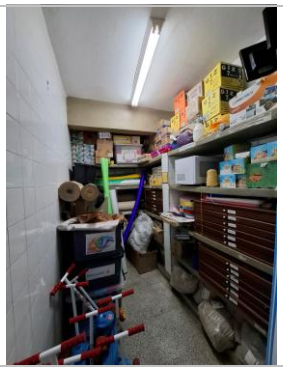


foto 55: Depósito

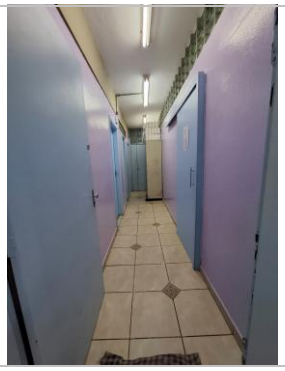


foto 56: Circulação Térreo



foto 57: Cozinha



foto 58: Cozinha
Trinca na bancada



foto 59: Cozinha
Torneira danificada



foto 60: Cozinha
Remendo no piso de granilite para passagem do gás

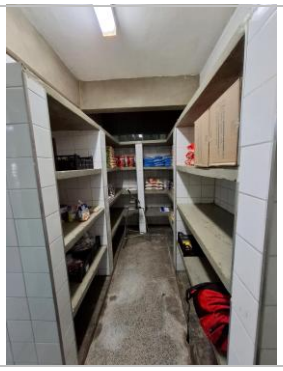


foto 61: Despensa

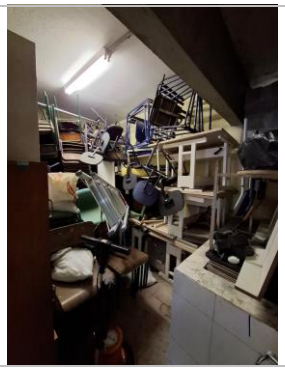


foto 62: Depósito

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI ANTONIO CARLOS BRASILEIRO DE ALMEIDA JOBIM - TOM



foto 63: WC PCD



foto 64: WC PCD
Fiação solta e fora do condulete

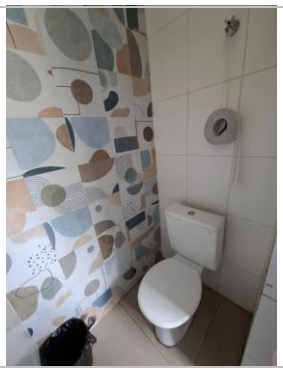


foto 65: WC Térreo meninos



foto 66: WC Térreo meninas
Forro sem pintura



foto 67: Refeitório



foto 68: Refeitório
Vidro da esquadria quebrado



Foto 69: Refeitório
Tubo com corrosão



Foto 70: Refeitório
Caixa de energia sem a tampa

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI ANTONIO CARLOS BRASILEIRO DE ALMEIDA JOBIM - TOM



Foto 71: Refeitório
Itens de combate a incêndio



Foto 72: Refeitório
Quadro de energia



Foto 73: Reservatório



Foto 74: Reservatório
Apenas 1 bomba



Foto 75: Fachada dos fundos



Foto 76: Fachada lateral



Foto 77: Fachada lateral
Detalhe SPDA: descida



Foto 78: Fachada frontal



Foto 79: Mini-quadra



Foto 80: Rampa de acesso à entrada



Foto 81: Muro frontal



Foto 82: Muro lateral



Foto 83: Muro com gradil nos fundos



Foto 84: Cobertura da escola e da mini-quadra
