CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL

Dados Gerais

Nome da Unidade:	EMEF VIRGINIA LORISA ZEITOUNIAN CAMARGO, PROFA		
Sequencial (U.E):	50	**Código da Unidade:**	19407

Endereço da Escola

Logradouro, número e complemento (se houver)	RUA TRITÃO, S/N - CIDADE SATÉLITE SANTA BÁRBARA - CEP 08340160 - SÃO PAULO/SP

Descrição do Imóvel

Tipo de Construção (técnica construtiva predominante)	Concreto armado com fechamento em alvenaria	Padrão:	11. EMEF 20 SALAS OLIVAL COSTA	Nº de Pavimentos	3

Implantação

Área do Terreno (m²)	6.216,29			Área Edificada/ Construída (m²)	3.645,09
Área Pavimentada (m²)	1.635,00			Área Verde / Permeável (m²)	2.871,50
Área da projeção do(s) edifício(s) (m²)	1.709,79	Bloco salas	1.171,92	Quadra	537,87

Abastecimento

Água										
Forma de abastecimento (rede pública, poço artesiano, sem abastecimento etc.):	REDE PÚBLICA									
Quantidade de reservatório de água	1									
Capacidade por reservatório (L)	Acima de 20.001 L	Constatação		Visual	Projeto	SIM				
Gás										
Encanado (Sim ou Não)	NÃO	Botijão de Gás (Sim ou Não)		SIM	Quantidade de Botijões de Gás	4				
Energia Elétrica										
Aparelho Ar condicionado (Sim ou Não)	NÃO	Quantidade:	NA							
Possui fonte de energia complementar (Sim ou Não)?	NÃO	Qual (por ex. Painel Solar ou outro)?	NA							
Possui Gerador de Energia? (Sim ou Não)?	SIM	Capacidade:	VISUAL							
Esgoto										
Rede Pública (Sim ou Não)	SIM	Fossa Séptica (Sim ou Não)	NÃO							
Caixa de Gordura (Sim ou Não)	SIM	Caixa de Passagem (Sim ou Não)	SIM							

Informações sobre Prevenção de Incêndios (AVCB e SPDA)

Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro (Sim ou Não)	NÃO	Nº	N/A							
Extintor	SIM	9								
Hidrante	SIM	3								
Sinalização Emergência	SIM	55								
Iluminação Emergência	SIM	12								
Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) (Sim ou Não)	SIM	Nº	Total (Sim ou N	SIM	Parcial (Sim ou Não)	NÃO				

Acessibilidade

Elevador (Sim ou Não)	SIM	Quantidade:	1	Quant. Ativos/Funcionais:	1		
Plataforma Elevatória (Sim ou Não)	NÃO	Quantidade:	NA	Quant. Ativos/Funcionais:	NA		
Rampa de Acesso a Unidade (Sim ou Não)	SIM	Rampa de Acesso a outros espaços necessários (Sim ou Não)			NÃO		
Tipo de sinalização	SIM	Sonora (Sim ou Não)	NÃO	Visual (Sim ou Não)	SIM	Tátil (Sim ou Não)	NÃO
Selo de Acessibilidade (Sim ou Não)	NÃO	Nº	NA				
Vaga de estacionamento para deficientes (Sim ou Não)	NÃO	Quantidade:	0				

CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL

Ambientes da Escola

Administrativo e Apoio/Serviços

Ambiente	Comprimento (m)	Largura (m)	Pé Direito (m)	Área (m²)	Tipo de Construção	Revestimento de Piso	Revestimento de Parede	Possui Forro? Se sim, qual tipo?	Nível de Comprometimento do Ambiente	Observações
Coordenação pedagógica	4,00	5,60	3,20	22,37	Alvenaria	Cerâmico	Pintura	Não	2	Piso desgastado (Foto 07)
Copa da Secretaria	2,00	4,68	2,90	9,36	Alvenaria	Cerâmico	Pintura	Não	0	
Circulação da Diretoria	1,88	6,33	2,90	11,90	Alvenaria	Cerâmico	Pintura	Não	0	
Sala da Educação Física	2,35	4,94	2,90	11,61	Alvenaria	Cerâmico	Pintura	Não	0	
Palco	7,19	4,15	2,90	29,93	Alvenaria	Cerâmico	Pintura	Não	0	
Copa da Direção	1,50	1,90	2,90	3,32	Alvenaria	Cerâmico	Cerâmico	Não	2	Piso quebrado (Foto 61)
Depósito Material de Limpeza	1,44	3,65	2,90	5,79	Alvenaria	Cerâmico	Pintura	Não	2	Porta enferrujada (Foto 17, 63)
Depósito Material Didático	1,58	2,00	2,50	3,16	Alvenaria	Cerâmico	Pintura		0	
Despensa/ Depósito Alimen	6,98	4,66	2,90	32,20	Alvenaria	Cerâmico	Pintura	Não	2	Corrosão na base da porta (Foto 19)
Estacionamento	10,00	40,00	0,00	400,00	Ambiente Aberto	Concretado	Pintura	Não	2	Piso quebrado, demarcação de vagas, infiltração (Foto 73)
Sala de recursos	7,10	7,10	2,95	49,42	Alvenaria	Cerâmico	Pintura	Não	0	
Lavanderia	7,00	3,79	2,90	26,56	Alvenaria	Cerâmico	Pintura	Não	2	Infiltração severa no piso e paredes (Foto 56)
Pátio Coberto/Refeitório	21,70	14,18	2,95	272,89	Alvenaria	Cerâmico	Pintura	Não	2	Infiltração, pintura desgastada, cobertura danificada (Foto 39, 80)
Play Ground	10,00	38,80	0,00	388,00	Ambiente Aberto	Concretado	Pintura	Não	2	Infiltração, piso quebrado, pintura desgastada (Foto 74)
Quadra Coberta	17,93	30,00	2,90	537,87	Alvenaria	Concretado	Pintura	Não	3	Cobertura com furos, gradil enferujado, piso danificado (Foto 75)
Patio descoberto	13,50	8,89	0,00	120,00	Ambiente Aberto	Concretado	Pintura	Não	2	Piso rachado, pintura desgastada (Foto 76)
Sala de Assistente Diretor	3,44	3,46	2,90	11,90	Alvenaria	Cerâmico	Pintura	Não	0	
Sala de Diretor	3,42	3,46	2,90	11,91	Alvenaria	Cerâmico	Pintura	Não	0	
Secretaria	7,00	7,06	3,15	39,42	Alvenaria	Cerâmico	Pintura	Não	0	
Cozinha	7,03	7,06	2,50	49,63	Alvenaria	Cerâmico	Pintura	Não	2	Piso desgastado (Foto 29 e 30)
Apoio pedagógico	7,00	3,31	2,90	23,17	Alvenaria	Cerâmico	Pintura	Não	0	
Circulação 1º piso	35,90	5,52	2,90	198,00	Alvenaria	Cerâmico	Pintura	Não	2	Revestimento de parede (Foto 12)
Circulação 2º piso	35,90	5,52	2,90	198,00	Alvenaria	Cerâmico	Pintura	Não	0	
Circulação Externa Coberto	22,05	5,00	2,90	110,26	Alvenaria	Cerâmico	Pintura	Não	2	Piso rachado, pintura desgastada, cobertura com furos, infiltração (Foto 80)

Salas de Aula

Ambiente	Comprimento (m)	Largura (m)	Pé Direito (m)	Área (m²)	Tipo de Construção	Revestimento de Piso	Revestimento de Parede	Possui Forro? Se sim, qual tipo?	Nível de Comprometimento do Ambiente	Observações
Sala de Aula 1	7,02	7,08	2,90	49,70	Alvenaria	Cerâmico	Pintura	Não	0	
Sala de Aula 2	7,04	7,05	2,90	49,63	Alvenaria	Cerâmico	Pintura	Não	0	
Sala de Aula 3	7,04	7,07	2,90	49,77	Alvenaria	Cerâmico	Pintura	Não	0	
Sala de Aula 4 - Laboratorio de Ciencias	7,02	7,06	2,90	49,56	Alvenaria	Cerâmico	Pintura	Não	2	Desgaste e corrosão esquadrias (Foto 13)
Sala de Aula 5 - Sala de Leitura	7,05	7,06	2,90	49,77	Alvenaria	Cerâmico	Pintura	Não	0	
Sala de Aula 6	7,04	7,06	2,90	49,70	Alvenaria	Cerâmico	Pintura	Não	0	
Sala de Aula 7	7,03	7,06	2,90	49,63	Alvenaria	Cerâmico	Pintura	Não	0	
Sala de Aula 8	7,02	7,04	2,90	49,42	Alvenaria	Cerâmico	Pintura	Não	0	
Sala de Aula 9	7,03	7,05	2,90	49,56	Alvenaria	Cerâmico	Pintura	Não	0	
Sala de Aula 10	7,00	7,03	2,90	49,21	Alvenaria	Cerâmico	Pintura	Não	0	
Sala de Aula 11 - Sala de Informática	7,03	8,30	3,20	58,35	Alvenaria	Formicado	Pintura	Não	0	
Sala de Aula 12	5,70	7,03	3,20	40,07	Alvenaria	Cerâmico	Pintura	Não	0	

CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL

Sala de Aula 13	5,70	7,03	3,20	40,07	Alvenaria	Cerâmico	Pintura	Não	**0**	
Sala de Aula 14	7,00	7,06	3,20	49,42	Alvenaria	Cerâmico	Pintura	Não	**0**	
Sala de Aula 15	7,00	7,07	3,20	49,49	Alvenaria	Cerâmico	Pintura	Não	**0**	
Sala de Aula 16	7,04	7,06	3,20	49,70	Alvenaria	Cerâmico	Pintura	Não	**0**	
Sala de Aula 17	7,03	7,06	3,20	49,63	Alvenaria	Cerâmico	Pintura	Não	**0**	
Sala de Aula 18	7,00	5,70	3,20	39,90	Alvenaria	Cerâmico	Pintura	Não	**0**	
Sala de Aula 19	7,00	5,70	3,20	39,90	Alvenaria	Cerâmico	Pintura	Não	**0**	
Sala de Aula 20 - Sala dos professores	7,00	5,70	3,20	39,90	Alvenaria	Formicado	Pintura	Não	**0**	

Sanitários										**Informações Complementares**		
Ambiente	Comprimento (m)	Largura (m)	Pé Direito (m)	Área (m²)	Revestimento de Piso	Revestimento de Parede	Possui Forro? Se sim, qual tipo?	Observações	Nível de Comprometimento do Ambiente	Quant. Vasos Sanitários	Quant. Cubas e trocadores	Quant. Chuveiros
Sanitário Funcionários Fem.	1,67	2,30	3,20	3,84	Cerâmico	Cerâmico	Gesso		**0**	4	4	0
Sanitário Funcionários. Masc.	1,67	2,22	3,20	3,71	Cerâmico	Cerâmico	Gesso		**0**	4	4	0
Sanitário Funcionários. Unissex	1,00	3,00	3,20	3,00	Cerâmico	Cerâmico	Gesso		**0**	1	1	0
Sanitário Aluno Fem.	3,00	5,00	3,20	15,00	Cerâmico	Cerâmico	Gesso		**0**	8	9	0
Sanitário Aluno Masc.	3,00	1,00	3,20	3,00	Cerâmico	Cerâmico	Gesso		**0**	8	9	0
Sanitário Aluno. Unissex	3,00	1,00	3,20	3,00	Cerâmico	Cerâmico	Gesso		**0**	1	1	0
Sanitário PCD Unissex - TÉRREO	5,00	1,00	3,20	5,00	Cerâmico	Cerâmico	Gesso	Porta com pintura deteriorada e corrosão na fechadura (Foto 23)	**3**	1	1	0

Informações Adicionais									
Ambiente	Necessário adequar ou implantar? (SIM / NÃO / NÃO SE APLICA)	Informações Complementares							Observações
Fechamento do lote (muro, cerca, gradil, vegetação)	SIM	Muro		Área (m²)		Gradil	Área (m²)	973,50	Gradil com pintura desgastada e enferrujado (Foto 31)
Estacionamento(s)	SIM	Área (m²)		650,00					Infiltração, sem demarcação de vagas, piso rachado (Fotos 40 , 41 e 73)
Playground (Sim ou Não)	SIM	Área (m²)		120,00					Infiltração e desgaste de pintura (Foto 74)
Tanque de Areia (Sim ou Não)	NÃO	Área Cúbica (m³)							
Calçadas (Sim ou Não?)	SIM								Calçadas com rachaduras e desnível (Foto 03)
Serralherias (Portões, travas e outros)	SIM								Serralherias enferrujadas (Foto 46, 54)
Alarmes e sensores (Sim ou Não?)	NÃO								
Câmeras de segurança (Sim ou Não?)	NÃO								
Rede de gás na testada? (Sim ou Não)	NÃO								

Observações Gerais:	**Escola com manutenção predial regular e algumas patologias a serem verificados: pontos de umidade e infiltração em áreas internas e externas, cobertura com telhas quebradas, pisos danificados e com rachaduras, esquadrias enferrujadas, pintura deteriorada.**

FICHA 4 - DIAGNÓSTICO DE ASPECTOS DE INFRAESTRUTURA PREDIAL DAS UNIDADES ESCOLARES			
Item	**Descrição dos Itens Avaliados**	**Necessidade de Intervenção**	**Observações**
1. Infraestrutura da Escola			
Condições das fundações, pilares, vigas, lajes, cobertura, estruturas metálicas, paredes, esquadrias e pisos			
1.1	Fundações: verificar se há rachaduras, trincas, fissuras, desplacamentos ou quaisquer sinais de falhas na fundação que possam comprometer a estabilidade do prédio	NÃO	
1.2	Pilares: verificar se há rachaduras, trincas, fissuras, desplacamentos ou quaisquer sinais de falhas nos pilares que possam comprometer a estabilidade do prédio	NÃO	
1.3	Vigas: verificar se há rachaduras, trincas, fissuras, desplacamentos ou quaisquer sinais de falhas nas vigas que possam comprometer a estabilidade do prédio	NÃO	
1.4	Lajes: verificar se há rachaduras, trincas, fissuras, desplacamentos ou quaisquer sinais de falhas nas lajes que possam comprometer a estabilidade do prédio	NÃO	
1.5	Cobertura: verificar se há sinais de infiltração, vazamentos, telhas soltas ou outras falhas que possam causar danos à estrutura da escola	SIM	Coberturas da escola e quadra danificadas, com vazamentos e telhas soltas
1.6	Estruturas metálicas: verificar se há sinais de problemas nas estruturas metálicas, como corrosão ou deformação	SIM	Alambrados e gradis em corrosão e/ou desgastados pelo tempo
1.7	Paredes: verificar se há sinais de problemas nas paredes, como rachaduras, infiltrações ou umidade excessiva	SIM	Paredes externas e fachadas com infiltração e pontos de umidade excessiva
1.8	Esquadrias: verificar se há problemas nas esquadrias, tais como falta de peças, corrosão, vidros quebrados e dificuldade de manuseio	SIM	Algumas esquadrias emperram e estao enferrujadas
1.9	Pisos: verificar se há sinais de problemas nos pisos, como desníveis, rachaduras ou solturas de revestimento	SIM	Piso cimentado das areas externas com desnível e desgastados
2. Instalações Elétricas e Hidráulicas			
Condições das instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias			
2.1	Instalações elétricas: verificar se as instalações elétricas estão em conformidade com as normas de segurança, se há fios expostos, equipamentos com defeito ou outros problemas que possam representar risco de incêndio ou choque elétrico. verificar também se o quadro de energia está em bom estado e se as tomadas e interruptores estão funcionando corretamente	SIM	O quadro de entrada é obsoleto e, apresenta diversas inconformidades significativas, não atendendo aos requisitos essenciais da ABNT NBR 5410, NR-10 e NBR IEC 61439, podendo ocasionar o comprometimento da segurança operacional da instalação.
2.2	Instalações hidráulicas: verificar se as instalações hidráulicas estão em bom estado, sem vazamentos, rachaduras ou outros problemas que possam prejudicar o funcionamento do sistema. verificar também se as torneiras, registros e outros componentes estão em bom estado e se o sistema de esgoto está funcionando corretamente	NÃO	
2.3	Instalações sanitárias: verificar se as instalações sanitárias estão em bom estado, sem vazamentos, rachaduras ou outros problemas que possam prejudicar o funcionamento do sistema. verificar também se as louças sanitárias, como vasos e pias, estão em bom estado e se os ralos estão desobstruídos	NÃO	
2.4	Reservatórios de água: verificar se os reservatórios de água estão em bom estado, sem vazamentos ou outros problemas que possam prejudicar o funcionament do sistema de abastecimento	SIM	Umidade excessiva e pintura desgastada

CAIXA

FICHA 4 - DIAGNÓSTICO DE ASPECTOS DE INFRAESTRUTURA PREDIAL DAS UNIDADES ESCOLARES			
Item	**Descrição dos Itens Avaliados**	**Necessidade de Intervenção**	**Observações**
3. Acessibilidade			
Condições de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida			
3.1	Rampas de acesso: verificar se há rampas de acesso em bom estado e com inclinação adequada	SIM	Adequação da rampa, corrimão e piso tátil considerando a acessibilidade e a segurança, bem como a padronização dos componentes.
3.2	Elevadores: verificar se há elevadores em bom estado e se estão em conformidade com as normas de acessibilidade	NÃO	
3.3	Banheiros adaptados: verificar se há banheiros adaptados em bom estado e se estão em conformidade com as normas de acessibilidade	NÃO	
4. Condições de Habitabilidade			
Condições de ventilação e iluminação natural e artificial e conforto térmico dos ambientes			
4.1	Condições gerais de habitabilidade e conforto térmico por setor (salas de aulas, outros ambientes pedagógicos, ambientes administrativos, cozinha e refeitório, etc.)	NÃO	
5. Áreas Externas/Paisagismo			
Condições de adequabilidade das áreas externas da escola			
5.1	Condições Gerais do Paisagismo na Unidade Educacional	NÃO	
5.2	Drenagem: verificar se a drenagem da área externa da escola está funcionando corretamente, evitando acúmulo de água em dias de chuva	SIM	O sistema de instalações pluviais necessita de manutenção/substituição de tubulações danificadas
5.3	Pintura externa: verificar se a pintura externa da escola está em bom estado, sem descascamentos ou sinais de desgaste	SIM	Verificou-se a necessidade de regularização e pintura de todas as paredes da fachada

Profissional Responsável
Nome: RENATA CARDOSO MONIZ CALDEIRA
Cargo/função: ARQUITETA E URBANISTA
CREA/CAU: A57880-0

Responsável pela validação CAIXA
Nome: Decio de Souza Espindola
Cargo/função: Engenheiro Civil
CREA/CAU: 5062158870-SP

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEF VIRGINIA LORISA ZEITOUNIAN CAMARGO, PROFA

1 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Cód. Unidade	
19407	EMEF VIRGINIA LORISA ZEITOUNIAN CAMARGO, PROFA



foto 01: Placa Externa



foto 02: Placa Interna



foto 03: Fachada



foto 04:Fachada
Infiltração na fachada, piso deteriorado



foto 05: Acesso de alunos



foto 06: Fachada
Infiltração na fachada

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF VIRGINIA LORISA ZEITOUNIAN CAMARGO, PROFA



foto 07: Coordenação pedagógica

Piso desgastado



foto 08: Coordenação pedagógica

Piso desgastado



foto 09: Lavabo Masculino

Padronizar revestimento e torneiras



foto 10: Lavabo masculino

Padronizar revestimento e torneiras



foto 11: Circulação

Padronizar piso



foto 12: Circulação

Revestimento de parede

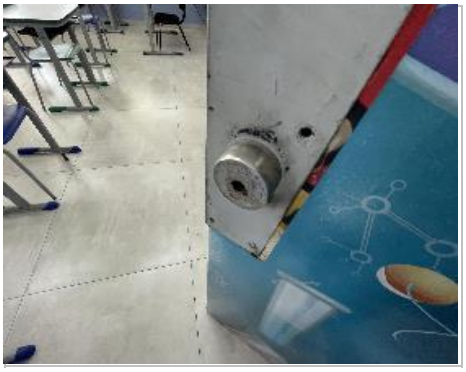


foto 13: Laboratório de ciências.

Desgaste e corrosão esquadrias



foto 14: Laboratório de ciências.

CAIXA

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF VIRGINIA LORISA ZEITOUNIAN CAMARGO, PROFA



foto 15:



foto 16: sala de leitura



foto 17: DML
Porta enferrujada



foto 18: Sala de história



foto 19: Deposito
Corrosão na base da porta.



foto 20: Area de serviço
Ferrugem acentuada e desgaste generalizado na porta.



foto 21: Hall externo sala de aula



foto 22: Circulação

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF VIRGINIA LORISA ZEITOUNIAN CAMARGO, PROFA



foto 23: Porta do banheiro

Porta com pintura deteriorada e corrosão na fechadura.



foto 24: escada



foto 25: Extintor em troca.



foto 26: Circulação alunos

Padronizar piso



foto 27: Banheiro masculino



foto 28: Circulação

Piso quebrado



foto 29: Cozinha

Piso desgastado

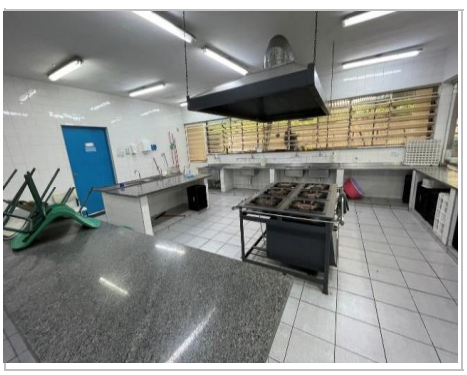


foto 30: Cozinha

Piso desgastado

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF VIRGINIA LORISA ZEITOUNIAN CAMARGO, PROFA



foto 31: Quadro de entrada
Infiltração e pintura deteriorada



foto 32: Pateo coberto
Infiltração e pintura deteriorada



foto 33: Área externa
Infiltração na base da parede e pintura deteriorada



foto 34: Drenagem
Deterioração do piso com fissuras/trincas, desgaste do concreto



foto 35: Drenagem
Infiltração na base da parede e pintura deteriorada



foto 36: Drenagem
Infiltração na base da parede e pintura deteriorada



foto 37: Drenagem
Infiltração na base da parede e pintura deteriorada



foto 38: Lavatorio
Deterioração de equipamento (dispensador de sabão quebrado), falta de manutenção no lavatório e no piso.

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF VIRGINIA LORISA ZEITOUNIAN CAMARGO, PROFA



foto 39: Pateo coberto refeitorio
Cobertura quebrada, infltração



foto 40: Estacionamento
Desgaste, infiltração e fissuras no piso



foto 41:Estacionamento
Desgaste, infiltração e fissuras no piso



foto 42: Reservatorio
Pintura deteriorada.

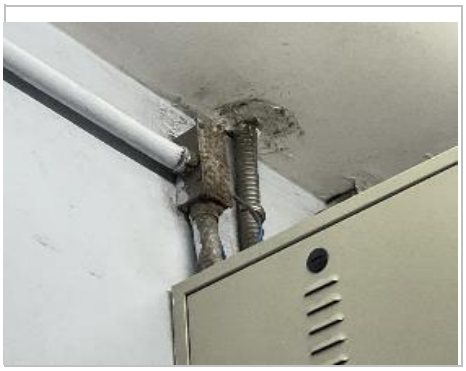


foto 43: Circulação
Acima do quadro de energia elétrica, infiltração de umidade provocando corrosão e degradação do revestimento e do concreto.



foto 44: Rampa de acesso
Infiltração e piso rachado



foto 45: Rampa de acesso
Infiltração e piso rachado



foto 46: Quadro de entrada
Degradação generalizada por falta de manutenção, com corrosão acentuada dos elementos metálicos.

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF VIRGINIA LORISA ZEITOUNIAN CAMARGO, PROFA



foto 47: Quadro
Pintura degradada, com corrosão acentuada dos elementos metálicos



foto 48: Calçadas
Asfalto e calçada com rachaduras e desagregação.



foto 49: Fachada
Infiltração e pintura deteriorada



foto 50: Fachada
Infiltração e pintura deteriorada



foto 51: Fachada
Umidade e pintura degradada



foto 52: Fachada
Mofo e bolor na pintura externa.



foto 53: Fachada
Infiltração de água com manchas de umidade e pintura descascando.



foto 54: Portão de entrada
Corrosão e ferrugem

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF VIRGINIA LORISA ZEITOUNIAN CAMARGO, PROFA



foto 55: Hidrometro
Umidade na base da parede



foto 56: Lavanderia
Umidade, mofo, bolor e degradação da pintura.



foto 57: Lavanderia
Umidade, mofo, bolor e degradação da pintura.



foto 58: Fachada



foto 59: Coordenação pedagógica



foto 60: Coordenação pedagógica
Padronizar piso e interruptores



foto 61: Secretaria

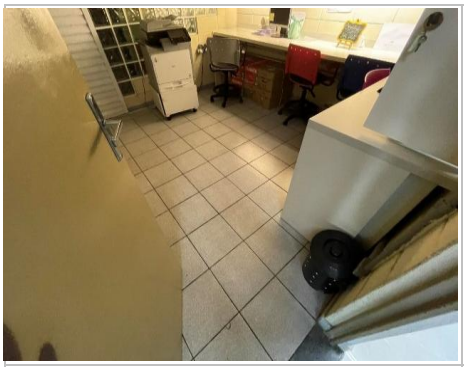


foto 62: Copa da secretaria
Padronizar piso e porta

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF VIRGINIA LORISA ZEITOUNIAN CAMARGO, PROFA



foto 63: DML
Piso quebrado, porta enferrujada



foto 64: Assitente de Diretor
Piso fora do padrão

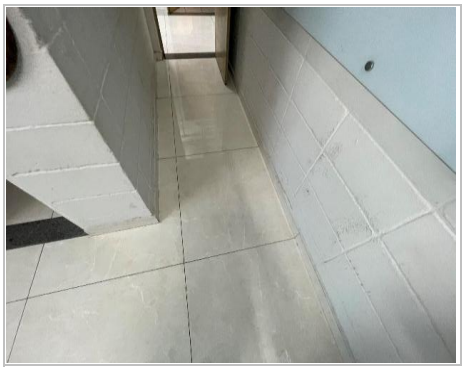


foto 65: Sala do diretor
Piso fora do padrão



foto 66: Circulação Diretoria
Piso fora do padrão



foto 67: Sala da educação física
Piso fora do padrão



foto 68: Palco
Rever eletrica

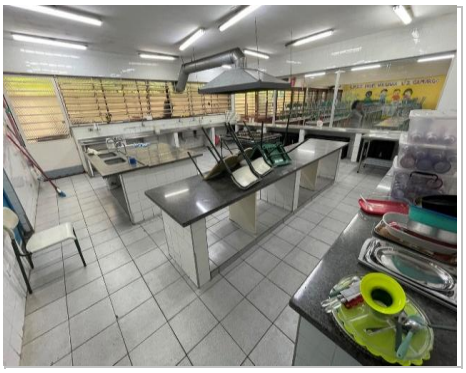


foto 69: Cozinha



foto 70: Sala da recursos
Piso fora do padrão

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF VIRGINIA LORISA ZEITOUNIAN CAMARGO, PROFA



foto 71: Secretaria
Piso fora do padrão



foto 72: Patio refeitorio



foto 73: Estacionamento
Infiltração, vagas, piso quebrado



foto 73: Estacionamento
Infiltração, vagas, piso quebrado



foto 73: Estacionamento
Infiltração, vagas, piso quebrado



foto 73: Estacionamento
Infiltração, vagas, piso quebrado



foto 74: Playground
Infiltração, piso rachado, pintura desgastada



foto 75: Quadra coberta
Piso rachado, pintura desgastada, cobertura com furos

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF VIRGINIA LORISA ZEITOUNIAN CAMARGO, PROFA

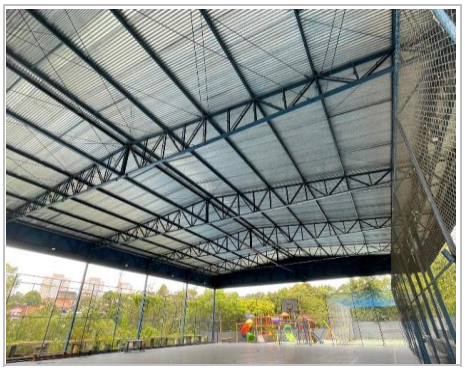


foto 75: Quadra coberta
Piso rachado, pintura desgastada, cobertura com furos



foto 75: Quadra coberta
Piso rachado, pintura desgastada, cobertura com furos



foto 76: Patio descoberto
Piso rachado, pintura desgastada



foto 76: Patio descoberto
Piso rachado, pintura desgastada



foto 77: Apoio Pedagogico
Rever eletrica e infiltração teto



foto 78: Circ 1º Piso
Padronizar piso

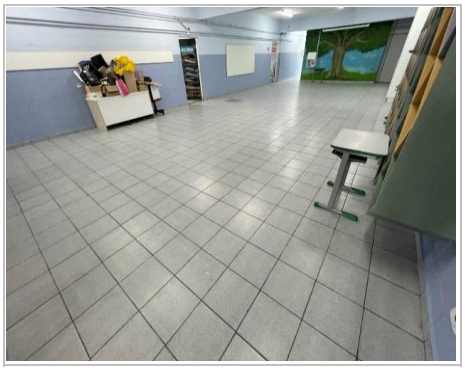


foto 79: Circ 2º Piso
Padronizar piso

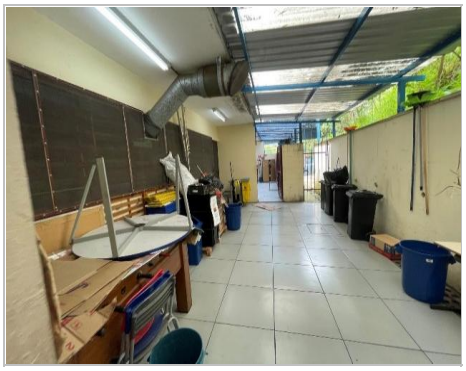


foto 80: Patio coberto
Cobertura danificada

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF VIRGINIA LORISA ZEITOUNIAN CAMARGO, PROFA



foto 80: Patio coberto
Cobertura danificada, infiltração



foto 80: Patio coberto
Piso rachado, pintura desgastada, cobertura com furos, infiltração



foto 81: Sala dos professores

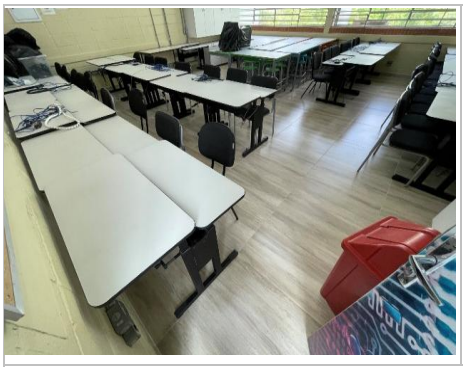


foto 82: Sala de Informatica



foto 83: Vista geral salas de aula

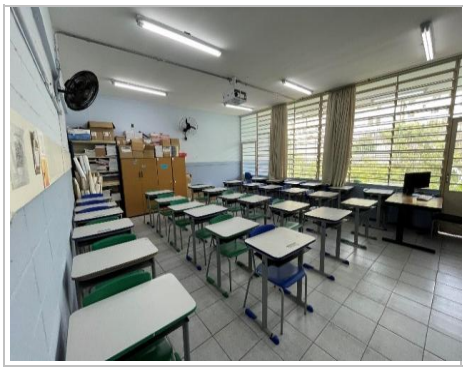


foto 84: Vista geral salas de aula



foto 85: Vista geral salas de aula



foto 86: Vista geral salas de aula

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF VIRGINIA LORISA ZEITOUNIAN CAMARGO, PROFA



foto 87: Vista fachada
Fachada com pontos de infiltração e pintura danificada



foto 87: Vista fachada
Fachada com pontos de infiltração e pintura danificada



foto 87: Vista fachada
Fachada com pontos de infiltração e pintura danificada



foto 88: Rampa acessivel
Fachada com pontos de infiltração, pintura danificada, rever inclinação



foto 89: Reservatório



foto 90: Elétrica



foto 91: Elétrica



foto 92: Elétrica

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEF VIRGINIA LORISA ZEITOUNIAN CAMARGO, PROFA



foto 93: Elétrica



foto 94: Hidrometro
