CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL

Dados Gerais

Nome da Unidade:	EMEI ANTONIA DE OLIVEIRA MOTA DE ARAUJO		
Sequencial (U.E):	58	**Código da Unidade:**	092584

Endereço da Escola

Logradouro, número e complemento (se houver)	RUA CINIRA POLONIO, 1 - CONJUNTO PROMORAR RIO CLARO - CEP 08395-320 - SÃO PAULO/SP

Descrição do Imóvel

Tipo de Construção (técnica construtiva predominante)	Concreto armado fechamento em alvenaria	Padrão:	6. EMEI PADRÃO 6 SALAS – NORMAL COI 94	Nº de Pavimentos	1

Implantação

Área do Terreno (m²)	2.205,96			Área Edificada/ Construída (m²)	834,17
Área Pavimentada (m²)	1.221,79			Área Verde / Permeável (m²)	150,00
Área da projeção do(s) edifício(s) (m²)	834,17	Bloco salas	834,17	Quadra	-

Abastecimento

Água							
Forma de abastecimento (rede pública, poço artesiano, sem abastecimento etc.):	REDE PÚBLICA						
Quantidade de reservatório de água	1						
Capacidade por reservatório (L)	De 10.001 a 20.000 L		Constatação	Visual	Projeto	NÃO	
Gás							
Encanado (Sim ou Não)	NÃO	Botijão de Gás (Sim ou Não)		SIM	Quantidade de Botijões de Gás	2	
Energia Elétrica							
Aparelho Ar condicionado (Sim ou Não)	SIM				Quantidade:	2	
Possui fonte de energia complementar (Sim ou Não)?	NÃO				Qual (por ex. Painel Solar ou outro)?	N/A	
Possui Gerador de Energia? (Sim ou Não)?	SIM				Capacidade: VISUAL		
Esgoto							
Rede Pública (Sim ou Não)	SIM				Fossa Séptica (Sim ou Não)	NÃO	
Caixa de Gordura (Sim ou Não)	SIM				Caixa de Passagem (Sim ou Não)	SIM	

Informações sobre Prevenção de Incêndios (AVCB e SPDA)

Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro (Sim ou Não)	NÃO	Nº	N/A						
Extintor	SIM	6							
Hidrante	NÃO								
Sinalização Emergência	NÃO								
Iluminação Emergência	NÃO								
Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) (Sim ou Não)	NÃO	Nº	Total (Sim ou N	NÃO	Parcial (Sim ou Não)	NÃO			

Acessibilidade

Elevador (Sim ou Não)	NÃO			Quantidade:	N/A	Quant. Ativos/Funcionais:	N/A	
Plataforma Elevatória (Sim ou Não)	NÃO			Quantidade:	N/A	Quant. Ativos/Funcionais:	N/A	
Rampa de Acesso a Unidade (Sim ou Não)	SIM			Rampa de Acesso a outros espaços necessários (Sim ou Não)			N/A	
Tipo de sinalização	NÃO	Sonora (Sim ou Não)	NÃO	Visual (Sim ou Não)	N/A	Tátil (Sim ou Não)	NÃO	
Selo de Acessibilidade (Sim ou Não)	NÃO		Nº	N/A				
Vaga de estacionamento para deficientes (Sim ou Não)	NÃO			Quantidade:	N/A			

CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL

Ambientes da Escola

Administrativo e Apoio/Serviços

Ambiente	Comprimento (m)	Largura (m)	Pé Direito (m)	Área (m²)	Tipo de Construção	Revestimento de Piso	Revestimento de Parede	Possui Forro? Se sim, qual tipo?	Nível de Comprometimento do Ambiente	Observações
Coordenação pedagógica	2,70	2,00	2,80	5,46	Alvenaria	Cerâmico	Pintura	Não	3	Esquadrias emperram, instalações elétricas danificadas (Foto 82)
Lavanderia	5,15	2,50	3,47	12,88	Alvenaria	Cerâmico	Cerâmico	Não	3	Instalações elétricas danificadas, forro, imperm (Fotos 85 a 87)
Área descoberta floreira	5,00	17,62	NA	88,10	Ambiente Aberto	Cimentado	Pintura	Não	3	Piso com pintura desgastada, infiltrações (foto 07)
Copa	3,84	2,50	2,80	9,91	Alvenaria	Cerâmico	Cerâmico	Não	3	Esquadrias emperram, instalações elétricas danificadas
Área descoberta hortaliças	18,00	3,38	NA	60,92	Ambiente Aberto	Cimentado	Pintura	Não	3	Piso com pintura desgastada, infiltrações (foto 12)
Patio coberto quadra	18,02	4,33	3,47	78,03	Alvenaria	Cimentado	Pintura	Não	3	Piso com pintura desgastada, infiltrações (foto 11)
Depósito Material Didático	3,83	4,70	2,80	18,15	Alvenaria	Cerâmico	Pintura	Não	3	Esquadrias emperram, instalações elétricas danificadas
Despensa/ Depósito Alimen	3,84	2,30	2,80	8,70	Alvenaria	Granilite	Cerâmico	Não	3	Esquadrias emperram, instalações elétricas danificadas
Estacionamento	15,00	15,00	NA	292,00	Ambiente Aberto	Cimentado	Pintura	Não	3	Piso com pintura desgastada, infiltrações (foto 59,60,61)
Pátio Coberto	15,00	15,00	NA	225,00	Alvenaria	Cimentado	Pintura	Não	3	Piso com pintura desgastada, infiltrações (foto 88)
Pátio Descoberto (piso acimentado)	15,00	15,00	NA	225,00	Ambiente Aberto	Cimentado	Pintura	Não	3	Piso com pintura desgastada, infiltrações (foto 80)
Play Ground	11,90	9,24	NA	110,00	Ambiente Aberto	Emborrachado	Pintura	Não	3	Piso com pintura desgastada, infiltrações (foto 66 a 70)
Quadra Descoberta	9,00	9,00	NA	84,00	Ambiente Aberto	Cimentado	Pintura	Não	3	Piso com pintura desgastada, infiltrações (foto 04)
Refeitório	11,87	7,90	2,20	94,33	Alvenaria	Granilite	Pintura	Não	3	Esquadrias emperram, instalações elétricas, vidro quebrado, infiltraçao (Foto 43 a 49)
Sala de Diretor	2,70	2,96	2,80	8,25	Alvenaria	Cerâmico	Pintura	Não	3	Esquadrias emperram, instalações elétricas danificadas
Patio coberto refeitorio	14,92	3,75	2,80	55,94	Alvenaria	Granilite	Pintura	Não	3	
Sala de Professores	3,86	7,90	3,47	30,34	Alvenaria	Cerâmico	Pintura	Não	3	Esquadrias emperram, instalações elétricas danificadas
Sala de Reuniões	7,90	7,40	3,47	58,46	Alvenaria	Cerâmico	Pintura	Não	3	Esquadrias emperram, instalações elétricas danificadas
Secretaria	3,83	2,96	2,80	11,66	Alvenaria	Cerâmico	Pintura	Não	3	Esquadrias emperram, instalações elétricas danificadas
Circulação - Administração	9,30	5,00	2,80	46,50	Alvenaria	Granilite	Pintura	Não	3	Esquadrias emperram, instalações elétricas danificadas
Cozinha	3,83	7,90	2,76	30,50	Alvenaria	Granilite	Cerâmico	Não	3	Instalações elétricas danificadas, forro, imperm (Foto 52 a 54)
Circulação - Sala Aula	30,00	1,30	2,80	39,00	Alvenaria	Granilite	Pintura	Não	3	Esquadrias emperram, instalações elétricas danificadas

Salas de Aula

Ambiente	Comprimento (m)	Largura (m)	Pé Direito (m)	Área (m²)	Tipo de Construção	Revestimento de Piso	Revestimento de Parede	Possui Forro? Se sim, qual tipo?	Nível de Comprometimento do Ambiente	Observações
Sala de Aula 1	3,86	7,9	3,47	30,34	Alvenaria	Cerâmico	Pintura	Não	3	Esquadrias emperram, instalações elétricas danificadas, infiltração, piso desgastado (Foto 33 a 38)

CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL

Sala de Aula 2	7,86	7,87	3,47	62,26	Alvenaria	Cerâmico	Pintura	Não	**3**	Esquadrias emperram, instalações elétricas danificadas, infiltração, piso desgastado (Foto 27 a 30)
Sala de Aula 3	7,86	7,87	3,47	62,26	Alvenaria	Cerâmico	Pintura	Não	**3**	Esquadrias emperram, instalações elétricas danificadas, infiltração, piso desgastado (Foto 15 a 20)
Sala de Aula 4	7,86	7,87	3,47	62,26	Alvenaria	Cerâmico	Pintura	Não	**3**	Esquadrias emperram, instalações elétricas danificadas, infiltração, piso desgastado (Foto 20 a 26)
Biblioteca	7,86	7,87	3,47	62,26	Alvenaria	Cerâmico	Pintura	Não	**3**	Esquadrias emperram, instalações elétricas danificadas, infiltração, piso desgastado (Foto 39 e 40)

Sanitários — **Informações Complementares**

Ambiente	Comprimento (m)	Largura (m)	Pé Direito (m)	Área (m²)	Revestimento de Piso	Revestimento de Parede	Possui Forro? Se sim, qual tipo?	Observações	Nível de Comprometimento do Ambiente	Quant. Vasos Sanitários	Quant. Cubas e trocadores	Quant. Chuveiros
WC Funcionários Feminino	1,92	1,16	2,80	2,34	Cerâmico	Cerâmico	Gesso	Esquadrias emperram, instalações elétricas danificadas	**3**	1	1	0
WC Funcionários Masculino	1,92	1,16	2,80	2,34	Cerâmico	Cerâmico	Gesso	Esquadrias emperram, instalações elétricas danificadas	**3**	1	1	0
Sanitário Aluno Feminino	1,84	7,90	2,80	14,54	Cerâmico	Cerâmico	Gesso	Instalações elétricas danificadas, forro, imperm (Foto 41 e 42)	**3**	4	2	0
Sanitário Aluno Masculino	1,84	7,90	2,80	14,54	Cerâmico	Cerâmico	Gesso	Instalações elétricas danificadas, forro, imperm	**3**	4	2	0
WC Funcionários Feminino	1,46	2,00	2,80	2,69	Cerâmico	Granilite	Gesso	Esquadrias emperram, instalações elétricas danificadas	**3**	1	1	0
WC Funcionários Masculino	1,46	2,00	2,80	2,69	Cerâmico	Granilite	Gesso	Esquadrias emperram, instalações elétricas danificadas	**3**	1	1	0

Informações Adicionais

Ambiente	Necessário adequar ou implantar? (SIM / NÃO / NÃO SE APLICA)	Informações Complementares							Observações
Fechamento do lote (muro, cerca, gradil)	SIM	Muro		Área (m²)	4.411,92	Gradil	Área (m²)	1.102,98	Muro e gradil com rachaduras,infiltrações e pintura desgastada (Fotos 05, 14, 56, 57, 69, 78)
Estacionamento(s)	SIM	Área (m²)	292,00						Piso desgastado, infiltrações, sem demarcação de vagas (Fotos 58 a 61)
Playground (Sim ou Não)	SIM	Área (m²)	110,00						Piso avariado e brinquedos desgastados (Fotos 66 a 70)
Tanque de Areia (Sim ou Não)	SIM	Área Cúbica (m³	4,00						Pintura desgastada (Foto 75)
Calçadas (Sim ou Não?)	NÃO								
Serralherias (Portões, travas e outros)	NÃO								
Alarmes e sensores (Sim ou Não?)	NÃO								
Câmeras de segurança (Sim ou Não?)	SIM								Sistema de segurança ineficaz, rever as instalações
Rede de gás na testada? (Sim ou Não)	NÃO								

Observações Gerais:	**A escola apresenta pontos de infiltração, pisos danificados e desgastados pelo tempo, instalações gerais em mal estado, coberturas quebradas e com furos, e pouca manutenção predial.**

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL

FICHA 4 - DIAGNÓSTICO DE ASPECTOS DE INFRAESTRUTURA PREDIAL DAS UNIDADES ESCOLARES			
Item	**Descrição dos Itens Avaliados**	**Necessidade de Intervenção**	**Observações**
1. Infraestrutura da Escola			
Condições das fundações, pilares, vigas, lajes, cobertura, estruturas metálicas, paredes, esquadrias e pisos			
1.1	Fundações: verificar se há rachaduras, trincas, fissuras, desplacamentos ou quaisquer sinais de falhas na fundação que possam comprometer a estabilidade do prédio	NÃO	
1.2	Pilares: verificar se há rachaduras, trincas, fissuras, desplacamentos ou quaisquer sinais de falhas nos pilares que possam comprometer a estabilidade do prédio	NÃO	
1.3	Vigas: verificar se há rachaduras, trincas, fissuras, desplacamentos ou quaisquer sinais de falhas nas vigas que possam comprometer a estabilidade do prédio	NÃO	
1.4	Lajes: verificar se há rachaduras, trincas, fissuras, desplacamentos ou quaisquer sinais de falhas nas lajes que possam comprometer a estabilidade do prédio	NÃO	
1.5	Cobertura: verificar se há sinais de infiltração, vazamentos, telhas soltas ou outras falhas que possam causar danos à estrutura da escola	SIM	Cobertura com sinais de infiltração, telhas quebradas e desgastada pelo tempo/uso
1.6	Estruturas metálicas: verificar se há sinais de problemas nas estruturas metálicas, como corrosão ou deformação	NÃO	
1.7	Paredes: verificar se há sinais de problemas nas paredes, como rachaduras, infiltrações ou umidade excessiva	SIM	Paredes de alguns ambientes com infiltração e manchas de umidade
1.8	Esquadrias: verificar se há problemas nas esquadrias, tais como falta de peças, corrosão, vidros quebrados e dificuldade de manuseio	SIM	Esquadrias com desgaste de componentes, presença de partes soltas ou danificadas, além de sinais de corrosão nos elementos metálicos. Também foram observadas dificuldades de manuseio na totalidade das janelas da escola, indicando a necessidade de revisão geral, regulagem, recuperação ou substituição de ferragens. Diante das condições verificadas, recomenda-se a realização de manutenção corretiva para assegurar o adequado funcionamento das esquadrias e evitar riscos aos usuários
1.9	Pisos: verificar se há sinais de problemas nos pisos, como desníveis, rachaduras ou solturas de revestimento	SIM	Pisos com rachaduras, desnivel e infiltração
2. Instalações Elétricas e Hidráulicas			
Condições das instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias			
2.1	Instalações elétricas: verificar se as instalações elétricas estão em conformidade com as normas de segurança, se há fios expostos, equipamentos com defeito ou outros problemas que possam representar risco de incêndio ou choque elétrico. verificar também se o quadro de energia está em bom estado e se as tomadas e interruptores estão funcionando corretamente	SIM	O quadro de entrada é obsoleto e, apresenta diversas inconformidades significativas, não atendendo aos requisitos essenciais da ABNT NBR 5410, NR-10 e NBR IEC 61439, podendo ocasionar o comprometimento da segurança operacional da instalação. Instalações elétricas obsoletas, portanto, recomendamos a revisão geral e modernização dos circuitos e instalações elétricas
2.2	Instalações hidráulicas: verificar se as instalações hidráulicas estão em bom estado, sem vazamentos, rachaduras ou outros problemas que possam prejudicar o funcionamento do sistema. verificar também se as torneiras, registros e outros componentes estão em bom estado e se o sistema de esgoto está funcionando corretamente	NÃO	

FICHA 4 - DIAGNÓSTICO DE ASPECTOS DE INFRAESTRUTURA PREDIAL DAS UNIDADES ESCOLARES			
Item	**Descrição dos Itens Avaliados**	**Necessidade de Intervenção**	**Observações**
2.3	Instalações sanitárias: verificar se as instalações sanitárias estão em bom estado, sem vazamentos, rachaduras ou outros problemas que possam prejudicar o funcionamento do sistema. verificar também se as louças sanitárias, como vasos e pias, estão em bom estado e se os ralos estão desobstruídos	NÃO	
2.4	Reservatórios de água: verificar se os reservatórios de água estão em bom estado, sem vazamentos ou outros problemas que possam prejudicar o funcionament do sistema de abastecimento	SIM	Reservatorio com umidade e desgaste de pintura

CAIXA

FICHA 4 - DIAGNÓSTICO DE ASPECTOS DE INFRAESTRUTURA PREDIAL DAS UNIDADES ESCOLARES			
Item	**Descrição dos Itens Avaliados**	**Necessidade de Intervenção**	**Observações**
3. Acessibilidade			
Condições de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida			
3.1	Rampas de acesso: verificar se há rampas de acesso em bom estado e com inclinação adequada	SIM	Adequação da rampa, adequação de corrimão e piso tátil considerando a acessibilidade e a segurança, bem como a padronização dos componentes.
3.2	Elevadores: verificar se há elevadores em bom estado e se estão em conformidade com as normas de acessibilidade	NÃO	
3.3	Banheiros adaptados: verificar se há banheiros adaptados em bom estado e se estão em conformidade com as normas de acessibilidade	SIM	Executar sanitário PNE
4. Condições de Habitabilidade			
Condições de ventilação e iluminação natural e artificial e conforto térmico dos ambientes			
4.1	Condições gerais de habitabilidade e conforto térmico por setor (salas de aulas, outros ambientes pedagógicos, ambientes administrativos, cozinha e refeitório, etc.)	NÃO	
5. Áreas Externas/Paisagismo			
Condições de adequabilidade das áreas externas da escola			
5.1	Condições Gerais do Paisagismo na Unidade Educacional	NÃO	
5.2	Drenagem: verificar se a drenagem da área externa da escola está funcionando corretamente, evitando acúmulo de água em dias de chuva	NÃO	
5.3	Pintura externa: verificar se a pintura externa da escola está em bom estado, sem descascamentos ou sinais de desgaste	SIM	Verificou-se a necessidade de regularização e pintura de todas as paredes da fachada

Profissional Responsável
Nome: RENATA CARDOSO MONIZ CALDEIRA
Cargo/função: ARQUITETA E URBANISTA
CREA/CAU: A57880-0

Responsável pela validação CAIXA
Nome: Decio de Souza Espindola
Cargo/função: Engenheiro Civil
CREA/CAU: 5062158870-SP

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEI ANTONIA DE OLIVEIRA MOTA DE ARAUJO

1 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Cód. Unidade	
092584	EMEI ANTONIA DE OLIVEIRA MOTA DE ARAUJO



foto 01: Fachada
Placa Externa



foto 02: Fachada
Vista da rua



foto 03: Fachada
Vista da rua



foto 04: Quadra descoberta
Vista da quadra



foto 05: Entrada
Muro com sinais de umidade e pintura deteriorada.



foto 06: Entrada
Parede e chão com sinais de umidade, rachaduras, trincas, pintura deteriorada.

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI ANTONIA DE OLIVEIRA MOTA DE ARAUJO



foto 07: Área Comum.

Piso com fissuras, trincas e sinais de umidade.



foto 08: Área Comum.

Sinais de umidade, pintura degradada.



foto 09: Área comum



foto 10: Vista da Quadra



foto 11: Pateo coberto quadra

Piso de concreto com desgaste.



foto 12: Vista da Horta

Piso de concreto com desgaste, infiltração



foto 13: Área externa

Piso de concreto e parede com pintura deteriorada, sinais de umidade, fissuras.



foto 14: Área externa

Pintura desgastada, sinais de umidade

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI ANTONIA DE OLIVEIRA MOTA DE ARAUJO



foto 15: Sala de aula 03
Sinais de umidade nos rodapés



foto 16:Sala de aula 03
Piso quebrado, sinais de umidade e pintura deteriorada.

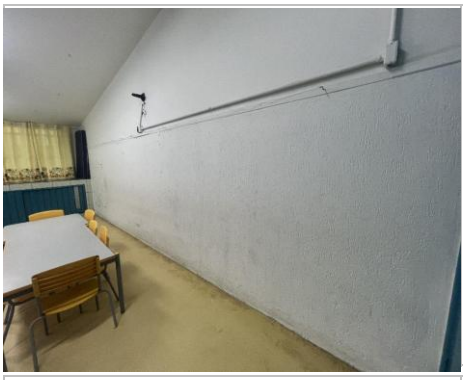


foto 17: Sala de aula 03
Parede e piso com sinais de umidade



foto 18: Sala de aula 03
Desgaste generalizado das superfícies, piso e acabamentos.



foto 19: Sala de aula 03
Parede e piso com umidade, desgaste, fissuras e descascado.



foto 20: Sala de aula 03
Sinais de umidade no teto



foto 21: Sala de aula 04
Sinais de umidade nos rodapés, piso e acabamentos deteriorados.



foto 22: Sala de aula 04
Sinais de umidadeno piso.

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI ANTONIA DE OLIVEIRA MOTA DE ARAUJO

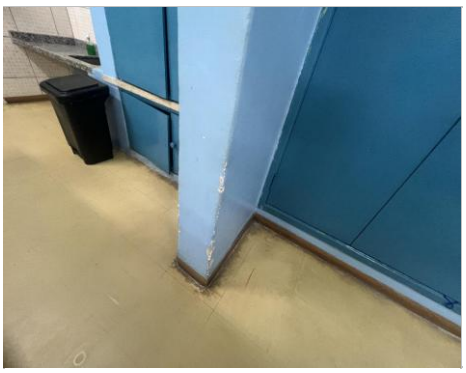


foto 23: Sala de aula 04
Sinais de umidade no piso



foto 24: Sala de aula 04
Sinais de umidade no piso e parede, rodapé deteriorado.



foto 25: Sala de aula 04
Sinais de umidade nas paredes

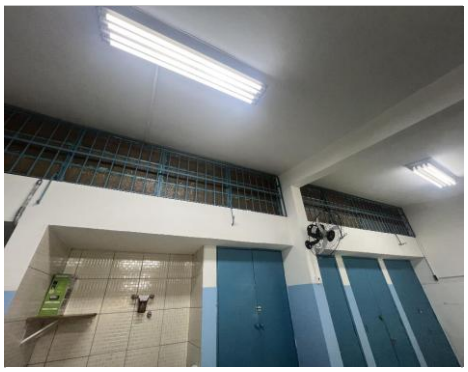


foto 26: Sala de aula 04
Armários



foto 27: Sala de aula 02



foto 28: Sala de aula 02
Revestimento descascando e umidade no piso.



foto 29: Sala de aula 02
Umidade no piso, pintura das paredes deteriorada e com fissuras.



foto 30: Sala de aula 02
Umidade no piso.

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI ANTONIA DE OLIVEIRA MOTA DE ARAUJO

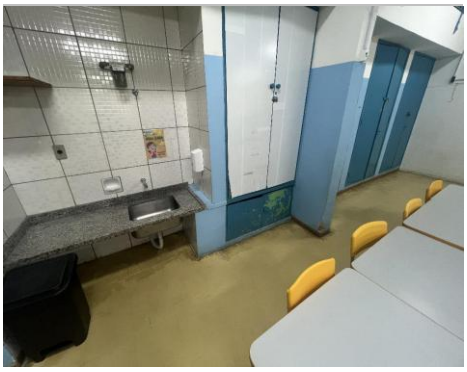


foto 31: Sala de aula 04
Sinais de umidade no piso, revestimento e pintura dos armários, descascando.



foto 32: Sala de aula 04
Sinais de umidade no piso, rodapé e quadro totalmente deteriorado.



foto 33: Sala de aula 01



foto 34: Sala de aula 01
Sinais de umidade no piso, rodapé, parede e pintura deteriorada.



foto 35: Sala de aula 01
Sinais de umidade e piso quebrado.



foto 36: Sala de aula 01
Sinais de umidade e piso quebrado.



foto 37: Sala de aula 01
Sinais de umidade no piso, rodapé, parede e pintura deteriorada.



foto 38: Sala de aula 01
Piso bastante deteriorado.

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI ANTONIA DE OLIVEIRA MOTA DE ARAUJO



foto 39: Biblioteca
Piso desgastado



foto 40: Biblioteca
Fissuras horizontais na parede.



foto 41: Banheiro feminino



foto 42: Banheiro feminino
Piso deteriorado, sinais de umidade, rachaduras.



foto 43: Vista refeitório

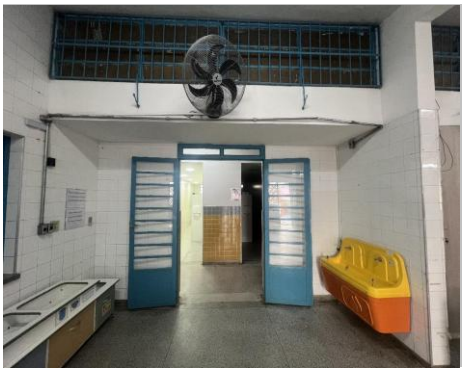


foto 44: Área bebedouro



foto 45: Refeitório
Piso com sinais de umidade e deteriorado.



foto 46: Refeitório

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI ANTONIA DE OLIVEIRA MOTA DE ARAUJO



foto 47: Refeitório
Parede quebrada

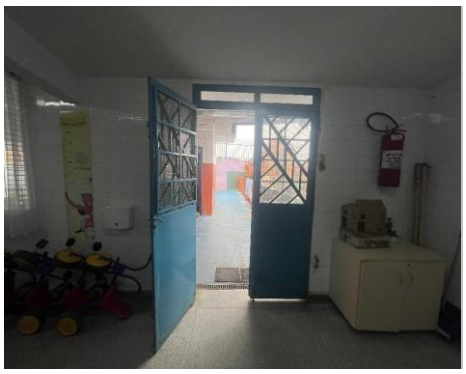


foto 48: Refeitório



foto 49: Refeitório
Vidro da porta quebrado e revestimento da porta deteriorado.

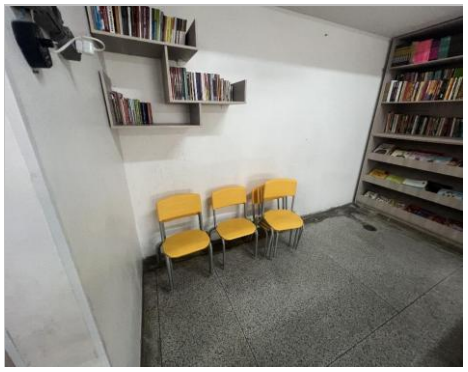


foto 50: Refeitório
Sinais de umidade e fissuras.



foto 51: Cozinha
Piso deteriorado



foto 52: Cozinha
Piso deteriorado



foto 53: Cozinha



foto 54: Cozinha

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI ANTONIA DE OLIVEIRA MOTA DE ARAUJO



foto 55: Área externa
Parede e piso com revestimento degradado, umidade, pintura descascada e fissuras.



foto 56: Área externa
Parede e piso com revestimento degradado, umidade, pintura descascada e fissuras.



foto 57: Área externa
Parede e piso com revestimento degradado, umidade, pintura descascada e fissuras.



foto 58: Área externa
Parede e piso com revestimento degradado, umidade, pintura descascada e fissuras.



foto 59: Estacionamento
Parede e piso com revestimento degradado, umidade, pintura descascada e fissuras.



foto 60: Estacionamento
Parede e piso com revestimento degradado, umidade, pintura descascada e fissuras.



foto 61: Estacionamento
Parede e piso com revestimento degradado, umidade, pintura descascada e fissuras.



foto 62: Área externa
Parede e piso com revestimento degradado, umidade, pintura descascada e fissuras.

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI ANTONIA DE OLIVEIRA MOTA DE ARAUJO



foto 63: Área externa
Parede e piso degradados, sinais de umidade e fissuras.



foto 64: Área externa
Parede e piso degradados, sinais de umidade, pintura descascada e fissuras.



foto 65: Hidrômetro
Pintura degradada, umidade e fissuras.



foto 66: Vista parque



foto 67: Vista parque



foto 68: Vista parque

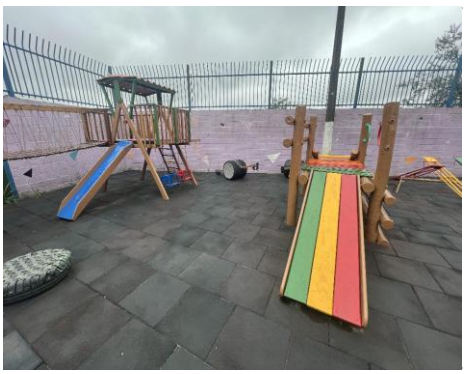


Foto 69: Vista parque

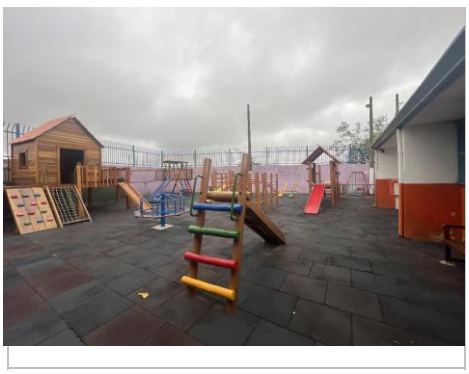


Foto 70:Vista parque

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI ANTONIA DE OLIVEIRA MOTA DE ARAUJO



Foto 71: Área externa



Foto 72: Área externa

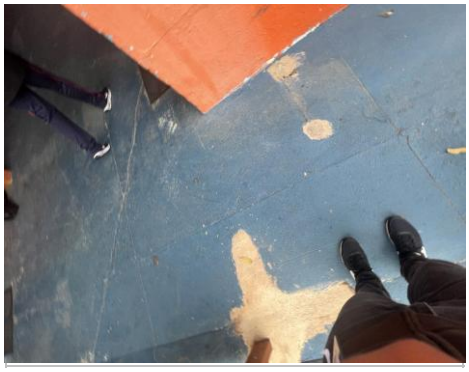


Foto 73: Área externa
Piso degradado, sinais de umidade, pintura descascada e fissuras.



Foto 74: Área externa
Parede e piso degradados, sinais de umidade, pintura descascada e fissuras.



Foto 75: Tanque de areia

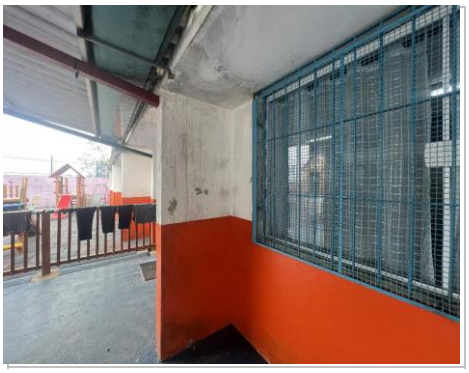


Foto 76: Área externa
Parede com pintura degradada, umidade, pintura descascada e fissuras.



Foto 77: Área externa
Teto com pintura degradada, umidade e fissuras.



Foto 78: Entrada e saída
Parede e piso degradados, sinais de umidade, pintura descascada e fissuras.

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI ANTONIA DE OLIVEIRA MOTA DE ARAUJO



Foto 79: Entrada e saída
Parede e piso degradados, sinais de umidade, pintura descascada e fissuras.



Foto 80: Pateo descoberto




Foto 81: Lavabo




Foto 82: Coordenação pedagógica



Foto 83: Almoxarifado



Foto 84: Refeitório funcionários



Foto 85: Lavanderia
Telhado danificado



Foto 86: Lavanderia
Infiltração próxima

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI ANTONIA DE OLIVEIRA MOTA DE ARAUJO



Foto 87: Lavanderia
Infiltração próxima

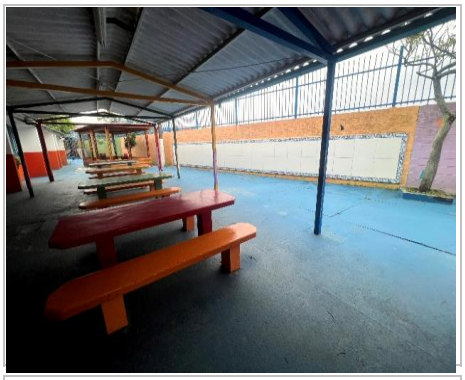


Foto 88: Pateo coberto
Desgaste de piso



Foto 89: Telhado
Danificado



Foto 90: Telhado
Danificado



Foto 91: Telhado
Danificado



Foto 92: Fachada
Pintura danificada, infiltrações



Foto 93: Fachada
Pintura danificada, infiltrações

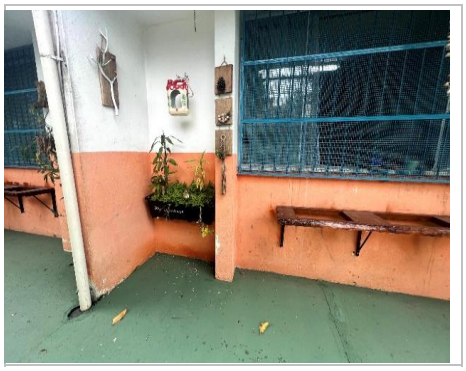


Foto 94: Fachada
Pintura danificada, infiltrações

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI ANTONIA DE OLIVEIRA MOTA DE ARAUJO



Foto 95 - Reservatorio

Pintura desgastada e infiltração



Foto 96 - Hidrometro



Foto 97 - Quadro de entrada

Não tinham a chave para abrir



Foto 98 - Quadros

Antigos e danificados
