CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL

Dados Gerais

Nome da Unidade:	EMEF FORTE DOS REIS MAGOS		
Sequencial (U.E):	62	**Código da Unidade:**	99792

Endereço da Escola

Logradouro, número e complemento (se houver)	RUA FORTE DOS REIS MAGOS, 46 - JARDIM RODOLFO PIRANI - CEP 08310430 - SÃO PAULO/SP

Descrição do Imóvel

Tipo de Construção (técnica construtiva predominante)	Concreto armado fechamento em alvenaria	Padrão:	11. EMEF 20 SALAS OLIVAL COSTA	Nº de Pavimentos	4

Implantação

Área do Terreno (m²)	4.941,13				Área Edificada/ Construída (m²)	3.041,80	
Área Pavimentada (m²)	2.330,68				Área Verde / Permeável (m²)	1.850,00	
Área da projeção do(s) edifício(s) (m²)	760,45		Bloco salas	760,45	Quadra	660,00	no corpo do edifício (4º pavimento)

Abastecimento

Água										
Forma de abastecimento (rede pública, poço artesiano, sem abastecimento etc.):	REDE PÚBLICA									
Quantidade de reservatório de água	1									
Capacidade por reservatório (L)	De 10.001 a 20.000 L	Constatação	Visual	Projeto	NÃO					
Gás										
Encanado (Sim ou Não)	NÃO	Botijão de Gás (Sim ou Não)		SIM		Quantidade de Botijões de Gás	5			
Energia Elétrica										
Aparelho Ar condicionado (Sim ou Não)	NÃO					Quantidade:	N/A			
Possui fonte de energia complementar (Sim ou Não)?	NÃO					Qual (por ex. Painel Solar ou outro)?	N/A			
Possui Gerador de Energia? (Sim ou Não)?	SIM					Capacidade: VISUAL	N/A			
Esgoto										
Rede Pública (Sim ou Não)	SIM					Fossa Séptica (Sim ou Não)	NÃO			
Caixa de Gordura (Sim ou Não)	SIM					Caixa de Passagem (Sim ou Não)	SIM			

Informações sobre Prevenção de Incêndios (AVCB e SPDA)

Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro (Sim ou Não)	NÃO	Nº	N/A						
Extintor	SIM	15							
Hidrante	SIM	4							
Sinalização Emergência	SIM	85							
Iluminação Emergência	SIM	16							
Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) (Sim ou Não)	SIM	Nº	Total (Sim ou N	SIM	Parcial (Sim ou Não)	SIM			

Acessibilidade

Elevador (Sim ou Não)	SIM			Quantidade:	1	Quant. Ativos/Funcionais:	1	
Plataforma Elevatória (Sim ou Não)	NÃO			Quantidade:	N/A	Quant. Ativos/Funcionais:	N/A	
Rampa de Acesso a Unidade (Sim ou Não)	SIM			Rampa de Acesso a outros espaços necessários (Sim ou Não)			NÃO	
Tipo de sinalização	SIM	Sonora (Sim ou Não)	NÃO	Visual (Sim ou Não)	SIM	Tátil (Sim ou Não)	SIM	
Selo de Acessibilidade (Sim ou Não)	NÃO		Nº	N/A				
Vaga de estacionamento para deficientes (Sim ou Não)	SIM			Quantidade:	1			

CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL

Ambientes da Escola

Administrativo e Apoio/Serviços

Ambiente	Comprimento (m)	Largura (m)	Pé Direito (m)	Área (m²)	Tipo de Construção	Revestimento de Piso	Revestimento de Parede	Possui Forro? Se sim, qual tipo?	Nível de Comprometimento do Ambiente	Observações
Lavanderia	2,80	3,48	3,63	10,00	Concreto / Alvenaria	Granilite	Pintura	Não	**0**	
Despensa	5,80	3,74	3,63	17,00	Concreto / Alvenaria	Granilite	Pintura	Não	**0**	
Depósito despensa	3,18	0,70	3,63	2,00	Concreto / Alvenaria	Granilite	Pintura	Não	**0**	
Hall serviços	4,75	1,80	3,63	8,55	Concreto / Alvenaria	Granilite	Pintura	Não	**0**	
Cozinha	7,00	7,13	3,63	38,00	Concreto / Alvenaria	Cerâmico	Cerâmico	Não	**0**	
Refeitório / Recreio	21,50	8,00	3,63	172,00	Concreto / Alvenaria	Granilite	Pintura	Não	**3**	Piso desgastado (Foto 78)
Térreo - Circulação	53,03	3,30	3,63	175,00	Concreto / Alvenaria	Granilite	Pintura	Não	**0**	
Sala dos Professores	7,16	3,55	3,63	25,00	Concreto / Alvenaria	Granilite	Pintura	Não	**3**	Piso desgastado (Foto 17)
Sala de Reuniao	7,16	3,55	3,63	25,00	Concreto / Alvenaria	Granilite	Pintura	Não	**3**	Infiltração nas paredes e teto (Foto 52)
Depósito 1	2,00	3,50	3,63	7,00	Concreto / Alvenaria	Granilite	Pintura	Não	**0**	
Diretoria	3,50	7,00	3,63	24,50	Concreto / Alvenaria	Granilite	Pintura	Não	**3**	Pintura deteriorada (Foto 12 e 13)
Hall diretoria	3,70	4,60	3,63	17,02	Concreto / Alvenaria	Granilite	Pintura	Não	**0**	
Secretaria	7,00	5,78	3,63	40,00	Concreto / Alvenaria	Granilite	Pintura	Não	**0**	
Almoxarifado	7,62	1,20	3,63	8,00	Concreto / Alvenaria	Granilite	Pintura	Não	**0**	
Circulação/entrada	6,97	7,16	3,63	50,00	Concreto / Alvenaria	Granilite	Pintura	Não	**3**	Sinais de umidade (Foto 14)
Depósito 2	4,00	2,00	3,63	8,00	Concreto / Alvenaria	Granilite	Pintura	Não	**0**	
1º Pavimento - Circulação	53,03	3,30	3,63	175,00	Concreto / Alvenaria	Granilite	Pintura	Não	**0**	
SRM	7,16	3,50	3,63	25,00	Concreto / Alvenaria	Granilite	Pintura	Não	**0**	
AVE	2,00	2,00	3,63	4,00	Concreto / Alvenaria	Granilite	Pintura	Não	**0**	
Sala de Educação Física	2,00	2,00	3,63	4,00	Concreto / Alvenaria	Granilite	Pintura	Não	**3**	Sinais de umidade e fissuras no teto (Foto 55 e 56)
2º Pavimento - Circulação	53,03	3,30	3,63	175,00	Concreto / Alvenaria	Granilite	Pintura	Não	**3**	Piso desagsatdo (Foto 28)
Quadra coberta	37,71	17,50	7,00	660,00	Concreto / Alvenaria	Granilite	Pintura	Não	**0**	
3º Pavimento - Circulação	16,74	6,00	3,63	100,45	Concreto / Alvenaria	Granilite	Pintura	Não	**3**	Piso desagsatdo (Foto 151)
Estacionamento	24,00	15,00	NA	360,00	Alvenaria	Cimentado	Pintura	NA	**0**	
Quadra descoberta	30,00	18,00	NA	540,00	Alvenaria	Cimentado	Pintura	NA	**0**	
Pátio descoberto	32,00	12,50	NA	400,00	Alvenaria	Cimentado	Pintura	NA	**0**	
Pátio descoberto jardim/ playgound	45,33	15,00	NA	680,00	Alvenaria	Cimentado / Natural	Pintura	NA	**0**	

CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL												
Solario descoberto	20,00	5,00	NA	100,00	Alvenaria	Cimentado	Pintura	NA	**3**	Infiltração nas paredes externas (Foto 153)		
Salas de Aula												
Ambiente	Comprimento (m)	Largura (m)	Pé Direito (m)	Área (m²)	Tipo de Construção	Revestimento de Piso	Revestimento de Parede	Possui Forro? Se sim, qual tipo?	Nível de Comprometimento do Ambiente	Observações		
Sala de Aula 1	7,16	7,07	3,63	49,00	Concreto / Alvenaria	Granilite	Pintura	Não	**0**			
Sala de Aula 2	7,16	7,07	3,63	49,00	Concreto / Alvenaria	Granilite	Pintura	Não	**0**			
Sala de Aula 3	7,16	7,07	3,63	50,00	Concreto / Alvenaria	Granilite	Pintura	Não	**0**			
Sala de Aula 4	7,16	7,07	3,63	50,00	Concreto / Alvenaria	Granilite	Pintura	Não	**0**			
Sala de Aula 5	7,16	7,07	3,63	50,00	Concreto / Alvenaria	Granilite	Pintura	Não	**0**			
Sala de Aula 6	7,16	7,07	3,63	50,00	Concreto / Alvenaria	Granilite	Pintura	Não	**0**			
Sala de Aula 7	7,16	7,07	3,63	50,00	Concreto / Alvenaria	Granilite	Pintura	Não	**0**			
Sala de Aula 8	7,16	7,07	3,63	49,00	Concreto / Alvenaria	Granilite	Pintura	Não	**0**			
Sala de Aula 9	7,16	7,07	3,63	50,00	Concreto / Alvenaria	Granilite	Pintura	Não	**0**			
Sala de Aula 10	7,16	7,07	3,63	50,00	Concreto / Alvenaria	Granilite	Pintura	Não	**0**			
Sala de Aula 11	7,16	7,07	3,63	50,00	Concreto / Alvenaria	Granilite	Pintura	Não	**0**			
Sala de Aula 12	7,16	3,50	3,63	25,00	Concreto / Alvenaria	Granilite	Pintura	Não	**0**			
Sala de Aula 13	7,16	7,07	3,63	50,00	Concreto / Alvenaria	Granilite	Pintura	Não	**0**			
Sala de Aula 14	7,16	7,07	3,63	50,00	Concreto / Alvenaria	Granilite	Pintura	Não	**0**			
Sala de Aula 15	7,16	7,07	3,63	50,00	Concreto / Alvenaria	Granilite	Pintura	Não	**0**			
Sala de Laboratório	7,16	7,07	3,63	50,00	Concreto / Alvenaria	Granilite	Pintura	Não	**0**			
Sala de Informática	7,16	7,07	3,63	50,00	Concreto / Alvenaria	Granilite	Pintura	Não	**3**	Vidros quebrados (Foto 48)		
Sala de Leitura	7,16	7,07	3,63	50,00	Concreto / Alvenaria	Granilite	Pintura	Não	**0**			
Sanitários										**Informações Complementares**		
Ambiente	Comprimento (m)	Largura (m)	Pé Direito (m)	Área (m²)	Revestimento de Piso	Revestimento de Parede	Possui Forro? Se sim, qual tipo?	Observações	Nível de Comprometimento do Ambiente	Quant. Vasos Sanitários	Quant. Cubas e trocadores	Quant. Chuveiros
Térreo - WC Feminino	2,28	3,48	3,63	8,00	Cerâmico	Cerâmico	Gesso		**0**	2	2	0
Térreo - WC Masculino	1,66	2,34	3,63	4,00	Cerâmico	Cerâmico	Gesso		**0**	1	1	0
Térreo - WC PNE Masculino	2,00	1,50	3,63	3,00	Cerâmico	Cerâmico	Gesso		**0**	1	1	1
Térreo - WC PNE Feminino	2,00	1,50	3,63	3,00	Cerâmico	Cerâmico	Gesso		**0**	1	1	1
Térreo - WC Feminino	3,47	4,90	3,63	17,00	Cerâmico	Cerâmico	Gesso		**0**	4	4	0
Térreo - WC Masculino	3,37	4,75	3,63	16,00	Cerâmico	Cerâmico	Gesso		**0**	4	4	0
Térreo - WC PNE Masculino	2,00	2,00	3,63	4,00	Cerâmico	Cerâmico	Gesso		**0**	1	1	1
Térreo - WC PNE Feminino	2,00	2,00	3,63	4,00	Cerâmico	Cerâmico	Gesso		**0**	1	1	1
2º Pav. - WC Feminino	3,47	4,90	3,63	17,00	Cerâmico	Cerâmico	Gesso		**0**	4	4	0
2º Pav. - WC Masculino	3,37	4,75	3,63	16,00	Cerâmico	Cerâmico	Gesso		**0**	4	4	0

CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL												
2º Pav. -WC PNE Masculino	2,00	2,00	3,63	4,00	Cerâmico	Cerâmico	Gesso		**0**	1	1	0
2º Pav. -WC PNE Feminino	2,00	2,00	3,63	4,00	Cerâmico	Cerâmico	Gesso		**0**	1	1	0

Informações Adicionais

Ambiente	Necessário adequar ou implantar? (SIM / NÃO / NÃO SE APLICA)	Informações Complementares						Observações
Fechamento do lote (muro, cerca, gradil, vegetação)	SIM	Muro	Área (m²)	4.447,02	Gradil	Área (m²)		Muros e muretas com infiltração e rachaduras (Fotos 123,124 e 130)
Estacionamento(s)	SIM	Área (m²)	360,00					Piso com rachaduras e pintura desgastada (Foto 128)
Playground (Sim ou Não)	SIM	Área (m²)	680,00					Piso com rachaduras e pintura desgastada (Foto 118 e 119)
Tanque de Areia (Sim ou Não)	N/A	Área Cúbica (m³)						
Calçadas (Sim ou Não?)	NÃO							
Serralherias (Portões, travas e outros)	NÃO							
Alarmes e sensores (Sim ou Não?)	NÃO							
Câmeras de segurança (Sim ou Não?)	NÃO							
Rede de gás na testada? (Sim ou Não)	N/A							

Observações Gerais:	**Escola em bom estado de conservação com poucas avarias consideráveis.**

FICHA 4 - DIAGNÓSTICO DE ASPECTOS DE INFRAESTRUTURA PREDIAL DAS UNIDADES ESCOLARES			
Item	**Descrição dos Itens Avaliados**	**Necessidade de Intervenção**	**Observações**
1. Infraestrutura da Escola			
Condições das fundações, pilares, vigas, lajes, cobertura, estruturas metálicas, paredes, esquadrias e pisos			
1.1	Fundações: verificar se há rachaduras, trincas, fissuras, desplacamentos ou quaisquer sinais de falhas na fundação que possam comprometer a estabilidade do prédio	NÃO	
1.2	Pilares: verificar se há rachaduras, trincas, fissuras, desplacamentos ou quaisquer sinais de falhas nos pilares que possam comprometer a estabilidade do prédio	NÃO	
1.3	Vigas: verificar se há rachaduras, trincas, fissuras, desplacamentos ou quaisquer sinais de falhas nas vigas que possam comprometer a estabilidade do prédio	NÃO	
1.4	Lajes: verificar se há rachaduras, trincas, fissuras, desplacamentos ou quaisquer sinais de falhas nas lajes que possam comprometer a estabilidade do prédio	NÃO	
1.5	Cobertura: verificar se há sinais de infiltração, vazamentos, telhas soltas ou outras falhas que possam causar danos à estrutura da escola	SIM	Cobertura com sinais de infiltração, telhas quebradas e desgastada pelo tempo/uso
1.6	Estruturas metálicas: verificar se há sinais de problemas nas estruturas metálicas, como corrosão ou deformação	NÃO	
1.7	Paredes: verificar se há sinais de problemas nas paredes, como rachaduras, infiltrações ou umidade excessiva	SIM	Paredes de alguns ambientes com infiltração e manchas de umidade
1.8	Esquadrias: verificar se há problemas nas esquadrias, tais como falta de peças, corrosão, vidros quebrados e dificuldade de manuseio	SIM	Esquadrias em corrosão
1.9	Pisos: verificar se há sinais de problemas nos pisos, como desníveis, rachaduras ou solturas de revestimento	SIM	Pisos com rachaduras, desnivel e infiltração
2. Instalações Elétricas e Hidráulicas			
Condições das instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias			
2.1	Instalações elétricas: verificar se as instalações elétricas estão em conformidade com as normas de segurança, se há fios expostos, equipamentos com defeito ou outros problemas que possam representar risco de incêndio ou choque elétrico. verificar também se o quadro de energia está em bom estado e se as tomadas e interruptores estão funcionando corretamente	SIM	Os quadros elétricos apresentam diversas inconformidades significativas, não atendendo aos requisitos essenciais da ABNT NBR 5410, NR-10 e NBR IEC 61439, representando risco elevado de choque elétrico, falhas de proteção e comprometimento da segurança operacional da instalação.
2.2	Instalações hidráulicas: verificar se as instalações hidráulicas estão em bom estado, sem vazamentos, rachaduras ou outros problemas que possam prejudicar o funcionamento do sistema. verificar também se as torneiras, registros e outros componentes estão em bom estado e se o sistema de esgoto está funcionando corretamente	NÃO	
2.3	Instalações sanitárias: verificar se as instalações sanitárias estão em bom estado, sem vazamentos, rachaduras ou outros problemas que possam prejudicar o funcionamento do sistema. verificar também se as louças sanitárias, como vasos e pias, estão em bom estado e se os ralos estão desobstruídos	NÃO	
2.4	Reservatórios de água: verificar se os reservatórios de água estão em bom estado, sem vazamentos ou outros problemas que possam prejudicar o funcionament do sistema de abastecimento	NÃO	

CAIXA

FICHA 4 - DIAGNÓSTICO DE ASPECTOS DE INFRAESTRUTURA PREDIAL DAS UNIDADES ESCOLARES			
Item	**Descrição dos Itens Avaliados**	**Necessidade de Intervenção**	**Observações**
3. Acessibilidade			
	Condições de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida		
3.1	Rampas de acesso: verificar se há rampas de acesso em bom estado e com inclinação adequada	NÃO	
3.2	Elevadores: verificar se há elevadores em bom estado e se estão em conformidade com as normas de acessibilidade	NÃO	
3.3	Banheiros adaptados: verificar se há banheiros adaptados em bom estado e se estão em conformidade com as normas de acessibilidade	NÃO	
4. Condições de Habitabilidade			
	Condições de ventilação e iluminação natural e artificial e conforto térmico dos ambientes		
4.1	Condições gerais de habitabilidade e conforto térmico por setor (salas de aulas, outros ambientes pedagógicos, ambientes administrativos, cozinha e refeitório, etc.)	NÃO	
5. Áreas Externas/Paisagismo			
	Condições de adequabilidade das áreas externas da escola		
5.1	Condições Gerais do Paisagismo na Unidade Educacional	NÃO	
5.2	Drenagem: verificar se a drenagem da área externa da escola está funcionando corretamente, evitando acúmulo de água em dias de chuva	NÃO	
5.3	Pintura externa: verificar se a pintura externa da escola está em bom estado, sem descascamentos ou sinais de desgaste	SIM	Verificou-se a necessidade de regularização e pintura de todas as paredes da fachada

Profissional Responsável
Nome: RENATA CARDOSO MONIZ CALDEIRA
Cargo/função: ARQUITETA E URBANISTA
CREA/CAU: A57880-0

Responsável pela validação CAIXA
Nome: Decio de Souza Espindola
Cargo/função: Engenheiro Civil
CREA/CAU: 5062158870-SP

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEF FORTE DOS REIS MAGOS

1 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Cód. Unidade	
99792	EMEF FORTE DOS REIS MAGOS



foto 01: Placa Interna



foto 02: Placa externa



foto 03: Fachada
Vista da rua



foto 03: Fachada
Vista da rua



foto 05: Fachada
Vista da rua



foto 06: Fachada
Vista da rua

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF FORTE DOS REIS MAGOS

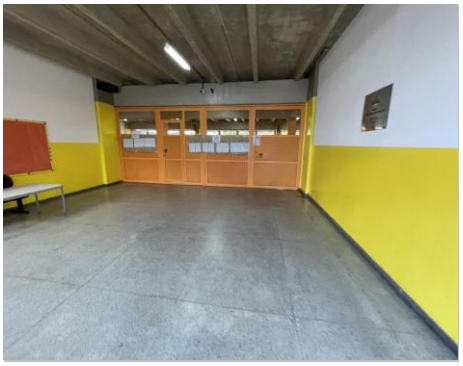


foto 07: Hall de entrada

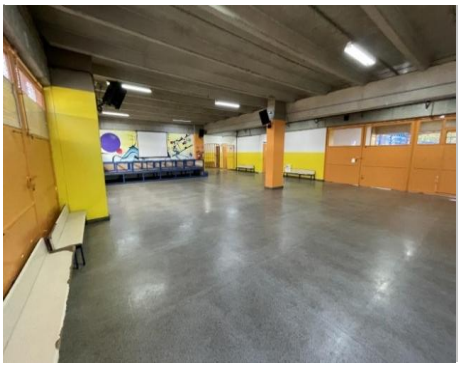


foto 08: Pátio interno



foto 09: Secretaria



foto 10: Secretaria



foto 11: Diretoria




foto 12: Diretoria
Pintura deteriorada



foto 13: Diretoria
Pintura deteriorada



foto 14: Circulação
Sinais de umidade

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEF FORTE DOS REIS MAGOS



foto 15: Sala dos professores



foto 16: Sala dos professores

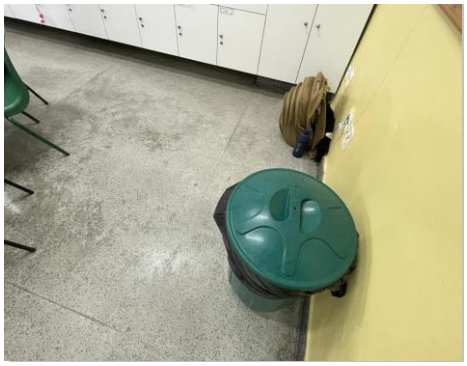


foto 17:Sala dos professores

Piso desgastado



foto 18: Depósito




foto 19: Depósito



foto 20: Almoxarifado

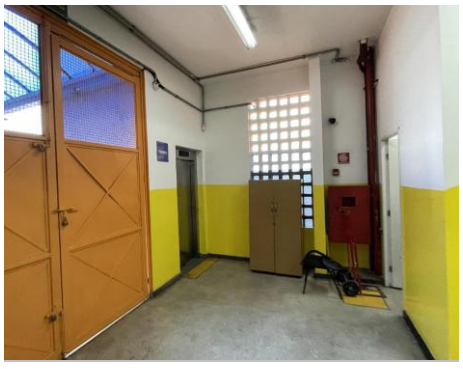


foto 21: Área comum



foto 22: Elevador

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF FORTE DOS REIS MAGOS

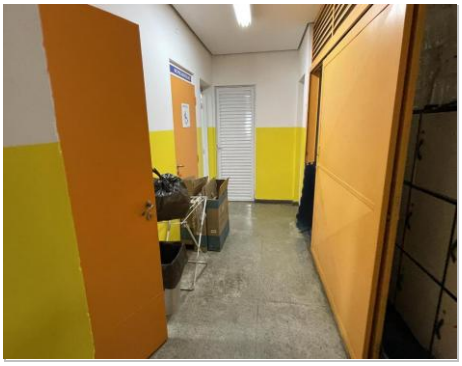


foto 23: Corredor



foto 24: Sala Sensorial



foto 25: Coord. Pedagógica



foto 26: Coord. Pedagógica



foto 27: Circulação



foto 28: Circulação
Piso desagsatdo



foto 29: Sala de aula 10



foto 30: Sala de aula 10

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEF FORTE DOS REIS MAGOS



foto 31: Sala de aula 11



foto 32: Sala de aula 11



foto 33: Sala de aula 12



foto 34: Sala de aula 12



foto 35: Sala de aula 13



foto 36: Sala de aula 13



foto 37: Sala de aula 14



foto 38: Sala de aula 14

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEF FORTE DOS REIS MAGOS



foto 39: Sala de aula 15

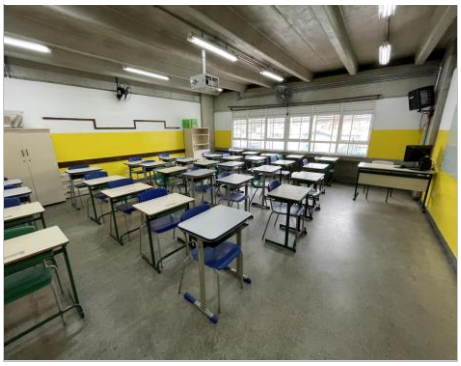


foto 40: Sala de aula 15



foto 41: Sala de aula 16



foto 42: Sala de aula 16



foto 43: Sala de aula 17

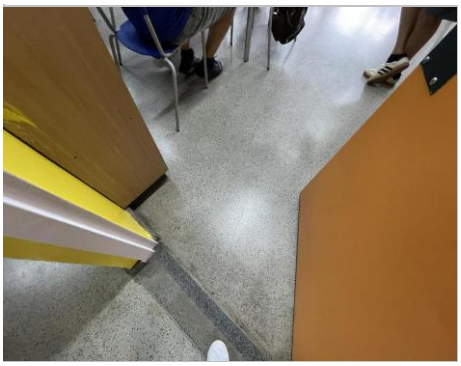


foto 44: Sala de aula 17



foto 45: Sala de informatica



foto 46: Sala de informatica

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF FORTE DOS REIS MAGOS



foto 47 Sala de informatica



foto 48: Sala de informatica
Vidros quebrados



foto 49: Laboratório

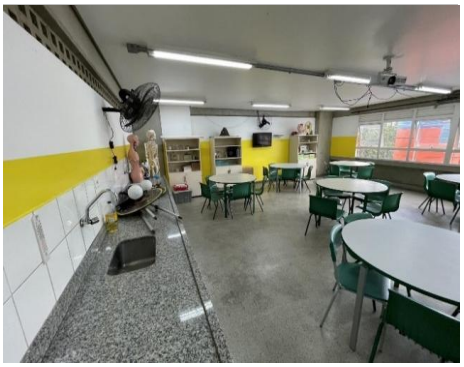


foto 50: Laboratório

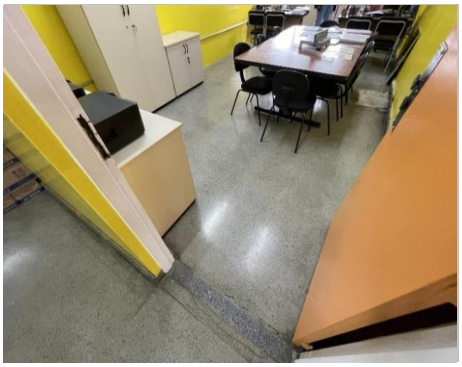


foto 51: Sala de reunião



foto 52:Sala de reunião
Infiltração



foto 53: Apoio pedagogico



foto 54:Apoio pedagogico

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF FORTE DOS REIS MAGOS



foto 55: Sala de Educação fisica
Sinais de umidade e fissuras no teto



foto 56: Sala de Educação fisica
Sinais de umidade e fissuras no teto



foto 57: Sala de aula 22



foto 58: Sala de aula 22



foto 59: Sala de aula 23



foto 60: Sala de aula 23



foto 61: Sala de aula 24

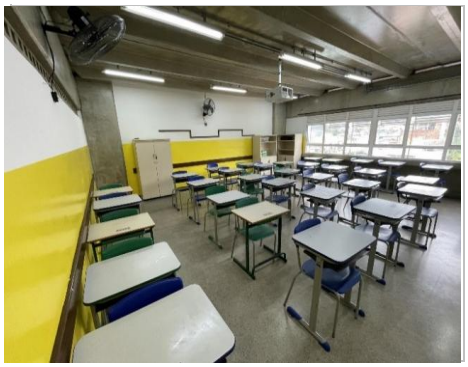


foto 62: Sala de aula 24

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEF FORTE DOS REIS MAGOS



foto 63: Sala de aula 25

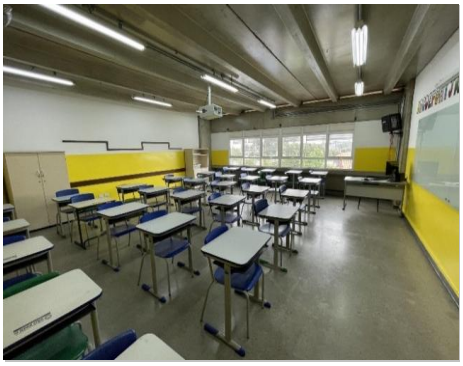


foto 64: Sala de aula 25



foto 65: Sala de aula 26

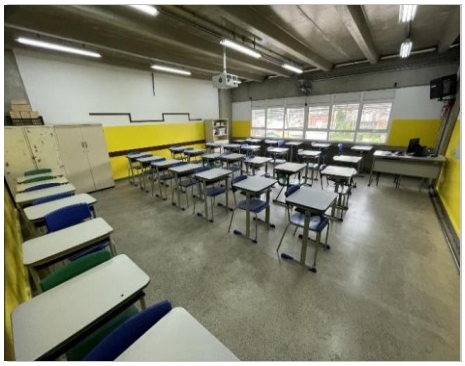


foto 66: Sala de aula 26



foto 67: Sala de aula 27

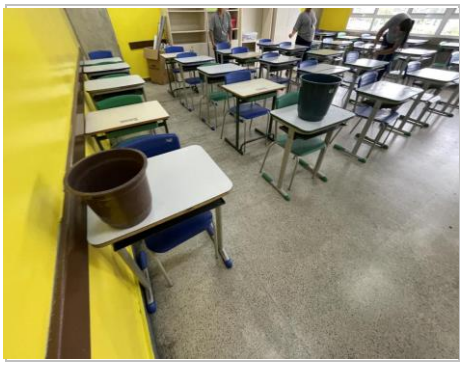


foto 68: Sala de aula 27



Foto 69: Sala de aula 28



Foto 70: Sala de aula 28

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEF FORTE DOS REIS MAGOS



Foto 71: Cozinha / Copa



Foto 72: Cozinha / Copa

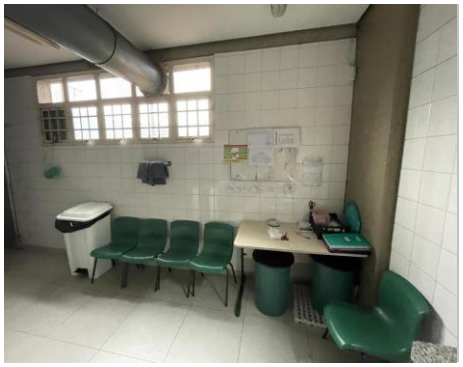


Foto 73: Cozinha / Copa



Foto 74: Cozinha / Copa



Foto 75: Cozinha / Copa



Foto 76: Cozinha / Copa



Foto 77: Cozinha / Copa



Foto 78: Refeitório alunos
Piso desgastado

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF FORTE DOS REIS MAGOS



Foto 79: Refeitório de alunos



Foto 80: Refeitório de Funcionários

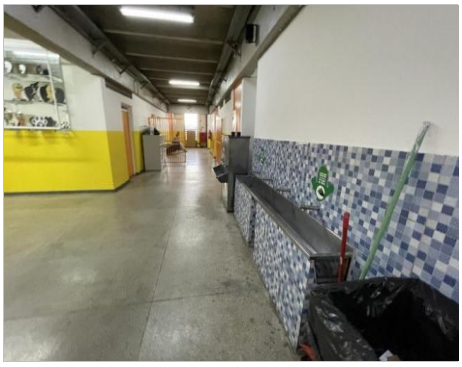


Foto 81: Lavatório / Bebedouro
Térreo

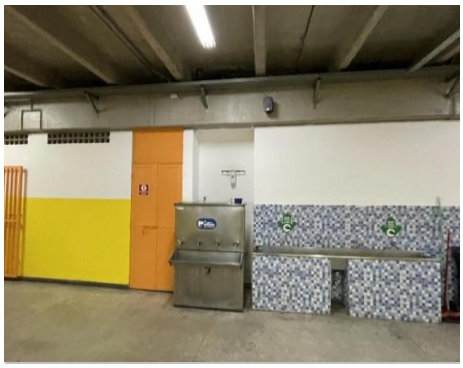


Foto 82: Lavatório / Bebedouro
Térreo



Foto 83: Lavanderia

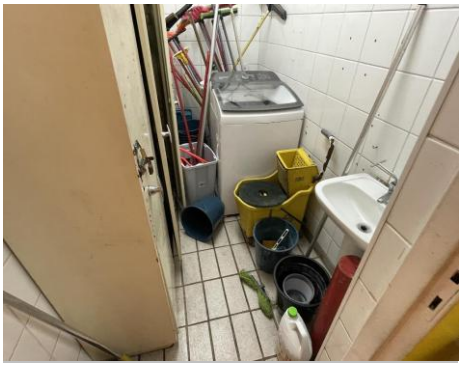


Foto 84: Lavanderia



Foto 85: WC Feminino 1



Foto 86: WC Feminino

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEF FORTE DOS REIS MAGOS



Foto 87: WC Masculino 1

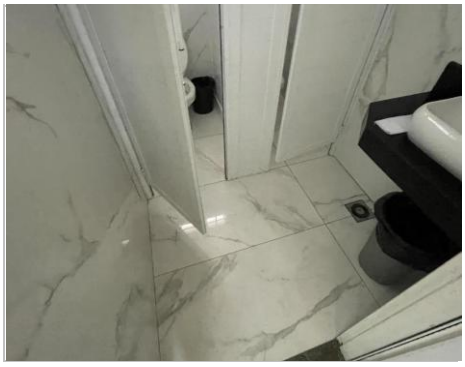


Foto 88: WC Masculino



Foto 89: WC Feminino 2



Foto 90: WC Feminino



Foto 91: WC Masculino 2



Foto 92: WC Masculino



Foto 93: WC PNE Feminino



Foto 94: WC PNE Feminino

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEF FORTE DOS REIS MAGOS



Foto 95: WC PNE Masculino

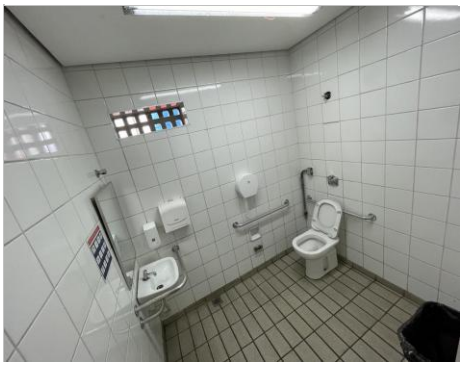


Foto 96: WC PNE Masculino



Foto 97: WC Feminino 3



Foto 98: WC Feminino



Foto 99: WC Masculino 3



Foto 100: WC Masculino

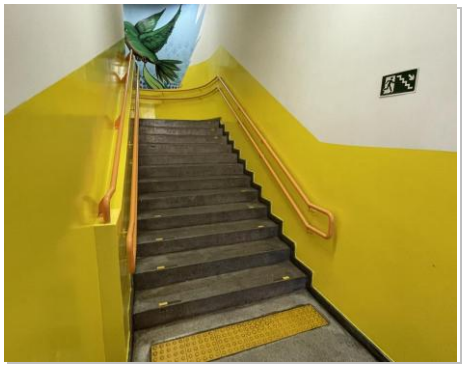


Foto 101: Escada Interna



Foto 102: Hall quadra coberta

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF FORTE DOS REIS MAGOS



Foto 103: Quadra Coberta



Foto 104: Quadra Coberta

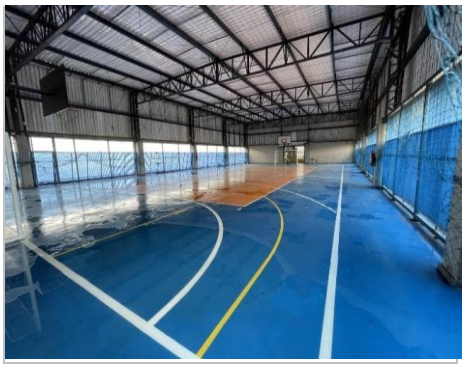


Foto 105: Quadra Coberta



Foto 106: Quadra Coberta
Telhado



Foto 107: Quadra Coberta
Telhado



Foto 108: Quadra Coberta

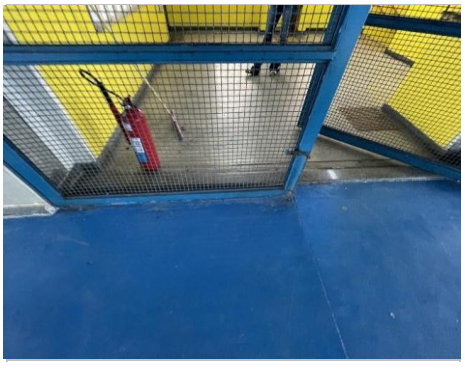


Foto 109: Portão da Quadra coberta

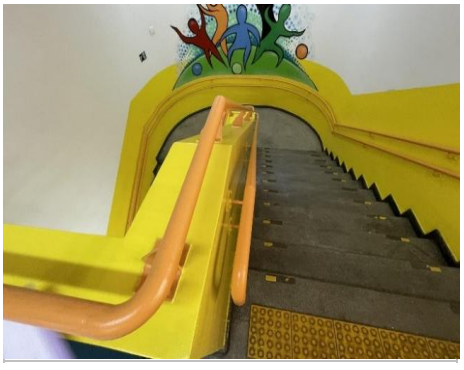


Foto 110: Escada interna / 3 andar

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF FORTE DOS REIS MAGOS



Foto 111: Área externa
Toldo



Foto 112: Área externa



Foto 113: Pátio externo



Foto 114: Vista do prédio
Sinais de umidade



Foto 115: Área Externa



Foto 116: Área Externa



Foto 117: Área Externa
Sinais de umidade e fissuras no piso de concreto



Foto 118: Vista do parque

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF FORTE DOS REIS MAGOS



Foto 119: Vista do parque
Piso de concreto deteriorado



Foto 120: Vista do parque



Foto 121: Vista do prédio
Infiltração



Foto 122: Quadra



Foto 123: Área externa
Fissuras no piso de concreto e tinta deteriorada



Foto 124: Área externa
Fissuras no piso de concreto e tinta deteriorada



Foto 125: Área externa
Sinais de umidade e fissuras no piso de concreto



Foto 126: Reservatório

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF FORTE DOS REIS MAGOS



Foto 127: Reservatório / Estacionamento

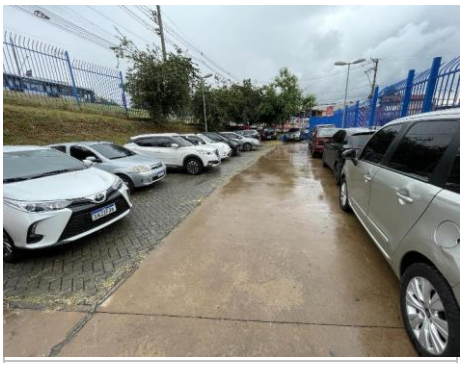


Foto 128: Estacionamento



Foto 129: Vista do prédio



Foto 130: Muro / Vista interna



Foto 131: Área comum / Vista do prédio



Foto 132: Área externa



Foto 133: Vista do prédio
Sinais de umidade, tinta deteriorada



Foto 134: Vista do prédio
Sinais de umidade, tinta deteriorada

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF FORTE DOS REIS MAGOS



Foto 135: Saída do estacionamento



Foto 136: Vista do parque / Prédio



Foto 137: Portão de saída de carros
Piso de concreto com fissuras



Foto 138: Lixo
Piso de concreto com fissuras e sinais de umidade



Foto 139: Lixo
Revestimento em cerâmica quebrado



Foto 140: Vista do medidor de luz

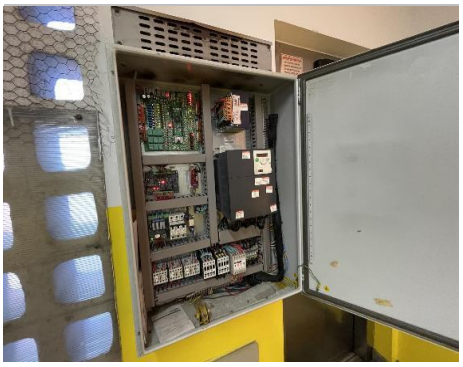


Foto 141: Vista do Quadro



Foto 142: Vista do Quadro

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF FORTE DOS REIS MAGOS

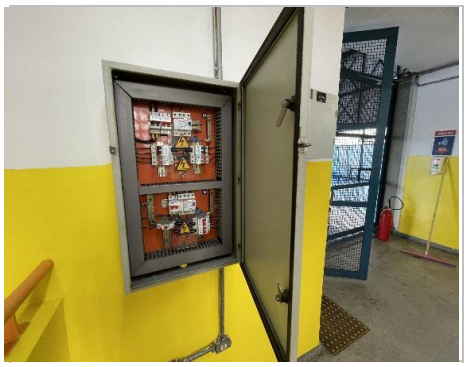


Foto 143: Vista do Quadro



Foto 144: Vista do Quadro



Foto 145: Vista do Quadro



Foto 146: Vista do Quadro

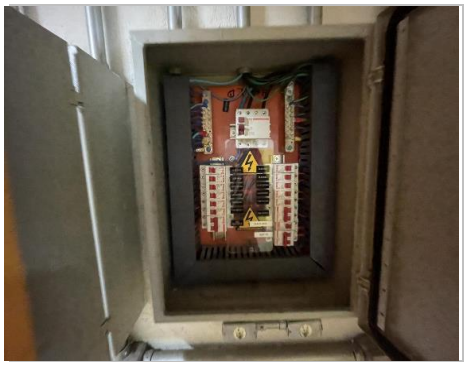


Foto 147: Vista do Quadro



Foto 148: Vista do Quadro

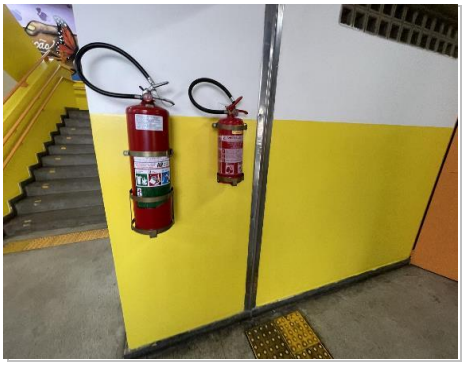


Foto 149: Extintores



Foto 150: Extintores

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEF FORTE DOS REIS MAGOS

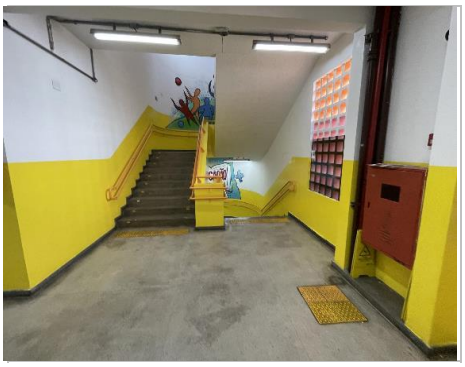


Foto 151: Circulação
Piso desagsatdo



Foto 152: Hidrômetro



Foto 153: Solario
Infiltração



Foto 154: Vista geral



Foto 155: Vista geral



Foto 156: Vista geral



Foto 157: Vista geral



Foto 158: Vista geral
