CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL

Dados Gerais

Nome da Unidade:	CEI MARIA APARECIDA NASCIMENTO		
Sequencial (U.E):	65	**Código da Unidade:**	400762

Endereço da Escola

Logradouro, número e complemento (se houver)	R. Jorge Carlos de Almeida, 66 - Jardim Santo Andre, São Paulo - SP, 08390-355

Descrição do Imóvel

Tipo de Construção (técnica construtiva predominante)	Concreto armado	Padrão:	15. CEI	Nº de Pavimentos	1

Implantação

Área do Terreno (m²)	3.440,00			Área Edificada/ Construída (m²)	1.531,34
Área Pavimentada (m²)	2.000,00			Área Verde / Permeável (m²)	645,00
Área da projeção do(s) edifício(s) (m²)	1.531,34	Bloco salas	1.531,34	Quadra	- *ver observações gerais (quadra considerada na EMEF)

Abastecimento

Água										
Forma de abastecimento (rede pública, poço artesiano, sem abastecimento etc.):	Rede pública, constatação visual.									
Quantidade de reservatório de água	1									
Capacidade por reservatório (L)	12500	Constatação		Visual	Projeto	NÃO				
Gás										
Encanado (Sim ou Não)	NÃO	Botijão de Gás (Sim ou Não)			SIM		Quantidade de Botijões de Gás	3		
Energia Elétrica										
Aparelho Ar condicionado (Sim ou Não)	NÃO						Quantidade:			
Possui fonte de energia complementar (Sim ou Não)?	NÃO						Qual (por ex. Painel Solar ou outro)?			
Possui Gerador de Energia? (Sim ou Não)?	NÃO						Capacidade:			
Esgoto										
Rede Pública (Sim ou Não)	SIM						Fossa Séptica (Sim ou Não)	NÃO		
Caixa de Gordura (Sim ou Não)	SIM						Caixa de Passagem (Sim ou Não)	SIM		

Informações sobre Prevenção de Incêndios (AVCB e SPDA)

Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro (Sim ou Não)	NÃO	Nº	N/A						
Extintor	SIM	4							
Hidrante	SIM	1							
Sinalização Emergência	PARCIAL								
Iluminação Emergência	NÃO								
Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) (Sim ou Não)	PARCIAL	Nº	Total (Sim ou N	NÃO	Parcial (Sim ou Não)		NÃO		

Acessibilidade

Elevador (Sim ou Não)	SIM			Quantidade:	1	Quant. Ativos/Funcionais:	1
Plataforma Elevatória (Sim ou Não)	NÃO			Quantidade:		Quant. Ativos/Funcionais:	
Rampa de Acesso a Unidade (Sim ou Não)	NÃO			Rampa de Acesso a outros espaços necessários (Sim ou Não)			
Tipo de sinalização	NÃO	Sonora (Sim ou Não)	NÃO	Visual (Sim ou Não)		Tátil (Sim ou Não)	NÃO
Selo de Acessibilidade (Sim ou Não)	NÃO		Nº				
Vaga de estacionamento para deficientes (Sim ou Não)	NÃO			Quantidade:	0		

CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL										
Ambientes da Escola										
Administrativo e Apoio/Serviços										
Ambiente	Comprimento (m)	Largura (m)	Pé Direito (m)	Área (m²)	Tipo de Construção	Revestimento de Piso	Revestimento de Parede	Possui Forro? Se sim, qual tipo?	Nível de Comprometimento do Ambiente	Observações
Sala de Leitura	6,85	2,87	2,50	19,66	Alvenaria Estrutural	Granilite	Pintura	Gesso	**2**	Fissura no gesso. Necessário reparo. Foto 14
Circulação Lavanderia	4,00	0,90	2,50	3,60	Alvenaria Estrutural	Granilite	Pintura	Gesso	**2**	Fissura no piso de granilite
Secretaria	7,20	3,50	3,00	25,20	Alvenaria Estrutural	Granilite	Pintura	Laje	**0**	
Diretoria	7,20	3,40	3,00	24,48	Alvenaria Estrutural	Granilite	Pintura	Laje	**0**	
Solário Administração	7,05	4,40	0,00	26,02	Alvenaria Estrutural	Concreto	Pintura	-	**0**	
Solário Sala 5	7,05	4,40	0,00	26,02	Alvenaria Estrutural	Concreto	Pintura	-	**0**	
Coordenação e Sala dos Prof.	7,20	4,10	3,00	29,52	Alvenaria Estrutural	Granilite	Pintura	Laje	**2**	Fissuras e manchas de infiltração. Necessário reparo. Foto 99,100,101,102
Solário Sala 8	7,05	4,40	0,00	26,02	Alvenaria Estrutural	Concreto	Pintura	-	**0**	
Solário Sala 7	7,05	4,40	0,00	26,02	Alvenaria Estrutural	Concreto	Pintura	-	**0**	
Solário Sala 10	7,05	4,40	0,00	26,02	Alvenaria Estrutural	Concreto	Pintura	-	**0**	
Solário Sala 12	7,05	4,40	0,00	26,02	Alvenaria Estrutural	Concreto	Pintura	-	**0**	
Solário Sala 9	7,05	4,40	0,00	26,02	Alvenaria Estrutural	Concreto	Pintura	-	**0**	
Solário Sala 11	7,05	4,40	0,00	26,02	Alvenaria Estrutural	Concreto	Pintura	-	**0**	
Junto com a Sala 16				0,00	Alvenaria Estrutural	Vinilico	Pintura	Laje	**0**	
Solário Sala 16	7,05	4,40	0,00	26,02	Alvenaria Estrutural	Concreto	Pintura	-	**0**	
Solário Sala 13	7,05	4,40	0,00	26,02	Alvenaria Estrutural	Concreto	Pintura	-	**0**	
Solário Sala 18	7,05	4,40	0,00	26,02	Alvenaria Estrutural	Concreto	Pintura	-	**0**	
Copa	4,80	3,45	2,50	16,56	Alvenaria Estrutural	Cerâmico	Azulejo	Gesso	**0**	
Lactário	2,62	2,38	2,50	6,24	Alvenaria Estrutural	Cerâmico	Azulejo	Gesso	**0**	
Cozinha	7,30	4,80	2,50	32,23	Alvenaria Estrutural	Cerâmico	Azulejo	Gesso	**2**	Fissura e infiltração no gesso. Necessário reparo. Foto 37;39
Despensa	2,30	1,45	3,00	3,34	Alvenaria Estrutural	Cerâmico	Azulejo	Laje	**2**	Fissura na laje. Necessário reparo. Foto 42
Depósito/ almoxarifado	5,00	3,40	2,50	12,83	Alvenaria Estrutural	Concreto	Azulejo	Gesso	**2**	
Circulação	39,90	3,30	3,00	131,67	Alvenaria Estrutural	Granilite	Pintura	Laje	**2**	Fissura no piso, gesso e laje - infiltração - descamação, Foto 03; 17;20
Refeitório	17,70	12,44	3,00	202,56	Alvenaria Estrutural	Granilite	Pintura	Laje	**2**	Fissura no piso, escorrimento, infiltração, Foto 11

CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL										
Circulação 2	10,71	7,58	3,00	81,18	Alvenaria Estrutural	Granilite	Pintura	Laje	**0**	

CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL

CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL

Salas de Aula

Ambiente	Comprimento (m)	Largura (m)	Pé Direito (m)	Área (m²)	Tipo de Construção	Revestimento de Piso	Revestimento de Parede	Possui Forro? Se sim, qual tipo?	Nível de Comprometimento do Ambiente	Observações
Sala de Aula 5	7,00	6,85	3,00	47,95	Alvenaria Estrutural	Vinilico	Pintura	Laje	**0**	
Sala de Aula 7	7,00	6,85	3,00	47,95	Alvenaria Estrutural	Vinilico	Pintura	Laje	**0**	
Sala de Aula 8	7,20	4,66	3,00	33,55	Alvenaria Estrutural	Vinilico	Pintura	Laje	**2**	Desgaste na pintura . Necessário reparo. Foto 107
Sala de Aula 9	7,00	6,85	3,00	47,95	Alvenaria Estrutural	Vinilico	Pintura	Laje	**2**	Desgaste na pintura . Necessário reparo. Fotos 69 e 70
Sala de Aula 10	7,20	5,30	3,00	38,16	Alvenaria Estrutural	Vinilico	Pintura	Laje	**2**	Desgaste na pintura . Necessário reparo. Fotos 61 e 62
Sala de Aula 11	6,85	5,50	2,50	37,68	Alvenaria Estrutural	Vinilico	Pintura	Gesso	**2**	Fissura no gesso, pintura. Necessário reparo. Foto 74-75
Sala de Aula 12	7,20	5,15	2,50	37,08	Alvenaria Estrutural	Vinilico	Pintura	Gesso	**2**	Desgaste na pintura e mancha de infiltração. Necessário reparo. Foto 65-66
Sala de Aula 13	6,85	5,25	2,50	35,96	Alvenaria Estrutural	Vinilico	Pintura	Gesso	**2**	Fissura no gesso, manchas de infiltração. Necessário reparo. Foto 87,88;90
Sala de Aula 16	7,20	4,72	2,50	33,98	Alvenaria Estrutural	Cerâmico	Azulejo	Gesso	**2**	Fissura no gesso, pintura. Necessário reparo. Foto
Sala de Aula 18	7,20	4,00	3,00	28,80	Alvenaria Estrutural	Vinilico	Pintura	Laje	**2**	Fissura no gesso, pintura. Necessário reparo. Foto 80,81,82

Sanitários										**Informações Complementares**		
Ambiente	Comprimento (m)	Largura (m)	Pé Direito (m)	Área (m²)	Revestimento de Piso	Revestimento de Parede	Possui Forro? Se sim, qual tipo?	Observações	Nível de Comprometimento do Ambiente	Quant. Vasos Sanitários	Quant. Cubas e trocadores	Quant. Chuveiros
Banheiro Feminino	3,10	2,68	2,50	8,31	Cerâmico	Azulejo	Gesso	Fissura no gesso, descamação no gesso. Foto 120	**2**	2	2	
Banheiro Masculino	3,10	1,20	2,50	3,72	Cerâmico	Azulejo	Gesso	Fissura no gesso. Foto 125	**2**	2	1	
Lavanderia	4,00	2,70	2,50	10,80	Cerâmico	Azulejo	Gesso	Fissura no piso e no forro de gesso, Necessário reparo. Foto 129,130,131,132	**2**	0	1	
Banheiro Infantil Masculino	5,00	2,75	2,50	13,75	Cerâmico	Azulejo	Gesso		**0**	8	4	
Banheiro Infantil Feminino	5,00	2,75	2,50	13,75	Cerâmico	Azulejo	Gesso		**0**	5	3	2
Banheiro Infantil	5,00	2,80	2,50	14,00	Cerâmico	Azulejo	Gesso	Desgaste na Pintura. Necessário reparo. Foto 49	**2**	8	3	
Banheiro PCD	2,27	1,85	2,50	4,20	Cerâmico	Azulejo	Gesso		**0**	1	1	

Informações Adicionais

Ambiente	Necessário adequar ou implantar? (SIM / NÃO / NÃO SE APLICA)	Informações Complementares							Observações
Fechamento do lote (muro, cerca, gradil, vegetação)	NÃO	Muro		Área (m²)		Gradil	Área (m²)		
Estacionamento(s)	NÃO	Área (m²)							
Playground (Sim ou Não)	NÃO	Área (m²)							
Tanque de Areia (Sim ou Não)	NÃO	Área Cúbica (m³)							
Calçadas (Sim ou Não?)	NÃO								
Serralherias (Portões, travas e outros)	NÃO								

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL			
Alarmes e sensores (Sim ou Não?)	NÃO		
Câmeras de segurança (Sim ou Não?)	NÃO		
Rede de gás na testada? (Sim ou Não)	NÃO		
Observações Gerais:	***O imóvel contém três unidades escolares no mesmo prédio (CEI MARIA APARECIDA NASCIMENTO/EMEI PAULA CRISTINA RODRIGUES/EMEF THEREZA MACIEL DE PAULA) A edificação não possui Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB). É composta predominantemente por salas e ambientes administrativos. Durante a vistoria, constatou-se que alguns ambientes apresentam fissuras no forro de gesso, bem como acentuado desgaste no piso e na pintura das paredes, indicando a necessidade de manutenção corretiva. Verificou-se, ainda, não conformidade quanto às condições de acessibilidade, uma vez que o banheiro destinado a Pessoas com Deficiência (PCD) não atende aos requisitos normativos vigentes.**		

FICHA 4 - DIAGNÓSTICO DE ASPECTOS DE INFRAESTRUTURA PREDIAL DAS UNIDADES ESCOLARES			
Item	**Descrição dos Itens Avaliados**	**Necessidade de Intervenção**	**Observações**
1. Infraestrutura da Escola			
Condições das fundações, pilares, vigas, lajes, cobertura, estruturas metálicas, paredes, esquadrias e pisos			
1.1	Fundações: verificar se há rachaduras, trincas, fissuras, desplacamentos ou quaisquer sinais de falhas na fundação que possam comprometer a estabilidade do prédio	NÃO	
1.2	Pilares: verificar se há rachaduras, trincas, fissuras, desplacamentos ou quaisquer sinais de falhas nos pilares que possam comprometer a estabilidade do prédio	NÃO	
1.3	Vigas: verificar se há rachaduras, trincas, fissuras, desplacamentos ou quaisquer sinais de falhas nas vigas que possam comprometer a estabilidade do prédio	NÃO	
1.4	Lajes: verificar se há rachaduras, trincas, fissuras, desplacamentos ou quaisquer sinais de falhas nas lajes que possam comprometer a estabilidade do prédio	SIM	Necessário realizar reparos em fissuras na laje.
1.5	Cobertura: verificar se há sinais de infiltração, vazamentos, telhas soltas ou outras falhas que possam causar danos à estrutura da escola	não se aplica	
1.6	Estruturas metálicas: verificar se há sinais de problemas nas estruturas metálicas, como corrosão ou deformação	NÃO	
1.7	Paredes: verificar se há sinais de problemas nas paredes, como rachaduras, infiltrações ou umidade excessiva	SIM	Necessário realizar repintura nas paredes.
1.8	Esquadrias: verificar se há problemas nas esquadrias, tais como falta de peças, corrosão, vidros quebrados e dificuldade de manuseio	NÃO	
1.9	Pisos: verificar se há sinais de problemas nos pisos, como desníveis, rachaduras ou solturas de revestimento	SIM	Necessário realizar reparos em fissuras no piso.
2. Instalações Elétricas e Hidráulicas			
Condições das instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias			
2.1	Instalações elétricas: verificar se as instalações elétricas estão em conformidade com as normas de segurança, se há fios expostos, equipamentos com defeito ou outros problemas que possam representar risco de incêndio ou choque elétrico. verificar também se o quadro de energia está em bom estado e se as tomadas e interruptores estão funcionando corretamente	NÃO	
2.2	Instalações hidráulicas: verificar se as instalações hidráulicas estão em bom estado, sem vazamentos, rachaduras ou outros problemas que possam prejudicar o funcionamento do sistema. verificar também se as torneiras, registros e outros componentes estão em bom estado e se o sistema de esgoto está funcionando corretamente	NÃO	
2.3	Instalações sanitárias: verificar se as instalações sanitárias estão em bom estado, sem vazamentos, rachaduras ou outros problemas que possam prejudicar o funcionamento do sistema. verificar também se as louças sanitárias, como vasos e pias, estão em bom estado e se os ralos estão desobstruídos	NÃO	
2.4	Reservatórios de água: verificar se os reservatórios de água estão em bom estado, sem vazamentos ou outros problemas que possam prejudicar o funcionament do sistema de abastecimento	SIM	Realizar inspeção e corrigir possíveis pontos de infiltração.

CAIXA

FICHA 4 - DIAGNÓSTICO DE ASPECTOS DE INFRAESTRUTURA PREDIAL DAS UNIDADES ESCOLARES			
Item	**Descrição dos Itens Avaliados**	**Necessidade de Intervenção**	**Observações**
3. Acessibilidade			
Condições de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida			
3.1	Rampas de acesso: verificar se há rampas de acesso em bom estado e com inclinação adequada	NÃO	
3.2	Elevadores: verificar se há elevadores em bom estado e se estão em conformidade com as normas de acessibilidade	NÃO	
3.3	Banheiros adaptados: verificar se há banheiros adaptados em bom estado e se estão em conformidade com as normas de acessibilidade	SIM	Necessário realizar a adequação de Acessibilidade para o banheiro PCD.
4. Condições de Habitabilidade			
Condições de ventilação e iluminação natural e artificial e conforto térmico dos ambientes			
4.1	Condições gerais de habitabilidade e conforto térmico por setor (salas de aulas, outros ambientes pedagógicos, ambientes administrativos, cozinha e refeitório, etc.)	NÃO	Recomenda-se implantar climatização da unidade
5. Áreas Externas/Paisagismo			
Condições de adequabilidade das áreas externas da escola			
5.1	Condições Gerais do Paisagismo na Unidade Educacional	NÃO	
5.2	Drenagem: verificar se a drenagem da área externa da escola está funcionando corretamente, evitando acúmulo de água em dias de chuva	NÃO	
5.3	Pintura externa: verificar se a pintura externa da escola está em bom estado, sem descascamentos ou sinais de desgaste	SIM	Necessário realizar a repintura da fachada.

Profissional Responsável
Nome: Matheus Noronha Mendonça
Cargo/função: Engenheiro Civil
CREA/CAU: 5070897203

Responsável pela validação CAIXA
Nome: Decio de Souza Espindola
Cargo/função: Engenheiro Civil
CREA/CAU: 5062158870-SP

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
CEI MARIA APARECIDA NASCIMENTO

1 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Cód. Unidade	
400762	CEI MARIA APARECIDA NASCIMENTO



Foto 01: Circulação



Foto 02: Refeitório



Foto 03: Circulação
Detalhe da fissura no piso



Foto 04: Refeitório



Foto 05: Refeitório
Detalhe do hidrante



Foto 06: Circulação
Detalhe na infiltração

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CEI MARIA APARECIDA NASCIMENTO



Foto 07: Refeitório



Foto 08: Refeitório

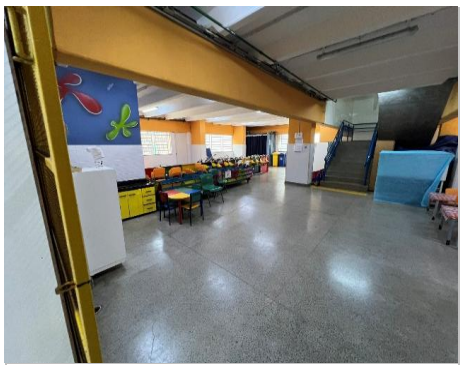


Foto 09: Refeitório



Foto 10: Refeitório



Foto 11: Refeitório
Detalhe da fissura no piso



Foto 12: Sala de Leitura



Foto 13: Sala de Leitura



Foto 14: Sala de Leitura
Fissura no forro de gesso

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CEI MARIA APARECIDA NASCIMENTO



Foto 15: Sala de Leitura

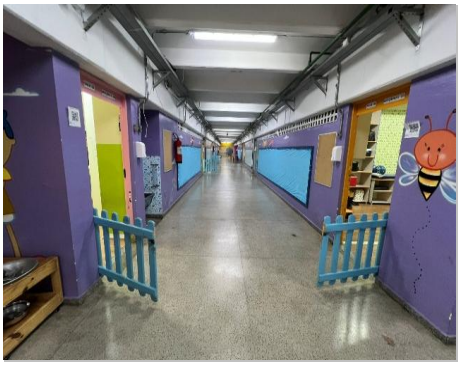


Foto 16: Circulação

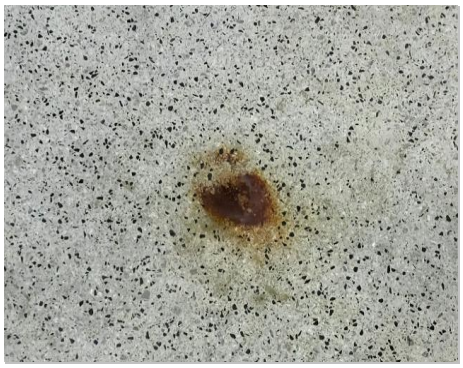


Foto 17: Circulação
Detalhe da infiltração



Foto 18: Circulação



Foto 19: Circulação



Foto 20: Circulação
Detalhe da fissura na laje



Foto 21: Circulação
Detalhe da fissura na laje



Foto 22: Circulação
Detalhe da fissura no piso

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
CEI MARIA APARECIDA NASCIMENTO



Foto 23: Detalhe do extintor



Foto 24: Detalhe do bebedouro



Foto 25: Solário



Foto 26: Sala de Aula 18



Foto 27: Sala de Aula 18

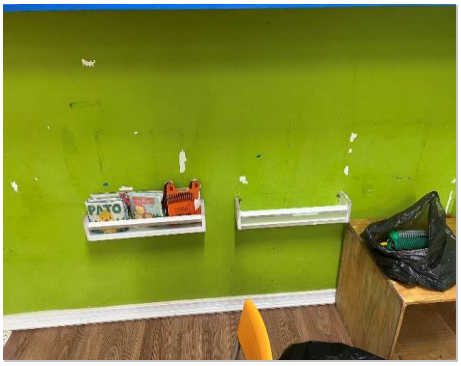


Foto 28: Sala de Aula 18
Descamação na pintura



Foto 29: Bebedouro



Foto 30: Solario

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CEI MARIA APARECIDA NASCIMENTO



Foto 31: Copa



Foto 32: Copa



Foto 33: Lactário

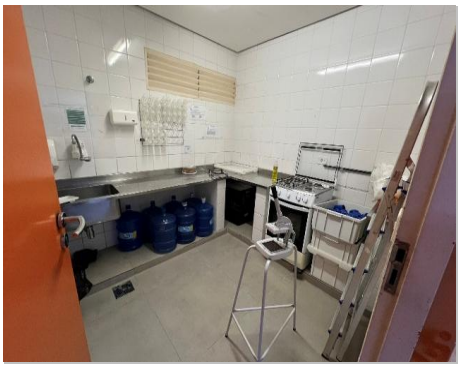


Foto 34: Lactário



Foto 35: Cozinha



Foto 36: Cozinha



Foto 37: Cozinha
Fissura no forro de gesso



Foto 38: Cozinha



Foto 39: Cozinha
Infiltração



Foto 40: Despensa



Foto 41: Despensa



Foto 42: Despensa
Fissura na parede



Foto 43: Sanitário meninos



Foto 44: Sanitário meninos



Foto 45: Sanitário meninas



Foto 46: Sanitário meninas

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
CEI MARIA APARECIDA NASCIMENTO



Foto 47: Sanitário Crianças



Foto 48: Sanitário Crianças



Foto 49: Sanitário Crianças
Descamação



Foto 50: Almoxarifado



Foto 51: Almoxarifado



Foto 52: Almoxarifado



Foto 53: Almoxarifado



Foto 54: Banheiro

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CEI MARIA APARECIDA NASCIMENTO



Foto 55: Banheiro



Foto 56: Banheiro
Descamação pintura



Foto 57: Banheiro
Descamação pintura



Foto 58: Solário



Foto 59: Sala de Aula 10



Foto 60: Sala de Aula 10



Foto 61: Sala de Aula 10
Desgaste na pintura

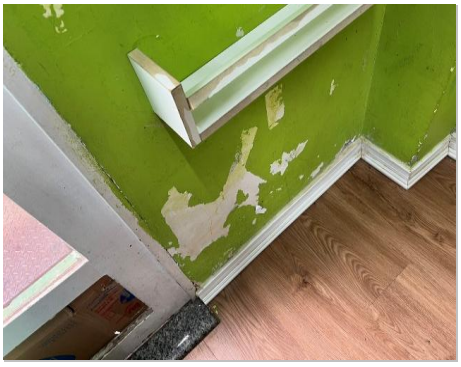


Foto 62: Sala de Aula 10
Desgaste na pintura

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CEI MARIA APARECIDA NASCIMENTO



Foto 63: Solário



Foto 64: Sala de Aula 12



Foto 65: Sala de Aula 12



Foto 66: Sala de Aula 12
Detalhe infiltração



Foto 67: Sala de Aula 12
Detalhe de descamação



Foto 68: Solário



Foto 69: Sala de Aula 09
Desgaste na pintura



Foto 70: Sala de Aula 09
Desgaste na pintura

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CEI MARIA APARECIDA NASCIMENTO



Foto 71: Solário



Foto 72: Sala de Aula 11



Foto 73: Sala de aula 11



Foto 74: Sala de Aula 11
Descamação na pintura.



Foto 75: Sala de Aula 11



Foto 76: Solário



Foto 77: Bebedouro



Foto 78: Sala de Aula 18

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

CEI MARIA APARECIDA NASCIMENTO



Foto 79: Sala de Aula 18



Foto 80: Sala de Aula 18
Detalhe da fissura



Foto 81: Sala de Aula 18
Detalhe da fissura



Foto 82: Sala de Aula 18
Detalhe da fissura



Foto 83: Solário



Foto 84: Bebedouro



Foto 85: Sala de Aula 13



Foto 86: Sala de Aula 13

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
CEI MARIA APARECIDA NASCIMENTO



Foto 87: Sala de Aula 13
detalhe da fissura no forro



Foto 88: Sala de Aula 13
detalhe da fissura no forro



Foto 89: Sala de Aula 13



Foto 90: Sala de Aula 13
detalhe da infiltração



Foto 91: Diretoria



Foto 92: Diretoria



Foto 93: Hidrante



Foto 94: Sala de Aula 05

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
CEI MARIA APARECIDA NASCIMENTO



Foto 95: Sala de Aula 05



Foto 96: Solário



Foto 97: Sala dos professores

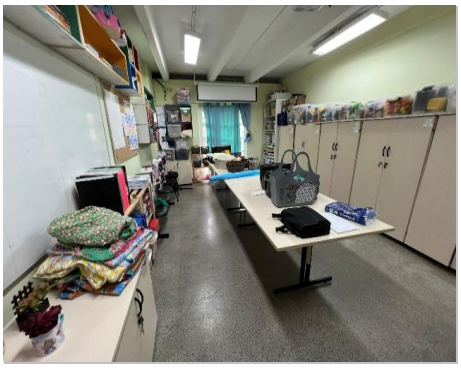


Foto 98: Sala dos professores



Foto 99: Sala dos professores



Foto 100: Sala dos professores

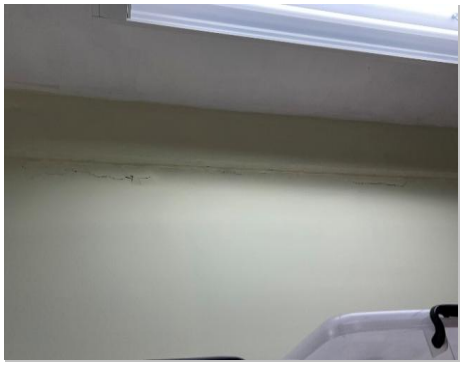


Foto 101: Sala dos professores



Foto 102: Sala dos professores



Foto 103: Sala de Aula 08



Foto 104: Sala de Aula 08



Foto 105: Sala de Aula 08



Foto 106: Bebedouro



Foto 107: Sala de Aula 08



Foto 108: Solário



Foto 109: Sala de Aula 07



Foto 110: Sala de Aula 07

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
CEI MARIA APARECIDA NASCIMENTO



Foto 111: Circulação



Foto 112: Circulação



Foto 113: Circulação



Foto 114: Circulação



Foto 115: Circulação



Foto 116: Circulação



Foto 117: Banheiro Mulher



Foto 118: Banheiro Mulher



Foto 119: Banheiro Mulher



Foto 120: Banheiro Mulher
Detalhe de fissura no forro



Foto 121: Banheiro Mulher



Foto 122: Wc homem



Foto 123: Wc homem



Foto 124: Wc homem



Foto 125: Wc homem



Foto 126: Lavanderia



Foto 127: Lavanderia



Foto 128: Lavanderia



Foto 129: Lavanderia
Fissura no forro



Foto 130: Lavanderia
Fissura no forro



Foto 131: Lavanderia
Fissura no piso



Foto 132: Lavanderia
Fissura no piso



Foto 133: Secretaria



Foto 134: Fachada

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
CEI MARIA APARECIDA NASCIMENTO



Foto 135: Fachada



Foto 136: Passeio público



Foto 137: Passeio público



Foto 138: Fachada
