CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL

Dados Gerais

Nome da Unidade:	EMEF JARDIM DAS LARANJEIRAS		
Sequencial (U.E):	77	**Código da Unidade:**	19221

Endereço da Escola

Logradouro, número e complemento (se houver)	RUA LUISA SARAZIM, 139

Descrição do Imóvel

Tipo de Construção (técnica construtiva predominante)	Alvenaria estrutural	Padrão:	13. EMEF PADRAO 072 16 SALAS	Nº de Pavimentos	3

Implantação

Área do Terreno (m²)	5.029,32			Área Edificada/ Construída (m²)	2.951,34
Área Pavimentada (m²)	2.596,00			Área Verde / Permeável (m²)	2.150,00
Área da projeção do(s) edifício(s) (m²)	1.318,91	Bloco salas	893,91	Quadra	425,00

Abastecimento

Água							
Forma de abastecimento (rede pública, poço artesiano, sem abastecimento etc.):	Rede Pública, constatação visual						
Quantidade de reservatório de água	1						
Capacidade por reservatório (L)	12500	Constatação		Visual	Projeto	NÃO	
Gás							
Encanado (Sim ou Não)	NÃO	Botijão de Gás (Sim ou Não)		SIM	Quantidade de Botijões de Gás	7	
Energia Elétrica							
Aparelho Ar condicionado (Sim ou Não)	PARCIAL				Quantidade:	2	
Possui fonte de energia complementar (Sim ou Não)?	NÃO				Qual (por ex. Painel Solar ou outro)?	0	
Possui Gerador de Energia? (Sim ou Não)?	NÃO				Capacidade:	0	
Esgoto							
Rede Pública (Sim ou Não)	SIM				Fossa Séptica (Sim ou Não)	NÃO	
Caixa de Gordura (Sim ou Não)	SIM				Caixa de Passagem (Sim ou Não)	SIM	

Informações sobre Prevenção de Incêndios (AVCB e SPDA)

Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro (Sim ou Não)	NÃO	Nº	N/A						
Extintor	SIM	7							
Hidrante	SIM	5							
Sinalização Emergência	SIM	15							
Iluminação Emergência	PARCIAL	2							
Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) (Sim ou Não)	PARCIAL	1	Total (Sim ou N	NÃO	Parcial (Sim ou Não)	SIM			

Acessibilidade

Elevador (Sim ou Não)	SIM				Quantidade:		Quant. Ativos/Funcionais:	
Plataforma Elevatória (Sim ou Não)	NÃO				Quantidade:		Quant. Ativos/Funcionais:	
Rampa de Acesso a Unidade (Sim ou Não)	NÃO				Rampa de Acesso a outros espaços necessários (Sim ou Não)			
Tipo de sinalização	SIM	Sonora (Sim ou Não)	NÃO		Visual (Sim ou Não)	NÃO	Tátil (Sim ou Não)	PARCIAL
Selo de Acessibilidade (Sim ou Não)	NÃO			Nº				
Vaga de estacionamento para deficientes (Sim ou Não)	SIM				Quantidade:	1		

CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL										
Ambientes da Escola										
Administrativo e Apoio/Serviços										
Ambiente	Comprimento (m)	Largura (m)	Pé Direito (m)	Área (m²)	Tipo de Construção	Revestimento de Piso	Revestimento de Parede	Possui Forro? Se sim, qual tipo?	Nível de Comprometimento do Ambiente	Observações
Sala de Leitura	7,00	5,70	2,80	39,90	Alvenaria Estrutural	Ceramico	Pintura	Laje	**0**	
Material Pedagógico	1,96	1,70	2,80	3,33	Alvenaria Estrutural	Ceramico	Azulejo	Laje	**0**	
Depósito 2º pav	4,05	7,00	2,80	11,65	Alvenaria Estrutural	Ceramico	Pintura	Laje	**2**	Infiltração. Necessário realizar o reparo. Foto 28
Coordenação	7,00	3,45	2,80	24,15	Alvenaria Estrutural	Ceramico	Pintura	Laje	**0**	
Sala dos Professores	7,00	3,45	2,80	24,15	Alvenaria Estrutural	Ceramico	Pintura	Laje	**2**	Infiltração Necessário realizar o reparo. Foto 35
Sala de Informática	7,05	7,00	2,80	49,35	Alvenaria Estrutural	Ceramico	Pintura	Gesso	**0**	
Circulação 2º pav	34,35	7,00	2,80	214,43	Alvenaria Estrutural	Ceramico	Pintura	Laje	**3**	Destacamento do revestimento cerâmico. Necessário realizar o reparo. Foto 02
Quarto da Limpeza	7,00	4,05	2,96	11,65	Alvenaria Estrutural	Ceramico	Pintura	Laje	**2**	Desgaste na pintura. Necessário realizar a repintura. Foto 71
Circulação 1º pav	34,35	7,00	2,96	211,54	Alvenaria Estrutural	Ceramico	Pintura	Laje	**3**	Destacamento do piso. Necessário realizar o reparo. Foto 86
Secretaria	7,04	7,03	2,78	36,75	Alvenaria Estrutural	Ceramico	Pintura	Gesso	**0**	
Direção	3,42	3,42	2,96	11,70	Alvenaria Estrutural	Ceramico	Pintura	Laje	**0**	
Assistente de Direção	5,47	4,50	2,96	19,71	Alvenaria Estrutural	Ceramico	Pintura	Laje	**3**	Ponto de recalque. Foto 103
Circulação Secretaria	7,04	1,83	2,96	10,66	Alvenaria Estrutural	Ceramico	Pintura	Laje	**3**	Ponto de recalque Foto 105
Almoxarifado	4,98	2,40	2,96	11,95	Alvenaria Estrutural	Ceramico	Pintura	Laje	**0**	
Cozinha	7,00	6,97	2,96	48,79	Alvenaria Estrutural	Ceramico	Azulejo	Laje	**0**	
Despensa	7,00	4,66	2,96	32,62	Alvenaria Estrutural	Ceramico	Azulejo	Laje	**0**	
Refeitório	14,15	7,12	2,96	100,75	Alvenaria Estrutural	Ceramico	Pintura	Laje	**3**	Destacamento do revestimento cerâmico. Necessário realizar o reparo. Foto 123
Pátio Coberto	21,40	14,28	2,96	302,59	Alvenaria Estrutural	Ceramico	Pintura	Laje	**3**	Destacamento do revestimento cerâmico. Necessário realizar o reparo. Foto 124
Sala de Reunião	5,80	3,96	2,96	22,97	Alvenaria Estrutural	Ceramico	Drywall	Laje	**0**	
Sala de Apoio	7,05	2,89	2,96	20,37	Alvenaria Estrutural	Ceramico	Drywall	Laje	**2**	Trinca. Necessário reparo. Foto 127
Sala de Recursos Multifuncionais	7,05	7,00	2,96	49,35	Alvenaria Estrutural	Ceramico	Pintura	Laje	**3**	Trinca com infiltração. Necessário reparo. Foto 131
Circulação Subsolo	23,10	10,16	2,96	212,26	Alvenaria Estrutural	Ceramico	Azulejo	Laje	**0**	
Depósito Materiais Esportivos - Subsolo	3,26	1,80	2,96	5,87	Alvenaria Estrutural	Ceramico	Pintura	Laje	**0**	Fissura. Necessário reparo. 137
Sala de Materiais Pedagógicos - Subsolo	3,26	1,88	2,96	6,13	Alvenaria Estrutural	Ceramico	Drywall	Laje	**0**	
Copa - Subsolo	3,26	3,15	2,96	10,27	Alvenaria Estrutural	Ceramico	Pintura	Laje	**2**	Fissura na parede. Necessário reparo. Foto 142

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL										
Playground				0,00	Alvenaria Estrutural	Grama Sintética	n/a	n/a	**3**	Presença de diversas aberturas no muro. Fotos 146, 147, 148
Garagem (17 vagas)	23,10	10,96	2,96	253,18	Alvenaria Estrutural	Cimentício	Pintura	Laje	**2**	Presença de infiltração na parede. Foto 154
Depósito - Térreo	2,00	1,80	2,96	3,60	Alvenaria Estrutural	Ceramico	Pintura	Laje	**0**	
Circulação 2 - Térreo	3,96	1,10	2,96	4,36	Alvenaria Estrutural	Ceramico	Pintura	Laje	**0**	
Elevador	2,88	1,75	2,40	5,04	NA	NA	NA	NA	**0**	
Circulação Elevador - Térreo	1,75	1,20	2,96	2,10	Alvenaria Estrutural	Ceramico	Pintura	Laje	**0**	
Varanda 01 - 2° Pavimento	7,00	2,80	2,80	19,60	Alvenaria Estrutural	Ceramico	Pintura	Laje	**0**	
Varanda 02 - 2° Pavimento	7,00	2,80	2,80	19,60	Alvenaria Estrutural	Ceramico	Pintura	Laje	**0**	
Varanda 03 - 2° Pavimento	7,00	2,80	2,80	19,60	Alvenaria Estrutural	Ceramico	Pintura	Laje	**0**	
Varanda 04 - 2° Pavimento	7,00	2,80	2,80	19,60	Alvenaria Estrutural	Ceramico	Pintura	Laje	**0**	
Varanda 05 - 2° Pavimento	7,00	2,80	2,80	19,60	Alvenaria Estrutural	Ceramico	Pintura	Laje	**0**	
Varanda 06 - 2° Pavimento	7,00	2,80	2,80	19,60	Alvenaria Estrutural	Ceramico	Pintura	Laje	**0**	
Circulação Elevador - 2° Pavimento	1,75	1,20	2,80	2,10	Alvenaria Estrutural	Ceramico	Pintura	Laje	**0**	

CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL

CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL

Salas de Aula

Ambiente	Comprimento (m)	Largura (m)	Pé Direito (m)	Área (m²)	Tipo de Construção	Revestimento de Piso	Revestimento de Parede	Possui Forro? Se sim, qual tipo?	Nível de Comprometimento do Ambiente	Observações
Sala de Aula 1	7,05	7,00	2,96	49,35	Alvenaria Estrutural	Ceramico	Pintura	Laje	1	Desgaste na pintura. Necessário realizar a repintura. Foto 53
Sala de Aula 2	7,05	7,00	2,96	49,35	Alvenaria Estrutural	Ceramico	Pintura	Laje	1	Desgaste na pintura. Necessário realizar a repintura. Foto 55
Sala de Aula 3	7,05	7,00	2,96	49,35	Alvenaria Estrutural	Ceramico	Pintura	Laje	1	Desgaste na pintura. Necessário realizar a repintura. Foto 57
Sala de Aula 4	7,05	7,00	2,96	49,35	Alvenaria Estrutural	Ceramico	Pintura	Laje	1	Desgaste na pintura. Necessário realizar a repintura. Foto 59
Sala de Aula 5	7,05	7,00	2,96	49,35	Alvenaria Estrutural	Ceramico	Pintura	Laje	1	Trinca. Necessário reparo. Foto 61
Sala de Aula 6	7,05	7,00	2,96	49,35	Alvenaria Estrutural	Ceramico	Pintura	Laje	1	Trinca - Infiltração - Pintura. Foto 84
Sala de Aula 7	7,05	7,00	2,96	49,35	Alvenaria Estrutural	Ceramico	Pintura	Laje	2	Desgaste na pintura. Necessário realizar a repintura. Foto 81
Sala de Aula 8	7,05	7,00	2,96	49,35	Alvenaria Estrutural	Ceramico	Pintura	Laje	1	Desgaste na pintura. Necessário realizar a repintura. Foto 79
Sala de Aula 9	7,05	7,00	2,96	49,35	Alvenaria Estrutural	Ceramico	Pintura	Laje	1	Desgaste na pintura. Necessário realizar a repintura. Foto 76
Sala de Aula 10	7,05	7,00	2,96	49,35	Alvenaria Estrutural	Ceramico	Pintura	Laje	1	Desgaste na pintura. Necessário realizar a repintura. Foto 74
Sala de Aula 11	7,05	7,00	2,80	49,35	Alvenaria Estrutural	Ceramico	Pintura	Laje	1	Infiltração na parede. Foto 04
Sala de Aula 12	7,05	7,00	2,80	49,35	Alvenaria Estrutural	Ceramico	Pintura	Laje	1	Desgaste na pintura. Necessário realizar a repintura. Foto 06
Sala de Aula 13	7,05	7,00	2,80	49,35	Alvenaria Estrutural	Ceramico	Pintura	Laje	2	Trinca - Infiltração - Pintura. Foto 41
Sala de Aula 14	7,00	5,70	2,80	39,90	Alvenaria Estrutural	Ceramico	Pintura	Laje	1	Desgaste na pintura. Necessário realizar a repintura. Foto 36
Sala de Aula 15	7,00	5,70	2,80	39,90	Alvenaria Estrutural	Ceramico	Pintura	Laje	1	Desgaste na pintura. Necessário realizar a repintura. Foto 30
Sala de Aula 16	7,00	5,70	2,80	39,90	Alvenaria Estrutural	Ceramico	Pintura	Laje	1	Desgaste na pintura. Necessário realizar a repintura. Foto 14
Sala de Aula 17	7,00	5,70	2,80	39,90	Alvenaria Estrutural	Ceramico	Pintura	Laje	0	

Sanitários

Ambiente	Comprimento (m)	Largura (m)	Pé Direito (m)	Área (m²)	Revestimento de Piso	Revestimento de Parede	Possui Forro? Se sim, qual tipo?	Observações	Nível de Comprometimento do Ambiente	Informações Complementares		
										Quant. Vasos Sanitários	Quant. Cubas e trocadores	Quant. Chuveiros
Banheiro Professores Fem. - 2º pav.	1,80	0,97	2,80	1,75	Ceramico	Azulejo	Laje		0	2	2	0
Banheiro Fem - 2º pav.	1,80	2,00	2,80	3,60	Ceramico	Azulejo	Laje		0	1	1	0
Banheiro PCD - 2º pav.	1,80	1,70	2,80	3,06	Ceramico	Azulejo	Laje		0	1	1	0
Banheiro Masc. - 2º pav	1,96	2,00	2,80	3,92	Ceramico	Azulejo	Laje		0	1	2	0
Banheiro Professores Masc. - 2º pav.	1,96	0,97	2,80	1,90	Ceramico	Azulejo	Laje		0	1	1	0
Banheiro Feminino - 1º pav.	2,48	2,00	2,96	4,96	Ceramico	Azulejo	Laje		0	2	2	0
Banheiro PCD - 1º pav.	2,00	1,80	2,96	3,60	Ceramico	Azulejo	Laje		0	1	1	0
Fraldário	2,00	1,80	2,96	3,60	Ceramico	Pintura	Laje		0	-	-	-
Banheiro Masculino - 1º pav.	2,48	2,00	2,96	4,96	Ceramico	Azulejo	Laje		0	1	2	0
Banheiro Funcionários - 1º pav.	2,00	0,97	2,96	1,94	Ceramico	Azulejo	Laje		0	1	1	0
Banheiro Funcionários Fem. - Térreo	1,72	1,20	2,96	2,06	Ceramico	Azulejo	Laje		0	1	1	0
Banheiro Funcionários Masc. - Térreo	1,57	1,20	2,96	1,88	Ceramico	Azulejo	Laje		0	6	6	0
Banheiro Fem. - Térreo	7,03	3,35	2,70	18,86	Ceramico	Azulejo	Gesso		0	1	1	0

CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL												
Banheiro PCD - Térreo	1,80	1,80	2,96	3,24	Ceramico	Azulejo	Laje		**0**	6	6	0
Banheiro Masc. - Térreo	7,03	3,35	2,70	19,46	Ceramico	Azulejo	Gesso		**0**	1	1	1
Vestiário Funcionários	2,20	2,20	2,96	4,84	Ceramico	Azulejo	Laje		**0**	0	1	0
Lavanderia	2,30	2,20	2,96	5,06	Ceramico	Azulejo	Laje		**0**	0	1	0
									0			

Informações Adicionais

Ambiente	Necessário adequar ou implantar? (SIM / NÃO / NÃO SE APLICA)	Informações Complementares							Observações
Fechamento do lote (muro, cerca, gradil, vegetação)	SIM	Muro		Área (m²)	154,00	Gradil	Área (m²)	0,00	Presença de trincas no muro, atrás do Playground. Necessário reparo
Estacionamento(s)	NÃO	Área (m²)		253,18					
Playground (Sim ou Não)	NÃO	Área (m²)							
Tanque de Areia (Sim ou Não)	NÃO	Área Cúbica (m³)							
Calçadas (Sim ou Não?)	NÃO								
Serralherias (Portões, travas e outros)	NÃO								
Alarmes e sensores (Sim ou Não?)	NÃO								
Câmeras de segurança (Sim ou Não?)	NÃO								
Rede de gás na testada? (Sim ou Não)	NÃO								

Observações Gerais:	**A edificação avaliada não possui AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) vigente, encontrando-se em desacordo com as exigências de segurança contra incêndio e pânico. O sistema de SPDA apresenta-se de forma parcial, estando instalado apenas um para-raios no reservatório, o que não garante a proteção integral da edificação contra descargas atmosféricas. Verificou-se ainda que os pisos das áreas de circulação apresentam destacamentos e desprendimentos localizados, caracterizando desgaste e comprometimento funcional, sendo necessários reparos pontuais para restabelecer as condições adequadas de segurança e uso.**

FICHA 4 - DIAGNÓSTICO DE ASPECTOS DE INFRAESTRUTURA PREDIAL DAS UNIDADES ESCOLARES			
Item	**Descrição dos Itens Avaliados**	**Necessidade de Intervenção**	**Observações**
1. Infraestrutura da Escola			
Condições das fundações, pilares, vigas, lajes, cobertura, estruturas metálicas, paredes, esquadrias e pisos			
1.1	Fundações: verificar se há rachaduras, trincas, fissuras, desplacamentos ou quaisquer sinais de falhas na fundação que possam comprometer a estabilidade do prédio	SIM	Ponto de recalque na Sala Assistente de Direção e circulação da secretaria (foto 104 e 105)
1.2	Pilares: verificar se há rachaduras, trincas, fissuras, desplacamentos ou quaisquer sinais de falhas nos pilares que possam comprometer a estabilidade do prédio	NÃO	
1.3	Vigas: verificar se há rachaduras, trincas, fissuras, desplacamentos ou quaisquer sinais de falhas nas vigas que possam comprometer a estabilidade do prédio	NÃO	
1.4	Lajes: verificar se há rachaduras, trincas, fissuras, desplacamentos ou quaisquer sinais de falhas nas lajes que possam comprometer a estabilidade do prédio	NÃO	
1.5	Cobertura: verificar se há sinais de infiltração, vazamentos, telhas soltas ou outras falhas que possam causar danos à estrutura da escola	NÃO	
1.6	Estruturas metálicas: verificar se há sinais de problemas nas estruturas metálicas, como corrosão ou deformação	NÃO	
1.7	Paredes: verificar se há sinais de problemas nas paredes, como rachaduras, infiltrações ou umidade excessiva	SIM	Infiltração na laje, Salas de Aula 11 e 13.
1.8	Esquadrias: verificar se há problemas nas esquadrias, tais como falta de peças, corrosão, vidros quebrados e dificuldade de manuseio	NÃO	
1.9	Pisos: verificar se há sinais de problemas nos pisos, como desníveis, rachaduras ou solturas de revestimento	SIM	Diversos pontos na edificação com destacamento das peças cerâmicas do piso
2. Instalações Elétricas e Hidráulicas			
Condições das instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias			
2.1	Instalações elétricas: verificar se as instalações elétricas estão em conformidade com as normas de segurança, se há fios expostos, equipamentos com defeito ou outros problemas que possam representar risco de incêndio ou choque elétrico. verificar também se o quadro de energia está em bom estado e se as tomadas e interruptores estão funcionando corretamente	SIM	Necessidade de adequação do sistema elétrico conforme NBR 5410.
2.2	Instalações hidráulicas: verificar se as instalações hidráulicas estão em bom estado, sem vazamentos, rachaduras ou outros problemas que possam prejudicar o funcionamento do sistema. verificar também se as torneiras, registros e outros componentes estão em bom estado e se o sistema de esgoto está funcionando corretamente	SIM	Necessidade de reparo na tubulação passante no Subsolo.
2.3	Instalações sanitárias: verificar se as instalações sanitárias estão em bom estado, sem vazamentos, rachaduras ou outros problemas que possam prejudicar o funcionamento do sistema. verificar também se as louças sanitárias, como vasos e pias, estão em bom estado e se os ralos estão desobstruídos	NÃO	
2.4	Reservatórios de água: verificar se os reservatórios de água estão em bom estado, sem vazamentos ou outros problemas que possam prejudicar o funcionament do sistema de abastecimento	NÃO	

FICHA 4 - DIAGNÓSTICO DE ASPECTOS DE INFRAESTRUTURA PREDIAL DAS UNIDADES ESCOLARES			
Item	**Descrição dos Itens Avaliados**	**Necessidade de Intervenção**	**Observações**
3. Acessibilidade			
Condições de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida			
3.1	Rampas de acesso: verificar se há rampas de acesso em bom estado e com inclinação adequada	SIM	Necessidade de adequação das rampas acessíveis conforme NBR 9050.
3.2	Elevadores: verificar se há elevadores em bom estado e se estão em conformidade com as normas de acessibilidade	NÃO	
3.3	Banheiros adaptados: verificar se há banheiros adaptados em bom estado e se estão em conformidade com as normas de acessibilidade	SIM	Necessidade de adequação conforme NBR 9050.
4. Condições de Habitabilidade			
Condições de ventilação e iluminação natural e artificial e conforto térmico dos ambientes			
4.1	Condições gerais de habitabilidade e conforto térmico por setor (salas de aulas, outros ambientes pedagógicos, ambientes administrativos, cozinha e refeitório, etc.)	SIM	Necessidade de implantação de climatização na edificação.
5. Áreas Externas/Paisagismo			
Condições de adequabilidade das áreas externas da escola			
5.1	Condições Gerais do Paisagismo na Unidade Educacional	SIM	Necessidade de poda na vegetação perimetral da edificação.
5.2	Drenagem: verificar se a drenagem da área externa da escola está funcionando corretamente, evitando acúmulo de água em dias de chuva	NÃO	
5.3	Pintura externa: verificar se a pintura externa da escola está em bom estado, sem descascamentos ou sinais de desgaste	SIM	Necessidade de reparos na fachada e repintura.

Profissional Responsável
Nome: Matheus Noronha Mendonça
Cargo/função: Engenheiro Civil
CREA/CAU: 5070897203

Responsável pela validação CAIXA
Nome: Decio de Souza Espindola
Cargo/função: Engenheiro Civil
CREA/CAU: 5062158870-SP

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEF JARDIM DAS LARANJEIRAS

1 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Cód. Unidade	
19221	EMEF JARDIM DAS LARANJEIRAS



Foto 01: Circulação 2º pav



Foto 02: Circulação 2º pav



Foto 03: Sala de Aula 11 - 2º Pav



Foto 04: Sala de Aula 11 - 2º Pav
Infiltração



Foto 05: Sala de Aula 12 - 2º Pav



Foto 06: Sala de Aula 12 - 2º Pav

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEF JARDIM DAS LARANJEIRAS



Foto 07: Sala de aula



Foto 08: Sala de aula



Foto 09: Varanda



Foto 10: Sala de Leitura - 2º Pav



Foto 11: Sala de Leitura - 2º Pav

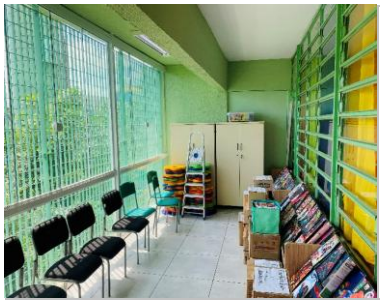


Foto 12: Varanda - Sala de Leitura



Foto 13: Sala de Aula 16- 2º Pav



Foto 14: Sala de Aula 16 - 2º Pav

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEF JARDIM DAS LARANJEIRAS



Foto 15: Banheiro Professores Fem 2º pav



Foto 16: Banheiro Professores Fem 2º pav



Foto 17: Banheiro Fem 2º pav



Foto 18: Banheiro Fem 2º pav



Foto 19: PCD 2º pav



Foto 20: PCD 2º pav



Foto 21: Material Pedagógico/ almoxarifado



Foto 22: Material Pedagógico/ almoxarifado

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEF JARDIM DAS LARANJEIRAS



Foto 23: Circulação 2º pav

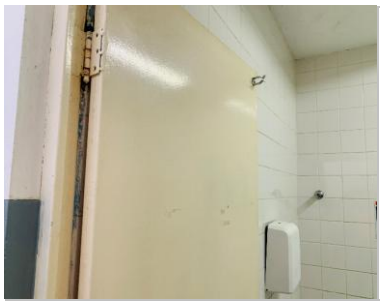


Foto 24: Banheiro Masc 2º pav

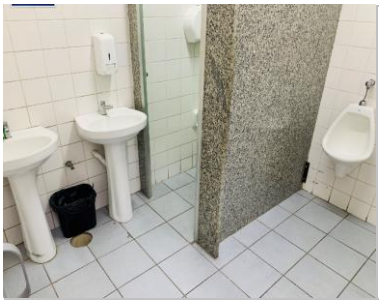


Foto 25: Banheiro Masc 2º pav



Foto 26: Banheiro Professores Masc 2º pav



Foto 27: Banheiro Professores Masc 2º pav



Foto 28: Depósito 2º pav
Infiltração



Foto 29: Sala de Aula 15 - 2º Pav

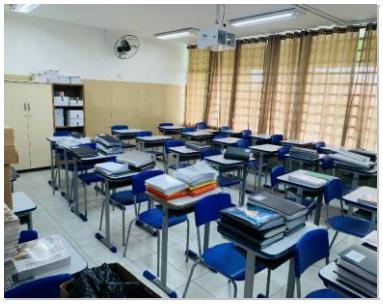


Foto 30: Sala de Aula 15 - 2º Pav

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEF JARDIM DAS LARANJEIRAS



Foto 31: Coordenação

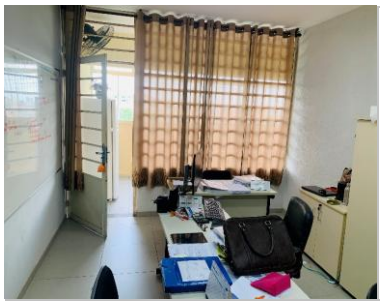


Foto 32: Coordenação




Foto 33: Varanda - Coordenação



Foto 34: Sala dos Professores



Foto 35: Sala dos Professores
Infiltração



Foto 36: Sala de Aula 14 - 2º Pav



Foto 37: Sala de Aula 14 - 2º Pav



Foto 38: Sala de Informática

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEF JARDIM DAS LARANJEIRAS



Foto 39: Sala de Informática



Foto 40: Sala de Aula 13 - 2º Pav



Foto 41: Sala de Aula 13- 2º Pav



Foto 42: Circulação 2º pav
Ausência de piso tátil



Foto 43: Circulação 2º pav



Foto 44: Circulação 2º pav



Foto 45: Circulação 2º pav
Hidrante em não conformidade



Foto 46: Circulação 2º pav

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEF JARDIM DAS LARANJEIRAS



Foto 47: Escada 2º pav



Foto 48: Escada 2º pav

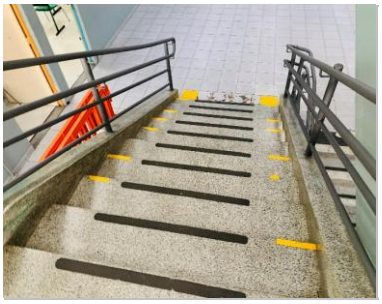


Foto 49: Escada 2º pav



Foto 50: Circulação 1º pav



Foto 51: Circulação 1º pav



Foto 52: Sala de Aula 1 - 1º Pav



Foto 53: Sala de Aula 1 - 1º Pav



Foto 54: Sala de Aula 2 - 1º Pav

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEF JARDIM DAS LARANJEIRAS



Foto 55: Sala de Aula 2 - 1º Pav



Foto 56: Sala de Aula 3 - 1º Pav



Foto 57: Sala de Aula 3 - 1º Pav



Foto 58: Sala de Aula 4 - 1º Pav



Foto 59: Sala de Aula 4 - 1º Pav



Foto 60: Sala de Aula 5 - 1º Pav



Foto 61: Sala de Aula 5 - 1º Pav
Trinca



Foto 62: Banheiro Fem 1º pav

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEF JARDIM DAS LARANJEIRAS



Foto 63: Banheiro Fem 1º pav



Foto 64: Sala dos Vigias



Foto 65: PCD 1º pav



Foto 66: PCD 1º pav



Foto 67: Fraldário



Foto 68: Banheiro Masc 1º pav



Foto 69: Banheiro Masc 1º pav



Foto 70: Quartinho da Limpeza

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEF JARDIM DAS LARANJEIRAS

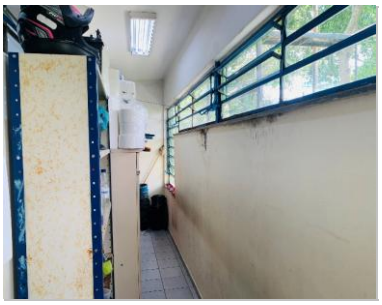


Foto 71: Quartinho da Limpeza



Foto 72: Banheiro Funcionários 1º pav



Foto 73: Sala de Aula 10 - 1º Pav



Foto 74: Sala de Aula 10 - 1º Pav



Foto 75: Sala de Aula 9 - 1º Pav



Foto 76: Sala de Aula 9 - 1º Pav



Foto 77: Sala de Aula 9 - 1º Pav
Pintura ruim



Foto 78: Sala de Aula 8 - 1º Pav

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEF JARDIM DAS LARANJEIRAS



Foto 79: Sala de Aula 8 - 1º Pav



Foto 80: Sala de Aula 7 - 1º Pav



Foto 81: Sala de Aula 7 - 1º Pav



Foto 82: Sala de Aula 6 - 1º Pav



Foto 83: Sala de Aula 6 - 1º Pav
Trinca e infiltração



Foto 84: Sala de Aula 6 - 1º Pav
Pintura ruim



Foto 85: Circulação 1º pav
Ausência de piso tátil



Foto 86: Circulação 1º pav

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEF JARDIM DAS LARANJEIRAS



Foto 87: Circulação 1º pav
Hidrante em não conformidade



Foto 88: Circulação 1º pav



Foto 89: Circulação 1º pav



Foto 90: Escada 1º pav



Foto 91: Escada 1º pav

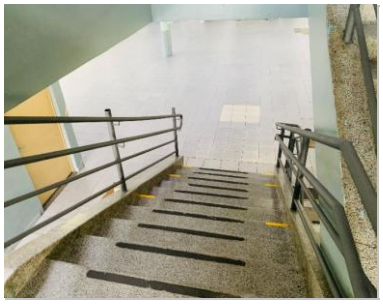


Foto 92: Escada 1º pav



Foto 93: Circulação Secretaria



Foto 94: Banheiro Funcionários Fem Térreo

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF JARDIM DAS LARANJEIRAS



Foto 95: Banheiro Funcionários Fem Térreo

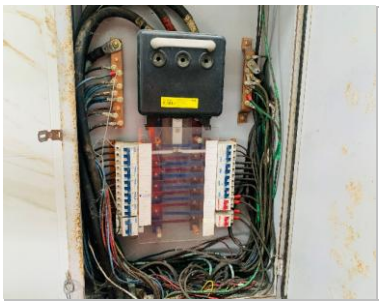


Foto 96: Circulação Secretaria



Foto 97: Banheiro Funcionários Masc Térreo



Foto 98: Banheiro Funcionários Masc Térreo




Foto 99: Secretaria



Foto 100: Secretaria

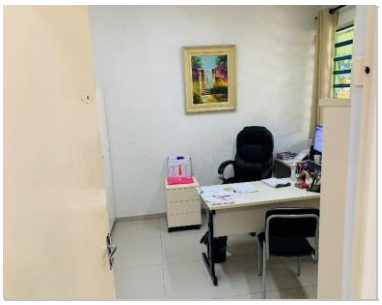


Foto 101: Direção



Foto 102: Assistente de Direção



Foto 103: Assistente de Direção



Foto 104: Assistente de Direção
Ponto de recalque

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEF JARDIM DAS LARANJEIRAS



Foto 105: Circulação Secretaria
Ponto de recalque



Foto 106: Banheiro Fem Térreo

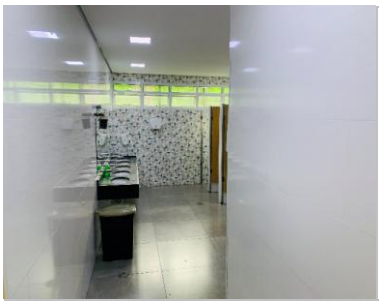


Foto 107: Banheiro Fem Térreo



Foto 108: Banheiro Fem Térreo

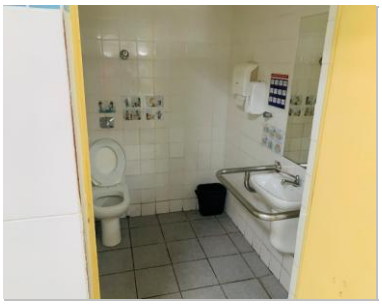


Foto 109: PCD Térreo



Foto 110: Almoxarifado



Foto 111: Almoxarifado

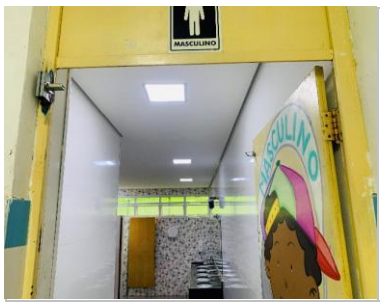


Foto 112: Banheiro Masc Térreo

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEF JARDIM DAS LARANJEIRAS



Foto 113: Banheiro Masc Térreo

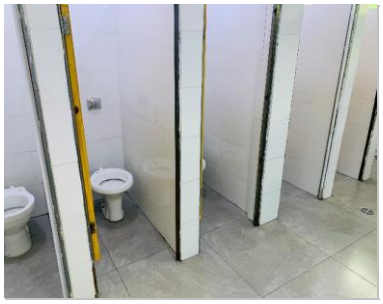


Foto 114: Banheiro Masc Térreo



Foto 115: Cozinha



Foto 116: Cozinha

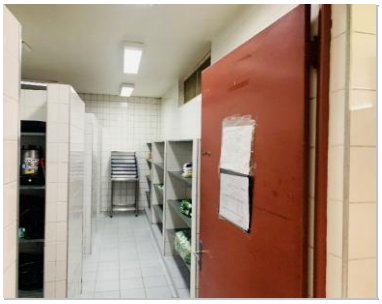


Foto 117: Despensa



Foto 118: Despensa



Foto 119: Pátio Coberto
Destacamento de piso



Foto 120: Refeitório
Destacamento de piso

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEF JARDIM DAS LARANJEIRAS



Foto 121: Pátio Coberto



Foto 122: Pátio Coberto



Foto 123: Pátio Coberto

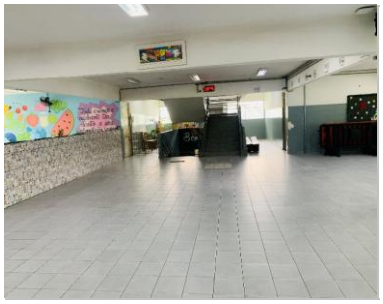


Foto 124: Pátio Coberto



Foto 125: Sala de Reunião



Foto 126: Sala de Reunião



Foto 127: Sala de Reunião



Foto 128: Sala de Apoio
Trinca



Foto 129: Sala de Reunião



Foto 130: Sala de Recursos Multifuncionais

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEF JARDIM DAS LARANJEIRAS



Foto 131: Sala de Recursos Multifuncionais
Trinca crítica



Foto 132: Escada Térreo



Foto 133: Escada Térreo



Foto 134: Circulação Subsolo



Foto 135: Circulação Subsolo



Foto 136: Depósito Materiais Esportivos



Foto 137: Depósito Materiais Esportivos
Fissura



Foto 138: Circulação Subsolo

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF JARDIM DAS LARANJEIRAS



Foto 139: Almoxarifado Materiais Descartáveis



Foto 140: Almoxarifado Materiais Descartáveis



Foto 141: Almoxarifado Materiais Descartáveis



Foto 142: Cozinha Subsolo



Foto 143: Cozinha Subsolo
Fissura



Foto 144: Playground



Foto 145: Playground



Foto 146: Playground
Presença de diversas aberturas no muro (provável recalque)

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEF JARDIM DAS LARANJEIRAS



Foto 147: Playground
Presença de diversas aberturas no muro (provável recalque)



Foto 148: Playground
Presença de diversas aberturas no muro (provável recalque)



Foto 149: Playground
Presença de diversas aberturas no muro (provável recalque)



Foto 150: Playground



Foto 151: Muro de divisa



Foto 152: Vista geral da fachada



Foto 153: Vista geral da fachada

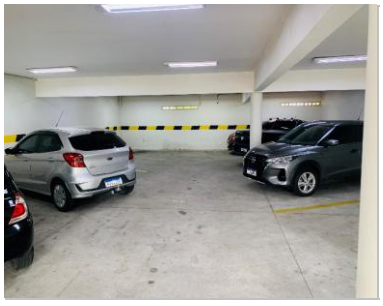


Foto 154: Vista geral do Subsolo

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEF JARDIM DAS LARANJEIRAS



Foto 155: Vista geral do Subsolo



Foto 156: Vista geral do Subsolo



Foto 157:Vista geral do Subsolo



Foto 158: Vista geral do reservatório



Foto 159: Vista geral do reservatório



Foto 160: Vista geral do reservatório



Foto 161: Vista geral do reservatório



Foto 162: Vista geral do reservatório

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEF JARDIM DAS LARANJEIRAS



Foto 163:Vista geral da fachada



Foto 164: Detalhe do hidrante



Foto 165: Área de circulação externa



Foto 166: Área de circulação externa



Foto 167: Vista geral da fachada
Presença de fissuras



Foto 168: Vista geral da fachada
Presença de fissuras



Foto 169: Vista geral da Quadra



Foto 170: Vista geral da Quadra

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEF JARDIM DAS LARANJEIRAS



Foto 171: Vista geral da Quadra



Foto 172: Vista geral da Quadra



Foto 173: Vista geral da Quadra



Foto 174: Vista geral da Quadra



Foto 175: Vista geral da Quadra



Foto 176: Vista geral da Quadra



Foto 177:



Foto 178:

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEF JARDIM DAS LARANJEIRAS



Foto 179: detalhe do reservatório



Foto 180: detalhe do reservatório



Foto 181: Abrigo de gás



Foto 182: Abrigo de gás



Foto 183: Vista geral da lavanderia



Foto 184: Vista geral da lavanderia



Foto 185: Vista geral do muro de divisa



Foto 186: Vista geral da edificação

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEF JARDIM DAS LARANJEIRAS



Foto 187: Aterramento



Foto 188: Identificação



Foto 189: Detalhe da parede



Foto 190: Vista geral do bebedouro



Foto 191: Logradouro



Foto 192: Logradouro



Foto 193: Logradouro



Foto 194: Logradouro

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEF JARDIM DAS LARANJEIRAS



Foto 195: Vista geral da fachada



Foto 196: Passeio público
