CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL

Dados Gerais

Nome da Unidade:	EMEI JARDIM DA CONQUISTA II		
Sequencial (U.E):	79	**Código da Unidade:**	19320

Endereço da Escola

Logradouro, número e complemento (se houver)	TRAVESSA JAMBALAYA, 49

Descrição do Imóvel

Tipo de Construção (técnica construtiva predominante)	Concreto armado	Padrão:	1. EMEI 8 SALAS COM LAJE COI 90 B	Nº de Pavimentos	2

Implantação

Área do Terreno (m²)	2.546,00			Área Edificada/ Construída (m²)	1.038,65
Área Pavimentada (m²)	2.186,00			Área Verde / Permeável (m²)	360,00
Área da projeção do(s) edifício(s) (m²)	512,37	Bloco salas	512,37	Quadra	-

Abastecimento

Água										
Forma de abastecimento (rede pública, poço artesiano, sem abastecimento etc.):	Rede pública									
Quantidade de reservatório de água	1									
Capacidade por reservatório (L)	20000	Constatação		Projeto	Projeto	SIM				
Gás										
Encanado (Sim ou Não)	SIM	Botijão de Gás (Sim ou Não)		SIM	Quantidade de Botijões de Gás	4				
Energia Elétrica										
Aparelho Ar condicionado (Sim ou Não)	NÃO				Quantidade:	0				
Possui fonte de energia complementar (Sim ou Não)?	NÃO				Qual (por ex. Painel Solar ou outro)?	0				
Possui Gerador de Energia? (Sim ou Não)?	NÃO				Capacidade:	0				
Esgoto										
Rede Pública (Sim ou Não)	SIM				Fossa Séptica (Sim ou Não)	NÃO				
Caixa de Gordura (Sim ou Não)	SIM				Caixa de Passagem (Sim ou Não)	SIM				

Informações sobre Prevenção de Incêndios (AVCB e SPDA)

Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro (Sim ou Não)	NÃO	Nº	N/A							
Extintor	SIM	5								
Hidrante	SIM	2								
Sinalização Emergência	SIM	2								
Iluminação Emergência	SIM	7								
Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) (Sim ou Não)	SIM	Nº	Total (Sim ou N	SIM	Parcial (Sim ou Não)	NÃO				

Acessibilidade

Elevador (Sim ou Não)	SIM			Quantidade:	1	Quant. Ativos/Funcionais:	1
Plataforma Elevatória (Sim ou Não)	NÃO			Quantidade:	0	Quant. Ativos/Funcionais:	0
Rampa de Acesso a Unidade (Sim ou Não)	SIM			Rampa de Acesso a outros espaços necessários (Sim ou Não)			SIM
Tipo de sinalização	SIM	Sonora (Sim ou Não)	SIM	Visual (Sim ou Não)	PARCIAL	Tátil (Sim ou Não)	PARCIAL
Selo de Acessibilidade (Sim ou Não)	NÃO		Nº				
Vaga de estacionamento para deficientes (Sim ou Não)	NÃO				Quantidade:	0	

CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL

Ambientes da Escola

Administrativo e Apoio/Serviços

Ambiente	Comprimento (m)	Largura (m)	Pé Direito (m)	Área (m²)	Tipo de Construção	Revestimento de Piso	Revestimento de Parede	Possui Forro? Se sim, qual tipo?	Nível de Comprometimento do Ambiente	Observações
Depósito - Térreo	5,22	1,45	1,50	7,57	Concreto armado				**0**	
Hall - Térreo	7,67	2,38	3,00	14,85	Concreto armado	Cerâmico	Pintura	Laje	**0**	
Secretaria - Térreo	6,10	2,25	3,00	15,56	Concreto armado	Cerâmico	Pintura	Laje	**0**	
Direção - Térreo	4,05	2,55	3,00	10,33	Concreto armado	Cerâmico	Pintura	Laje	**0**	
Coordenação - Térreo	4,05	2,55	3,00	10,33	Concreto armado	Cerâmico	Pintura	Laje	**0**	
Refeitório dos Professores - Térreo	6,10	3,93	3,00	18,04	Concreto armado	Cerâmico	Pintura	Laje	**3**	Fissura na parede, necessitando realizar o reparo
Almoxarifado - Térreo	3,85	1,90	3,00	7,32	Concreto armado	Cerâmico	Pintura	Laje	**0**	
Refeitório - Térreo	21,45	10,55	3,00	209,31	Concreto armado	Cerâmico	Pintura	Laje	**3**	Descamação na pintura da laje
Brinquedoteca - Térreo	7,07	6,10	3,00	43,13	Concreto armado	Cerâmico	Pintura	Laje	**0**	
Circulação - Térreo	6,10	1,20	3,00	7,32	Concreto armado	Cerâmico	Pintura	Laje	**3**	Descamação na pintura da parede
Copa Funcionário - Térreo	2,75	1,40	3,00	3,85	Concreto armado	Cerâmico	Pintura	Laje	**3**	Fissura - descamação
Cozinha - Térreo	7,25	4,78	3,00	33,78	Concreto armado	Cerâmico	Azulejo	Gesso/Laje	**3**	Fissura na parede e descamação da pintura no shaft. Necessário realizar o reparo
Área de Serviço - Térreo	7,25	3,00	3,00	21,51	Concreto armado	Cerâmico	Pintura	-	**3**	Infiltração
Despensa - Térreo	4,75	3,20	3,00	14,46	Concreto armado	Cerâmico	Azulejo	Laje	**3**	Desplacamento de revestimento
Escada 1º Pav	7,23	1,71	3,00	12,36	Concreto armado	Granilite	Pintura	Laje	**0**	
Circulação- 1º Pav	22,97	3,47	5,00	79,59	Concreto armado	Cerâmico	Pintura	Laje	**3**	Descamação na pintura da parede. Presença de fissura no revestimento cerâmico do piso com indícios de desplacamento do revestimento. Necessário realizar o reparo.
Escada	4,75	3,20	3,00	14,46	Concreto armado	Granilite	Pintura	Laje	**3**	Infiltração e Fissura na parede da escada, necessário realizar reparo
Casa de Máquinas - 1º Pav				0,00	Concreto armado	Concreto	Pintura	Laje	**0**	Infiltração na parede com início de mancha de bolor, necessitando reparo
Área Externa - Térreo				0,00	Concreto armado	Concreto	Pintura	-	**3**	Afundamento no piso da área externa, gerando irregularidade na circulação

CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL

CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL

Salas de Aula

Ambiente	Comprimento (m)	Largura (m)	Pé Direito (m)	Área (m²)	Tipo de Construção	Revestimento de Piso	Revestimento de Parede	Possui Forro? Se sim, qual tipo?	Nível de Comprometimento do Ambiente	Observações
Sala de Aula 1 - 1º Pav	7,10	7,00	3,00	49,70	Concreto armado	Cerâmico	Pintura	Laje	**3**	Presença de infiltração na parede abaixo da janela
Sala de Aula 2 - 1º Pav	7,10	7,00	3,00	49,70	Concreto armado	Cerâmico	Pintura	Laje	**3**	Fissura na parede, necessitando realizar o reparo
Sala de Aula 3 - 1º Pav	7,10	7,00	3,00	49,70	Concreto armado	Cerâmico	Pintura	Laje	**3**	Descamação na parede acima da porta e presença de infiltração na parede abaixo da janela
Sala de Aula 4 - 1º Pav	7,10	7,00	3,00	49,70	Concreto armado	Cerâmico	Pintura	Laje	**0**	
Sala de Aula 5 - 1º Pav	7,10	7,00	3,00	49,70	Concreto armado	Cerâmico	Pintura	Laje	**3**	Fissura na parede, necessitando realizar o reparo
Sala de Aula 6 - 1º Pav	7,10	7,00	3,00	49,70	Concreto armado	Cerâmico	Pintura	Laje	**0**	
Sala de Aula 7 - 1º Pav	7,10	7,00	3,00	49,70	Concreto armado	Cerâmico	Pintura	Laje	**3**	Infiltração - fissura na parede, necessitando reparo
Sala de Aula 8 - 1º Pav	7,10	7,00	3,00	49,70	Concreto armado	Cerâmico	Pintura	Laje	**3**	Infiltração na laje, necessitando reparo para recuperar a estanqueidade do sistema de cobertura. Presença de fissura na parede, necessitando reparo

Sanitários

Ambiente	Comprimento (m)	Largura (m)	Pé Direito (m)	Área (m²)	Revestimento de Piso	Revestimento de Parede	Possui Forro? Se sim, qual tipo?	Observações	Nível de Comprometimento do Ambiente	**Informações Complementares** Quant. Vasos Sanitários	Quant. Cubas e trocadores	Quant. Chuveiros
W.C Feminino Cozinha - Térreo	2,10	0,90	3,00	1,89	Cerâmico	Azulejo	Laje	Fissura na laje	**3**	1	1	0
Banheiro Adulto Feminino - Térreo	2,10	1,90	3,00	3,99	Cerâmico	Azulejo	Laje		**0**	2	1	0
Vestiário Equipe da Limpeza - Térreo	3,00	2,10	3,00	6,30	Cerâmico	Azulejo	Laje		**0**	2	1	0
W.C Masculino - Térreo	1,70	1,65	3,00	2,81	Cerâmico	Azulejo	Laje		**0**	1	1	1
Lavanderia - Térreo	3,18	2,75	3,00	5,41	Cerâmico	Azulejo	Laje	Fissura	**1**	0	1	0
PCD - Térreo	1,90	1,52	2,55	2,89	Cerâmico	Azulejo	Laje	Corrosão na base da barra de apoio e na fissura na interface da parede com a estrutura	**3**	1	1	0
WC - Térreo	3,60	3,15	2,55	9,17	Cerâmico	Azulejo	Laje	Descamação	**3**	3	1	0
WC Masculino - 1º Pav	5,76	1,66	3,00	7,83	Cerâmico	Azulejo	Laje		**0**	2	1	0
PCD - 1º Pav	2,36	1,40	3,00	3,30	Cerâmico	Azulejo	Laje	Infiltração	**3**	1	1	0
WC Feminino - 1º Pav	5,76	1,66	3,00	7,83	Cerâmico	Azulejo	Laje		**0**	2	1	0

Informações Adicionais

Ambiente	Necessário adequar ou implantar? (SIM / NÃO / NÃO SE APLICA)	Informações Complementares							Observações
Fechamento do lote (muro, cerca, gradil, vegetação)	NÃO	Muro		Área (m²)	2.122,00	Gradil	Área (m²)	5.305,00	
Estacionamento(s)	SIM	Área (m²)							Implantar bicicletário
Playground (Sim ou Não)	NÃO	Área (m²)		360,00					
Tanque de Areia (Sim ou Não)	NÃO	Área Cúbica (m³)							
Calçadas (Sim ou Não?)	NÃO								
Serralherias (Portões, travas e outros)	NÃO								
Alarmes e sensores (Sim ou Não?)	NÃO								
Câmeras de segurança (Sim ou Não?)	NÃO								

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL			
Rede de gás na testada? (Sim ou Não)	NÃO		
Observações Gerais:	**Edificação com fissuras na interface da alvenaria com elementos estruturais (vigas e laje), necessitando reparo. Reservatório apresentou manchas de umidade indicando infiltração e perda da capacidade de estanqueidade do elemento. Não foi encontrado AVCB na unidade.**		

FICHA 4 - DIAGNÓSTICO DE ASPECTOS DE INFRAESTRUTURA PREDIAL DAS UNIDADES ESCOLARES			
Item	**Descrição dos Itens Avaliados**	**Necessidade de Intervenção**	**Observações**
1. Infraestrutura da Escola			
Condições das fundações, pilares, vigas, lajes, cobertura, estruturas metálicas, paredes, esquadrias e pisos			
1.1	Fundações: verificar se há rachaduras, trincas, fissuras, desplacamentos ou quaisquer sinais de falhas na fundação que possam comprometer a estabilidade do prédio	NÃO	
1.2	Pilares: verificar se há rachaduras, trincas, fissuras, desplacamentos ou quaisquer sinais de falhas nos pilares que possam comprometer a estabilidade do prédio	NÃO	
1.3	Vigas: verificar se há rachaduras, trincas, fissuras, desplacamentos ou quaisquer sinais de falhas nas vigas que possam comprometer a estabilidade do prédio	NÃO	
1.4	Lajes: verificar se há rachaduras, trincas, fissuras, desplacamentos ou quaisquer sinais de falhas nas lajes que possam comprometer a estabilidade do prédio	SIM	Fissuras nas lajes
1.5	Cobertura: verificar se há sinais de infiltração, vazamentos, telhas soltas ou outras falhas que possam causar danos à estrutura da escola	SIM	Salas do último pavimento com infiltração, dando indícios de que o sistema de cobertura está com falhas de estanqueidade. É recomendado uma revisão completa no sistema de cobertura da unidade, principalmente nos pontos acima da Sala de Aula 8
1.6	Estruturas metálicas: verificar se há sinais de problemas nas estruturas metálicas, como corrosão ou deformação	NÃO	
1.7	Paredes: verificar se há sinais de problemas nas paredes, como rachaduras, infiltrações ou umidade excessiva	SIM	Fissuras no encunhamento das paredes com a laje, ocasionado possivelmente devido à falha na execução do encunhamento, não deixando espaço para estrutura e parede trabalharem (expansão e contração). Ncessário realizar reparo para dissipar as tensões concentradas. Paredes com manchas de umidade e bolor, necessário realizar reparo.
1.8	Esquadrias: verificar se há problemas nas esquadrias, tais como falta de peças, corrosão, vidros quebrados e dificuldade de manuseio	SIM	Corrosão na base metálica do WC PNE no Térreo
1.9	Pisos: verificar se há sinais de problemas nos pisos, como desníveis, rachaduras ou solturas de revestimento	SIM	Afundamentos parciais no piso da Área Externa, necessitando reparo.
2. Instalações Elétricas e Hidráulicas			
Condições das instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias			
2.1	Instalações elétricas: verificar se as instalações elétricas estão em conformidade com as normas de segurança, se há fios expostos, equipamentos com defeito ou outros problemas que possam representar risco de incêndio ou choque elétrico. verificar também se o quadro de energia está em bom estado e se as tomadas e interruptores estão funcionando corretamente	NÃO	
2.2	Instalações hidráulicas: verificar se as instalações hidráulicas estão em bom estado, sem vazamentos, rachaduras ou outros problemas que possam prejudicar o funcionamento do sistema. verificar também se as torneiras, registros e outros componentes estão em bom estado e se o sistema de esgoto está funcionando corretamente	NÃO	
2.3	Instalações sanitárias: verificar se as instalações sanitárias estão em bom estado, sem vazamentos, rachaduras ou outros problemas que possam prejudicar o funcionamento do sistema. verificar também se as louças sanitárias, como vasos e pias, estão em bom estado e se os ralos estão desobstruídos	NÃO	

FICHA 4 - DIAGNÓSTICO DE ASPECTOS DE INFRAESTRUTURA PREDIAL DAS UNIDADES ESCOLARES			
Item	**Descrição dos Itens Avaliados**	**Necessidade de Intervenção**	**Observações**
2.4	Reservatórios de água: verificar se os reservatórios de água estão em bom estado, sem vazamentos ou outros problemas que possam prejudicar o funcionament do sistema de abastecimento	SIM	Reservatório com infiltração, necessário realizar reparo para recuperar a capacidade de estanqueidade do elemento.

FICHA 4 - DIAGNÓSTICO DE ASPECTOS DE INFRAESTRUTURA PREDIAL DAS UNIDADES ESCOLARES			
Item	**Descrição dos Itens Avaliados**	**Necessidade de Intervenção**	**Observações**
3. Acessibilidade			
Condições de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida			
3.1	Rampas de acesso: verificar se há rampas de acesso em bom estado e com inclinação adequada	NÃO	
3.2	Elevadores: verificar se há elevadores em bom estado e se estão em conformidade com as normas de acessibilidade	NÃO	
3.3	Banheiros adaptados: verificar se há banheiros adaptados em bom estado e se estão em conformidade com as normas de acessibilidade	SIM	Necessário adequar as barras de apoio e demais medidas necessárias para atender os requisitos da NBR 9050
4. Condições de Habitabilidade			
Condições de ventilação e iluminação natural e artificial e conforto térmico dos ambientes			
4.1	Condições gerais de habitabilidade e conforto térmico por setor (salas de aulas, outros ambientes pedagógicos, ambientes administrativos, cozinha e refeitório, etc.)	NÃO	
5. Áreas Externas/Paisagismo			
Condições de adequabilidade das áreas externas da escola			
5.1	Condições Gerais do Paisagismo na Unidade Educacional	NÃO	
5.2	Drenagem: verificar se a drenagem da área externa da escola está funcionando corretamente, evitando acúmulo de água em dias de chuva	NÃO	
5.3	Pintura externa: verificar se a pintura externa da escola está em bom estado, sem descascamentos ou sinais de desgaste	SIM	Necessário realizar reparo nos pontos de infiltração da fachada e posterior repintura da fachada.

Profissional Responsável
Nome: Matheus Noronha Mendonça
Cargo/função: Engenheiro Civil
CREA/CAU: 5070897203

Responsável pela validação CAIXA
Nome: Decio de Souza Espindola
Cargo/função: Engenheiro Civil
CREA/CAU: 5062158870-SP

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEI JARDIM DA CONQUISTA II

1 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Cód. Unidade	
19320	EMEI JARDIM DA CONQUISTA II



Foto 01: Identificação do Empreendimento



Foto 02: Passeio Público



Foto 03: Passeio Público



Foto 04: Passeio Público



Foto 05: Corredor da Entrada



Foto 06: Elevador Elétrico

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEI JARDIM DA CONQUISTA II

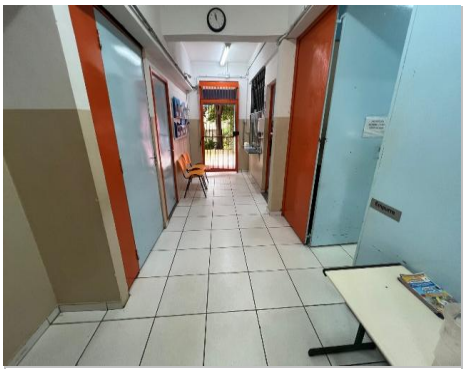


Foto 07: Hall



Foto 08: Hall

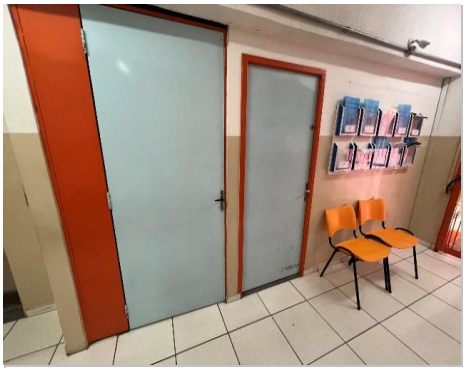


Foto 09: Hall

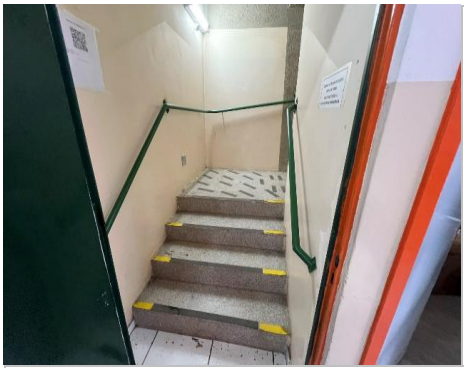


Foto 10: Escada

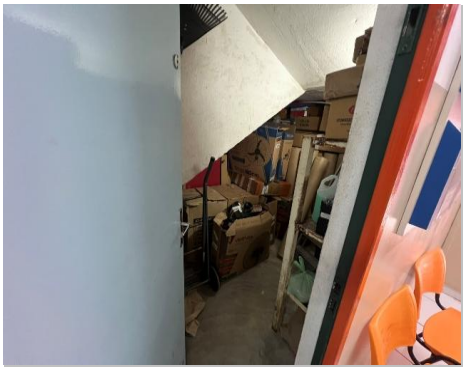


Foto 11: Depósito



Foto 12: Secretaria

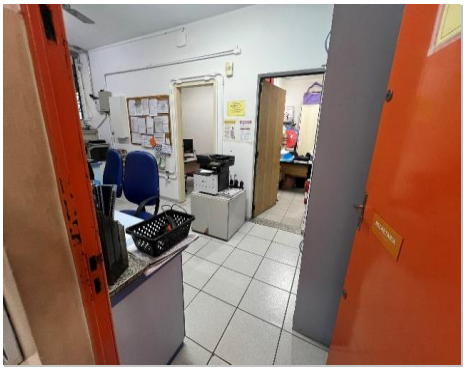


Foto 13: Secretaria




Foto 14: Direção

CAIXA

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEI JARDIM DA CONQUISTA II



Foto 15: Direção

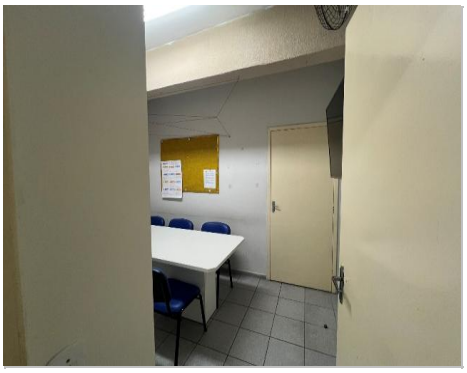


Foto 16: Sala dos Professores

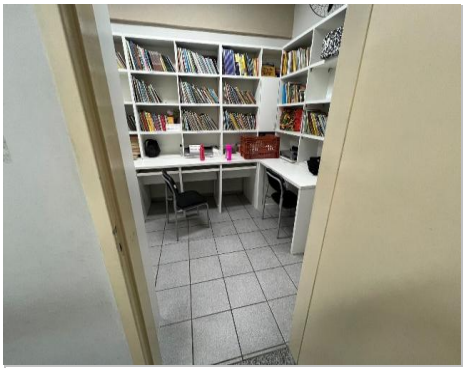


Foto 17: Refeitório dos Professores

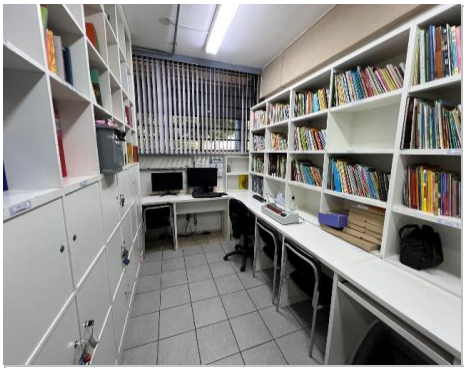


Foto 18: Refeitório dos Professores

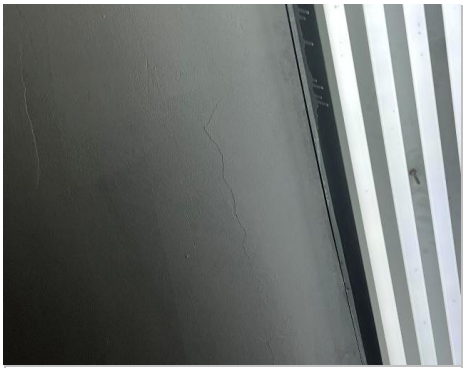


Foto 19: Refeitório dos Professores
Fissura na laje



Foto 20: Almoxarifado



Foto 21: Refeitório



Foto 22: Refeitório

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI JARDIM DA CONQUISTA II



Foto 23: Refeitório
Descamação na pintura



Foto 24: Refeitório
Descamação na pintura



Foto 25: Refeitório



Foto 26: Refeitório



Foto 27: Brinquedoteca



Foto 28: Refeitório



Foto 29: Circulação - Térreo



Foto 30: Circulação - Térreo
Descamação na pintura

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI JARDIM DA CONQUISTA II



Foto 31: W.C Fem Cozinha



Foto 32: W.C Fem Cozinha



Foto 33: W.C Fem Cozinha



Foto 34: W.C Adulto Fem



Foto 35: W.C Adulto Fem



Foto 36: Vestiário - Eq. Limpeza



Foto 37: Vestiário - Eq. Limpeza




Foto 38: Vestiário - Eq. Limpeza

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEI JARDIM DA CONQUISTA II

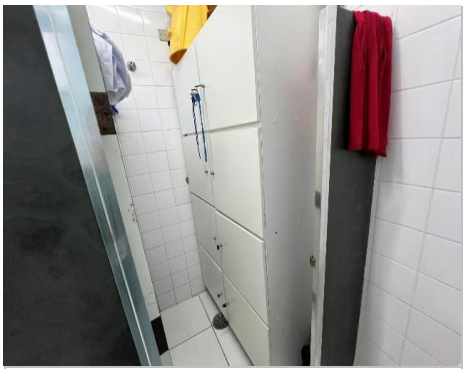


Foto 39: Vestiário - Eq. Limpeza



Foto 40: Circulação - Térreo



Foto 41: W.C. Masc



Foto 42: W.C. Masc



Foto 43: Circulação - Térreo



Foto 44: Lavanderia

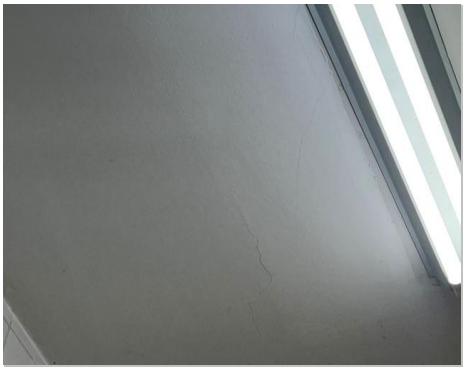


Foto 45: Lavanderia
Fissura na laje

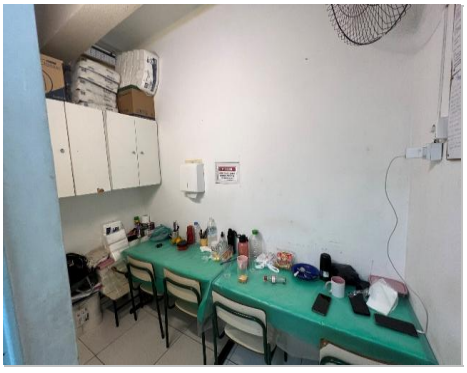


Foto 46: Copa

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI JARDIM DA CONQUISTA II



Foto 47: Copa
Fissura e descamação na parede



Foto 48: Cozinha

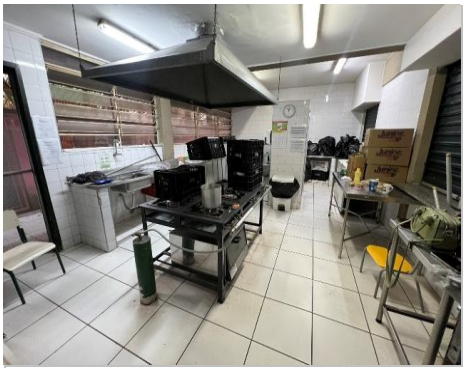


Foto 49: Cozinha



Foto 50: Cozinha
Descamação na pintura



Foto 51: Cozinha
Fissura na laje



Foto 52: Cozinha



Foto 53: Área de Serviço



Foto 54: Área de Serviço

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI JARDIM DA CONQUISTA II



Foto 55: Área de Serviço



Foto 56: Área de Serviço



Foto 57: Área de Serviço
Infiltração



Foto 58: Área de Serviço
Infiltração



Foto 59: Área de Serviço
Infiltração

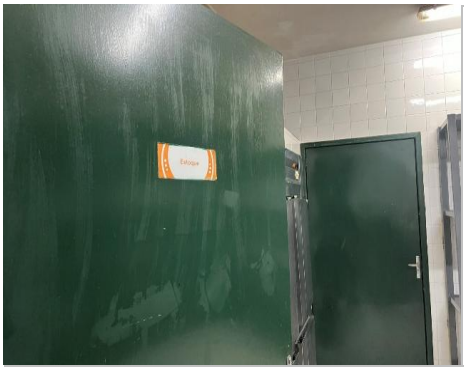


Foto 60: Despensa



Foto 61: Despensa



Foto 62: Despensa
Desplacamento do revestimento

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEI JARDIM DA CONQUISTA II



Foto 63: PCD

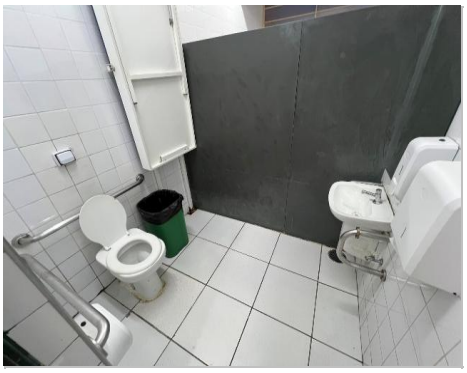


Foto 64: PCD

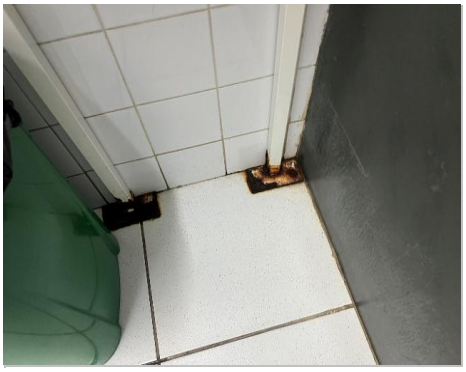


Foto 65: PCD
Corrosão no suporte metálico



Foto 66: PCD



Foto 67: PCD
Fissura na parede



Foto 68: PCD
Fissura na parede



Foto 69: Refeitório
Descamação na pintura



Foto 70: W.C. Feminino Infantil

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEI JARDIM DA CONQUISTA II



Foto 71: W.C. Feminino Infantil
Descamação na pintura



Foto 72: W.C. Feminino Infantil



Foto 73: W.C. Feminino Infantil



Foto 74: W.C. Feminino Infantil



Foto 75: W.C. Feminino Infantil



Foto 76: W.C. Feminino Infantil
Descamação na pintura

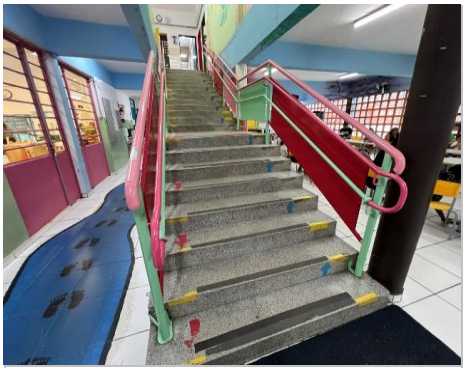


Foto 77: Escada 1º Pav



Foto 78: Circulação- 1º Pav

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI JARDIM DA CONQUISTA II



Foto 79: Circulação- 1º Pav
Descamação na pintura



Foto 80: Sala 3



Foto 81: Sala 3



Foto 82: Sala 3
Infiltração



Foto 83: Sala 3
Infiltração

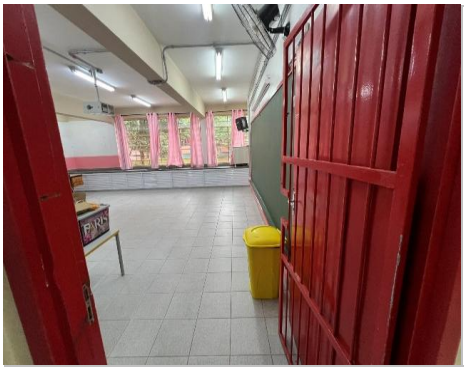


Foto 84: Sala 1

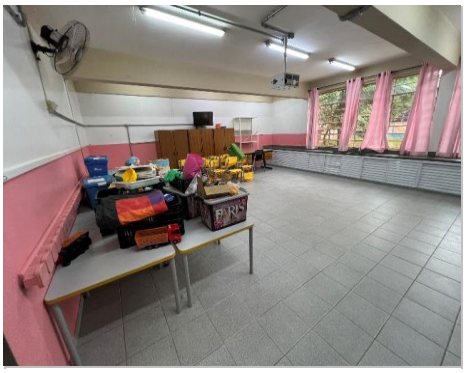


Foto 85: Sala 1



Foto 86: Sala 1
Descamação na pintura

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEI JARDIM DA CONQUISTA II



Foto 87: Sala 1
Infiltração



Foto 88: Sala 1
Infiltração



Foto 89: Sala 1
Infiltração



Foto 90: Banheiro Masculino

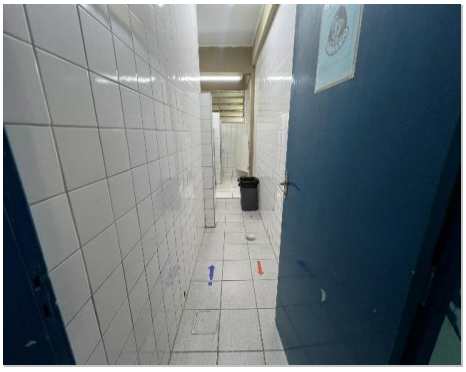


Foto 91: Banheiro Masculino



Foto 92: Banheiro Masculino



Foto 93: Banheiro Masculino

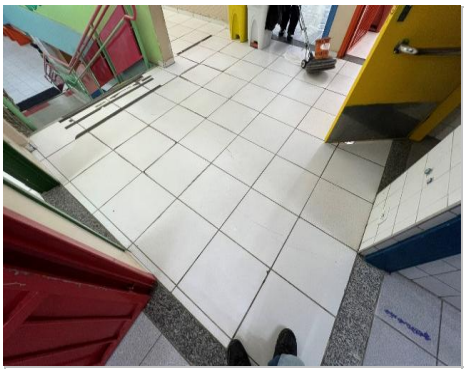


Foto 94: Circulação - 1º Pav

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI JARDIM DA CONQUISTA II



Foto 95: Circulação - 1º Pav
Fissura no piso



Foto 96: Circulação - 1º Pav
Fissura no piso



Foto 97: Banheiro PCD



Foto 98: Banheiro PCD



Foto 99: Banheiro PCD
Infiltração



Foto 100: Banheiro PCD
Infiltração



Foto 101: Banheiro PCD



Foto 102: Banheiro Feminino

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI JARDIM DA CONQUISTA II

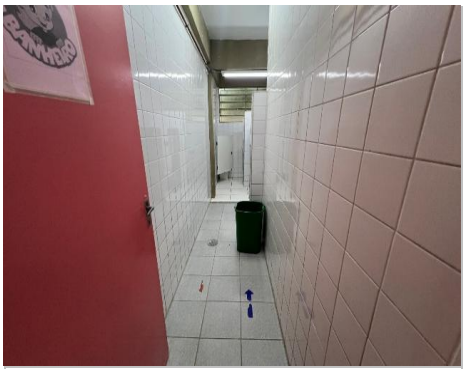


Foto 103: Banheiro Feminino



Foto 104: Banheiro Feminino



Foto 105: Banheiro Feminino



Foto 106: Sala 2



Foto 107: Sala 2



Foto 108: Sala 2
Fissura na parede



Foto 109: Sala 4



Foto 110: Sala 4

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI JARDIM DA CONQUISTA II

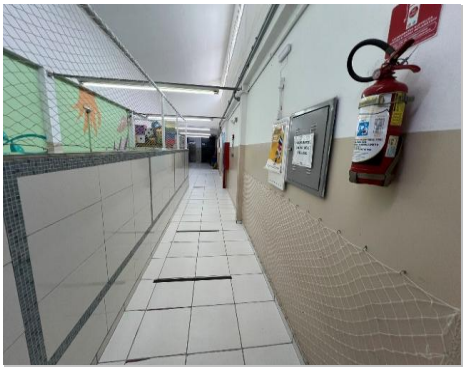


Foto 111: Circulação - 1º Pav



Foto 112: Circulação - 1º Pav



Foto 113: Circulação - 1º Pav
Piso liso



Foto 114: Circulação - 1º Pav



Foto 115: Sala 6



Foto 116: Sala 6

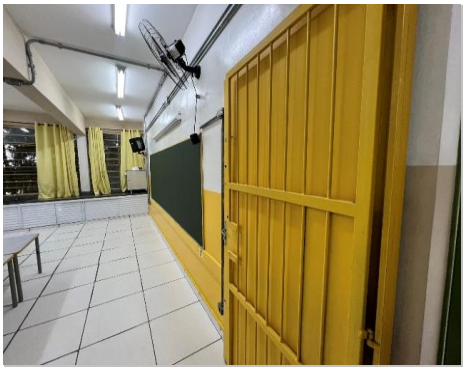


Foto 117: Sala 8



Foto 118: Sala 8

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI JARDIM DA CONQUISTA II



Foto 119: Sala 8
Infiltração



Foto 120: Sala 8



Foto 121:

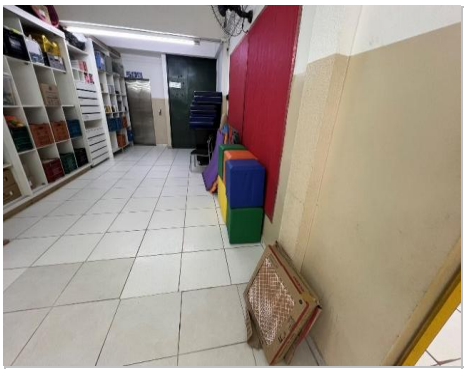


Foto 122: Circulação - 1º Pav



Foto 123: Elevador Elétrico



Foto 124: Circulação - 1º Pav



Foto 125: Circulação - 1º Pav
Descamação na pintura



Foto 126: Circulação - 1º Pav

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI JARDIM DA CONQUISTA II

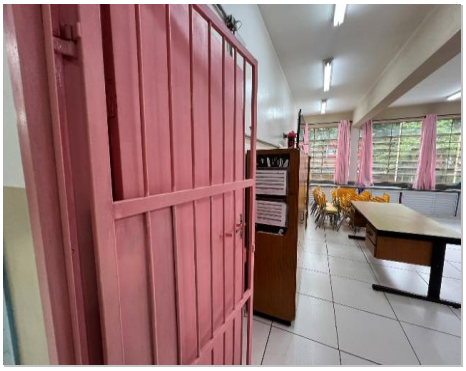


Foto 127: Sala 7



Foto 128: Sala 7



Foto 129: Sala 7
Fissura na parede



Foto 130: Sala 7
Infiltração



Foto 131: Sala 5



Foto 132: Sala 5



Foto 133: Sala 5
Fissura na parede



Foto 134: Circulação - 1º Pav

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI JARDIM DA CONQUISTA II

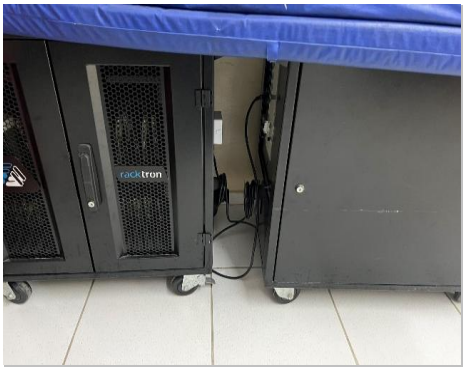


Foto 135: Circulação - 1º Pav



Foto 136: Escada



Foto 137: Circulação - 1º Pav
Fissura na parede

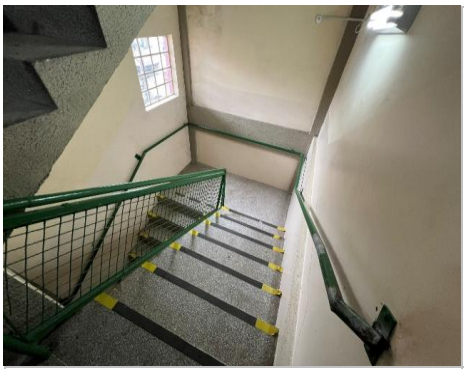


Foto 138: Escada



Foto 139: Escada
Fissura na parede



Foto 140: Escada
Infiltração



Foto 141: Escada
Vidro quebrado



Foto 142: Escada
Fissura na parede

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEI JARDIM DA CONQUISTA II

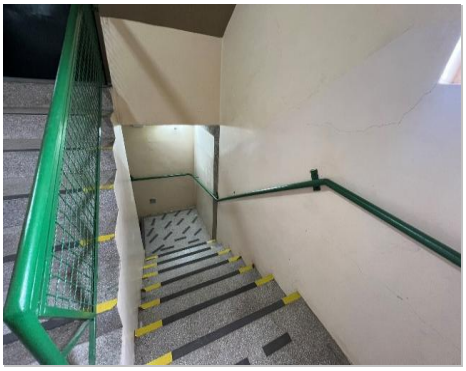


Foto 143: Escada



Foto 144: Escada
Estufamento

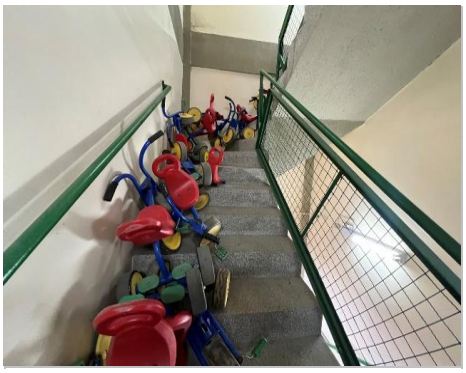


Foto 145: Escada



Foto 146: Escada
Fissura na parede



Foto 147: Escada
Infiltração



Foto 148: Escada
Fissura



Foto 149: Escada
Infiltração



Foto 150: Escada
Infiltração

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI JARDIM DA CONQUISTA II



Foto 151: Escada
Fissura na parede



Foto 152: Escada
Descamação na pintura



Foto 153: Escada
Infiltração



Foto 154: Casa de Máquinas - 1º Pav



Foto 155: Casa de Máquinas - 1º Pav
Infiltração



Foto 156: Casa de Máquinas - 1º Pav



Foto 157: Casa de Máquinas - 1º Pav
Infiltração



Foto 158: Área Externa

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI JARDIM DA CONQUISTA II



Foto 159: Área Externa



Foto 160: Área Externa



Foto 161: Área Externa



Foto 162: Fachada



Foto 163: Fachada
Infiltração



Foto 164: Fachada



Foto 165: Fachada



Foto 166: Fachada
Infiltração

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI JARDIM DA CONQUISTA II



Foto 167: Fachada
Mancha de escorrimento



Foto 168: Fachada
Mancha de escorrimento



Foto 169: Fachada
Infiltração



Foto 170: Playground



Foto 171: Playground



Foto 172: Playground



Foto 173: Playground



Foto 174: Fachada

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI JARDIM DA CONQUISTA II



Foto 175: Fachada
Infiltração



Foto 176: Área Externa



Foto 177: Área Externa



Foto 178: Horta

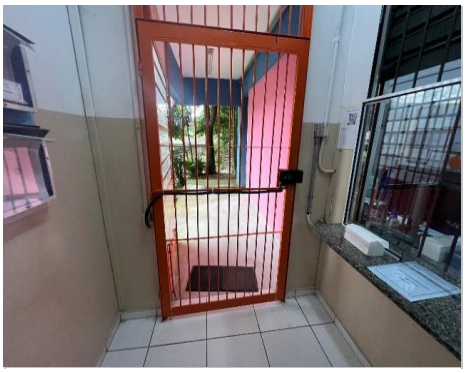


Foto 179: Hall



Foto 180: Área Externa



Foto 181: Área Externa



Foto 182: Fachada
Descontinuidade do revestimento

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI JARDIM DA CONQUISTA II



Foto 183: Fachada
Infiltração e descamação



Foto 184: Fachada
Infiltração



Foto 185: Fachada
Infiltração



Foto 186: Fachada
Infiltração



Foto 187: Fachada
Mancha de escorrimento



Foto 188: Fachada



Foto 189: Reservatório



Foto 190: Reservatório

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI JARDIM DA CONQUISTA II



Foto 191: Reservatório
Mancha de escorrimento



Foto 192: Reservatório



Foto 193: Reservatório



Foto 194: Fachada
Mancha de umidade



Foto 195: Fachada



Foto 196: Fachada
Infiltração



Foto 197: Fachada
Mancha de umidade e fissura



Foto 198: Estacionamento
Fissura no piso

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI JARDIM DA CONQUISTA II



Foto 199: Estacionamento
Fissura no piso



Foto 200: Estacionamento
Fissura no piso



Foto 201: Telhado



Foto 202: Telhado



Foto 203: Telhado



Foto 204: Telhado



Foto 205: Telhado

Foto 206:
