CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL

Dados Gerais

Nome da Unidade:	EMEF HENRIQUE SOUZA FILHO (HENFIL)		
Sequencial (U.E):	84	**Código da Unidade:**	892

Endereço da Escola

Logradouro, número e complemento (se houver)	RUA ÉRICO SEMER S/N - JARDIM MARILU

Descrição do Imóvel

Tipo de Construção (técnica construtiva predominante)	Concreto armado	Padrão:	12. EMEF PADRAO 072 12 SALA	Nº de Pavimentos	2

Implantação

Área do Terreno (m²)	3.439,14 m²			Área Edificada/ Construída (m²)	2.045,97 m²
Área Pavimentada (m²)	2.384,93 m²			Área Verde / Permeável (m²)	1.054,21 m²
Área da projeção do(s) edifício(s) (m²)	1.306,44 m²	Bloco salas	816,15	Quadra	490,29 m²

Abastecimento

Água

Forma de abastecimento (rede pública, poço artesiano, sem abastecimento etc.):	REDE PÚBLICA						
Quantidade de reservatório de água	1						
Capacidade por reservatório (L)	39000 L	Constatação		Inf. Resp.	Projeto	NÃO	

Gás

Encanado (Sim ou Não)	NÃO	Botijão de Gás (Sim ou Não)		SIM	Quantidade de Botijões de Gás	4 X 45 KG

Energia Elétrica

Aparelho Ar condicionado (Sim ou Não)	SIM	Quantidade:	2
Possui fonte de energia complementar (Sim ou Não)?	NÃO	Qual (por ex. Painel Solar ou outro)?	0
Possui Gerador de Energia? (Sim ou Não)?	NÃO	Capacidade:	0

Esgoto

Rede Pública (Sim ou Não)	SIM	Fossa Séptica (Sim ou Não)	NÃO
Caixa de Gordura (Sim ou Não)	SIM	Caixa de Passagem (Sim ou Não)	SIM

Informações sobre Prevenção de Incêndios (AVCB e SPDA)

Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro (Sim ou Não)	NÃO	Nº	N/A						
Extintor	SIM	7							
Hidrante	SIM	5							
Sinalização Emergência	NÃO	0							
Iluminação Emergência	SIM	12							
Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) (Sim ou Não)	SIM	Nº	Total (Sim ou N	NÃO	Parcial (Sim ou Não)	SIM			

Acessibilidade

Elevador (Sim ou Não)	NÃO			Quantidade:	0	Quant. Ativos/Funcionais:	0
Plataforma Elevatória (Sim ou Não)	NÃO			Quantidade:	0	Quant. Ativos/Funcionais:	0
Rampa de Acesso a Unidade (Sim ou Não)	NÃO			Rampa de Acesso a outros espaços necessários (Sim ou Não)			NÃO
Tipo de sinalização	NÃO	Sonora (Sim ou Não)	NÃO	Visual (Sim ou Não)	NÃO	Tátil (Sim ou Não)	NÃO
Selo de Acessibilidade (Sim ou Não)	NÃO			Nº			
Vaga de estacionamento para deficientes (Sim ou Não)	NÃO					Quantidade:	0

CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL										
Ambientes da Escola										
Administrativo e Apoio/Serviços										
Ambiente	Comprimento (m)	Largura (m)	Pé Direito (m)	Área (m²)	Tipo de Construção	Revestimento de Piso	Revestimento de Parede	Possui Forro? Se sim, qual tipo?	Nível de Comprometimento do Ambiente	Observações
Secretaria - Térreo	7,71	8,95	3,00 2,75	49,81	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre massa	Não	**2**	Tubulaçãoes desativadas sem acabamento. Caixas de passagem de elétrica sem acabamento. Janelas com dificuldade de abrir e fechar (foto 03)
Almoxarifado - Térreo	2,47	4,50	3,00	11,12	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre massa	Não	**0**	
Depósito - Térreo	2,56	7,60	3,00	19,46	Alvenaria/ drywall	Cerâmico	Pintura sobre massa	Não	**3**	Mancha de infiltração no teto (foto 6)
Sala Diretor - Térreo	3,68	4,16	2,72 2,31	15,31	Alvenaria/ drywall	Cerâmico	Pintura sobre massa	Sim. Drywall	**3**	Mancha de infiltração no teto. Há fiações expostas. Caixa de passagem sem acabamento no teto. Fissura na viga. Janelas com dificuldade de abrir e fechar (foto 9 a 11)
Depósito sob escada 1 - Térreo	3,80	2,85	var.	5,43	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre massa	Não	**0**	
Depósito 3 - Térreo	2,70	1,10	2,31	2,97	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre massa	Sim. Drywall	**3**	Parede com mofo. Forro com abertura, sem pintura. (Foto 13 e 14)
Radio - Térreo	1,32	1,10	2,41	1,45	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre massa	Sim. PVC	**3**	Parede com mofo (foto 15 e 16)
Coordenador Pedagógico - Térreo	2,50	7,23	3,00	18,08	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre massa	Não	**2**	Fissura na parede. Janelas com dificuldade de abrir e fechar (foto 17 e 18)
Palco - Térreo	7,86	4,55	2,40	35,72	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre massa	Não	**2**	Há fiações expostas (foto 19)
Camarin - Térreo	7,87	1,98	2,87	15,58	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre massa	Não	**2**	Janelas com dificuldade de abrir e fechar.
Refeitório - Térreo	16,15	17,74	3,00	243,58	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre massa	Não	**2**	Janelas com dificuldade de abrir e fechar.
Cozinha Professores - Térreo	7,92	4,13	3,15	19,79	Alvenaria	Cerâmico	Azulejo	Não	**2**	Janelas com dificuldade de abrir e fechar.
Depósito sob escada 2 - Térreo	3,80	2,85	var.	5,43	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre massa	Não	**2**	Parede com mofo. Tubulação de incêndio em PVC. Caixa de passagem sem acabamento, fiação exposta.
Cozinha - Térreo	5,12	4,60	3,00	23,55	Alvenaria	Cerâmico	Azulejo	Não	**2**	Janelas com dificuldade de abrir e fechar.
Despensa - Térreo	2,45	4,51	3,00	11,05	Alvenaria	Cerâmico	Azulejo	Não	**0**	
Copa - Térreo	2,40	2,06	3,00	4,94	Alvenaria/ Divisória	Cerâmico	Azulejo	Não	**2**	Janelas com dificuldade de abrir e fechar.
Lavanderia - Térreo	4,95	3,27	3,00	11,07	Alvenaria	Cerâmico	Azulejo	Não	**2**	Extensão de tomada pendurado na torneira e alimenta duas máquinas de lavar. Azulejo danificado. Janelas com dificuldade de abrir e fechar (foto 33 e 34)
Depósito Mat. Limpeza - Térreo	2,05	6,00	3,27	12,30	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre massa	Não	**3**	Trinca na parede (foto 36)
Circulação 1 - Térreo	2,47	2,00	3,00	4,94	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre massa	Não	**0**	
Circulação 2 - Térreo	2,55	1,18	3,00	3,01	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre massa	Não	**0**	
Hall - Térreo	2,31	3,27	3,00	7,55	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre massa	Não	**2**	Revisar quadro de luz. Parede quebrado para passagem de conduite no quando de luz sem acabamento
Sala dos Professores - Pav. Superior	5,89	4,14	3,00	30,92	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre massa	Sim. PVC	**2**	Fissura na parede. Janelas com dificuldade de abrir e fechar (foto 54)
Projeto Apoio Pedagógico (PAP) - Pav. Superior	7,77	6,60	2,79	33,41	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre massa	Não	**2**	Fissura na parede. Janelas com dificuldade de abrir e fechar (foto 56)

CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL												
Circulação 3 - Pav. Superior	15,85	9,57	2,73 2,77	99,96	Alvenaria	Cerâmico	Cerâmico / Pintura sobre massa	Não	**2**	Revisar quadro de luz		
Circulação 4 - Pav. Superior	1,80	2,47	3,00	4,45	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre massa	Não	**0**			
Circulação 5 - Pav. Superior	1,85	1,93	3,00	3,57	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre massa	Não	**0**			
Circulação 6 - Pav. Superior	1,94	2,47	3,00	4,79	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre massa	Não	**0**			
Quadra Coberta	17,70	27,53	-	490,29	Estr. metálica	Cimentado	Sem pintura	Não	**1**	Pintura do piso descascando		
Escada 1	3,95	2,85	-	11,26	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre massa	Não	**0**			
Escada 2	3,95	2,85	-	11,26	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre massa	Não	**0**			
Salas de Aula												
Ambiente	Comprimento (m)	Largura (m)	Pé Direito (m)	Área (m²)	Tipo de Construção	Revestimento de Piso	Revestimento de Parede	Possui Forro? Se sim, qual tipo?	Nível de Comprometimento do Ambiente	Observações		
Sala de Aula 1 - Térreo	7,84	7,34	3,00	57,55	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre massa	Não	**2**	Há fiações expostas. Tubo corrugado mal instalado. Janelas com dificuldade de abrir e fechar.		
Sala de Aula 2 - Térreo	5,20	9,40	3,00	48,88	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre massa	Não	**2**	Há fiações expostas. Infiltração parede. Janelas com dificuldade de abrir e fechar (foto 40)		
Sala de Aula 3 - Pav. Superior	7,80	7,05	3,00	55,00	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre massa	Não	**2**	Caixas de passagem de elétrica sem acabamento. Há fiações expostas. Janelas com dificuldade de abrir e fechar (foto 66 e 67)		
Sala de Aula 4 - Pav. Superior	7,80	7,40	3,00	57,72	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre massa	Não	**2**	Janelas com dificuldade de abrir e fechar.		
Sala de Aula 5 - Pav. Superior	7,80	7,40	3,00	57,72	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre massa	Não	**2**	Janelas com dificuldade de abrir e fechar.		
Sala de Aula 6 - Pav. Superior	7,80	7,05	3,00	55,00	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre massa	Não	**2**	Janelas com dificuldade de abrir e fechar.		
Sala de Aula 7 - Pav. Superior	7,80	7,40	3,00	57,72	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre massa	Não	**2**	Janelas com dificuldade de abrir e fechar.		
Sala de Aula 8 - Pav. Superior	7,80	7,40	3,00	57,72	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre massa	Não	**2**	Janelas com dificuldade de abrir e fechar.		
Sala de Leitura - Pav. Superior	7,83	7,73	3,00	54,55	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre massa	Não	**2**	Janelas com dificuldade de abrir e fechar.		
Sala de Informática - Pav. Superior	7,80	9,68	3,00	75,50	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre massa	Não	**2**	Janelas com dificuldade de abrir e fechar.		
Sanitários										**Informações Complementares**		
Ambiente	Comprimento (m)	Largura (m)	Pé Direito (m)	Área (m²)	Revestimento de Piso	Revestimento de Parede	Possui Forro? Se sim, qual tipo?	Observações	Nível de Comprometimento do Ambiente	Quant. Vasos Sanitários	Quant. Cubas e trocadores	Quant. Chuveiros
Sanitário Funcionários Fem. - Térreo	1,05	2,56	2,75	2,69	Cerâmico	Azulejo	Não		**0**	1	1	0
Sanitário Funcionários. Masc. - Térreo	1,10	2,56	2,75	2,82	Cerâmico	Azulejo	Não		**0**	1	1	0
Sanitário Func. 1. - Térreo	1,58	1,98	3,00	3,13	Cerâmico	Azulejo	Não	Janelas com dificuldade de abrir e fechar	**2**	1	1	0
Sanitário Func. 2 - Térreo	0,85	1,98	3,00	1,68	Cerâmico	Azulejo	Não	Janelas com dificuldade de abrir e fechar	**2**	1	0	0
Sanitário Aluno Fem. + PCD- Térreo	5,48	3,27	3,00	17,92	Cerâmico	Azulejo	Não	Janelas com dificuldade de abrir e fechar	**2**	5	5	0

CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL

Sanitário Aluno Masc. + PCD - Térreo	5,48	3,27	3,00	17,92	Cerâmico	Azulejo	Não	Janelas com dificuldade de abrir e fechar	**2**	4	5	0
Vestiário Funcionários - Pav. Superior	4,32	2,90	3,00	10,15	Cerâmico	Pintura sobre massa	Não	Janelas com dificuldade de abrir e fechar	**2**	0	0	0
Sanitário Func. Fem. - Pav. Superior	2,63	1,84	3,00	4,84	Cerâmico	Azulejo	Não	Azulejo descolando. .Janelas com dificuldade de abrir e fechar	**2**	2	2	0
Sanitário Func. Masc. - Pav. Superior	1,35	0,87	3,00	1,17	Cerâmico	Azulejo	Não		**0**	1	1	0

Informações Adicionais

Ambiente	Necessário adequar ou implantar? (SIM / NÃO / NÃO SE APLICA)	Informações Complementares							Observações
Fechamento do lote (muro, cerca, gradil, vegetação)	NÃO	Muro		Área (m²)	551,95	Gradil	Área (m²)	199,75	
Estacionamento(s)	NÃO	Área (m²)		211,08					Existe uma área cimentada onde utilizam como estacionamento.
Playground (Sim ou Não)	NÃO	Área (m²)		258,40					
Tanque de Areia (Sim ou Não)	N/A	Área Cúbica (m³)							
Calçadas (Sim ou Não?)	NÃO								
Serralherias (Portões, travas e outros)	SIM								Revisar abrigo de lixo. Há portas metalicas com pontos oxidadas.
Alarmes e sensores (Sim ou Não?)	NÃO								
Câmeras de segurança (Sim ou Não?)	SIM								Não há câmeras de segurança.
Rede de gás na testada? (Sim ou Não)	NÃO								

Observações Gerais:	**Trata-se de uma escola conservada, porém sem acessibilidade.** **Verificadas infiltrações em alguns ambientes e nas paredes da caixa dágua .** **Segundo o diretor, nos finais de semana a quadra é aberta para a comunidade, que é muito participativa e não há vandalismo.** **O diretor solicita instalação de ar-condicionado em todas as salas de aula, pois no período da tarde a alta temperatura torna-se insuportável.**

CAIXA

FICHA 4 - DIAGNÓSTICO DE ASPECTOS DE INFRAESTRUTURA PREDIAL DAS UNIDADES ESCOLARES			
Item	**Descrição dos Itens Avaliados**	**Necessidade de Intervenção**	**Observações**
1. Infraestrutura da Escola			
Condições das fundações, pilares, vigas, lajes, cobertura, estruturas metálicas, paredes, esquadrias e pisos			
1.1	Fundações: verificar se há rachaduras, trincas, fissuras, desplacamentos ou quaisquer sinais de falhas na fundação que possam comprometer a estabilidade do prédio	NÃO	
1.2	Pilares: verificar se há rachaduras, trincas, fissuras, desplacamentos ou quaisquer sinais de falhas nos pilares que possam comprometer a estabilidade do prédio	NÃO	
1.3	Vigas: verificar se há rachaduras, trincas, fissuras, desplacamentos ou quaisquer sinais de falhas nas vigas que possam comprometer a estabilidade do prédio	NÃO	
1.4	Lajes: verificar se há rachaduras, trincas, fissuras, desplacamentos ou quaisquer sinais de falhas nas lajes que possam comprometer a estabilidade do prédio	SIM	Quebras nos bancos de concreto, sob elemento vazado (cobogó), na área externa da edificação, próximo à entrada principal.
1.5	Cobertura: verificar se há sinais de infiltração, vazamentos, telhas soltas ou outras falhas que possam causar danos à estrutura da escola	SIM	Telha de fibrocimento.
1.6	Estruturas metálicas: verificar se há sinais de problemas nas estruturas metálicas, como corrosão ou deformação	SIM	Corrosão por oxidação em elementos estruturais metálicos da cobertura da Quadra Poliesportiva.
1.7	Paredes: verificar se há sinais de problemas nas paredes, como rachaduras, infiltrações ou umidade excessiva	SIM	Infiltrações na base dos muros externos, no muro de divisa (arrimo) junto à quadra poliesportiva e na lateral direita da edificação (vista frontal pela via pública). Quebra de trecho do muro, com armaduras expostas, junto à porta desativada de acesso externo à Quadra Poliesportiva.
1.8	Esquadrias: verificar se há problemas nas esquadrias, tais como falta de peças, corrosão, vidros quebrados e dificuldade de manuseio	SIM	Comprometimento da funcionalidade das esquadrias, com dificuldade de abertura e fechamento.
1.9	Pisos: verificar se há sinais de problemas nos pisos, como desníveis, rachaduras ou solturas de revestimento	SIM	Quebras nos revestimentos cerâmicos do assento do banco localizado no pátio descoberto ao fundo do terreno.
2. Instalações Elétricas e Hidráulicas			
Condições das instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias			
2.1	Instalações elétricas: verificar se as instalações elétricas estão em conformidade com as normas de segurança, se há fios expostos, equipamentos com defeito ou outros problemas que possam representar risco de incêndio ou choque elétrico. verificar também se o quadro de energia está em bom estado e se as tomadas e interruptores estão funcionando corretamente	SIM	Há fios expostos, caixa de passagem sem acabamento. Necessário revisar quadros de luz. Há tomadas no padrão antigo.
2.2	Instalações hidráulicas: verificar se as instalações hidráulicas estão em bom estado, sem vazamentos, rachaduras ou outros problemas que possam prejudicar o funcionamento do sistema. verificar também se as torneiras, registros e outros componentes estão em bom estado e se o sistema de esgoto está funcionando corretamente	NÃO	
2.3	Instalações sanitárias: verificar se as instalações sanitárias estão em bom estado, sem vazamentos, rachaduras ou outros problemas que possam prejudicar o funcionamento do sistema. verificar também se as louças sanitárias, como vasos e pias, estão em bom estado e se os ralos estão desobstruídos	NÃO	
2.4	Reservatórios de água: verificar se os reservatórios de água estão em bom estado, sem vazamentos ou outros problemas que possam prejudicar o funcionament do sistema de abastecimento	NÃO	Não há Infiltrações nas paredes dos dois reservatórios superiores de água. Parede suja.

FICHA 4 - DIAGNÓSTICO DE ASPECTOS DE INFRAESTRUTURA PREDIAL DAS UNIDADES ESCOLARES			
Item	**Descrição dos Itens Avaliados**	**Necessidade de Intervenção**	**Observações**
3. Acessibilidade			
Condições de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida			
3.1	Rampas de acesso: verificar se há rampas de acesso em bom estado e com inclinação adequada	SIM	Não há rampa de acesso (foto 90)
3.2	Elevadores: verificar se há elevadores em bom estado e se estão em conformidade com as normas de acessibilidade	SIM	Necessário fazer estudo para acessibilizar a escola.
3.3	Banheiros adaptados: verificar se há banheiros adaptados em bom estado e se estão em conformidade com as normas de acessibilidade	SIM	Acessibilidade parcial
4. Condições de Habitabilidade			
Condições de ventilação e iluminação natural e artificial e conforto térmico dos ambientes			
4.1	Condições gerais de habitabilidade e conforto térmico por setor (salas de aulas, outros ambientes pedagógicos, ambientes administrativos, cozinha e refeitório, etc.)	NÃO	
5. Áreas Externas/Paisagismo			
Condições de adequabilidade das áreas externas da escola			
5.1	Condições Gerais do Paisagismo na Unidade Educacional	NÃO	
5.2	Drenagem: verificar se a drenagem da área externa da escola está funcionando corretamente, evitando acúmulo de água em dias de chuva	SIM	Corrosão por oxidação nas grelhas metálicas no acesso da Quadra Poliesportiva e na grelha de captação de tubulação de água pluvial na lateral direita da edificação (considerando a vista frontal pela via pública).
5.3	Pintura externa: verificar se a pintura externa da escola está em bom estado, sem descascamentos ou sinais de desgaste	SIM	Descascamento na lateral direita da edificação (vista frontal pela via pública).

Profissional Responsável
Nome: Hatsumi Ito Chida
Cargo/função: Arquiteta
CREA/CAU: A 2374-4

Responsável pela validação CAIXA
Nome: Decio de Souza Espindola
Cargo/função: Engenheiro Civil
CREA/CAU: 5062158870-SP

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEF HENRIQUE SOUZA FILHO (HENFIL)

1 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Cód. Unidade	
892	EMEF HENRIQUE SOUZA FILHO (HENFIL)



foto 01: VISTA GERAL

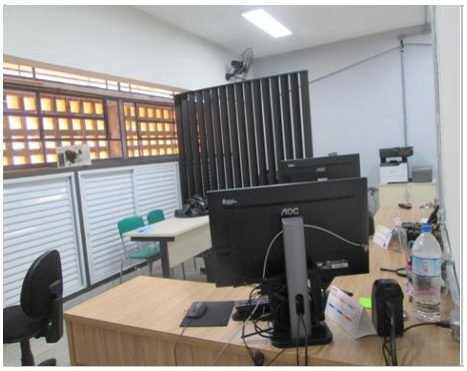


foto 02: SECRETARIA - TÉRREO



foto 03: SECRETARIA - TÉRREO - TOMADA COM PADRÃO OBSOLETO



foto 04: ALMOXARIFADO - TÉRREO



foto 05: DEPÓSITO - TÉRREO



foto 06: DEPÓSITO - TÉRREO - INTERRUPTOR DE SOBREPOR

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF HENRIQUE SOUZA FILHO (HENFIL)



foto 07: DEPÓSITO - TÉRREO - MANCHA DE INFILTRAÇÃO NO TETO

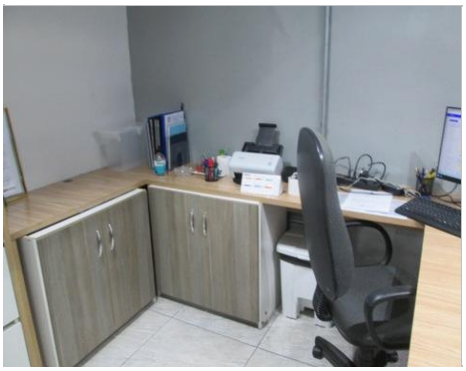


foto 08: SALA DIRETOR - TÉRREO



foto 09: SALA DIRETOR - TÉRREO - FISSURA NA VIGA



foto 10: SALA DIRETOR - TÉRREO - FALTA TAMPA CEGA NO PORTO DE ILUMINAÇÃO



foto 11: SALA DIRETOR - TÉRREO - PONTO DE ENERGIA EXPOSTO



foto 12: DEPÓSITO 1 - TÉRREO - PORTA SEM CHAVE



foto 13: DEPÓSITO 3 - TÉRREO PAREDE COM MOFO



foto 14: DEPÓSITO 3 - TÉRREO - FALTA REPARO NO FORRO

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF HENRIQUE SOUZA FILHO (HENFIL)



foto 15: 13-RÁDIO - TÉRREO



foto 16: RÁDIO - TÉRREO - MANCHA DE INFILTRAÇÃO.
TOMADAS COM PADRÃO OBSOLETO

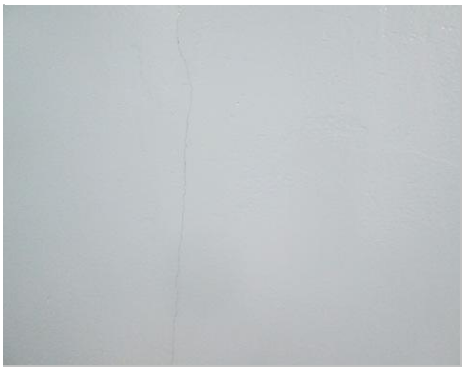


foto 17: COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA -
TÉRREO - FISSURA NA PAREDE



foto 18: COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA - TÉRREO




foto 19: PALCO - TÉRREO
FIAÇÕES EXPOSTAS



foto 20: CAMARIM - TÉRREO



foto 21: REFEITÓRIO - TÉRREO

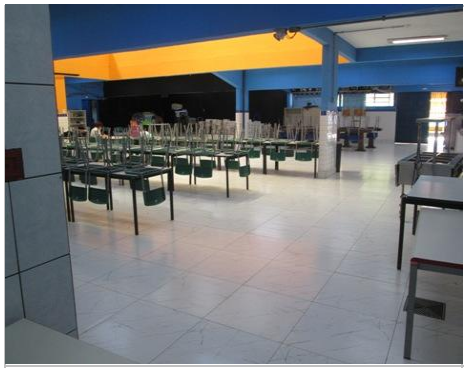


foto 22: REFEITÓRIO - TÉRREO

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF HENRIQUE SOUZA FILHO (HENFIL)



foto 23: REFEITÓRIO - TÉRREO



foto 24: COZINHA PROFESSORES - TÉRREO



foto 25: DEPÓSITO 2 - TÉRREO



foto 26: DEPÓSITO 2 - TUBULAÇÃO DE INCÊNDIO EM PVC



foto 27: COZINHA - TÉRREO



foto 28: COZINHA - TÉRREO - MANCHA NO TETO



foto 29: COZINHA - TÉRREO - TORNEIRAS DIFERENTES



foto 30: DESPENSA DEPÓSITO DE ALIMENTOS - TÉRREO

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF HENRIQUE SOUZA FILHO (HENFIL)



foto 31: COPA - TÉRREO



foto 32: COPA - TÉRREO - TAMPA DE CAIXA DE PASSAGEM DANIFICADA



foto 33: LAVANDERIA - TÉRREO



foto 34: LAVANDERIA - TÉRREO - PISO COM COLORAÇÃO DIFERENTE



foto 35: DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA - TÉRREO

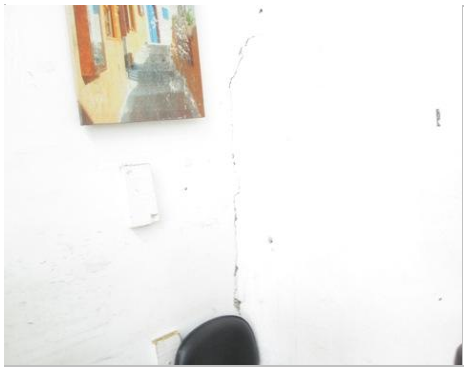


foto 36: DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA - TÉRREO - FISSURA NA PAREDE



foto 37: CIRCULAÇÃO 1 - TÉRREO - VISTA DO ARMÁRIO



foto 38: CIRCULAÇÃO 2 - TÉRREO

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF HENRIQUE SOUZA FILHO (HENFIL)



foto 39: ESCADARIA DE ACESSO AO 1º PAVIMENTO - CORRIMÃO NÃO ATENDE A NBR 9050



foto 40: SALA DE AULA 1 - TÉRREO
Há fiações expostas. Tubo corrugado mal instalado. Janelas com dificuldade de abrir e fechar



foto 41: SALA DE AULA 2 - TÉRREO



foto 42: SANITÁRIO FUNCIONÁRIOS 1 - TÉRREO



foto 43: SANITÁRIO FUNCIONÁRIO 2 - PORTA SEM CHAVE



foto 44: SANITÁRIO ALUNO FEMININO - TÉRREO



foto 45: SANITÁRIO ALUNO MASCULINO - TÉRREO



foto 46: SANITÁRIO FUNCIONÁRIOS FEMININO - TÉRREO

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF HENRIQUE SOUZA FILHO (HENFIL)



foto 47: SANITÁRIO FUNCIONÁRIOS MASCULINO - TÉRREO



foto 48: QUADRO DE ENERGIA TÉRREO



foto 49: QUADRO DE ENERGIA TÉRREO



foto 50: QUADRO DE ENERGIA TÉRREO - FALTA FECHAMENTO



foto 51: QUADRO DE ENERGIA TÉRREO



foto 52: SALA DOS PROFESSORES - PAVIMENTO SUPERIOR



foto 53: SALA DOS PROFESSORES - PAVIMENTO SUPERIOR

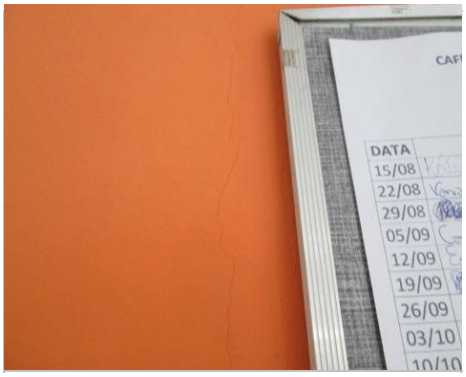


foto 54: SALA DOS PROFESSORES - PAVIMENTO SUPERIOR - FISSURA NA PAREDE

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF HENRIQUE SOUZA FILHO (HENFIL)



foto 55: SALA DE APOIO PEDAGÓGICO - PAVIMENTO SUPERIOR



foto 56: SALA DE APOIO PEDAGÓGICO - PAVIMENTO SUPERIOR - FISSURA NA PAREDE



foto 57: SALA DE APOIO PEDAGÓGICO - PAVIMENTO SUPERIOR - TOMADA COM PADRÃO ANTIGO



foto 58: CIRCULAÇÃO 3 - PAVIMENTO SUPERIOR



foto 59: CIRCULAÇÃO 3 - PAVIMENTO SUPERIOR



foto 60: CIRCULAÇÃO 3 - PAVIMENTO SUPERIOR



foto 61: CIRCULAÇÃO 4 - PAVIMENTO SUPERIOR

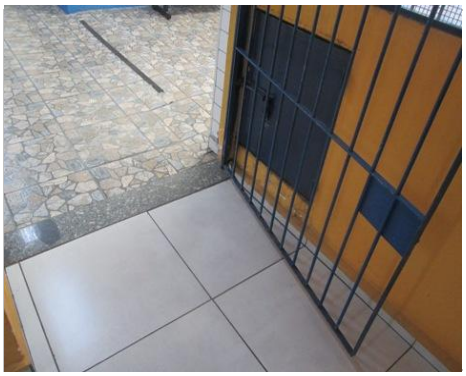


foto 62: CIRCULAÇÃO 4 - PAVIMENTO SUPERIOR - ALÇAPÃO DE ACESSO A COBERTURA

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF HENRIQUE SOUZA FILHO (HENFIL)



foto 63: CIRCULAÇÃO 5 - PAVIMENTO SUPERIOR



foto 64: CIRCULAÇÃO 6 - PAVIMENTO SUPERIOR



foto 65: SALA DE AULA 3 - PAVIMENTO SUPERIOR



foto 66: SALA DE AULA 3 - PAVIMENTO SUPERIOR - TRECHO INACESSÍVEL PARA MANUTENÇÃO ENTRE JANELA E GRADIL



foto 67: SALA DE AULA 3 - PAVIMENTO SUPERIOR - FIAÇÃO EXPOSTA

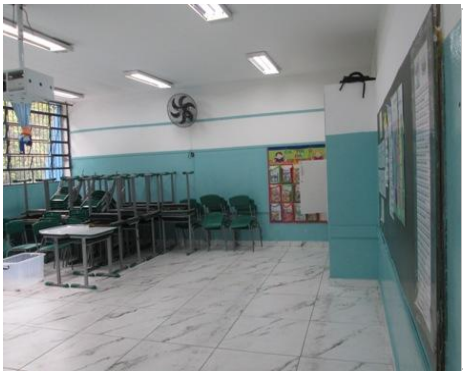


foto 68: SALA DE AULA 4 - PAVIMENTO SUPERIOR



foto 69: SALA DE AULA 5 - PAVIMENTO SUPERIOR



foto 70: SALA DE AULA 5 - PAVIMENTO SUPERIOR - CANALETA EM PVC FALTANDO ACABAMENTO

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF HENRIQUE SOUZA FILHO (HENFIL)



foto 71: SALA DE AULA 5 - PAVIMENTO SUPERIOR - TOMADA COM PADRÃO OBSOLETO



foto 72: SALA DE AULA 6 - PAVIMENTO SUPERIOR



foto 73: SALA DE AULA 7 - PAVIMENTO SUPERIOR



foto 74: SALA DE AULA 7 - PAVIMENTO SUPERIOR - CANALETA DANIFICADA



foto 75: SALA DE AULA 8 - PAVIMENTO SUPERIOR



foto 76: SALA DE AULA 8 - PAVIMENTO SUPERIOR - CANALETA EM PVC FALTANDO ACABAMENTO



foto 77: SALA DE LEITURA - PAVIMENTO SUPERIOR



foto 78: SALA DE INFORMÁTICA - PAVIMENTO SUPERIOR

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF HENRIQUE SOUZA FILHO (HENFIL)



foto 79: VESTIÁRIO FUNCIONÁRIO - PAVIMENTO SUPERIOR



foto 80: VESTIÁRIO FUNCIONÁRIO FEMININO - PAVIMENTO SUPERIOR



foto 81: VESTIÁRIO FUNCIONÁRIO MASCULINO - PAVIMENTO SUPERIOR



foto 82: QUADRO DE LUZ - PAVIMENTO SUPERIOR



foto 83: QUADRO DE LUZ - PAVIMENTO SUPERIOR



foto 84: QUADRO DE LUZ - PAVIMENTO SUPERIOR



foto 85: QUADRO DE LUZ - PAVIMENTO SUPERIOR



foto 86: ACESSO DA ADMINISTRAÇÃO

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF HENRIQUE SOUZA FILHO (HENFIL)



foto 87: VISTA DO ACESSO DOS ALUNOS



foto 88: VISTA DA FACHADA PRINCIPAL



foto 89: ACESSO DA COMUNIDADE PARA USO DA QUADRA NOS FINS DE SEMANA



foto 90: ACESSO DOS ALUNOS NÃO É ACESSIBILIZADO



foto 91: VISTA LATERAL. DESCIDA DO TUBO DE AP NÃO É ADEQUADA



foto 92: PLAYGROUND



foto 93: DESCIDA DE AP INADEQUADA



foto 94: TUBO DE AP DESCOLADO

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF HENRIQUE SOUZA FILHO (HENFIL)



foto 95: ACESSO AO RESERVATÓRIO INFERIOR



foto 96: CASA DE BOMBAS DO RESERVATÓRIO INFERIOR



foto 97: QUADRA COBERTA



foto 98: PISO DA QUADRA COBERTA DANIFICADO



foto 99: COBERTURA



foto 100: ACESSO A CAIXA D' ÁGUA. ESCADA MARINHEIRO OXIDADA



foto 101: COBERTURA DA QUADRA COBERTA
