CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL

Dados Gerais

Nome da Unidade:	EMEI PESTALOZZI		
Sequencial (U.E):	85	**Código da Unidade:**	90867

Endereço da Escola

Logradouro, número e complemento (se houver)	RUA ABNER RIBEIRO BORGES 154 - JARDIM ROSELI

Descrição do Imóvel

Tipo de Construção (técnica construtiva predominante)	Concreto armado	Padrão:	8. EMEI PESTALOZZI CD 487	Nº de Pavimentos	2

Implantação

Área do Terreno (m²)	3.406,50 m²			Área Edificada/ Construída (m²)	1.784,72 m²
Área Pavimentada (m²)	2.234,58 m²			Área Verde / Permeável (m²)	1.171,92 m²
Área da projeção do(s) edifício(s) (m²)	1.177,57 m²	Bloco salas	1177,57	Quadra	- m²

Abastecimento

Água							
Forma de abastecimento (rede pública, poço artesiano, sem abastecimento etc.):	REDE PÚBLICA						
Quantidade de reservatório de água	1						
Capacidade por reservatório (L)	40.000 L	Constatação		Inf. Resp.	Projeto		
Gás							
Encanado (Sim ou Não)	NÃO	Botijão de Gás (Sim ou Não)		SIM	Quantidade de Botijões de Gás	5X45	
Energia Elétrica							
Aparelho Ar condicionado (Sim ou Não)	SIM				Quantidade:	1	
Possui fonte de energia complementar (Sim ou Não)?	NÃO				Qual (por ex. Painel Solar ou outro)?	0	
Possui Gerador de Energia? (Sim ou Não)?	NÃO				Capacidade:	0	
Esgoto							
Rede Pública (Sim ou Não)	SIM				Fossa Séptica (Sim ou Não)	NÃO	
Caixa de Gordura (Sim ou Não)	SIM				Caixa de Passagem (Sim ou Não)	NÃO	

Informações sobre Prevenção de Incêndios (AVCB e SPDA)

Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro (Sim ou Não)	NÃO	Nº	N/A						
Extintor	SIM	4							
Hidrante	SIM	3							
Sinalização Emergência	NÃO	0							
Iluminação Emergência	SIM	15							
Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) (Sim ou Não)	NÃO	Nº	Total (Sim ou N	NÃO	Parcial (Sim ou Não)	NÃO			

Acessibilidade

Elevador (Sim ou Não)	SIM			Quantidade:	1	Quant. Ativos/Funcionais:	1
Plataforma Elevatória (Sim ou Não)	NÃO			Quantidade:	0	Quant. Ativos/Funcionais:	0
Rampa de Acesso a Unidade (Sim ou Não)	SIM			Rampa de Acesso a outros espaços necessários (Sim ou Não)			NÃO
Tipo de sinalização	SIM	Sonora (Sim ou Não)	SIM	Visual (Sim ou Não)	NÃO	Tátil (Sim ou Não)	NÃO
Selo de Acessibilidade (Sim ou Não)	NÃO		Nº				
Vaga de estacionamento para deficientes (Sim ou Não)	NÃO			Quantidade:	0		

CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL

Ambientes da Escola

Administrativo e Apoio/Serviços

Ambiente	Comprimento (m)	Largura (m)	Pé Direito (m)	Área (m²)	Tipo de Construção	Revestimento de Piso	Revestimento de Parede	Possui Forro? Se sim, qual tipo?	Nível de Comprometimento do Ambiente	Observações
Refeitório - Térreo	12,80	13,80	3,00 4,58	180,36	Alvenaria	Granilite	Pintura sobre massa	Não	**2**	Revisar quadro de luz.
Sala de Estudo - Térreo	2,70	3,23	3,00	8,72	Alvenaria	Cerâmica	Pintura sobre massa	Não	**2**	Mancha de infiltração na parede. Fissura no teto e na parede.
JEIF - Térreo	3,82	3,16	2,95	12,07	Alvenaria	Cerâmica	Pintura sobre massa	Não	**2**	Buraco na parede, fiação de elétrica exposta. Caixa de passagem sem acabamento, fiação exposta.
Copa - Térreo	4,07	4,45	2,95	18,11	Alvenaria	Cerâmica	Azulejo / Pintura sobre massa	Não	**0**	
Sala de Professores - Térreo	5,28	4,51	2,95	23,81	Alvenaria	Cerâmica	Pintura sobre massa	Não	**2**	Mancha de infiltração no teto
Almoxarifado - Térreo	2,62	4,53	2,95	11,87	Alvenaria	Cerâmica	Pintura sobre massa	Não	**0**	
Circulação 2 - Térreo	4,91	1,05	2,95	5,16	Alvenaria	Cerâmica	Pintura sobre massa	Não	**0**	
Sala Coordenação - Térreo	2,64	4,47	2,95	11,80	Alvenaria	Cerâmica	Pintura sobre massa	Não	**0**	
Direção - Térreo	4,67	4,44	2,95	20,73	Alvenaria	Cerâmica	Pintura sobre massa	Não	**2**	Revisar quadro de luz.
Secretaria - Térreo	3,37	5,07	2,95	16,78	Alvenaria	Cerâmica	Pintura sobre massa	Não	**2**	Revisar tomadas queimadas (foto 18)
Arquivo - Térreo	1,28	1,80	2,95	2,30	Alvenaria	Cerâmica	Azulejo	Não	**0**	Mancha de infiltração no teto
Circulação 1 - Térreo	7,96	1,58	3,00	17,27	Alvenaria	Cerâmica	Pintura sobre massa	Não	**2**	Caixa de passagem de elétrica sem acabamento, enfiação exposta. Caixa de passagem sem acabamento. Fissura entre teto e alvenaria
Cozinha - Térreo	8,50	4,18	3,00	32,55	Alvenaria	Cerâmica	Azulejo	Não	**2**	Pintura estufada, possível infiltração no teto. Caixa da tomada cortada. Piso danificado. Fissura no azulejo
Despensa - Térreo	3,30	3,10	3,00	10,23	Alvenaria	Cerâmica	Azulejo	Não	**N/A**	Sem chave
Vestiário - Térreo	4,05	2,45	3,00	9,92	Alvenaria	Cerâmica	Azulejo	Não	**3**	Solicita reforma geral na área da lavanderia com mudança de localização para abrir mais espaço para outras atividades. Azulejo descolando. Infiltração no teto.
Sanit. Funcionário - Térreo	2,45	1,20	3,00	2,94	Alvenaria	Cerâmica	Azulejo	Não	**0**	
Circulação 3 - Térreo	31,30	11,60	3,00	80,84	Alvenaria	Cerâmica	Azulejo / Pintura sobre massa	Não	**2**	Trinca sob janela externa e das salas de aula, entre a viga e alvenaria. Revisar quadro de luz.
Hall Elevador - Térreo	2,30	1,81	3,00	4,16	Alvenaria	Cerâmica	Pintura sobre massa	Não	**0**	
Copa - Térreo	4,35	4,00	variável	14,40	Alvenaria	Cerâmica	Pintura sobre massa	Não	**0**	
Circulação 4 - Pav. Superior	31,30	11,60	3,00	80,84	Alvenaria	Cerâmica	Azulejo / Pintura sobre massa	Não	**2**	Fissura sob janela das salas de aula, entre a viga e alvenaria. Mancha de infiltração no teto. Revisar quadro de luz.
Hall Elevador - Pav. Superior	2,30	1,81	3,00	4,16	Alvenaria	Cerâmica	Pintura sobre massa	Não	**0**	
Terraço Coberto - Pav. Superior	8,67	13,80	variável	111,49	Alvenaria	Pintura sobre cimentado	Pintura sobre massa	Não	**1**	Terraço todo aberto. Venta muito. Fissura nas muretas. Mancha de infiltração
Almoxarifado - Pav. Superior	1,54	1,93	4,98	2,97	Alvenaria	Cerâmica	Pintura sobre massa	Não	**1**	Fissura na parede entre viga e alvenaria

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL										
Arquivo - Pav. Superior	4,30	3,95	1,76	14,02	Alvenaria	Cimentado	Pintura sobre massa	Não	**2**	Mancha de infiltração no teto (foto 70)
Escada	4,50	4,00	-	18,00	Alvenaria	Granito	Pintura sobre massa	Não	**0**	
Mini-quadra descoberta	12,50	7,00	-	87,50	-	Cimentado	-	Não	**0**	

CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL

Salas de Aula

Ambiente	Comprimento (m)	Largura (m)	Pé Direito (m)	Área (m²)	Tipo de Construção	Revestimento de Piso	Revestimento de Parede	Possui Forro? Se sim, qual tipo?	Nível de Comprometimento do Ambiente	Observações
Sala de Aula 1 - Térreo	7,00	7,00	3,00	49,00	Alvenaria	Cerâmica	Pintura sobre massa	Não	**0**	
Sala de Aula 2 - Térreo	7,00	7,00	3,00	49,00	Alvenaria	Cerâmica	Pintura sobre massa	Não	**0**	
Sala de Aula 3 - Térreo	7,00	7,00	3,00	49,00	Alvenaria	Cerâmica	Pintura sobre massa	Não	**0**	
Sala de Aula 4 - Térreo	7,00	7,00	3,00	49,00	Alvenaria	Cerâmica	Pintura sobre massa	Não	**2**	Trinca entre porta da entrada e janela para circulação.
Sala de Aula 5 - Térreo	7,00	7,00	3,00	49,00	Alvenaria	Cerâmica	Pintura sobre massa	Não	**0**	
Sala de Aula 6 - Pav. Superior	7,00	8,95	3,00	57,48	Alvenaria	Cerâmica	Pintura sobre massa	Não	**0**	
Sala de Aula 7 - Pav. Superior	7,00	7,00	3,00	49,00	Alvenaria	Cerâmica	Pintura sobre massa	Não	**0**	
Sala de Aula 8 - Pav. Superior	7,00	7,00	3,00	49,00	Alvenaria	Cerâmica	Pintura sobre massa	Não	**1**	Fissura no teto
Sala de Aula 9 - Pav. Superior	7,00	7,00	3,00	49,00	Alvenaria	Cerâmica	Pintura sobre massa	Não	**1**	Pintura da parede descascando
Sala de Aula 10 - Pav. Superior	7,00	7,00	3,00	49,00	Alvenaria	Cerâmica	Pintura sobre massa	Não	**2**	Tubo corrugado de elétrica sem fixação
Sala de Aula 11 - Térreo	7,00	6,46	3,00	45,22	Alvenaria / gesso acartonado	Cerâmica	Pintura sobre massa	Não	**1**	Solicita reforma com janela voltada para área externa e acesso voltada para circulação interna

Sanitários — **Informações Complementares**

Ambiente	Comprimento (m)	Largura (m)	Pé Direito (m)	Área (m²)	Revestimento de Piso	Revestimento de Parede	Possui Forro? Se sim, qual tipo?	Observações	Nível de Comprometimento do Ambiente	Quant. Vasos Sanitários	Quant. Cubas e trocadores	Quant. Chuveiros
Sanitário Aluno Masc. 1 - Térreo	3,20	4,38	3,00	12,84	Cerâmica	Azulejo	Não		**0**	3	4	1
Sanitário Aluno Fem. 1 - Térreo	3,35	4,38	3,00	14,67	Cerâmica	Azulejo	Não		**0**	3	4	1
Sanitário PCD Masc - Térreo	2,00	2,50	2,95	5,00	Cerâmica	Azulejo	Não		**0**	1	1 / 1	1
Sanitário Funcionário Feminino - Térreo	2,13	2,45	2,95	5,22	Cerâmica	Azulejo	Não	Mancha de infiltração no teto	**1**	2	2	0
Sanitário Aluno Masc. 2 - Térreo	4,30	1,56	2,67	6,71	Cerâmica	Azulejo	Sim. Gesso	Mancha de infiltração no teto. Acabamento do interruptor danificado	**1**	4	0	0
Sanitário Aluno Fem. 2 - Térreo	4,30	1,72	3,00	7,40	Cerâmica	Azulejo	Não	Mancha de infiltração no teto	**1**	4	0	0
AVE - Térreo	2,14	1,55	2,63	3,32	Cerâmica	Azulejo	Sim. Gesso		**0**	1	1 / 1	0
Hall Sanitário - Térreo	2,15	1,43	3,07	3,07	Cerâmica	Azulejo	Sim. Gesso		**0**	0	2	0
Sanitário Aluno Fem. - Pav. Superior	3,05	1,57	3,00	4,79	Cerâmica	Azulejo	Não		**0**	3	0	0
Sanitário Aluno Masc. - Pav. Superior	2,13	1,58	3,00	3,37	Cerâmica	Azulejo	Não		**0**	2	0	0
Sanitário Professores - Pav. Superior	1,00	1,57	3,00	1,57	Cerâmica	Azulejo	Não		**0**	1	1	0
Hall Sanitário - Pav. Superior	2,17	1,60	3,00	3,47	Cerâmica	Azulejo	Não		**0**	0	2	0

Informações Adicionais

Ambiente	Necessário adequar ou implantar? (SIM / NÃO / NÃO SE APLICA)	Informações Complementares	Observações

CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL									
Fechamento do lote (muro, cerca, gradil, vegetação)	NÃO	Muro		Área (m²)	441,00	Gradil	Área (m²)	183,50	Aproximadamente 65m de muro em comum com a EMEF Felicio Pafgliuso.
Estacionamento(s)	NÃO	Área (m²)		-					
Playground (Sim ou Não)	NÃO	Área (m²)		681,18					
Tanque de Areia (Sim ou Não)	NÃO	Área Cúbica (m³)		5,88					
Calçadas (Sim ou Não?)	SIM								Calçada interna e externa com vários pontos deteriorada.
Serralherias (Portões, travas e outros)	SIM								
Alarmes e sensores (Sim ou Não?)	SIM								
Câmeras de segurança (Sim ou Não?)	SIM								
Rede de gás na testada? (Sim ou Não)	NÃO								

Observações Gerais:	**Trata-se de uma EMEI. Houve uma reforma há 6 meses no muro que desabou. Interferiu na tubulação de esgoto, e desde então, retorna o cheiro de esgoto na escola. Solicita revisão. Solicita cobertura na rampa de acesso da escola, pois nos dias de chuva, é necessário "mudar" a entrada dos alunos.**

FICHA 4 - DIAGNÓSTICO DE ASPECTOS DE INFRAESTRUTURA PREDIAL DAS UNIDADES ESCOLARES			
Item	**Descrição dos Itens Avaliados**	**Necessidade de Intervenção**	**Observações**
1. Infraestrutura da Escola			
Condições das fundações, pilares, vigas, lajes, cobertura, estruturas metálicas, paredes, esquadrias e pisos			
1.1	Fundações: verificar se há rachaduras, trincas, fissuras, desplacamentos ou quaisquer sinais de falhas na fundação que possam comprometer a estabilidade do prédio	NÃO	
1.2	Pilares: verificar se há rachaduras, trincas, fissuras, desplacamentos ou quaisquer sinais de falhas nos pilares que possam comprometer a estabilidade do prédio	NÃO	
1.3	Vigas: verificar se há rachaduras, trincas, fissuras, desplacamentos ou quaisquer sinais de falhas nas vigas que possam comprometer a estabilidade do prédio	NÃO	
1.4	Lajes: verificar se há rachaduras, trincas, fissuras, desplacamentos ou quaisquer sinais de falhas nas lajes que possam comprometer a estabilidade do prédio	NÃO	
1.5	Cobertura: verificar se há sinais de infiltração, vazamentos, telhas soltas ou outras falhas que possam causar danos à estrutura da escola	SIM	Cobertura em telhas de fibrocimento na edificação. Oxidação dos rufos e calhas.
1.6	Estruturas metálicas: verificar se há sinais de problemas nas estruturas metálicas, como corrosão ou deformação	não se aplica	
1.7	Paredes: verificar se há sinais de problemas nas paredes, como rachaduras, infiltrações ou umidade excessiva	SIM	Infiltrações nas paredes externas e internas da Área de Serviços descoberta, nas platibandas da edificação e na mureta externa junto ao talude, próximas à Torre do Reservatório de Água.
1.8	Esquadrias: verificar se há problemas nas esquadrias, tais como falta de peças, corrosão, vidros quebrados e dificuldade de manuseio	SIM	Comprometimento da funcionalidade das esquadrias, com dificuldade de abertura e fechamento.
1.9	Pisos: verificar se há sinais de problemas nos pisos, como desníveis, rachaduras ou solturas de revestimento	SIM	Fissuras no piso do Pátio cimentado descoberto e ao redor da edificação. Calçada com irregularidades, fissuras e quebras, situada nas proximidades do acesso de alunos.
2. Instalações Elétricas e Hidráulicas			
Condições das instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias			
2.1	Instalações elétricas: verificar se as instalações elétricas estão em conformidade com as normas de segurança, se há fios expostos, equipamentos com defeito ou outros problemas que possam representar risco de incêndio ou choque elétrico. verificar também se o quadro de energia está em bom estado e se as tomadas e interruptores estão funcionando corretamente	SIM	Há fios expostos, caixa de passagem sem acabamento. Necessário revisar quadros de luz. Há tomadas no padrão antigo.
2.2	Instalações hidráulicas: verificar se as instalações hidráulicas estão em bom estado, sem vazamentos, rachaduras ou outros problemas que possam prejudicar o funcionamento do sistema. verificar também se as torneiras, registros e outros componentes estão em bom estado e se o sistema de esgoto está funcionando corretamente	NÃO	
2.3	Instalações sanitárias: verificar se as instalações sanitárias estão em bom estado, sem vazamentos, rachaduras ou outros problemas que possam prejudicar o funcionamento do sistema. verificar também se as louças sanitárias, como vasos e pias, estão em bom estado e se os ralos estão desobstruídos	NÃO	
2.4	Reservatórios de água: verificar se os reservatórios de água estão em bom estado, sem vazamentos ou outros problemas que possam prejudicar o funcionament do sistema de abastecimento	NÃO	

CAIXA

FICHA 4 - DIAGNÓSTICO DE ASPECTOS DE INFRAESTRUTURA PREDIAL DAS UNIDADES ESCOLARES			
Item	**Descrição dos Itens Avaliados**	**Necessidade de Intervenção**	**Observações**
3. Acessibilidade			
Condições de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida			
3.1	Rampas de acesso: verificar se há rampas de acesso em bom estado e com inclinação adequada	SIM	Rampa externa descoberta com corrimão duplo, descontínuo, instalado apenas em um dos lados e sem prolongamento mínimo de 0,30 m, em desconformidade com a ABNT NBR 9050. Ausência de piso tátil direcional e de alerta.
3.2	Elevadores: verificar se há elevadores em bom estado e se estão em conformidade com as normas de acessibilidade	NÃO	
3.3	Banheiros adaptados: verificar se há banheiros adaptados em bom estado e se estão em conformidade com as normas de acessibilidade	NÃO	
4. Condições de Habitabilidade			
Condições de ventilação e iluminação natural e artificial e conforto térmico dos ambientes			
4.1	Condições gerais de habitabilidade e conforto térmico por setor (salas de aulas, outros ambientes pedagógicos, ambientes administrativos, cozinha e refeitório, etc.)	NÃO	
5. Áreas Externas/Paisagismo			
Condições de adequabilidade das áreas externas da escola			
5.1	Condições Gerais do Paisagismo na Unidade Educacional	NÃO	
5.2	Drenagem: verificar se a drenagem da área externa da escola está funcionando corretamente, evitando acúmulo de água em dias de chuva	SIM	Oxidação generalizada nas grelhas de drenagem ao redor da edificação.
5.3	Pintura externa: verificar se a pintura externa da escola está em bom estado, sem descascamentos ou sinais de desgaste	SIM	Pontos de ferrugens nsa áreas correspondentes aos gradis situados no pátio cimentado descoberto e no playground

Profissional Responsável
Nome: Hatsumi Ito Chida
Cargo/função: Arquiteta
CREA/CAU: A 2374-4

Responsável pela validação CAIXA
Nome: Decio de Souza Espindola
Cargo/função: Engenheiro Civil
CREA/CAU: 5062158870-SP

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEI PESTALOZZI

1 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Cód. Unidade	
90867	EMEI PESTALOZZI



foto 01: PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA



foto 02: REFEITÓRIO - TÉRREO

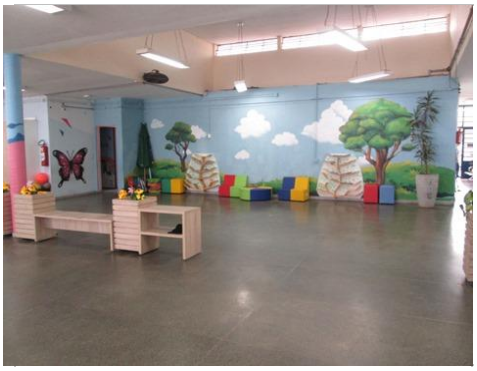


foto 03: REFEITÓRIO - TÉRREO




foto 04: SALA DE ESTUDOS - TÉRREO



foto 05: SALA DE ESTUDOS - TÉRREO - INFILTRAÇÃO NA PAREDE

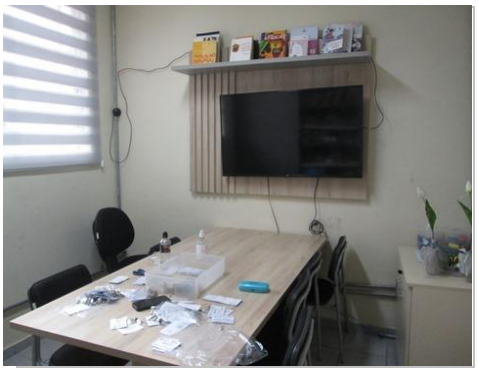


foto 06: JEIF - TÉRREO

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI PESTALOZZI



foto 07: JEIF - TÉRREO - FIAÇÃO EXPOSTA



foto 08: JEIF - TÉRREO - FIAÇÃO EXPOSTA



foto 09: COPA - TÉRREO



foto 10: ALMOXARIFE - TÉRREO



foto 11: ALMOXARIFE - TÉRREO - INFILTRAÇÃO NO TETO



foto 12: SALA DOS PROFESSORES - TÉRREO



foto 13: CIRCULAÇÃO 2 - TÉRREO

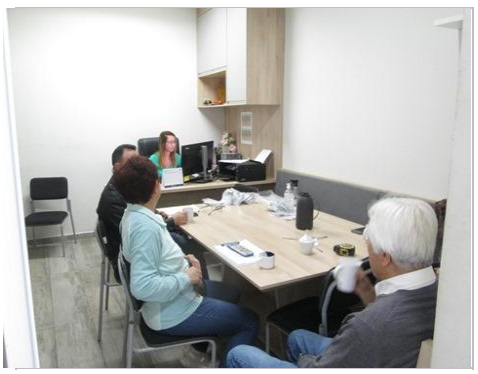


foto 14: SALA COORDENAÇÃO - TÉRREO

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI PESTALOZZI



foto 15: SALA COORDENAÇÃO - TÉRREO - FISSURA NA PAREDE

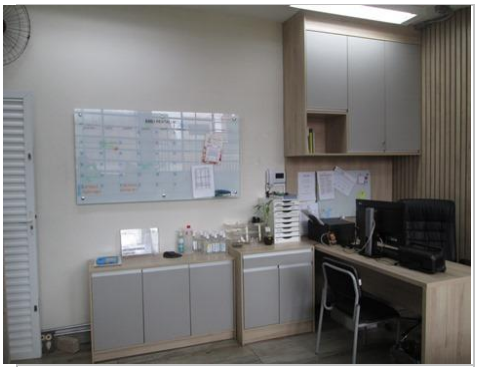


foto 16: DIREÇÃO - TÉRREO



foto 17: SECRETARIA - TÉRREO



foto 18: SECRETARIA - TÉRREO - TOMADA APARENTA QUEIMADA



foto 19: ARQUIVO - TÉRREO



foto 20: CIRCULAÇÃO 1 - TÉRREO



foto 21: CIRCULAÇÃO 1 - TÉRREO - FISSURA ENTRE PAREDE E TETO

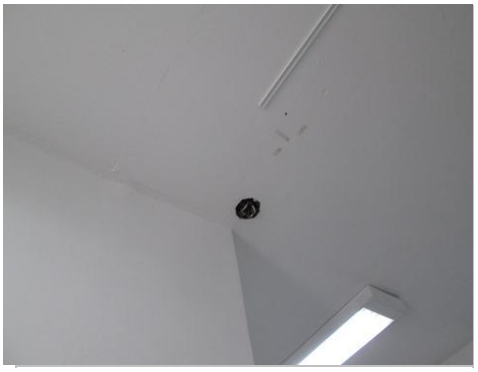


foto 22: CIRCULAÇÃO 1 - TÉRREO - FALTA TAMPA CEGA

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI PESTALOZZI



foto 23: COZINHA - TÉRREO



foto 24: COZINHA - TÉRREO - TOMADAS COM PADRÃO OBSOLETO



foto 25: COZINHA - TÉRREO - PISO DANIFICADO



foto 26: COZINHA - TÉRREO - PINTURA ESTUFADA POSSÍVEL INFILTRAÇÃO NO TETO



foto 27: COZINHA - TÉRREO - FISSURA NO AZULEJO

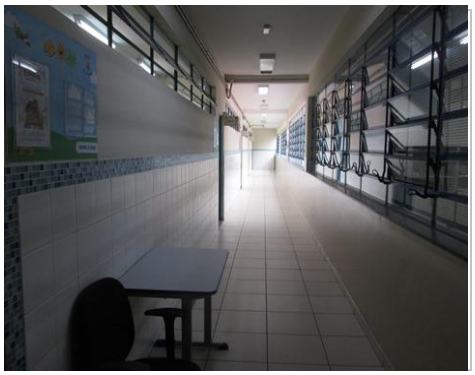


foto 28: CIRCULAÇÃO 3 - TÉRREO



foto 29: CIRCULAÇÃO 3 - TÉRREO



foto 30: CIRCULAÇÃO 3 - TÉRREO - LAVATÓRIO NA CIRCULAÇÃO

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI PESTALOZZI



foto 31: CIRCULAÇÃO 3 - TÉRREO - FISSURA NA PAREDE

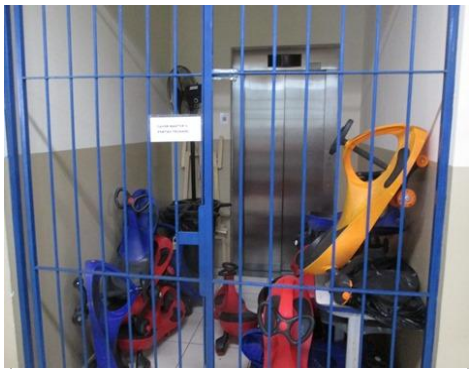


foto 32: HALL DO ELEVADOR - TÉRREO



foto 33: COPA - TÉRREO



foto 34: SALA DE AULA 1 - TÉRREO



foto 35: SALA DE AULA 2 - TÉRREO



foto 36: SALA DE AULA 3 - TÉRREO

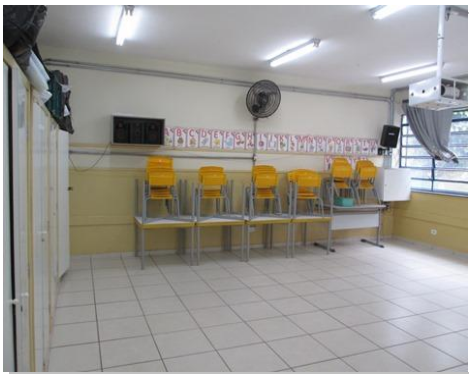


foto 37: SALA DE AULA 4 - TÉRREO



foto 38: SALA DE AULA 4 - TÉRREO - TRINCA NA PAREDE

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI PESTALOZZI



foto 39: SALA DE AULA 5 - TÉRREO



foto 40: SALA DE AULA 5 - TÉRREO - TRINCA NA PAREDE



foto 41 :SALA DE AULA 11- TÉRREO



foto 42: SALA DE AULA 11- TÉRREO - FISSURA NA JUNÇÃO DAS PLACAS DE GESSO ACARTONADO



foto 43: SANITÁRIO ALUNO MASCULINO - TÉRREO



foto 44: SANITÁRIO ALUNO MASCULINO - TÉRREO - INFILTRAÇÃO NO TETO



foto 45: SANITÁRIO ALUNO FEMININO - TÉRREO



foto 46: 5- SANITÁRIO PCD MASCULINO - TÉRREO

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI PESTALOZZI



foto 47: SANITÁRIO PCD MASCULINO - TÉRREO - INFILTRAÇÃO NA LAJE



foto 48: SANITÁRIO FUNCIONÁRIO FEMININO - TÉRREO



foto 49: SANITÁRIO FUNCIONÁRIO FEMININO - TÉRREO - INFILTRAÇÃO NO TETO



foto 50: SANITÁRIO ALUNO MASCULINO - TÉRREO

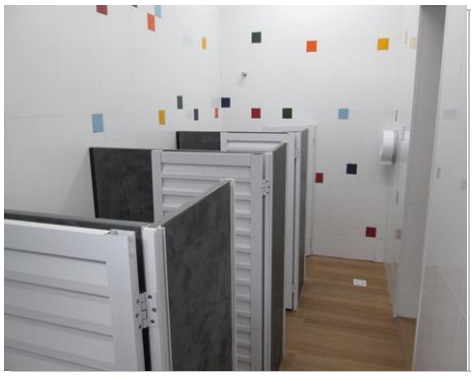


foto 51: SANITÁRIO ALUNO FEMININO - TÉRREO



foto 52: AVE - TÉRREO



foto 53: HALL SANITÁRIO - TÉRREO



foto 54: QUADRO DE ENERGIA - TÉRREO

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI PESTALOZZI



foto 55: QUADRO DE ENERGIA - TÉRREO



foto 56: QUADRO DE ENERGIA - TÉRREO



foto 57: QUADRO DE ENERGIA - TÉRREO



foto 58: QUADRO DE ENERGIA - TÉRREO



foto 59: QUADRO DE ENERGIA - TÉRREO



foto 60: QUADRO DE ENERGIA - TÉRREO



foto 61: ESCADARIA DE ACESSO DO TÉRREO AO PAVIMENTO SUPERIOR



foto 62: CIRCULAÇÃO 4 - PAVIMENTO SUPERIOR

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI PESTALOZZI

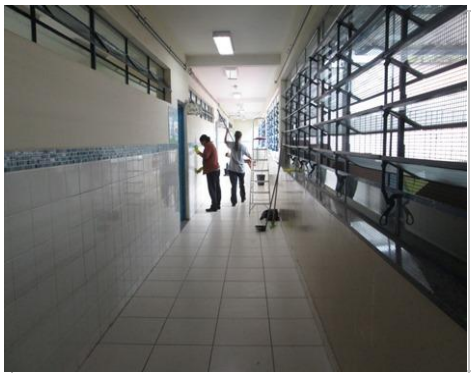


foto 63: CIRCULAÇÃO 4 - PAVIMENTO SUPERIOR



foto 64: CIRCULAÇÃO 4 - PAVIMENTO SUPERIOR - LAVATÓRIOS INSTALADOS NA CIRCULAÇÃO



foto 65: CIRCULAÇÃO 4 - PAVIMENTO SUPERIOR - MANCHA NO TETO



foto 66: HALL DO ELEVADOR - PAVIMENTO SUPERIOR



foto 67: TERRAÇO COBERTO - PAVIMENTO SUPERIOR



foto 68: ALMOXARIFE - PAVIMENTO SUPERIOR



foto 69: ARQUIVO - PAVIMENTO SUPERIOR



foto 70: ARQUIVO - PAVIMENTO SUPERIOR - FISSURA NA PAREDE

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI PESTALOZZI



foto 71: SALA DE AULA 6 - PAVIMENTO SUPERIOR



foto 72: SALA DE AULA 7 - PAVIMENTO SUPERIOR



foto 73: SALA DE AULA 8 - PAVIMENTO SUPERIOR



foto 74: SALA DE AULA 8 - PAVIMENTO SUPERIOR - FISSURA NO TETO



foto 75: SALA DE AULA 9 - PAVIMENTO SUPERIOR



foto 76: SALA DE AULA 9 - PAVIMENTO SUPERIOR - FISSURA NA PAREDE



foto 77: SALA DE AULA 10 - PAVIMENTO SUPERIOR



foto 78: SALA DE AULA 10 - PAVIMENTO SUPERIOR - PISO DANIFICADO

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI PESTALOZZI



foto 79: SANITÁRIO ALUNO FEMININO - PAVIMENTO SUPERIOR



foto 80: SANITÁRIO ALUNO MASCULINO - PAVIMENTO SUPERIOR



foto 81: SANITÁRIO PROFESSORES - PAVIMENTO SUPERIOR

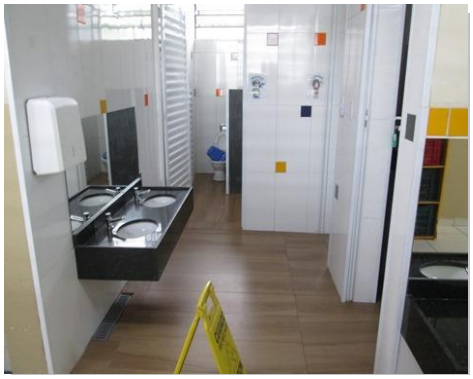


foto 82: HALL SANITÁRIOS - PAVIMENTO SUPERIOR



foto 83: QUADRO DE ENERGIA - PAVIMENTO SUPERIOR



foto 84: ACESSO A ADMINISTRAÇÃO



foto 85: ACESSO DOS ALUNOS ACESSIBILIZADO



foto 86: PÁTIO

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI PESTALOZZI



foto 87: BLOCO ADMINISTRATIVO



foto 88: LAJE COM SINAIS DE INFILTRAÇÃO



foto 89: RESERVATÓRIO D' ÁGUA



foto 90: LAJE DE COBERTURA DA LAVANDERIA E ABRIGO DE GÁS



foto 91: CASA DE BOMBAS



foto 92: COBERTURA. FITA DE FECHAMENTO SPDA



foto 93: DESCIDA DO SPDA



foto 94: CALÇADA EXTERNA

CAIXA

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEI PESTALOZZI



foto 95: CALÇADA EXTERNA
