CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL

Dados Gerais

Nome da Unidade:	EMEF COELHO NETO		
Sequencial (U.E):	89	**Código da Unidade:**	93572

Endereço da Escola

Logradouro, número e complemento (se houver)	RUA DIOGO GARCIA 128 - PARQUE BOA ESPERANÇA

Descrição do Imóvel

Tipo de Construção (técnica construtiva predominante)	Concreto armado	Padrão:	N/D	Nº de Pavimentos	3

Implantação

Área do Terreno (m²)	5.940,00 m²			Área Edificada/ Construída (m²)	3.767,45 m²
Área Pavimentada (m²)	1.765,30 m²			Área Verde / Permeável (m²)	2.230,40 m²
Área da projeção do(s) edifício(s) (m²)	1.944,30 m²	Bloco salas	1189,3	Quadra	755,00 m²

Abastecimento

Água							
Forma de abastecimento (rede pública, poço artesiano, sem abastecimento etc.):	REDE PÚBLICA						
Quantidade de reservatório de água	1						
Capacidade por reservatório (L)		Constatação		Não Disponível	Projeto	NÃO	
Gás							
Encanado (Sim ou Não)	NÃO	Botijão de Gás (Sim ou Não)		SIM	Quantidade de Botijões de Gás	5 X 45	
Energia Elétrica							
Aparelho Ar condicionado (Sim ou Não)	SIM				Quantidade:	1	
Possui fonte de energia complementar (Sim ou Não)?	NÃO				Qual (por ex. Painel Solar ou outro)?	0	
Possui Gerador de Energia? (Sim ou Não)?	NÃO				Capacidade:	0	
Esgoto							
Rede Pública (Sim ou Não)	SIM				Fossa Séptica (Sim ou Não)	NÃO	
Caixa de Gordura (Sim ou Não)	SIM				Caixa de Passagem (Sim ou Não)	SIM	

Informações sobre Prevenção de Incêndios (AVCB e SPDA)

Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro (Sim ou Não)	NÃO	Nº	N/A						
Extintor	SIM	12							
Hidrante	SIM	6							
Sinalização Emergência	PARCIAL								
Iluminação Emergência	PARCIAL								
Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) (Sim ou Não)	PARCIAL	Nº	Total (Sim ou N	PARCIAL	Parcial (Sim ou Não)	PARCIAL			

Acessibilidade

Elevador (Sim ou Não)	SIM			Quantidade:	1	Quant. Ativos/Funcionais:	1
Plataforma Elevatória (Sim ou Não)	NÃO			Quantidade:	0	Quant. Ativos/Funcionais:	0
Rampa de Acesso a Unidade (Sim ou Não)				Rampa de Acesso a outros espaços necessários (Sim ou Não)			SIM
Tipo de sinalização	NÃO	Sonora (Sim ou Não)	NÃO	Visual (Sim ou Não)		Tátil (Sim ou Não)	NÃO
Selo de Acessibilidade (Sim ou Não)	NÃO			Nº			
Vaga de estacionamento para deficientes (Sim ou Não)	NÃO			Quantidade:	0		

CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL

Ambientes da Escola

Administrativo e Apoio/Serviços

Ambiente	Comprimento (m)	Largura (m)	Pé Direito (m)	Área (m²)	Tipo de Construção	Revestimento de Piso	Revestimento de Parede	Possui Forro? Se sim, qual tipo?	Nível de Comprometimento do Ambiente	Observações
Circulação 1 - Térreo	7,50	6,11	2,76	34,48	Alvenaria / Divisória	Cerâmico / granilite	Pintura sobre massa / divisória	Não	**2**	Caixa de passagem sem acabamento, enfiação exposta. Revisar quadro de luz. Trinca na parede sobre porta de entrada.
Secretaria - Térreo	5,85	7,28	2,76	42,59	Alvenaria / Divisória	Granilite	Pintura sobre massa / divisória	Não	**2**	Enfiação exposta. Fissura no granilite
Circulação 2 - Térreo	4,46	6,76	2,50	24,50	Alvenaria / Divisória	Granilite	Pintura sobre massa / divisória	Sim. Forro de gesso	**1**	Fissura no granilite. Forro danificado.
Arquivo 1 - Térreo	3,27	3,67	2,76	12,00	Divisória	Granilite	Divisória	Não	**2**	Fissura no granilite. Forro danificado. Caixa de passagem de elétrica no piso sem acabamento, enfiação exposta.
Arquivo 2 - Térreo	2,56	3,67	2,76	9,40	Alvenaria / Divisória	Granilite	Pintura sobre massa / divisória	Não	**1**	Porta sem maçaneta, fechadura. Fissura no granilite.
Sala de Diretor - Térreo	5,85	3,56	2,76	20,83	Alvenaria / Divisória	Granilite	Pintura sobre massa / divisória	Não	**2**	Fissura no granilite. Enfiação exposta, pendurada.
Copa funcionários 1 - Térreo	2,08	1,46	2,50	3,04	Alvenaria	Cerâmico	Azulejo	Sim. Forro de gesso	**0**	
Depósito 1 - Térreo				0,00					**N/A**	Sem chave
Circulação 3 - 1º Pav	10,40	11,60	3,15 2,92	62,67	Alvenaria / Divisória	Granilite	Pintura sobre massa / divisória	Parcial. Forro de gesso	**1**	Infiltração pela junta de dilatação.
Sala de Coordenação Pedagógica - 1º Pav	5,85	3,57	3,15	20,88	Alvenaria / Divisória	Granilite	Pintura sobre massa / divisória	Não	**2**	Enfiação exposta. Revisar quadro de luz.
Sala de Professores - 1º Pav	5,85	7,37	3,15	43,11	Alvenaria / Divisória	Granilite	Pintura sobre massa / divisória	Não	**0**	
Copa funcionários 2 - 1º Pav	5,85	3,56	3,15	20,83	Alvenaria / Divisória	Granilite	Pintura sobre massa / divisória	Não	**2**	
Copa funcionários 3 - 1º Pav	2,10	1,44	2,92	3,02	Alvenaria	Cerâmico	Azulejo	Sim. Forro de gesso	**0**	Fissura no azulejo.
Circulação 4 - 1º Pav	29,00	1,95	3,15	56,55	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre bloco	Não	**2**	Revisar quadro de luz. Enfiação exposta.
Sala de Recursos Multifuncionais - 1º Pav	3,02	7,05	3,15	21,29	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre massa	Não	**2**	Canaleta de pvc sem fixação, sem acabamento, enfiação exposta.
Depósito Ed. Física - 1º Pav	3,39	3,93	3,15	13,32	Alvenaria	Cimentado	Pintura sobre bloco	Não	**0**	
Depósito sob escada 2 - 1º Pav	3,50	4,47	variável	15,65	Alvenaria	Cimentado	Bloco aparente	Não	**0**	
Refeitório - 1º Pav	10,63	7,05	3,15	74,94	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre bloco / Azulejo	Não	**2**	Interruptor sem acabamento, enfiação exposta.
Cozinha - 1º Pav	5,21	6,98	3,15	36,37	Alvenaria	Cerâmico	Azulejo	Não	**2**	Paredes com mofo.
Despensa - 1º Pav	5,20	5,20	3,15	27,04	Alvenaria	Cerâmico	Azulejo	Não	**0**	
DML - 1º Pav	5,20	1,67	3,15	8,68	Cimentado	Cerâmico	Pintura sobre massa	Não	**2**	Enfiação exposta.
Circulação 5 - 1º Pav	14,45	1,95	3,15	28,18	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre bloco	Não	**0**	

CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL										
Lavanderia - 1º Pav	1,57	2,45	3,15	3,85	Alvenaria	Cerâmico	Azulejo	Não	0	
Copa Funcionários 4 - 1º Pav	3,15	3,40	3,15	11,10	Alvenaria	Cerâmico	Azulejo	Não	2	Canaleta de pvc sem fixação, enfiação exposta.
Sala de Música - 1º Pav	3,35	7,05	3,15	23,62	Alvenaria	Vinílico	Espuma acústica	Não	0	
Patio interno - 1º Pav	18,07	9,00	3,15	162,63	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre bloco / Azulejo	Não	1	Junta de dilatação descolando.
Palco - 1º Pav	3,60	7,23	2,47	26,03	Alvenaria	Cerâmico	Azulejo	Não	0	
Sala de Apoio Pedagógico - 1º Pav	3,36	7,05	3,15	23,69	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre massa	Não	1	Fissura na parede.
Almoxarifado - 1º Pav	3,36	7,05	3,15	23,69	Alvenaria	Cerâmico	Azulejo	Não	0	
Circulação 6 - Administração - 2º Pav	10,40	10,87	3,10	59,04	Alvenaria / Divisória	Granilite	Pintura sobre massa / divisória	Não	2	Junta de dilatação descolando. Infiltração pela junta de dilatação. Revisar quadro de luz. Caixa de passagem de elétrica sem acabamento, enfiação exposta Ralo linear sem grelha.
Depósito 3 - 2º Pav	4,40	2,00	3,10	8,80	Alvenaria	Granilite	Pintura sobre massa	Não	2	Batente danificado, sem fechadura, trinco e maçaneta.
Circulação 7 - Sala Aula - 2º Pav	57,85	1,95	3,10	125,83	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre bloco	Não	2	Infiltração teto. Piso danificado. Junta de dilatação deslocando. Revisar quadro de luz. Rodapé descolado.
Depósito 4 - 2º Pav	1,68	2,55	2,95	4,28	Alvenaria / drywall	Cerâmico	Pintura sobre bloco / Pintura sobre massa	Não	2	Enfiação exposta. Drywall sem pintura. Revisar quadro de luz.
Escada 1	1,73	5,58	-	9,65	Alvenaria	Granilite	Pintura sobre bloco	-	0	
Escada 2	7,05	4,80		33,84	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre bloco	-	0	
Escada 3	1,73	5,58	-	9,65	Alvenaria	Granilite	Pintura sobre bloco	-	0	
Quadra coberta	22,78	33,10	variável	754,02	Mureta / alambrado	Cimentado	Pintura sobre massa / alambrado	Telhado	3	cobertura metálica simples, sem tratamento térmico ou acústico, apresenta danos, incluindo furos que provocam vazamentos na área de jogos (foto 201); quebra de peças nas tampas pré-fabricadas que cobrem as canaletas; fissuras e infiltrações em excesso nos degraus de acesso à quadra, inclusive espelhos (foto 203); Infiltrações identificadas nas paredes das muretas de fechamento
Quadra descoberta	28,80	15,81	-	455,33	Mureta / alambrado	Cimentado	Pintura sobre massa / alambrado	-	2	Fissuras e infiltrações em excesso no piso da quadra e nas arquibancadas, incluindo os espelhos; Infiltrações identificadas nas paredes das muretas de fechamento
				0,00					1	

Salas de Aula

Ambiente	Comprimento (m)	Largura (m)	Pé Direito (m)	Área (m²)	Tipo de Construção	Revestimento de Piso	Revestimento de Parede	Possui Forro? Se sim, qual tipo?	Nível de Comprometimento do Ambiente	Observações
Sala de Aula 15 - 1º Pav	7,05	7,05	3,15	49,70	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre massa	Não	2	Canaleta de pvc sem fixação, sem acabamento, enfiação exposta.
Sala de Aula 16 - 1º Pav	7,05	7,05	3,15	49,70	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre massa	Não	0	
Sala de Aula 17 - 1º Pav	7,05	7,05	3,15	49,70	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre massa	Não	2	Canaleta de pvc sem fixação, sem acabamento, enfiação exposta. Fissura na parede.
Sala Multiuso - 1º Pav	7,05	7,05	3,15	49,70	Alvenaria	Laminado	Pintura sobre bloco	Não	0	

CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL										
Sala de Aula 1 - Laboratório de Ciências - 2º Pav	7,05	7,05	3,10	49,70	Alvenaria	Vinílico	Pintura sobre massa	Não	**2**	Infiltração teto.
Sala de Aula 2 - 2º Pav	7,05	7,05	3,10	49,70	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre massa	Não	**2**	Mancha de infiltração no teto.
Sala de Aula 3 - 2º Pav	7,05	7,05	3,10	49,70	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre massa	Não	**2**	Tomada danificada, enfiação exposta. Infiltração teto.
Sala de Aula 4 - 2º Pav	7,05	7,05	3,10	49,70	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre massa	Não	**2**	Alvenaria proximo a batente danificado. Mancha de infiltração no teto.
Sala de Aula 5 - 2º Pav	7,05	7,05	3,10	49,70	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre massa	Não	**2**	Enfiação exposta. Alvenaria proximo a batente danificado.
Sala de Aula 6 - 2º Pav	7,05	7,05	3,10	49,70	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre massa	Não	**2**	Enfiação exposta. Mancha de infiltração teto.

CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL												
Sala de Aula 7 - 2º Pav	7,05	7,05	3,10	49,70	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre massa	Não	**2**	Infiltração pela junta de dilatação. Tomada sem fixação, enfiação exposta.		
Sala de Aula 8 - 2º Pav	7,05	7,05	3,10	49,70	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre massa	Não	**3**	Revisar acabamento da junta de dilatação. Azulejo descolando. Piso danificado. Pintura do teto descascando.		
Sala de Aula 9 - 2º Pav	7,05	7,05	3,10	49,70	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre massa	Não	**1**	Piso danificado. Fissura na parede.		
Sala de Aula 10 - 2º Pav	7,05	7,05	3,10	49,70	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre massa	Não	**0**			
Sala de Aula 11 - 2º Pav	7,05	7,05	3,10	49,70	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre massa	Não	**2**	Piso danificado. Enfiação exposta. Fissura na parede. Alvenaria proximo a batente danificado.		
Sala de Aula 12 - 2º Pav	7,05	7,05	3,10	49,70	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre massa	Não	**2**	Piso danificado. Fissura na parede, azulejo descolando.		
Sala de Aula 13 - 2º Pav	7,05	7,05	3,10	49,70	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre massa	Não	**3**	Piso danificado. Trinca na parede, azulejo descolando.		
Sala de Aula 14 - 2º Pav	7,05	7,05	3,10	49,70	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre massa	Não	**2**	Trinca na parede.		
Sala de Leitura - 2º Pav	5,80	14,58	3,10	84,56	Alvenaria / Divisória	Granilite	Pintura sobre massa / divisória	Não	**1**	Fissura na parede.		
Laboratório de Educação Digital - 2º Pav	7,05	7,05	3,10	49,70	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre massa	Não	**0**			
Sanitários										**Informações Complementares**		
Ambiente	Comprimento (m)	Largura (m)	Pé Direito (m)	Área (m²)	Revestimento de Piso	Revestimento de Parede	Possui Forro? Se sim, qual tipo?	Observações	Nível de Comprometimento do Ambiente	Quant. Vasos Sanitários	Quant. Cubas e trocadores	Quant. Chuveiros
Sanitário Funcionários Unissex - Térreo	2,08	1,46	2,50	3,04	Cerâmico	Azulejo	Sim. Forro de gesso		**0**	1	1	0
Sanitário Funcionários Feminino 1 - 1º Pav	2,08	2,78	2,92	5,78	Cerâmico	Azulejo	Sim. Forro de gesso		**0**	2	1	0
Sanitário Funcionários Masculino - 1º Pav	2,08	1,16	2,92	2,41	Cerâmico	Azulejo	Sim. Forro de gesso		**0**	1	1	0
AVE - 1º Pav	3,26	6,81	3,15	21,03	Cerâmico	Azulejo	Não	Há 1 trocador	**0**	1	3 / 1	1
Sanitário PCD - 1º Pav	1,68	1,98	3,15	3,33	Cerâmico	Azulejo	Não	Há 1 trocador. Forro de gesso danificado. Fissura no azulejo.	**2**	1	1 / 1	0
Vestiário de Funcionários 1 - 1º Pav	3,34	3,45	3,15	11,52	Cerâmico	Azulejo	Não		**0**	0	0	0
Sanitário Funcionários Feminino 2 - 1º Pav	1,57	1,67	2,99	2,62	Cerâmico	Azulejo	Não	Revisar ligação do chuveiro.	**2**	1	1	1
Vestiário de Funcionários 2 - 1º Pav	3,38	7,05	3,15	18,30	Cerâmico	Azulejo	Não	Caixa de passagem sem acabamento, enfiação exposta.	**2**	0	2	0
Sanitário Alunos Feminino 1 - 1º Pav	3,37	6,98	3,10	23,52	Cerâmico	Azulejo	Não	Porta faltando veneziana.	**2**	6	4	0
Sanitário Alunos Masculino 1 - 1º Pav	3,37	6,99	3,10	23,56	Cerâmico	Azulejo	Não	Há 3 mictórios. Mictório sem metais.	**2**	4	5	0
Sanitário Alunos Feminino 2 - 2º Pav	2,11	1,31	3,10	2,76	Granilite	Azulejo	Não	Azulejo danificado. Batente danificado, sem fechadura, trinco e maçaneta.	**2**	1	1	0
Sanitário Alunos Masculino 2 - 2º Pav	2,10	1,31	3,10	2,75	Granilite	Azulejo	Não	Interruptor sem acabamento, enfiação exposta. Azulejo danificado.	**2**	1	1	0
Informações Adicionais												

CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL									
Ambiente	Necessário adequar ou implantar? (SIM / NÃO / NÃO SE APLICA)	Informações Complementares							Observações
Fechamento do lote (muro, cerca, gradil, vegetação)	SIM	Muro		Área (m²)	877,34	Gradil	Área (m²)	365,56	Há trechos do muro com fissuras, trincas e rachaduras.
Estacionamento(s)	NÃO	Área (m²)		373,00					Existe uma área cimentada onde utilizam como estacionamento.
Playground (Sim ou Não)	NÃO	Área (m²)		-					
Tanque de Areia (Sim ou Não)	NÃO	Área Cúbica (m^3)		-					
Calçadas (Sim ou Não?)	SIM								As calçadas em geral encontram-se degradadas.
Serralherias (Portões, travas e outros)	SIM								Necessita manutenção. Alçapão da caixa dágua danificada (foto133).
Alarmes e sensores (Sim ou Não?)	SIM								
Câmeras de segurança (Sim ou Não?)	SIM								Será padronizada.
Rede de gás na testada? (Sim ou Não)	NÃO								

Observações Gerais:	**Trata se de uma escola necessitando revisão de acessibilidade na rampa de acesso e acesso interno para quadra coberta. Para acessar a escola, o cadeirante tem que entrar pela secretaria.** **A escola apresenta muita infiltração pelo telhado de fibrocimento. As juntas de dilatação apresentam falhas, com fissuras e infiltrações.** **Os pisos das salas de aula e circulações não são padronizados.**

FICHA 4 - DIAGNÓSTICO DE ASPECTOS DE INFRAESTRUTURA PREDIAL DAS UNIDADES ESCOLARES			
Item	**Descrição dos Itens Avaliados**	**Necessidade de Intervenção**	**Observações**
1. Infraestrutura da Escola			
Condições das fundações, pilares, vigas, lajes, cobertura, estruturas metálicas, paredes, esquadrias e pisos			
1.1	Fundações: verificar se há rachaduras, trincas, fissuras, desplacamentos ou quaisquer sinais de falhas na fundação que possam comprometer a estabilidade do prédio	NÃO	
1.2	Pilares: verificar se há rachaduras, trincas, fissuras, desplacamentos ou quaisquer sinais de falhas nos pilares que possam comprometer a estabilidade do prédio	SIM	Falhas no revestimento de poliuretano (PU), apresentando rompimento nas juntas de dilatação.
1.3	Vigas: verificar se há rachaduras, trincas, fissuras, desplacamentos ou quaisquer sinais de falhas nas vigas que possam comprometer a estabilidade do prédio	SIM	Falhas no revestimento de poliuretano (PU), apresentando rompimento nas juntas de dilatação.
1.4	Lajes: verificar se há rachaduras, trincas, fissuras, desplacamentos ou quaisquer sinais de falhas nas lajes que possam comprometer a estabilidade do prédio	NÃO	
1.5	Cobertura: verificar se há sinais de infiltração, vazamentos, telhas soltas ou outras falhas que possam causar danos à estrutura da escola	SIM	Não foram identificadas falhas na cobertura da edificação; contudo, as telhas são de fibrocimento e foi verificado infiltração na laje do 2º pavimento. A cobertura metálica simples da Quadra Poliesportiva, sem tratamento térmico ou acústico, apresenta danos, incluindo furos que provocam vazamentos na área de jogos.
1.6	Estruturas metálicas: verificar se há sinais de problemas nas estruturas metálicas, como corrosão ou deformação	SIM	Trechos de oxidação e corrosão foram identificados nas terças metálicas da estrutura da cobertura da Quadra Poliesportiva coberta, assim como nos alambrados laterais de fechamento e traves de gol, inclusive para a Quadra Poliesportiva descoberta. Os gradis dos muros externos do terreno apresentam corrosão excessiva.
1.7	Paredes: verificar se há sinais de problemas nas paredes, como rachaduras, infiltrações ou umidade excessiva	SIM	Infiltrações identificadas nas paredes das muretas de fechamento das Quadras Poliesportivas coberta e descoberta, bem como pontos de infiltração na base das paredes externas da edificação.
1.8	Esquadrias: verificar se há problemas nas esquadrias, tais como falta de peças, corrosão, vidros quebrados e dificuldade de manuseio	SIM	Comprometimento da funcionalidade das esquadrias, com dificuldade de abertura e fechamento.
1.9	Pisos: verificar se há sinais de problemas nos pisos, como desníveis, rachaduras ou solturas de revestimento	SIM	Quebra de peças nas tampas pré-fabricadas que cobrem as canaletas da Quadra Poliesportiva coberta. Fissuras e infiltrações em excesso nas circulações externas da edificação, nos degraus de acesso à Quadra Poliesportiva coberta, no piso da Quadra Poliesportiva descoberta e nas arquibancadas, incluindo os espelhos.
2. Instalações Elétricas e Hidráulicas			
Condições das instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias			
2.1	Instalações elétricas: verificar se as instalações elétricas estão em conformidade com as normas de segurança, se há fios expostos, equipamentos com defeito ou outros problemas que possam representar risco de incêndio ou choque elétrico. verificar também se o quadro de energia está em bom estado e se as tomadas e interruptores estão funcionando corretamente	SIM	Caixa de passagem sem acabamento. Necessário revisar quadros de luz. Há tomadas no padrão antigo.

FICHA 4 - DIAGNÓSTICO DE ASPECTOS DE INFRAESTRUTURA PREDIAL DAS UNIDADES ESCOLARES			
Item	**Descrição dos Itens Avaliados**	**Necessidade de Intervenção**	**Observações**
2.2	Instalações hidráulicas: verificar se as instalações hidráulicas estão em bom estado, sem vazamentos, rachaduras ou outros problemas que possam prejudicar o funcionamento do sistema. verificar também se as torneiras, registros e outros componentes estão em bom estado e se o sistema de esgoto está funcionando corretamente	NÃO	
2.3	Instalações sanitárias: verificar se as instalações sanitárias estão em bom estado, sem vazamentos, rachaduras ou outros problemas que possam prejudicar o funcionamento do sistema. verificar também se as louças sanitárias, como vasos e pias, estão em bom estado e se os ralos estão desobstruídos	NÃO	
2.4	Reservatórios de água: verificar se os reservatórios de água estão em bom estado, sem vazamentos ou outros problemas que possam prejudicar o funcionamento do sistema de abastecimento	NÃO	Não foi possível verificar em razão da falta de acesso.

FICHA 4 - DIAGNÓSTICO DE ASPECTOS DE INFRAESTRUTURA PREDIAL DAS UNIDADES ESCOLARES			
Item	**Descrição dos Itens Avaliados**	**Necessidade de Intervenção**	**Observações**
3. Acessibilidade			
Condições de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida			
3.1	Rampas de acesso: verificar se há rampas de acesso em bom estado e com inclinação adequada	SIM	Rampas com inclinação inadequada, sem piso tátil e sem corrimão duplo, em desacordo com a NBR 9050. Observa-se que as arquibancadas externas da Quadra Poliesportiva descoberta são totalmente inacessíveis, devido à ausência de degraus intermediários.
3.2	Elevadores: verificar se há elevadores em bom estado e se estão em conformidade com as normas de acessibilidade	NÃO	
3.3	Banheiros adaptados: verificar se há banheiros adaptados em bom estado e se estão em conformidade com as normas de acessibilidade	SIM	Atualizar acessibilidade.
4. Condições de Habitabilidade			
Condições de ventilação e iluminação natural e artificial e conforto térmico dos ambientes			
4.1	Condições gerais de habitabilidade e conforto térmico por setor (salas de aulas, outros ambientes pedagógicos, ambientes administrativos, cozinha e refeitório, etc.)	NÃO	
5. Áreas Externas/Paisagismo			
Condições de adequabilidade das áreas externas da escola			
5.1	Condições Gerais do Paisagismo na Unidade Educacional	SIM	Vegetação (grama) apresenta falhas na cobertura em diversos trechos e, em alguns pontos, altura que requer cuidado, sem apresentar excesso.
5.2	Drenagem: verificar se a drenagem da área externa da escola está funcionando corretamente, evitando acúmulo de água em dias de chuva	SIM	Empoçamentos nas circulações externas da edificação e em grande volume ao redor da Quadra Poliesportiva descoberta. Problemas de drenagem também ocasionam acúmulo de água na Quadra Poliesportiva coberta.
5.3	Pintura externa: verificar se a pintura externa da escola está em bom estado, sem descascamentos ou sinais de desgaste	SIM	Pinturas externas da edificação comprometidas, assim como nos gradis dos muros, no muro da face interna, nos alambrados e nos equipamentos esportivos.

Profissional Responsável
Nome: Hatsumi Ito Chida
Cargo/função Arquiteta
CREA/CAU: A 2374-4

Responsável pela validação CAIXA
Nome: Decio de Souza Espindola
Cargo/função: Engenheiro Civil
CREA/CAU: 5062158870-SP

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEF COELHO NETO

1 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Cód. Unidade	
93572	EMEF COELHO NETO



foto 01: CIRCULAÇÃO 1 - TÉRREO



foto 02: CIRCULAÇÃO 1 - TÉRREO - CANALETA EM PVC



foto 03: CIRCULAÇÃO 1 - FISSURA NA PAREDE



foto 04: SECRETARIA - TÉRREO



foto 05:SECRETARIA - TÉRREO - FIAÇÃO EXPOSTA



foto 06: CIRCULAÇÃO 2 - TÉRREO

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF COELHO NETO



foto 07: CIRCULAÇÃO 2 - TÉRREO - FORRO DE GESSO DANIFICADO



foto 08: CIRCULAÇÃO 2 - TÉRREO - CANALETAS EM PVC PVC



foto 09: ARQUIVO 1 - TÉRREO



foto 10: -ARQUIVO 1 - TÉRREO - FALTA TAMPA CEGA NA NA CX DE PASSAGEM



foto 11: ARQUIVO 2 - TÉRREO



foto 12: SALA DE DIRETOR - TÉRREO



foto 13: SALA DE DIRETOR - TÉRREO - TOMADA PADRÃO OBSOLETO E CANALETA EM PVC



foto 14: SALA DE DIRETOR - TÉRREO - FIAÇÃO EXPOSTA

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF COELHO NETO

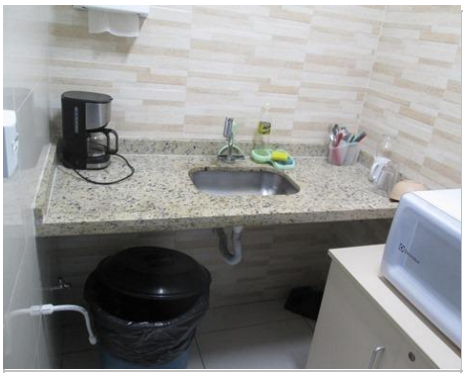


foto 15: COPA FUNCIONÁRIOS 1 - TÉRREO



foto 16: COPA FUNCIONÁRIOS 1 - TÉRREO - CANALETAS EM PVC



foto 17: DEPÓSITO 1 - TÉRREO - SEM CHAVE



foto 18: SANITÁRIO FUNCIONÁRIOS UNISSEX - TÉRREO



foto 19: TÉRREO - FISSURA NO PISO



foto 20: VISTA DO ELEVADOR



foto 21: QUADRO DE ENERGIA - TÉRREO



foto 22: QUADRO DE ENERGIA - TÉRREO

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF COELHO NETO



foto 23: ESCADARIA DE ACESSO DO TÉRREO AO 1º PAVIMENTO



foto 24: CIRCULAÇÃO 3 - 1º PAVIMENTO



foto 25: CIRCULAÇÃO 3 - 1º PAVIMENTO



foto 26: CIRCULAÇÃO 3 - 1º PAVIMENTO - JUNTA DE DILATAÇÃO DANIFICADA



foto 27: CIRCULAÇÃO 3 - 1º PAVIMENTO - JUNTA DE DILATAÇÃO DANIFICADA



foto 28: CIRCULAÇÃO 3 - 1º PAVIMENTO - FISSURA NO PISO



foto 29: CIRCULAÇÃO 3 - 1º PAVIMENTO - DIVISÓRIA DANIFICADA



foto 30: SALA DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA - 1º PAVIMENTO

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF COELHO NETO



foto 31: SALA DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA - 1º PAVIMENTO - CANALETA EM PVC



foto 32: SALA DOS PROFESSORES - 1º PAVIMENTO



foto 33: SALA DOS PROFESSORES - 1º PAVIMENTO - UTILIZAÇÃO DE EXTENSÕES

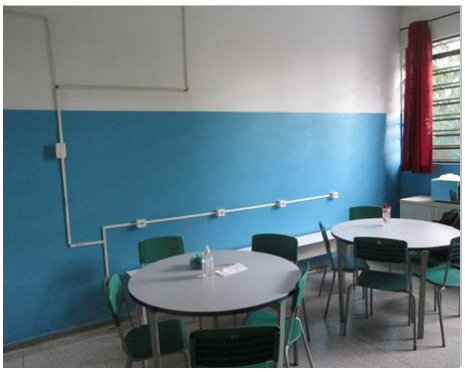


foto 34: COPA FUNCIONÁRIOS 2 - 1º PAVIMENTO - UTILIZAÇÃO DE CANALETAS EM PVC



foto 35: COPA FUNCIONÁRIOS 3 - 1º PAVIMENTO



foto 36: COPA FUNCIONÁRIOS 3 - 1º PAVIMENTO - UTILIZAÇÃO DE CANALETAS EM PVC



foto 37: CIRCULAÇÃO 4 - 1º PAVIMENTO



foto 38: CIRCULAÇÃO 4 - 1º PAVIMENTO

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF COELHO NETO



foto 39: CIRCULAÇÃO 4 - 1º PAVIMENTO



foto 40: CIRCULAÇÃO 4 - 1º PAVIMENTO - FIAÇÃO EXPOSTA



foto 41: SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS - 1º PAVIMENTO



foto 42: SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS - 1º PAVIMENTO - TOMADA PADRÃO OBSOLETO




foto 43: DEPÓSITO ED. FÍSICA - 1º PAVIMENTO



foto 44: DEPÓSITO ED. FÍSICA - 1º PAVIMENTO - CANALETA EM PVC

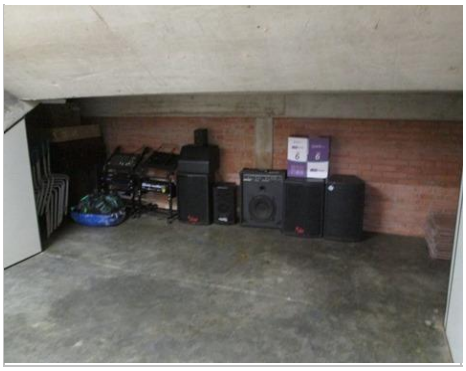


foto 45: DEPÓSITO SOB ESCADA 2- 1º PAVIMENTO



foto 46: REFEITÓRIO - 1º PAVIMENTO

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF COELHO NETO



foto 47: REFEITÓRIO - 1º PAVIMENT



foto 48: REFEITÓRIO - 1º PAVIMENTO - FALTA ESPELHO DO INTERRUPTOR



foto 49: COZINHA - 1º PAVIMENTO



foto 50: COZINHA - 1º PAVIMENTO - MANCHA DE INFILTRAÇÃO



foto 51: DESPENSA - 1º PAVIMENTO



foto 52: DESPENSA - 1º PAVIMENTO - CANALETAS DE PVC



foto 53: DESPENSA - 1º PAVIMENTO - CANALETAS DE PVC



foto 54: DML - 1º PAVIMENTO

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF COELHO NETO



foto 55: CIRCULAÇÃO 5 - 1º PAVIMENTO



foto 56: CIRCULAÇÃO 5 - 1º PAVIMENTO - TOMADA COM CANALETA EM PVC



foto 57: CIRCULAÇÃO 5 - MANCHA DE CURTO CIRCUITO NO TETO



foto 58: LAVANDERIA - 1º PAVIMENTO



foto 59: COPA FUNCIONÁRIOS 4 - 1º PAVIMENTO



foto 60: COPA FUNCIONÁRIOS 4 - 1º PAVIMENTO - TOMADA COM FIAÇÃO EXPOSTA




foto 61: SALA DE MÚSICA - 1º PAVIMENTO



foto 62: PÁTIO INTERNO - 1º PAVIMENTO

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF COELHO NETO



foto 63: PÁTIO INTERNO - 1º PAVIMENTO



foto 64: PÁTIO INTERNO - 1º PAVIMENTO - JUNTA DE DILATAÇÃO DANIFICADA



foto 65: PÁTIO INTERNO - 1º PAVIMENTO - JUNTA DE DILATAÇÃO DANIFICADA



foto 66: PÁTIO INTERNO - 1º PAVIMENTO - ESCADARIA DE ACESSO AO 2º PAVIMENTO



foto 67: PALCO - 1º PAVIMENTO



foto 68: PALCO - 1º PAVIMENTO - ESCADA DE ACESSO AO PALCO



foto 69: SALA DE APOIO PEDAGÓGICO - 1º PAVIMENTO

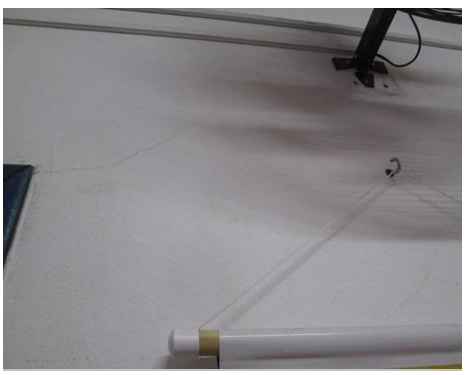


foto 70: SALA DE APOIO PEDAGÓGICO - 1º PAVIMENTO - FISSURA NA PAREDE

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF COELHO NETO



foto 71: ALMOXARIFADO - 1º PAVIMENTO



foto 72: ALMOXARIFADO - 1º PAVIMENTO - CANALETA EM PVC



foto 73: SALA DE AULA 15 - 1º PAVIMENTO



foto 74: SALA DE AULA 15 - 1º PAVIMENTO - ESPELHO DA TOMADA DE PADRÃO DIFERENTE



foto 75: SALA DE AULA 15 - 1º PAVIMENTO - CANALETA EM PVC



foto 76: SALA DE AULA 16 - 1º PAVIMENTO



foto 77: SALA DE AULA 16 - 1º PAVIMENTO - REVESTIMENTO DANIFICADO



foto 78: SALA DE AULA 16 - 1º PAVIMENTO -FISSURA NA PAREDE

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF COELHO NETO



foto 79: SALA DE AULA 17 - 1º PAVIMENTO



foto 80: SALA DE AULA 17 - 1º PAVIMENTO - RODAPÉ DANIFICADO



foto 81: SALA DE AULA 17 - 1º PAVIMENTO - FISSURA NA PAREDE



foto 82: SALA DE AULA 17 - 1º PAVIMENTO - FIAÇÃO EXPOSTA



foto 83: SALA MULTIUSO -1º PAVIMENTO

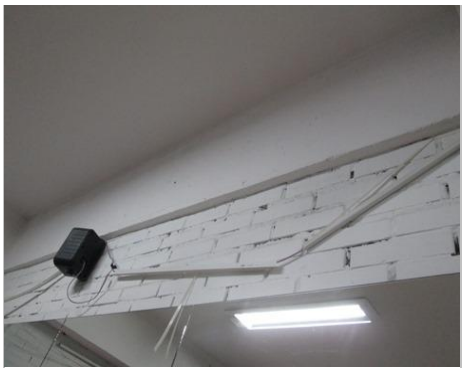


foto 84: SALA MULTIUSO -1º PAVIMENTO - CANALETA EM PVC



foto 85: SANITÁRIO FUNCIONÁRIOS FEMININO 1- 1º PAVIMENTO



foto 86: SANITÁRIO FUNCIONÁRIOS FEMININO 1- 1º PAVIMENTO - PORTA DANIFICADA

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF COELHO NETO



foto 87: SANITÁRIO FUNCIONÁRIOS MASCULINO - 1º PAVIMENTO



foto 88: SANITÁRIO FUNCIONÁRIOS MASCULINO - 1º PAVIMENTO - PORTA DANIFICADA



foto 89: AVE - 1º PAVIMENTO



foto 90: AVE - 1º PAVIMENTO



foto 91: SANITÁRIO PCD - 1º PAVIMENTO



foto 92: SANITÁRIO PCD - 1º PAVIMENTO - FURO NA LAJE COM FIAÇÃO EXPOSTA



foto 93: SANITÁRIO PCD - 1º PAVIMENTO - FISSURA NO AZULEJO



foto 94: VESTIÁRIO FUNCIONÁRIOS 1 - 1º PAVIMENTO

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF COELHO NETO



foto 95: SANITÁRIO FUNCIONÁRIO FEMININO 2 - 1º PAVIMENTO



foto 96: SANITÁRIO FUNCIONÁRIO FEMININO 2 - 1º PAVIMENTO - CHUVEIRO




foto 97: VESTIÁRIO FUNCIONÁRIO 2 - 1º PAVIMENTO

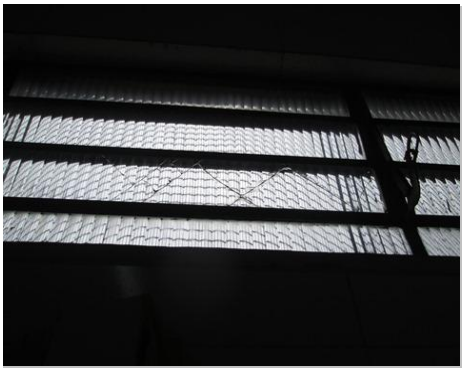


foto 98: VESTIÁRIO FUNCIONÁRIO 2 - 1º PAVIMENTO - VIDRO QUEBRADO



foto 99: -SANITÁRIO ALUNO FEMININO 1 - 1º PAVIMENTO



foto 100: SANITÁRIO ALUNO FEMININO 1 - 1º PAVIMENTO - VASO SANITÁRIO ENTUPIDO



foto 101: SANITÁRIO ALUNO FEMININO 1 - 1º PAVIMENTO - PORTA DANIFICADA



foto 102: SANITÁRIO ALUNO MASCULINO 1 - 1º PAVIMENTO

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF COELHO NETO



foto 103: SANITÁRIO ALUNO MASCULINO 1 - 1º PAVIMENTO - PISO COM COLORAÇÃO DIFERENTE



foto 104: ESCADARIA - 1º PAVIMENTO - FALTA FINALIZAÇÃO DE PINTURA DO DEPÓSITO 4

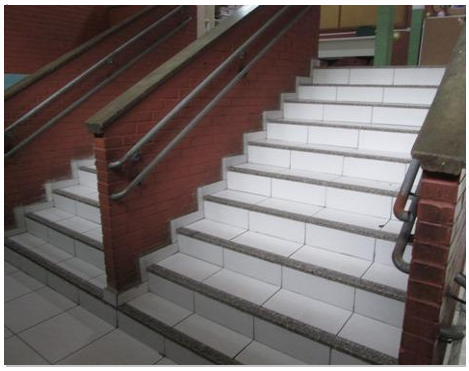


foto 105: ESCADARIA DE ACESSO AO 2º PAVIMENTO



foto 106: QUADRO DE ENERGIA - 1º PAVIMENTO



foto 107: QUADRO DE ENERGIA - 1º PAVIMENTO



foto 108: QUADRO DE ENERGIA - 1º PAVIMENTO

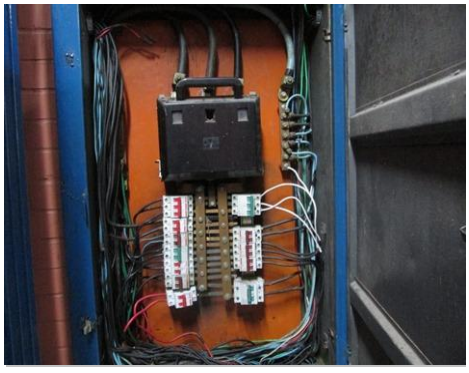


foto 109: QUADRO DE ENERGIA - 1º PAVIMENTO



foto 110: QUADRO DE ENERGIA - 1º PAVIMENTO

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF COELHO NETO



foto 111: QUADRO DE ENERGIA - 1º PAVIMENTO



foto 112: QUADRO DE ENERGIA - 1º PAVIMENTO



foto 113: QUADRO DE ENERGIA - 1º PAVIMENTO



foto 114: QUADRO DE ENERGIA - 1º PAVIMENTO



foto 115: QUADRO DE ENERGIA - 1º PAVIMENTO



foto 116: QUADRO DE ENERGIA - 1º PAVIMENTO



foto 117: CIRCULAÇÃO 6 - 2º PAVIMENTO



foto 118: CIRCULAÇÃO 6 - 2º PAVIMENTO

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF COELHO NETO



foto 119: CIRCULAÇÃO 6 - 2º PAVIMENTO

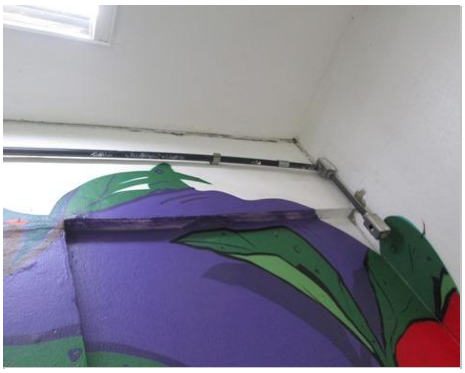


foto 120: CIRCULAÇÃO 6 - 2º PAVIMENTO - JUNTA DE DILATAÇÃO DANIFICADA



foto 121: CIRCULAÇÃO 6 - 2º PAVIMENTO - JUNTA DE DILATAÇÃO DANIFICADA



foto 122: CIRCULAÇÃO 6 - 2º PAVIMENTO - FIAÇÃO EXPOSTA



foto 123: CIRCULAÇÃO 6 - 2º PAVIMENTO - FALTA GRELHA DO RALO



foto 124: CIRCULAÇÃO 6 - 2º PAVIMENTO - CANALETA EM PVC



foto 125: DEPÓSITO 3 - 2º PAVIMENTO



foto 126: DEPÓSITO 3 - 2º PAVIMENTO - BATENTE DANIFICADO

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF COELHO NETO



foto 127: CIRCULAÇÃO 7 - 2º PAVIMENTO



foto 128: CIRCULAÇÃO 7 - 2º PAVIMENTO



foto 129: CIRCULAÇÃO 7 - 2º PAVIMENTO - ESCADARIA DE ACESSO DO 1º AO 2º PAVIMENTO



foto 130: CIRCULAÇÃO 7 - 2º PAVIMENTO JUNTA DE DILATAÇÃO DANIFICADA



foto 131: CIRCULAÇÃO 7 - 2º PAVIMENTO - PISO DANIFICADO



foto 132: CIRCULAÇÃO 7 - 2º PAVIMENTO - MANCHA DE INFILTRAÇÃO NO TETO



foto 133 - 2º PAVIMENTO - ALÇAPÃO DE ACESSO A COBERTURA DANIFICADA



foto 134: -CIRCULAÇÃO 7 - 2º PAVIMENTO -MANCHA DE INFILTRAÇÃO NO TETO

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF COELHO NETO

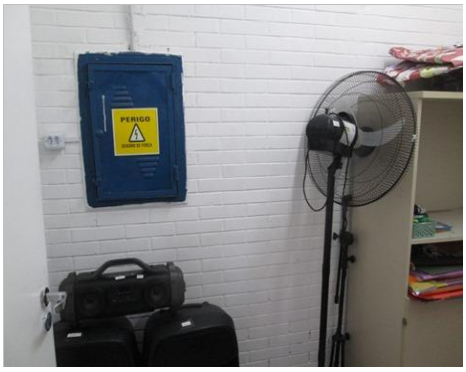


foto 135: DEPÓSITO 4 - 2º PAVIMENTO



foto 136: SALA DE AULA 1 - LABORATÓRIO DE CIÊNCIA - 2º PAVIMENTO



foto 137: SALA DE AULA 1 - LABORATÓRIO DE CIÊNCIA - 2º PAVIMENTO - MANCHA DE INFILTRAÇÃO NO TETO

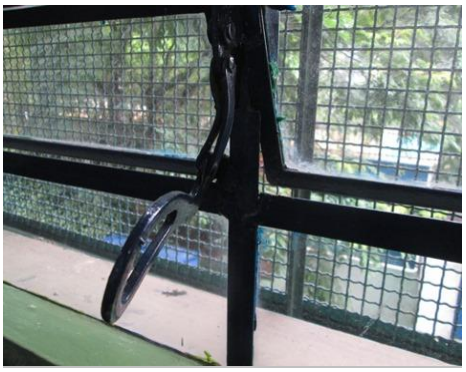


foto 138: SALA DE AULA 1 - LABORATÓRIO DE CIÊNCIA - 2º PAVIMENTO - JANELA DANIFICADA



foto 139: SALA DE AULA 2 - 2º PAVIMENTO



foto 140: SALA DE AULA 2 - 2º PAVIMENTO - PINTURA NO TETO DANIFICADA



foto 141: SALA DE AULA 3 - 2º PAVIMENTO



foto 142: SALA DE AULA 3 - 2º PAVIMENTO - PISO DANIFICADO

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF COELHO NETO



foto 143: SALA DE AULA 3 - 2º PAVIMENTO - MANCHA DE INFILTRAÇÃO NO TETO



foto 144: SALA DE AULA 3 - 2º PAVIMENTO - ESPELHO DANIFICADO E FIAÇÃO EXPOSTA

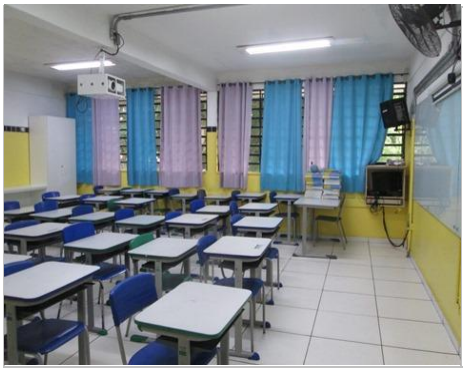


foto 145: SALA DE AULA 4 - 2º PAVIMENTO

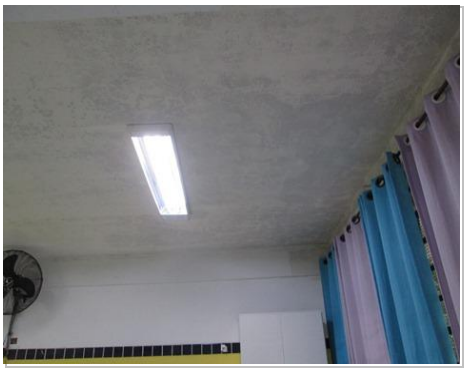


foto 146: SALA DE AULA 4 - 2º PAVIMENTO - MANCHA DE INFILTRAÇÃO NO TETO



foto 147: SALA DE AULA 5 - 2º PAVIMENTO



foto 148: SALA DE AULA 5 - 2º PAVIMENTO - FIAÇÃO EXPOSTA QUE NÃO ATENDE AO PADRÃO DE CORES

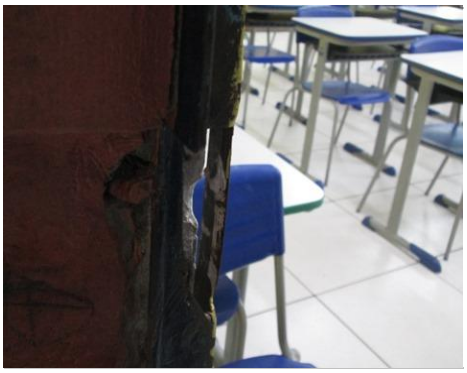


foto 149: SALA DE AULA 5 - 2º PAVIMENTO - BATENTE DANIFICADO

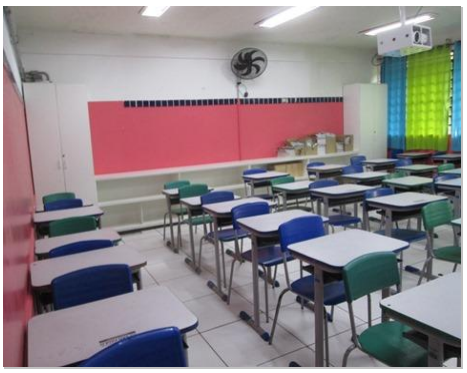


foto 150: SALA DE AULA 6 - 2º PAVIMENTO

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF COELHO NETO



foto 151: SALA DE AULA 6 - 2º PAVIMENTO -MANCHA DE INFILTRAÇÃO NO TETO



foto 152: SALA DE AULA 6 - 2º PAVIMENTO -MANCHA DE INFILTRAÇÃO NO TETO



foto 153: SALA DE AULA 6 - 2º PAVIMENTO - BATENTE DANIFICADO



foto 154: SALA DE AULA 7 - 2º PAVIMENTO



foto 155: SALA DE AULA 7 - 2º PAVIMENTO - TOMADA DANIFICADA COM FIAÇÃO EXPOSTAS QUE NÃO ATENDE O PADRÃO DE CORES



foto 156: SALA DE AULA 7 - 2º PAVIMENTO - JUNTA DE DILATAÇÃO DANIFICADA



foto 157: SALA DE AULA 8 - 2º PAVIMENTO



foto 158: SALA DE AULA 8 - 2º PAVIMENTO - PISO DANIFICADO

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF COELHO NETO



foto 159: SALA DE AULA 8 - 2º PAVIMENTO - PINTURA DO TETO DANIFICADA



foto 160: SALA DE AULA 8 - 2º PAVIMENTO - JUNTA DE DILATAÇÃO DANIFICADA

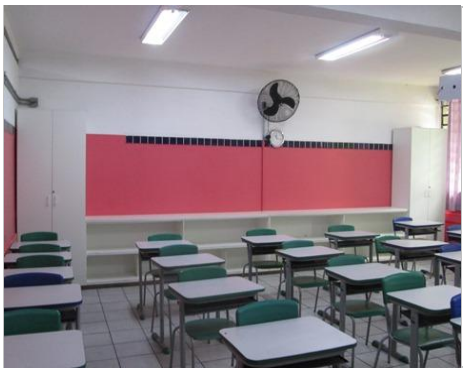


foto 161: SALA DE AULA 9 - 2º PAVIMENTO



foto 162: SALA DE AULA 9 - 2º PAVIMENTO - PISO CERÂMICO DANIFICADO



foto 163: SALA DE AULA 10 - 2º PAVIMENTO



foto 164: SALA DE AULA 10 - 2º PAVIMENTO - FISSURA NA PAREDE

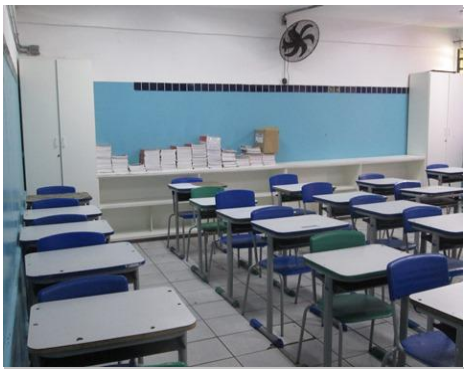


foto 165: SALA DE AULA 11 - 2º PAVIMENTO



foto 166: SALA DE AULA 11 - 2º PAVIMENTO - REVESTIMENTO DA PAREDE DANIFICADO

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF COELHO NETO



foto 167: SALA DE AULA 11 - 2º PAVIMENTO - PISO DANIFICADO



foto 168: SALA DE AULA 11 - 2º PAVIMENTO - FIAÇÃO EXPOSTA QUE NÃO ATENDE AO PADRÃO DE CORES



foto 169: SALA DE AULA 12 - 2º PAVIMENTO



foto 170: SALA DE AULA 12 - 2º PAVIMENTO - PISO DANIFICADO



foto 171: SALA DE AULA 11 - 2º PAVIMENTO - FIAÇÃO EXPOSTA QUE NÃO ATENDE AO PADRÃO DE CORES



foto 172: SALA DE AULA 13 - 2º PAVIMENTO

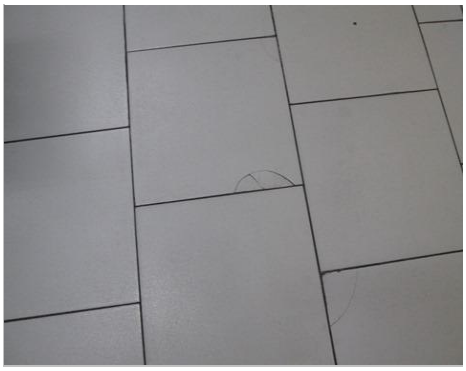


foto 173: SALA DE AULA 13 - 2º PAVIMENTO - PISO DANIFICADO



foto 174: SALA DE AULA 13 - 2º PAVIMENTO - FISSURA NA PAREDE

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF COELHO NETO



foto 175: SALA DE AULA 13 - 2º PAVIMENTO - ESPELHO DANIFICADO



foto 176: SALA DE AULA 14 - 2º PAVIMENTO



foto 177: SALA DE AULA 14 - 2º PAVIMENTO -FISSURA NA PAREDE



foto 178: SALA DE AULA 14 - 2º PAVIMENTO - JANELA DANIFICADA



foto 179: SALA DE LEITURA - 2º PAVIMENTO



foto 180: SALA DE LEITURA - 2º PAVIMENTO - FISSURA NA PAREDE



foto 181: LABORATÓRIO DE EDUCAÇÃO DIGITAL - 2º PAVIMENTO



foto 182: SANITÁRIO ALUNO FEMININO - 2º PAVIMENTO

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF COELHO NETO



foto 183: SANITÁRIO ALUNO FEMININO - 2º PAVIMENTO - PORTA DANIFICADA



foto 184: SANITÁRIO ALUNO FEMININO - 2º PAVIMENTO - FISSURA NO AZULEJO



foto 185: SANITÁRIO ALUNO FEMININO - 2º PAVIMENTO - AZULEJO DANIFICADO



foto 186: SANITÁRIO ALUNO MASCULINO - 2º PAVIMENTO



foto 187: SANITÁRIO ALUNO MASCULINO - 2º PAVIMENTO VIDRO QUEBRADO



foto 188: SANITÁRIO ALUNO MASCULINO - 2º PAVIMENTO - PORTA DANIFICADA



foto 189: ESCADARIA DE ACESSO DO 1º AO 2º PAVIMENTO



foto 190: QUADRO DE ENERGIA - 2º PAVIMENTO

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF COELHO NETO



foto 191: QUADRO DE ENERGIA - 2º PAVIMENTO



foto 192: QUADRO DE ENERGIA - 2º PAVIMENTO



foto 193: QUADRO DE ENERGIA - 2º PAVIMENTO



foto 194: QUADRO DE ENERGIA - 2º PAVIMENTO



foto 195: QUADRO DE ENERGIA - 2º PAVIMENTO



foto 196: ENTRADA DA ESCOLA



foto 197: VISTA GERAL



foto 198: ACESSO DOS ALUNOS

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF COELHO NETO



foto 199: VISTA GERAL



foto 200: QUADRA DESCOBERTA



foto 201: QUADRA COBERTA
cobertura com infiltrações;



foto 202: VISTA GERAL



foto 203: ACESSO À QUADRA
fissuras e infiltrações



foto 204: ARQUIBANCADA EXTERNA
fissuras e infiltrações



foto 205: MUITO PISO DANIFICADO
fissuras

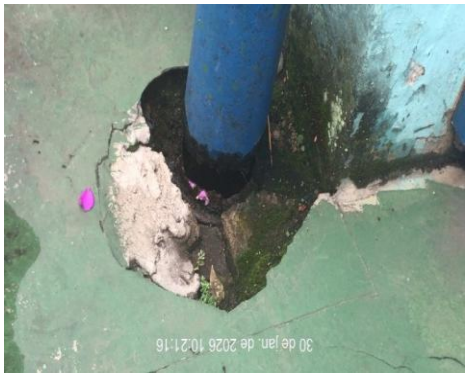


foto 206: DESCIDA AP CORROÍDO DA ESCOLA
