CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL

Dados Gerais

Nome da Unidade:	EMEI IGUATEMI		
Sequencial (U.E):	93	**Código da Unidade:**	19593

Endereço da Escola

Logradouro, número e complemento (se houver)	Rua Tauro s/n - Sítio dos Franças / Recanto Verde

Descrição do Imóvel

Tipo de Construção (técnica construtiva predominante)	Concreto armado	Padrão:	8. EMEI PESTALOZZI CD 487	Nº de Pavimentos	2

Implantação

Área do Terreno (m²)	2.063,42 m²			Área Edificada/ Construída (m²)	1.086,68 m²
Área Pavimentada (m²)	1.692,39 m²			Área Verde / Permeável (m²)	371,03 m²
Área da projeção do(s) edifício(s) (m²)	543,34 m²	Bloco salas	543,34	Quadra	Não

Abastecimento

Água							
Forma de abastecimento (rede pública, poço artesiano, sem abastecimento etc.):	rede pública						
Quantidade de reservatório de água	1						
Capacidade por reservatório (L)	8.000	Constatação		Inf. Resp.	Projeto	SIM	
Gás							
Encanado (Sim ou Não)	NÃO	Botijão de Gás (Sim ou Não)		SIM	Quantidade de Botijões de Gás	5 x 45	
Energia Elétrica							
Aparelho Ar condicionado (Sim ou Não)	NÃO				Quantidade:	0	
Possui fonte de energia complementar (Sim ou Não)?	NÃO				Qual (por ex. Painel Solar ou outro)?	0	
Possui Gerador de Energia? (Sim ou Não)?	NÃO				Capacidade:	0	
Esgoto							
Rede Pública (Sim ou Não)	SIM				Fossa Séptica (Sim ou Não)	NÃO	
Caixa de Gordura (Sim ou Não)	SIM				Caixa de Passagem (Sim ou Não)	SIM	

Informações sobre Prevenção de Incêndios (AVCB e SPDA)

Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro (Sim ou Não)	NÃO	Nº	N/A						
Extintor	SIM	9							
Hidrante	SIM	2							
Sinalização Emergência	SIM	4							
Iluminação Emergência	SIM	14							
Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) (Sim ou Não)	NÃO	Nº	Total (Sim ou N	PARCIAL	Parcial (Sim ou Não)	PARCIAL			

Acessibilidade

Elevador (Sim ou Não)	SIM			Quantidade:	1	Quant. Ativos/Funcionais:	1
Plataforma Elevatória (Sim ou Não)	NÃO			Quantidade:		Quant. Ativos/Funcionais:	
Rampa de Acesso a Unidade (Sim ou Não)	SIM			Rampa de Acesso a outros espaços necessários (Sim ou Não)			NÃO
Tipo de sinalização	NÃO	Sonora (Sim ou Não)	NÃO	Visual (Sim ou Não)	NÃO	Tátil (Sim ou Não)	PARCIAL
Selo de Acessibilidade (Sim ou Não)	NÃO		Nº				
Vaga de estacionamento para deficientes (Sim ou Não)	NÃO			Quantidade:	0		

CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL

Ambientes da Escola

Administrativo e Apoio/Serviços

Ambiente	Comprimento (m)	Largura (m)	Pé Direito (m)	Área (m²)	Tipo de Construção	Revestimento de Piso	Revestimento de Parede	Possui Forro? Se sim, qual tipo?	Nível de Comprometimento do Ambiente	Observações
Refeitório/ Pátio - Térreo	23,53	10,59	3,00	223,86	Alvenaria	Granilite	Pintura sobre massa	Não	2	Caixa de passagem de elétrica sem acabamento. Há fiações expostas. Revisar quadro de luz.
Secretaria - Térreo	2,89	6,41	2,50	16,33	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre massa	Sim. Gesso acartonado	2	Fissura no encontro viga x parede. Fissura na parede sob bancada. Caixa de passagem de elétrica sem acabamento, há fiações expostas.
Depósito sob escada - Térreo	2,46	3,00	variável	7,38	Alvenaria	Granilite	Pintura sobre massa	Não	0	
Depósito - Térreo	1,71	2,92	3,05	4,99	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre massa	Não	0	
Circulação Direção - Térreo	1,55	2,00	3,00	3,10	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre massa	Não	0	
Almoxarifado - Térreo	3,13	1,96	3,00	6,13	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre massa	Não	2	Trinca na parede. Revestimento próximo a batente danificado. Fissura no encontro laje x parede.
Direção - Térreo	2,60	6,10	3,00	14,78	Alvenaria / Divisória	Cerâmico	Pintura sobre massa / Divisória	Não	2	Improviso de elétrica (utilização de régua).
Coordenação - Térreo	2,55	4,08	3,00	10,40	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre massa	Não	2	Há fiações expostas.
Jornada Especial Integral de Ação (JEIF) - Térreo	2,57	3,88	3,00	9,97	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre massa	Não	2	Há fiações expostas.
Sala de Professores - Térreo	3,62	6,14	3,00	17,74	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre massa	Não	2	Utilização de "T" para microondas e geladeira.
Circulação Lavanderia - Térreo	1,23	6,37	3,00	7,84	Alvenaria	Granilite	Azulejo / Pintura sobre massa	Não	0	
Lavanderia - Térreo	1,18	1,83	3,00	2,16	Alvenaria	Cerâmico	Azulejo	Não	2	Ponto de chuveiro desativado, há fiação exposta. Luminária sem fixação.
Copa - Térreo	4,38	1,93	2,59	5,79	Alvenaria	Granilite	Azulejo	Sim. Forro de gesso	0	
Cozinha - Térreo	4,30	7,33	2,60 3,00	31,52	Alvenaria	Cerâmico	Azulejo	Parcial. Forro de gesso	1	Pontos de oxidação na porta. Ponto de infiltração no forro.
Despensa - Térreo	3,00	4,01	3,02	12,03	Alvenaria	Cerâmico	Azulejo	Não	0	
Circulação Sanitário - Térreo	3,60	1,02	3,00	3,67	Alvenaria	Granilite	Azulejo / Pintura sobre massa	Não	1	Granilite próximo ao ralo linear danificado.
Circulação - Pav. Superior	24,10	3,42	variável	72,39	Alvenaria	Granilite	Azulejo / Pintura sobre massa	Não	2	Há fiações expostas. Revisar quadro de luz. Fissura no granilite próximo a junta de dilatação.
Escada 1	7,10	1,68	-	11,93	-	Granilite	-	-	0	
Escada 2	3,00	2,46	-	7,38	Alvenaria	Granilite	Azulejo / Pintura sobre massa	Não	2	Infiltração na laje.

Salas de Aula

Ambiente	Comprimento (m)	Largura (m)	Pé Direito (m)	Área (m²)	Tipo de Construção	Revestimento de Piso	Revestimento de Parede	Possui Forro? Se sim, qual tipo?	Nível de Comprometimento do Ambiente	Observações
Sala de Aula 1 - Pav. Superior	7,05	7,00	3,15	49,35	Alvenaria	Cerâmico	Azulejo / Pintura sobre massa	Não	2	Todas as janelas com dificuldade de abrir e fechar.

CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL												
Sala de Aula 2 - Pav. Superior	7,05	7,00	3,15	49,35	Alvenaria	Cerâmico	Azulejo / Pintura sobre massa	Não	**2**	Infiltração na laje e parede. Fissura no encontro estrutura x parede. Revisar quadro de luz.		
Sala de Aula 3 - Pav. Superior	7,05	7,00	3,15	49,35	Alvenaria	Cerâmico	Azulejo / Pintura sobre massa	Não	**2**	Infiltração na laje e parede. Fissura no encontro estrutura x parede; necessidade de revisão da vedação das torneiras (foto 52)		
Sala de Aula 4 - Pav. Superior	7,05	7,00	3,15	49,35	Alvenaria	Cerâmico	Azulejo / Pintura sobre massa	Não	**2**			
Sala de Aula 5 - Pav. Superior	7,05	7,00	3,15	49,35	Alvenaria	Cerâmico	Azulejo / Pintura sobre massa	Não	**2**	Piso danificado.		
Sala de Aula 6 - Pav. Superior	7,05	7,00	3,15	49,35	Alvenaria	Cerâmico	Azulejo / Pintura sobre massa	Não	**3**	Infiltração na laje e com mofo. Fissura entre estrutura e parede; piso cerâmico danificado (foto 59)		
Sala de Aula 7 - Pav. Superior	7,05	7,00	3,15	49,35	Alvenaria	Cerâmico	Azulejo / Pintura sobre massa	Não	**3**	Infiltração na laje e com mofo. Fissura entre estrutura e parede; piso cerâmico danificado (foto 64)		
Sala de Aula 8 - Pav. Superior	7,05	7,00	3,15	49,35	Alvenaria	Cerâmico	Azulejo / Pintura sobre massa	Não	**2**	Infiltração na laje e com mofo; piso cerâmico danificado (foto 67)		
Sala de Aula 9 - Térreo	7,00	6,20	3,00	43,40	Alvenaria	Cerâmico	Azulejo / Pintura sobre massa	Não	**2**	Há Fiação exposta.		
Sanitários										**Informações Complementares**		
Ambiente	Comprimento (m)	Largura (m)	Pé Direito (m)	Área (m²)	Revestimento de Piso	Revestimento de Parede	Possui Forro? Se sim, qual tipo?	Observações	Nível de Comprometimento do Ambiente	Quant. Vasos Sanitários	Quant. Cubas e trocadores	Quant. Chuveiros
Banho e Troca (AVE) - Térreo	2,07	1,91	3,04	3,95	Cerâmico	Azulejo	Não	Há 1 trocador	**0**	0	0 / 1	1
Sanitário Funcionário Fem. - Térreo	2,07	2,98	3,07	6,17	Cerâmico	Azulejo	Não	Infiltração ao redor do vaso sanitário.	**2**	3	2	0
Sanitário Funcionário Masc - Térreo	2,08	0,94	3,04	1,96	Cerâmico	Azulejo	Não		**0**	1	1	0
Vestiário - Térreo	1,19	3,08	3,00	3,67	Cerâmico	Azulejo	Não		**0**	0	0	0
Sanitário Aluno Unissex - Térreo	2,65	1,95	3,00	5,17	Cerâmico	Azulejo	Não	Infiltração ao redor do vaso sanitário.	**2**	3	2	0
Sanitário Aluno PCD Unissex- Térreo	1,67	1,93	3,08	3,22	Cerâmico	Azulejo	Não	Há 1 trocador	**0**	1	1 / 1	0
Sanitário Aluno Fem. - Pav. Superior	4,58	1,63	2,64	7,47	Cerâmico	Azulejo	Sim. Gesso acartonado	Há 4 cubas com 3 torneiras na circulação que são compartilhadas entre os sanitários. Dentro do sanitáiro não há lavatório. Infiltração ao redor do vaso sanitário.	**2**	5	0	0
Sanitário Aluno Masc. - Pav. Superior	4,45	1,60	2,62	7,12	Cerâmico	Azulejo	Sim. Gesso acartonado	Há 4 cubas com 3 torneiras na circulação que são compartilhadas entre os sanitários. Dentro do sanitáiro não há lavatório. Mancha de infiltração no forro.	**2**	5	0	0
Informações Adicionais												

CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL									
Ambiente	Necessário adequar ou implantar? (SIM / NÃO / NÃO SE APLICA)	Informações Complementares							Observações
Fechamento do lote (muro, cerca, gradil, vegetação)	SIM	Muro		Área (m²)	445,26	Gradil	Área (m²)	85,71	Alambrados com pontos de ferrugem, necessita reforma (foto 91)
Estacionamento(s)	NÃO	Área (m²)		237,00					Existe um espaço pavimentado onde guardam carros
Playground (Sim ou Não)	NÃO	Área (m²)		724,00					Há 2 playgrounds.
Tanque de Areia (Sim ou Não)	NÃO	Área Cúbica (m³)		-					
Calçadas (Sim ou Não?)	NÃO								
Serralherias (Portões, travas e outros)	SIM								Revisar fixação do corrimão da rampa de entrada da escola.
Alarmes e sensores (Sim ou Não?)	NÃO								
Câmeras de segurança (Sim ou Não?)	SIM								Possui 32 cameras. Será padronizada.
Rede de gás na testada? (Sim ou Não)	NÃO								

Observações Gerais:	**Trata-se de uma EMEI sem acessibilidade nem AVCB. Houve troca de telhado total em 2025, porem foi observado infiltração pela cobertura. Segundo a diretora, ainda está na garantia para revisar. Há 2 cadeirantes na escola que necessita de elevador, porem a porta não fecha, e dá "trancos" ao utilizar. Iluminação de emergência muito precária, necessitando uso da lanterna ao utilizar. O guarda corpo da escada de acesso a cobertura não tem proteção lateral (foto 74). Há infiltração pela fissura entre estrutura e parede.**

FICHA 4 - DIAGNÓSTICO DE ASPECTOS DE INFRAESTRUTURA PREDIAL DAS UNIDADES ESCOLARES			
Item	**Descrição dos Itens Avaliados**	**Necessidade de Intervenção**	**Observações**
1. Infraestrutura da Escola			
Condições das fundações, pilares, vigas, lajes, cobertura, estruturas metálicas, paredes, esquadrias e pisos			
1.1	Fundações: verificar se há rachaduras, trincas, fissuras, desplacamentos ou quaisquer sinais de falhas na fundação que possam comprometer a estabilidade do prédio	NÃO	
1.2	Pilares: verificar se há rachaduras, trincas, fissuras, desplacamentos ou quaisquer sinais de falhas nos pilares que possam comprometer a estabilidade do prédio	NÃO	
1.3	Vigas: verificar se há rachaduras, trincas, fissuras, desplacamentos ou quaisquer sinais de falhas nas vigas que possam comprometer a estabilidade do prédio	NÃO	
1.4	Lajes: verificar se há rachaduras, trincas, fissuras, desplacamentos ou quaisquer sinais de falhas nas lajes que possam comprometer a estabilidade do prédio	NÃO	
1.5	Cobertura: verificar se há sinais de infiltração, vazamentos, telhas soltas ou outras falhas que possam causar danos à estrutura da escola	SIM	Apesar da substituição recente da cobertura por telhas metálicas com tratamento termoacústico, os pontos de fixação parafusados não apresentam vedação com arruelas de borracha.
1.6	Estruturas metálicas: verificar se há sinais de problemas nas estruturas metálicas, como corrosão ou deformação	NÃO	
1.7	Paredes: verificar se há sinais de problemas nas paredes, como rachaduras, infiltrações ou umidade excessiva	SIM	Verificado pontos de infiltração nas paredes no encontro viga x alvenaria
1.8	Esquadrias: verificar se há problemas nas esquadrias, tais como falta de peças, corrosão, vidros quebrados e dificuldade de manuseio	SIM	Comprometimento da funcionalidade das esquadrias, com dificuldade de abertura e fechamento.
1.9	Pisos: verificar se há sinais de problemas nos pisos, como desníveis, rachaduras ou solturas de revestimento	SIM	no geral encontra-se em bom estado, com fissuras pontuais na circulação e peças danificadas em algumas salas de aula
2. Instalações Elétricas e Hidráulicas			
Condições das instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias			
2.1	Instalações elétricas: verificar se as instalações elétricas estão em conformidade com as normas de segurança, se há fios expostos, equipamentos com defeito ou outros problemas que possam representar risco de incêndio ou choque elétrico. verificar também se o quadro de energia está em bom estado e se as tomadas e interruptores estão funcionando corretamente	SIM	Caixa de passagem sem acabamento. Necessário revisar quadros de luz. Há tomadas no padrão antigo.
2.2	Instalações hidráulicas: verificar se as instalações hidráulicas estão em bom estado, sem vazamentos, rachaduras ou outros problemas que possam prejudicar o funcionamento do sistema. verificar também se as torneiras, registros e outros componentes estão em bom estado e se o sistema de esgoto está funcionando corretamente	SIM	Verificar vazamentos em vasos sanitários e vedação das toneiras
2.3	Instalações sanitárias: verificar se as instalações sanitárias estão em bom estado, sem vazamentos, rachaduras ou outros problemas que possam prejudicar o funcionamento do sistema. verificar também se as louças sanitárias, como vasos e pias, estão em bom estado e se os ralos estão desobstruídos	SIM	Há infiltração no entorno dos vasos sanitários.
2.4	Reservatórios de água: verificar se os reservatórios de água estão em bom estado, sem vazamentos ou outros problemas que possam prejudicar o funcionament do sistema de abastecimento	NÃO	

CAIXA

FICHA 4 - DIAGNÓSTICO DE ASPECTOS DE INFRAESTRUTURA PREDIAL DAS UNIDADES ESCOLARES			
Item	**Descrição dos Itens Avaliados**	**Necessidade de Intervenção**	**Observações**
3. Acessibilidade			
Condições de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida			
3.1	Rampas de acesso: verificar se há rampas de acesso em bom estado e com inclinação adequada	SIM	Rampa recentemente reformada, contudo apresenta necessidade de manutenção nos corrimãos duplos e ausência de piso tátil.
3.2	Elevadores: verificar se há elevadores em bom estado e se estão em conformidade com as normas de acessibilidade	SIM	Problemas recorrentes no elevador, com falhas no sistema de fechamento das portas.
3.3	Banheiros adaptados: verificar se há banheiros adaptados em bom estado e se estão em conformidade com as normas de acessibilidade	SIM	Existe sanitário acessibilizado
4. Condições de Habitabilidade			
Condições de ventilação e iluminação natural e artificial e conforto térmico dos ambientes			
4.1	Condições gerais de habitabilidade e conforto térmico por setor (salas de aulas, outros ambientes pedagógicos, ambientes administrativos, cozinha e refeitório, etc.)	NÃO	
5. Áreas Externas/Paisagismo			
Condições de adequabilidade das áreas externas da escola			
5.1	Condições Gerais do Paisagismo na Unidade Educacional	NÃO	
5.2	Drenagem: verificar se a drenagem da área externa da escola está funcionando corretamente, evitando acúmulo de água em dias de chuva	NÃO	
5.3	Pintura externa: verificar se a pintura externa da escola está em bom estado, sem descascamentos ou sinais de desgaste	NÃO	

Profissional Responsável
Nome: Hatsumi Ito Chida
Cargo/função: Arquiteta
CREA/CAU: A 2374-4

Responsável pela validação CAIXA
Nome: Decio de Souza Espindola
Cargo/função: Engenheiro Civil
CREA/CAU: 5062158870-SP

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEI IGUATEMI

1 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Cód. Unidade	
19593	EMEI IGUATEMI



foto 01: PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA

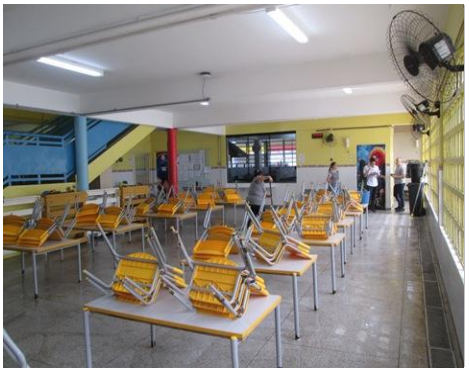


foto 02: REFEITÓRIO - TÉRREO



foto 03: REFEITÓRIO - TÉRREO



foto 04: REFEITÓRIO - TÉRREO



foto 05: REFEITÓRIO - TÉRREO - FIAÇÃO EXPOSTA




foto 06: SECRETARIA - TÉRREO

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI IGUATEMI



foto 07: DEPÓSITO - TÉRREO



foto 08: DEPÓSITO - TÉRREO - TRINCA NA PAREDE



foto 09: DEPÓSITO - TÉRREO - REVESTIMENTO DANIFICADO

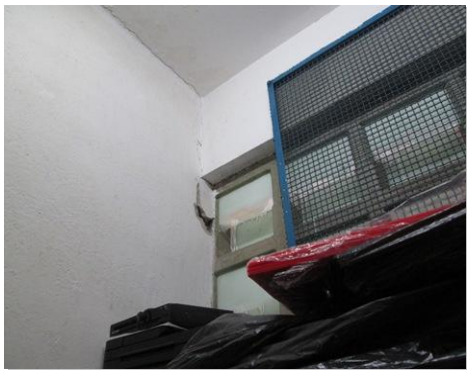


foto 10: DEPÓSITO - TÉRREO - FISSURA NA PAREDE



foto 11: CIRCULAÇÃO DIREÇÃO - TÉRREO



foto 12: CIRCULAÇÃO DIREÇÃO - TÉRREO - UTILIZAÇÃO DE DE CANALETA DE PVC



foto 13: ALMOXARIFADO - TÉRREO



foto 14: ALMOXARIFADO - TÉRREO - SEM ESPELHO. FIAÇÃO EXPOSTA

CAIXA

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI IGUATEMI



foto 15: DIREÇÃO - TÉRREO



foto 16: DIREÇÃO - TÉRREO - UTILIZAÇÃO DE CANALETA EM PVC E FIAÇÃO EXPOSTA



foto 17: COORDENAÇÃO - TÉRREO

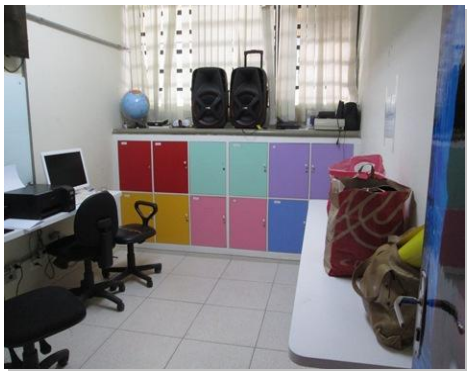


foto 18: JEIF - TÉRREO



foto 19: SALA DOS PROFESSORES - TÉRREO



foto 20: SALA DOS PROFESSORES - TÉRREO - UTILIZAÇÃO DE ADAPTADOR EM TOMADA DE GELADEIRA E MICROONDAS



foto 21: CIRCULAÇÃO LAVANDERIA - TÉRREO




foto 22: LAVANDERIA - TÉRREO

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI IGUATEMI



foto 23: COPA - TÉRREO



foto 24: COZINHA - TÉRREO



foto 25: COZINHA - TÉRREO - RECORTE NO PISO GRANILITE



foto 26: COZINHA - TÉRREO - PORTA OXIDADA



foto 27: COZINHA - TÉRREO - MANCHA DE INFILTRAÇÃO NO FORRO



foto 28: DESPENSA - TÉRREO



foto 29: DESPENSA - TÉRREO - PORTA OXIDADA



foto 30: CIRCULAÇÃO SANITÁRIO - TÉRREO

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI IGUATEMI



foto 31: SALA DE AULA 9 - TÉRREO



foto 32: AVE - TÉRREO



foto 33: AVE - TÉRREO - VIDRO QUEBRADO



foto 34: SANITÁRIO FUNCIONÁRIOS FEMININO - TÉRREO



foto 35: SANITÁRIO FUNCIONÁRIOS MASCULINO - TÉRREO



foto 36: VESTIÁRIO - TÉRREO



foto 37: SANITÁRIO ALUNO UNISSEX - TÉRREO



foto 38: SANITÁRIO ALUNO UNISSEX - TÉRREO - COLORAÇÃO DE PISO DIFERENTE, APARENTA VAZAMENTO

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI IGUATEMI



foto 39: SANITÁRIO ALUNO PCD UNISSEX - TÉRREO



foto 40: QUADRO DE ENERGIA - TÉRREO



foto 41: QUADRO DE ENERGIA - TÉRREO



foto 42: CIRCULAÇÃO - PAVIMENTO SUPERIOR



foto 43: CIRCULAÇÃO - PAVIMENTO SUPERIOR



foto 44: CIRCULAÇÃO - PAVIMENTO SUPERIOR



foto 45: CIRCULAÇÃO - PAVIMENTO SUPERIOR - LAVATÓRIOS



foto 46: CIRCULAÇÃO - PAVIMENTO SUPERIOR - FISSURA NO PISO

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI IGUATEMI



foto 47: SALA DE AULA 1 - PAVIMENTO SUPERIOR

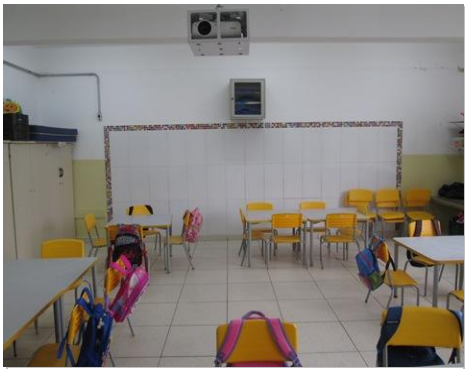


foto 48: SALA DE AULA 2 - PAVIMENTO SUPERIOR



foto 49: SALA DE AULA 2 - PAVIMENTO SUPERIOR - VIDRO QUEBRADO



foto 50: SALA DE AULA 2 - PAVIMENTO SUPERIOR - FISSURA NA PAREDE E MANCHA DE INFILTRAÇÃO



foto 51: SALA DE AULA 3 - PAVIMENTO SUPERIOR



foto 52: SALA DE AULA 3 - PAVIMENTO SUPERIOR - VAZAMENTO NA TORNEIRA



foto 53: SALA DE AULA 3 - PAVIMENTO SUPERIOR - MANCHA DE INFILTRAÇÃO NA PAREDE

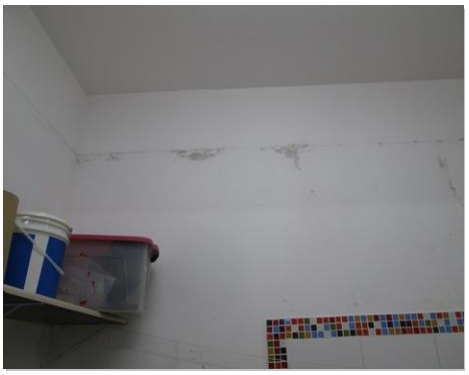


foto 54: SALA DE AULA 3 - PAVIMENTO SUPERIOR - FISSURA NA PAREDE E MANCHA DE INFILTRAÇÃO

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI IGUATEMI



foto 55: SALA DE AULA 4 - PAVIMENTO SUPERIOR



foto 56: SALA DE AULA 5 - PAVIMENTO SUPERIOR



foto 57: SALA DE AULA 5 - PAVIMENTO SUPERIOR - PISO CERÂMICO DANIFICADO



foto 58: SALA DE AULA 6 - PAVIMENTO SUPERIOR



foto 59: SALA DE AULA 6 - PAVIMENTO SUPERIOR - PISO DANIFICADO



foto 60: SALA DE AULA 6 - PAVIMENTO SUPERIOR - MANCHA DE INFILTRAÇÃO NO TETO



foto 61: SALA DE AULA 7 - PAVIMENTO SUPERIOR



foto 62: SALA DE AULA 7 - PAVIMENTO SUPERIOR - TOMADA COM PADRÃO OBSOLETO

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI IGUATEMI



foto 63: SALA DE AULA 7 - PAVIMENTO SUPERIOR - MANCHA DE INFILTRAÇÃO NO TETO



foto 64: SALA DE AULA 7 - PAVIMENTO SUPERIOR - PISO CERÂMICO DANIFICADO



foto 65: SALA DE AULA 8 - PAVIMENTO SUPERIOR



foto 66: SALA DE AULA 8 - PAVIMENTO SUPERIOR - TOMADA COM PADRÃO OBSOLETO



foto 67: SALA DE AULA 8 - PAVIMENTO SUPERIOR - PISO CERÂMICO DANIFICADO



foto 68: SALA DE AULA 8 - PAVIMENTO SUPERIOR - MANCHA DE INFILTRAÇÃO NO TETO



foto 69: SANITÁRIO ALUNO FEMININO - PAVIMENTO SUPERIOR



foto 70: SANITÁRIO ALUNO MASCULINO - PAVIMENTO SUPERIOR

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI IGUATEMI



foto 71: SANITÁRIO ALUNO MASCULINO - PAVIMENTO SUPERIOR - MANCHA DE INFILTRAÇÃO NO TETO



foto 72: ELEVADOR - NÃO FUNCIONA



foto 73: ESCADARIA DE ACESSO AO PAVIMENTO SUPERIOR - PISO TÁTIL NO PATAMAR DESCOLADO



foto 74: ESCADARIA DE ACESSO A COBERTURA



foto 75: FISSURA NA LAJE - HÁ RELATO DA DIRETORA QUE HÁ INFILTRAÇÃO PELA FISSURA QUE EMPOÇA NA ESCADA



foto 76: POÇA DE ÁGUA NO PATAMAR DA ESCADA



foto 77: QUADRO DE ENERGIA - PAVIMENTO SUPERIOR



foto 78: QUADRO DE ENERGIA - PAVIMENTO SUPERIOR

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI IGUATEMI



foto 79: QUADRO DE ENERGIA - PAVIMENTO SUPERIOR



foto 80: QUADRO DE ENERGIA - PAVIMENTO SUPERIOR



foto 81: ACESSO GERAL



foto 82: ACESSO ALUNOS



foto 83: VISTA DOS FUNDOS



foto 84: OBRA EM EXECUÇÃO



foto 85: VISTA LATERAL DIREITA



foto 86: TELHA TERMO ACÚSTICA NOVA

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEI IGUATEMI



foto 87: CALHA DA COBERTURA. FIAÇÃO EXPOSTA



foto 88: RUFO / PINGADEIRA COM PONTOS



foto 89: VISTA GERAL. TUBULAÇÃO DE AP



foto 90: MURETA COM TRINCA . PREVISTO OBRA PARA CORREÇÃO



foto 91: ESTRUTURA DO ALAMBRADO COM FERRUGEM
