CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL

Dados Gerais

Nome da Unidade:	EMEF PROFª DIRCE GENESIO DOS SANTOS		
Sequencial (U.E):	94	**Código da Unidade:**	19615

Endereço da Escola

Logradouro, número e complemento (se houver)	Rua Oscar Muller 135 - Jardim Iguatemi

Descrição do Imóvel

Tipo de Construção (técnica construtiva predominante)	Concreto armado	Padrão:	10. EMEF 18 SALAS MK (PRE MOLDADA)	Nº de Pavimentos	3

Implantação

Área do Terreno (m²)	6.268,00 m²			Área Edificada/ Construída (m²)	3.209,45 m²
Área Pavimentada (m²)	3.853,00 m²			Área Verde / Permeável (m²)	2.415,00 m²
Área da projeção do(s) edifício(s) (m²)	1.421,63 m²	Bloco salas	893,91	Quadra	527,72 m²

Abastecimento

Água							
Forma de abastecimento (rede pública, poço artesiano, sem abastecimento etc.):	rede pública						
Quantidade de reservatório de água	1						
Capacidade por reservatório (L)	não disponível	Constatação		Não Disponível	Projeto	NÃO	
Gás							
Encanado (Sim ou Não)	NÃO	Botijão de Gás (Sim ou Não)		SIM	Quantidade de Botijões de Gás	6 x 45	
Energia Elétrica							
Aparelho Ar condicionado (Sim ou Não)	SIM				Quantidade:	2	
Possui fonte de energia complementar (Sim ou Não)?	NÃO				Qual (por ex. Painel Solar ou outro)?	0	
Possui Gerador de Energia? (Sim ou Não)?	NÃO				Capacidade:	0	
Esgoto							
Rede Pública (Sim ou Não)	SIM				Fossa Séptica (Sim ou Não)	NÃO	
Caixa de Gordura (Sim ou Não)	SIM				Caixa de Passagem (Sim ou Não)	SIM	

Informações sobre Prevenção de Incêndios (AVCB e SPDA)

Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro (Sim ou Não)	SIM	Nº 725195	N/A							
Extintor	SIM	14								
Hidrante	SIM	4								
Sinalização Emergência	SIM	25								
Iluminação Emergência	SIM	14								
Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) (Sim ou Não)	NÃO	Nº	Total (Sim ou N	NÃO	Parcial (Sim ou Não)	SIM				

Acessibilidade

Elevador (Sim ou Não)	SIM			Quantidade:	1	Quant. Ativos/Funcionais:	1
Plataforma Elevatória (Sim ou Não)	NÃO			Quantidade:	0	Quant. Ativos/Funcionais:	0
Rampa de Acesso a Unidade (Sim ou Não)	SIM			Rampa de Acesso a outros espaços necessários (Sim ou Não)			
Tipo de sinalização	SIM	Sonora (Sim ou Não)	SIM	Visual (Sim ou Não)	NÃO	Tátil (Sim ou Não)	SIM
Selo de Acessibilidade (Sim ou Não)	NÃO			Nº			
Vaga de estacionamento para deficientes (Sim ou Não)	SIM				Quantidade:	2	

CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL

Ambientes da Escola

Administrativo e Apoio/Serviços

Ambiente	Comprimento (m)	Largura (m)	Pé Direito (m)	Área (m²)	Tipo de Construção	Revestimento de Piso	Revestimento de Parede	Possui Forro? Se sim, qual tipo?	Nível de Comprometimento do Ambiente	Observações
Secretaria - Térreo	7,00	7,10	2,87	36,74	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre bloco	Não	**2**	Há fiações expostas.
Sala do secretario - Térreo	3,43	3,48	2,87	11,94	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre bloco	Não	**0**	
Circulação 1 - Térreo	1,90	7,15	2,89	11,27	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre bloco	Não	**2**	Há fiações expostas. Caixas de passagem com tampas abertas. Revisar quadro de luz.
Almoxarifado - Térreo	4,95	2,40	2,88	11,88	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre bloco	Não	**1**	Mofo na laje.
Direção - Térreo	5,52	4,52	2,88	19,90	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre bloco	Não	**2**	Caixa de passagem de elétrica sem acabamento, há fiações expostas.
Cozinha - Térreo	6,95	7,10	2,88	49,35	Alvenaria	Cerâmico	Azulejo	Não	**2**	Infiltração na parede atrás das torneiras da circulação.
Despensa - Térreo	6,53	4,64	2,88	30,30	Alvenaria	Cerâmico	Azulejo	Não	**3**	Infiltração e mofo na laje.
Lavanderia - Térreo	2,17	2,27	2,85	4,93	Alvenaria	Cerâmico	Azulejo	Não	**2**	Mofo na laje. Tomada sem fixação, enfiação exposta. Azulejo com fissura.
Circulação 2 - Térreo	6,95	6,95	2,85	8,94	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre bloco	Não	**0**	
Depósito sob escada - Térreo	4,35	3,15	variável	15,17					**N/A**	Sem chave
Copa dos funcionários - Térreo	4,53	4,90	2,88	20,74	Alvenaria / Divisória	Cerâmico	Pintura sobre bloco / Divisória	Não	**2**	Improviso de elétrica (microondas e geladeira ligadas em uma régua). Botijão dentro do ambiente.
Sala material ed. Física - Térreo	5,50	1,68	variável	314,41	Alvenaria / Divisória	Cerâmico	Pintura sobre bloco / Divisória	Não	**2**	Tomada sem acabamento, enfiação exposta.
Refeitório - Térreo	14,15	21,40	2,88	164,78	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre bloco	Não	**2**	Infiltração parede e piso próximo a pontos de água e ralo. Pintura descascando. Há fiações expostas. Revisar quadro de luz.
Circulação 3 - 1º Pav.	33,60	7,00	2,90	235,20	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre bloco	Não	**2**	Revisar quadro de luz. Revestimento da estrutura fissurando. Canaleta elétrica de pvc danificado, fiação exposta.
Depósito 1 - 1º Pav.	1,20	7,00	2,90	8,40	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre bloco	Não	**0**	
Projeto Apoio Pedagógico - (PAP) - 1º Pav.	2,23	7,00	2,90	15,61	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre bloco	Não	**2**	Não há tomadas neste ambiente, improviso com extensões e réguas.
Coordenação Pedagógica 1 - 2º Pav.	4,33	5,80	3,10	25,11	Alvenaria / Divisória	Cerâmico	Pintura sobre bloco / Divisória	Não	**1**	Fissura na parede. Infiltração parede.
Coordenação Pedagógica 2 - 2º Pav.	2,62	5,80	3,10	15,20	Alvenaria / Divisória	Cerâmico	Pintura sobre bloco / Divisória	Não	**2**	Há fiações expostas. Infiltração no teto.
Depósito 2 - 2º Pav.	1,20	5,67	3,10	6,80	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre bloco	Não	**2**	Infiltração, mofo na parede.
Sala do grêmio - 2º Pav.	3,45	5,80	3,10	20,01	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre bloco	Não	**1**	Fissura na parede.
Sala de Material Pedagógico - 2º Pav.	3,45	5,80	3,10	158,31	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre bloco	Não	**2**	Infiltração teto. Improviso de elétrica com régua. Fissura na parede.
Circulação 4 - 2º Pav.	15,58	7,00	3,10	109,06	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre bloco	Não	**2**	Azulejo atrás do bebedouro danificado. Revisar quadro de luz. Azulejo descolando.

CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL										
Sala dos Professores - 2º Pav.	7,00	5,80	3,10	40,60	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre bloco	Não	2	Infiltração na parede. Improviso de elétrica com utilização de régua (2 microondas ligados). Há fiações expostas.
Varanda Grêmio - 2º Pav.	7,00	2,95	3,10	20,65	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre bloco	Não	0	
Varanda Sala de Aula 16 - 2º Pav.	7,00	2,95	3,10	20,65	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre bloco	Não	0	
Varanda Coordenação - 2º Pav.	7,00	2,95	3,10	20,65	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre bloco	Não	0	
Varanda Sala de Aula 11 - 2º Pav.	7,00	2,95	3,10	20,65	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre bloco	Não	2	Infiltração parede.
Varanda Sala de Aula 12 - 2º Pav.	7,00	2,95	3,10	20,65	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre bloco	Não	2	Infiltração, pintura descascando, mofo na parede e teto
Varanda Sala dos Professores - 2º Pav.	7,00	2,95	3,10	20,65	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre bloco	Não	0	
Escada 1 - 2º Pav.	4,63	3,52	-	16,30	-	Granilite	-	Não	1	Fissura entre a estrutura da escada e alvenaria do depósito.
Escada 2 - 2º Pav.	4,63	3,52	-	16,30	-	Granilite	-	Não	0	
Escada 3 - 2º Pav.	4,63	3,52	-	16,30	-	Granilite	-	Não	0	
Quadra coberta	18,52	28,50	variável	527,82	Alvenaria / estrutura metálica	Cimentado	Pintura sobre massa / alambrado	Telhado	1	Pilaretes encontram-se enferrujados
Quadra descoberta	28,33	19,15	-	542,52	Alvenaria / alambrado	Cimentado	Pintura sobre massa / alambrado	-	1	Fissura no piso da quadra
Salas de Aula										
Ambiente	Comprimento (m)	Largura (m)	Pé Direito (m)	Área (m²)	Tipo de Construção	Revestimento de Piso	Revestimento de Parede	Possui Forro? Se sim, qual tipo?	Nível de Comprometimento do Ambiente	Observações
Sala de Aula 1 - 1º Pav.	7,00	7,05	2,90	49,35	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre bloco	Não	1	Infiltração parede.
Sala de Aula 2 - 1º Pav.	7,00	7,05	2,90	49,35	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre bloco	Não	2	Revestimento da viga danificada.
Sala de Aula 3 - 1º Pav.	7,00	7,05	2,75	49,35	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre bloco	Sim. Forro de gesso	2	Tomada sem acabamento, enfiação exposta.
Sala de Aula 4 - 1º Pav.	7,00	7,05	2,90	49,35	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre bloco	Não	1	Piso danificado.
Sala de Aula 5 - 1º Pav.	7,00	7,05	2,90	49,35	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre bloco	Não	2	Fissura na laje, pintura estufando.
Sala de Aula 6 - 1º Pav.	7,00	7,05	2,90	49,35	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre bloco	Não	2	Infiltração parede.
Sala de Aula 7 - 1º Pav.	7,00	7,05	2,90	49,35	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre bloco	Não	0	
Sala de Aula 8 - 1º Pav.	7,00	7,05	2,90	49,35	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre bloco	Não	0	
Sala de Aula 9 - 1º Pav.	7,00	7,05	2,90	49,35	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre bloco	Não	1	Infiltração parede, pintura estufando. Fissura na parede.
Sala de Aula 10 - 1º Pav.	7,00	7,05	2,90	49,35	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre bloco	Não	0	
Sala de Aula 11 - 2º Pav.	7,00	5,80	3,10	40,60	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre bloco	Não	2	Revisar qudro de luz.
Sala de Aula 12 - 2º Pav.	7,00	5,80	3,10	40,60	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre bloco	Não	0	

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL												
Sala de Aula 13 - 2º Pav.	7,00	7,05	3,10	49,35	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre bloco	Não	2	Infiltração na laje. Improviso de elétrica com régua.		
Sala de Aula 14 - 2º Pav.	5,73	7,00	3,10	40,11	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre bloco	Não	1	Tubo corrugado no teto mal fixado.		
Sala de Aula 15 - 2º Pav.	7,00	7,05	3,10	49,35	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre bloco	Não	1	Revestimento próximo a batente danificado. Infiltração parede. Fissura no revestimento da viga.		
Sala de Aula 16 - 2º Pav.	7,00	5,80	3,10	40,60	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre bloco	Não	2	Caixa de passagem de elétrica sem acabamento, há fiações expostas. Fissura no revestimento da viga.		
Laboratório Educação Digital (LED) - 2º Pav.	7,00	7,05	3,10	49,35	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre bloco	Não	2	2 A.C. instalados, um deles está com mal funcionamento.Há fiações expostas. Fissura no revistimento da viga. Revisar quadro de luz. Improviso de elétrica com regua.		
Sala de Leitura - 2º Pav.	7,00	7,05	3,10	49,35	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre bloco	Não	2	Há fiações expostas.		
Sala de Aula 17 - Térreo	7,00	7,05	2,50	49,35	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre bloco	Não	2	Infiltração na parede. Há fiações expostas. Tomadas sem acabamento.		
Sala Multiuso - Térreo	7,00	7,00	2,88	49,00	Alvenaria	Cerâmico	Pintura sobre bloco	Não	2	há fiações expostas.		
Sanitários										**Informações Complementares**		
Ambiente	Comprimento (m)	Largura (m)	Pé Direito (m)	Área (m²)	Revestimento de Piso	Revestimento de Parede	Possui Forro? Se sim, qual tipo?	Observações	Nível de Comprometimento do Ambiente	Quant. Vasos Sanitários	Quant. Cubas e trocadores	Quant. Chuveiros
Sanitário Funcionário Masc. - Térreo	1,18	1,70	2,89	2,01	Cerâmico	Azulejo	Não	Infiltração ao redor do vaso sanitário.	2	1	1	1
Sanitário Funcionário Fem. - Térreo	1,18	1,56	2,89	1,84	Cerâmico	Azulejo	Não	Infiltração ao redor do vaso sanitário.	2	1	1	0
Sanitário Aluno PCD UNISSEX - Térreo	1,64	1,70	2,64	2,79	Cerâmico	Azulejo	Sim. Forro de gesso		0	1	1	0
Sanitário Aluno Fem. - Térreo	6,94	3,30	2,66	18,74	Cerâmico	Azulejo	Sim. Forro de gesso	Azulejo danificado.	1	6	3	
Sanitário Aluno Masc. - Térreo	6,94	3,30	2,66	17,82	Cerâmico	Azulejo	Sim. Forro de gesso		0	6	3	
WC Func. (virou DML) - Térreo	2,18	2,15	2,85	4,69	Cerâmico	Azulejo	Não		0	1	0	0
Vestiário - Térreo	2,20	2,16	2,85	4,75	Cerâmico	Azulejo	Não	Caixa de passagem de elétrica fica mais baixo do que o ponto do chuveiro, não tem acabamento, enfiação exposta. Infiltração ao redor da descarga hydra.	4	1	1	1
Sanitário Aluno PCD Feminino - 1º Pav.	1,69	1,51	2,68	2,55	Cerâmico	Azulejo	Sim. Forro de gesso		0	1	1	0
Sanitário Aluno Masc. - 1º Pav.	2,52	1,96	2,69	4,94	Cerâmico	Azulejo	Sim. Forro de gesso	Azulejo ao redor do batente danificado. Mancha de infiltração no forro.	2	2	2	0
Sala das AVE - 1º Pav.	2,58	1,96	2,65	5,06	Cerâmico	Azulejo	Sim. Forro de gesso	Há 1 trocador. Infiltração no forro.	1	0	0 / 1	0
Sanitário Funcionário Fem. - 1º Pav.	0,97	1,98	2,60	1,92	Cerâmico	Azulejo	Sim. Forro de gesso	Fissura nos azulejos. Infiltração ao redor da descarga hydra.	2	1	1	0
Sanitário Funcionário Masc. - 1º Pav.	0,96	1,98	2,70	1,90	Cerâmico	Azulejo	Sim. Forro de gesso	Fissura nos azulejos. Piso sem caimento para o ralo.	2	1	1	0
Sanitário Aluno PCD UNISSEX - 2º Pav.	1,72	1,64	3,10	2,82	Cerâmico	Azulejo	Não		0	1	1	0

CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL												
Sanitário Func. Masc. - 2º Pav.	0,97	2,01	3,10	1,95	Cerâmico	Azulejo	Não	Fissura no azulejo. Acabamento do interruptor danificado.	**1**	1	1	0
Sanitário Aluno Fem. 1 - 2º Pav.	0,96	1,98	3,10	1,90	Cerâmico	Azulejo	Não	Fissura no azulejo.	**1**	1	1	0
Sanitário Aluno Masc. - 2º Pav.	2,52	2,01	3,10	5,07	Cerâmico	Azulejo	Não	Há 2 mictórios	**0**	2	1	0
Sanitário Aluno Fem. 2 - 2º Pav.	2,54	1,98	3,10	5,03	Cerâmico	Azulejo	Não	Fissura no azulejo.	**1**	2	2	0

Informações Adicionais

Ambiente	Necessário adequar ou implantar? (SIM / NÃO / NÃO SE APLICA)	Informações Complementares							Observações
Fechamento do lote (muro, cerca, gradil, vegetação)	NÃO	Muro		Área (m²)	294,35	Gradil	Área (m²)	483,00	
Estacionamento(s)	NÃO	Área (m²)		719,22					
Playground (Sim ou Não)	NÃO	Área (m²)		137,93					
Tanque de Areia (Sim ou Não)	NÃO	Área Cúbica (m³)		-					
Calçadas (Sim ou Não?)	SIM								A diretora solicita uma calçada rampada próximo a acesso da administração.
Serralherias (Portões, travas e outros)	SIM								Corrimão na rampa de acesso a quadra coberta amassada.
Alarmes e sensores (Sim ou Não?)	SIM								Tem alarme contra furtos
Câmeras de segurança (Sim ou Não?)	SIM								Necessário nas quadras. Será padronizada.
Rede de gás na testada? (Sim ou Não)	NÃO								

Observações Gerais:	**Trata-se de uma escola com quase mil alunos. Tem AVCB. A portinhola de atendimento da cozinha / refeitório é pequena/restrita, a escola solicita portinhola maior de vidro. Solicita aumentar área do estacionamento, e execução de calçada rampada entre a entrada da escola e portão do estacionamento. Revisar vidro das janelas danificadas. Revisão total na elétrica. Disjuntor desarma com frequência, independente dos dias de chuva. Com chuva é pior. Não consegue fazer funcionar ao mesmo tempo os computadores com quadra e administração com quadra, apesar da quadra ter passado por reforma em 2023. Solicita cobertura na rampa de acesso e em frente a atendimento da secretaria.**

CAIXA

FICHA 4 - DIAGNÓSTICO DE ASPECTOS DE INFRAESTRUTURA PREDIAL DAS UNIDADES ESCOLARES			
Item	**Descrição dos Itens Avaliados**	**Necessidade de Intervenção**	**Observações**
1. Infraestrutura da Escola			
Condições das fundações, pilares, vigas, lajes, cobertura, estruturas metálicas, paredes, esquadrias e pisos			
1.1	Fundações: verificar se há rachaduras, trincas, fissuras, desplacamentos ou quaisquer sinais de falhas na fundação que possam comprometer a estabilidade do prédio	NÃO	
1.2	Pilares: verificar se há rachaduras, trincas, fissuras, desplacamentos ou quaisquer sinais de falhas nos pilares que possam comprometer a estabilidade do prédio	NÃO	
1.3	Vigas: verificar se há rachaduras, trincas, fissuras, desplacamentos ou quaisquer sinais de falhas nas vigas que possam comprometer a estabilidade do prédio	NÃO	
1.4	Lajes: verificar se há rachaduras, trincas, fissuras, desplacamentos ou quaisquer sinais de falhas nas lajes que possam comprometer a estabilidade do prédio	NÃO	
1.5	Cobertura: verificar se há sinais de infiltração, vazamentos, telhas soltas ou outras falhas que possam causar danos à estrutura da escola	NÃO	
1.6	Estruturas metálicas: verificar se há sinais de problemas nas estruturas metálicas, como corrosão ou deformação	SIM	Trechos de oxidação e corrosão nas terças metálicas e pilares da estrutura da cobertura da Quadra Poliesportiva coberta.
1.7	Paredes: verificar se há sinais de problemas nas paredes, como rachaduras, infiltrações ou umidade excessiva	SIM	Fissuras pontuais e infiltrações na base das paredes externas da edificação.
1.8	Esquadrias: verificar se há problemas nas esquadrias, tais como falta de peças, corrosão, vidros quebrados e dificuldade de manuseio	SIM	Comprometimento da funcionalidade das esquadrias, com dificuldade de abertura e fechamento.
1.9	Pisos: verificar se há sinais de problemas nos pisos, como desníveis, rachaduras ou solturas de revestimento	SIM	Fissuras no piso próximo à Quadra Poliesportiva coberta e nas arquibancadas, incluindo os espelhos.
2. Instalações Elétricas e Hidráulicas			
Condições das instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias			
2.1	Instalações elétricas: verificar se as instalações elétricas estão em conformidade com as normas de segurança, se há fios expostos, equipamentos com defeito ou outros problemas que possam representar risco de incêndio ou choque elétrico. verificar também se o quadro de energia está em bom estado e se as tomadas e interruptores estão funcionando corretamente	SIM	Caixa de passagem sem acabamento. Necessário revisar quadros de luz. Há tomadas no padrão antigo.
2.2	Instalações hidráulicas: verificar se as instalações hidráulicas estão em bom estado, sem vazamentos, rachaduras ou outros problemas que possam prejudicar o funcionamento do sistema. verificar também se as torneiras, registros e outros componentes estão em bom estado e se o sistema de esgoto está funcionando corretamente	NÃO	
2.3	Instalações sanitárias: verificar se as instalações sanitárias estão em bom estado, sem vazamentos, rachaduras ou outros problemas que possam prejudicar o funcionamento do sistema. verificar também se as louças sanitárias, como vasos e pias, estão em bom estado e se os ralos estão desobstruídos	SIM	Há vazamento entorno dos vasos sanitários.
2.4	Reservatórios de água: verificar se os reservatórios de água estão em bom estado, sem vazamentos ou outros problemas que possam prejudicar o funcionament do sistema de abastecimento	SIM	Pontos de infiltração no topo das paredes da Torre do Reservatório de Água.

FICHA 4 - DIAGNÓSTICO DE ASPECTOS DE INFRAESTRUTURA PREDIAL DAS UNIDADES ESCOLARES			
Item	**Descrição dos Itens Avaliados**	**Necessidade de Intervenção**	**Observações**
3. Acessibilidade			
Condições de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida			
3.1	Rampas de acesso: verificar se há rampas de acesso em bom estado e com inclinação adequada	SIM	Com exceção da rampa de acesso destinada a professores e pais, em conformidade com a ABNT NBR 9050, não há acesso por rampa para alunos, sendo que as demais rampas de acesso à Quadra Poliesportiva coberta não atendem à referida norma quanto aos corrimãos, que demandam manutenção, e à ausência de piso tátil.
3.2	Elevadores: verificar se há elevadores em bom estado e se estão em conformidade com as normas de acessibilidade	NÃO	
3.3	Banheiros adaptados: verificar se há banheiros adaptados em bom estado e se estão em conformidade com as normas de acessibilidade	NÃO	
4. Condições de Habitabilidade			
Condições de ventilação e iluminação natural e artificial e conforto térmico dos ambientes			
4.1	Condições gerais de habitabilidade e conforto térmico por setor (salas de aulas, outros ambientes pedagógicos, ambientes administrativos, cozinha e refeitório, etc.)	NÃO	
5. Áreas Externas/Paisagismo			
Condições de adequabilidade das áreas externas da escola			
5.1	Condições Gerais do Paisagismo na Unidade Educacional	SIM	Vegetação (grama) com altura excessiva nos jardins.
5.2	Drenagem: verificar se a drenagem da área externa da escola está funcionando corretamente, evitando acúmulo de água em dias de chuva	NÃO	
5.3	Pintura externa: verificar se a pintura externa da escola está em bom estado, sem descascamentos ou sinais de desgaste	SIM	Desgaste generalizado da pintura nas paredes externas e nos muros, bem como nos pisos localizados nas proximidades da Quadra Poliesportiva coberta.

Profissional Responsável
Nome: Hatsumi Ito Chida
Cargo/função: Arquiteta
CREA/CAU: A 2374-4

Responsável pela validação CAIXA
Nome: Decio de Souza Espindola
Cargo/função: Engenheiro Civil
CREA/CAU: 5062158870-SP

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEF PROFª DIRCE GENESIO DOS SANTOS

1 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Cód. Unidade	
19615	EMEF PROFª DIRCE GENESIO DOS SANTOS

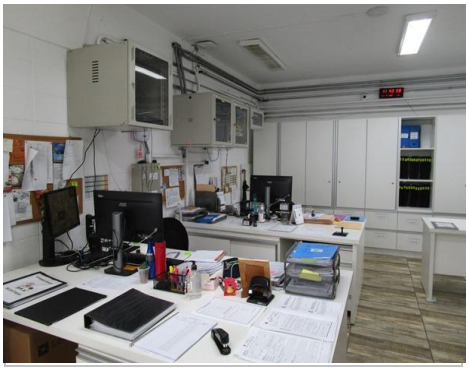


foto 01: SECRETARIA - TÉRREO



foto 02: SALA DO SECRETÁRIO - TÉRREO



foto 03: CIRCULAÇÃO 1 - TÉRREO



foto 04: ALMOXARIFADO - TÉRREO - MANCHA DE INFILTRAÇÃO NO TETO



foto 05: DIREÇÃO - TÉRREO



foto 06: COZINHA - TÉRREO

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF PROFª DIRCE GENESIO DOS SANTOS



foto 07: COZINHA - TÉRREO - PISO COM COLORAÇÃO DIFERENTE



foto 08: COZINHA - TÉRREO - FISSURA NA PAREDE



foto 09: COZINHA - TÉRREO - FALTA FRONTÃO E CALAFETE NA BANCADA



foto 10: COZINHA - TÉRREO - AZULEJO COM COLORAÇÃO DIFERENTE



foto 11: DESPENSA - TÉRREO



foto 12: DESPENSA - TÉRREO - MANCHA DE INFILTRAÇÃO NO TETO



foto 13: LAVANDERIA - TÉRREO



foto 14: CIRCULAÇÃO 2 - TÉRREO

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF PROFª DIRCE GENESIO DOS SANTOS



foto 15: CIRCULAÇÃO 2 - TÉRREO



foto 16: CIRCULAÇÃO 2 - TÉRREO



foto 17: CIRCULAÇÃO 2 - TÉRREO - PISO COM COLORAÇÃO DIFERENTE



foto 18: CIRCULAÇÃO 2 - TÉRREO - CANALETA EM PVC COM FIAÇÃO EXPOSTA



foto 19: DEPÓSITO SOB ESCADA - TÉRREO - SEM CHAVE



foto 20: COPA DOS FUNCIONÁRIOS - TÉRREO



foto 21: COPA DOS FUNCIONÁRIOS - TÉRREO - UTILIZAÇÃO DE EXTENSÃO PARA O MICROONDAS



foto 22: COPA DOS FUNCIONÁRIOS - TÉRREO - UTILIZAÇÃO DE BOTIJÃO

CAIXA

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF PROFª DIRCE GENESIO DOS SANTOS



foto 23: SALA MATERIAIS ED. FÍSICA - TÉRREO



foto 24: SALA MATERIAIS ED. FÍSICA - TÉRREO



foto 25: SALA MATERIAIS ED. FÍSICA - TÉRREO - FALTA ESPELHO DA TOMADA. FIAÇÃO EXPOSTA. TOMADA PADRÃO OBSOLETO



foto 26: REFEITÓRIO - TÉRREO



foto 27: REFEITÓRIO - TÉRREO

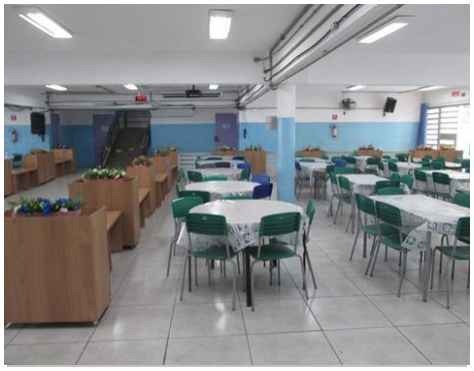


foto 28: REFEITÓRIO - TÉRREO



foto 29: 29-REFEITÓRIO - TÉRREO - PISO COM COLORAÇÃO DIFERENTE



foto 30: REFEITÓRIO - TÉRREO - INFILTRAÇÃO NA PAREDE

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF PROFª DIRCE GENESIO DOS SANTOS



foto 31: REFEITÓRIO - TÉRREO - FALTA TAMPA DA CAIXA DE PASSAGEM



foto 32: SALA DE AULA 17 - TÉRREO

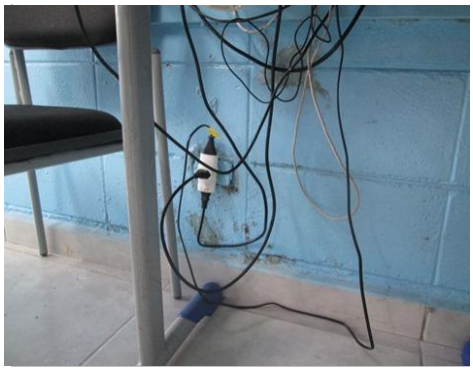


foto 33: SALA DE AULA 17 - TÉRREO - UTILIZAÇÃO DE ADAPTADOR



foto 34: SALA DE AULA 17 - TÉRREO - MANCHA DE INFILTRAÇÃO NA PAREDE



foto 35: SALA DE AULA 17 - TÉRREO - FIAÇÃO EXPOSTA

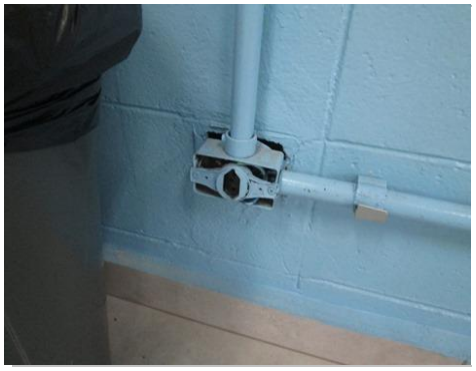


foto 36: SALA DE AULA 17 - TÉRREO - FALTA ESPELHO NA CAIXA DE PASSAGEM



foto 37: SALA MULTIUSO - TÉRREO



foto 38: SALA MULTIUSO - TÉRREO - PISO CERÂMICO DANIFICADO

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF PROFª DIRCE GENESIO DOS SANTOS



foto 39: SALA MULTIUSO - TÉRREO - FIAÇÃO EXPOSTA



foto 40: SANITÁRIO FUNCIONÁRIO MASCULINO - TÉRREO

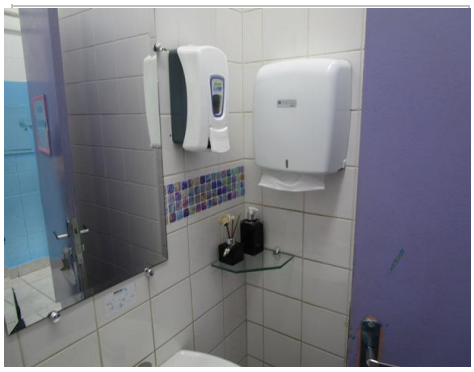


foto 41: SANITÁRIO FUNCIONÁRIO FEMININO - TÉRREO



foto 42: SANITÁRIO FUNCIONÁRIO FEMININO - TÉRREO - PISO COM COLORAÇÃO DIFERENTE. APARENTE INFILTRAÇÃO



foto 43: SANITÁRIO ALUNO PCD UNISSEX - TÉRREO



foto 44: SANITÁRIO ALUNO PCD UNISSEX - TÉRREO



foto 45: SANITÁRIO ALUNO FEMININO - TÉRREO



foto 46: SANITÁRIO ALUNO FEMININO - TÉRREO - PISO COM COLORAÇÃO DIFERENTE

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF PROFª DIRCE GENESIO DOS SANTOS



foto 47: SANITÁRIO ALUNO FEMININO - TÉRREO - FALTA TRECHO DE AZULEJO



foto 48: SANITÁRIO ALUNO MASCULINO - TÉRREO



foto 49: SANITÁRIO ALUNO MASCULINO - TÉRREO - PISO COM COLORAÇÃO DIFERENTE



foto 50: WC FUNCIONÁRIOS - VIROU DML - TÉRREO

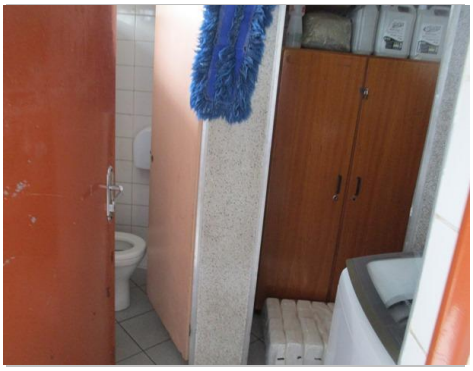


foto 51: WC FUNCIONÁRIOS - VIROU DML - TÉRREO



foto 52: WC FUNCIONÁRIOS - VIROU DML - TÉRREO - TOMADA COM PADRÃO OBSOLETO



foto 53: VESTIÁRIO - TÉRREO



foto 54: VESTIÁRIO - TÉRREO - TOMADA SOLTA

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF PROFª DIRCE GENESIO DOS SANTOS



foto 55: ELEVADOR - TÉRREO - ELEVADOR EM FUNCIONAMENTO



foto 56: QUADRO DE ENERGIA - TÉRREO



foto 57: QUADRO DE ENERGIA - TÉRREO



foto 58: QUADRO DE ENERGIA - TÉRREO



foto 59: QUADRO DE ENERGIA - TÉRREO



foto 60: QUADRO DE ENERGIA - TÉRREO



foto 61: QUADRO DE ENERGIA - TÉRREO



foto 62: CIRCULAÇÃO 3 - 1º PAVIMENTO

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF PROFª DIRCE GENESIO DOS SANTOS



foto 63: CIRCULAÇÃO 3 - 1º PAVIMENTO



foto 64: CIRCULAÇÃO 3 - 1º PAVIMENTO



foto 65: CIRCULAÇÃO 3 - 1º PAVIMENTO - TOMADA EXTERNA DANIFICADA



foto 66: CIRCULAÇÃO 3 - 1º PAVIMENTO - TOMADA COM PADRÃO OBSOLETO



foto 67: CIRCULAÇÃO 3 - 1º PAVIMENTO - FISSURA NA PAREDE



foto 68: DEPÓSITO 1 - 1º PAVIMENTO



foto 69: PAP - 1º PAVIMENTO



foto 70: PAP - 1º PAVIMENTO - NÃO HÁ PONTO DE TOMADA NA SALA. É UTILIZADO EXTENSÃO

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF PROFª DIRCE GENESIO DOS SANTOS

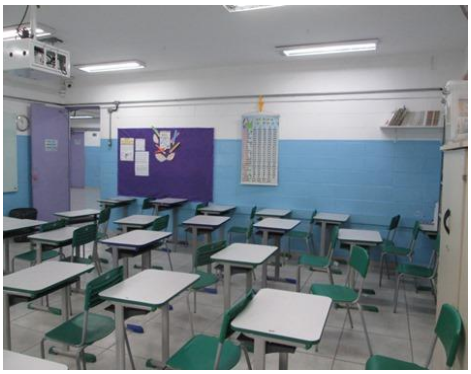


foto 71: SALA DE AULA 1 - 1º PAVIMENTO



foto 72: SALA DE AULA 1 - 1º PAVIMENTO - FISSURA NA PAREDE



foto 73: SALA DE AULA 2 - 1º PAVIMENTO



foto 74: SALA DE AULA 2 - 1º PAVIMENTO - REVESTIMENTO DA PAREDE DANIFICADO



foto 75: SALA DE AULA 3 - 1º PAVIMENTO



foto 76: SALA DE AULA 3 - 1º PAVIMENTO - SEM ESPELHO NA TOMADA

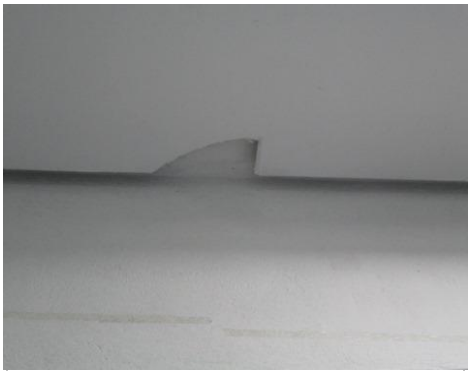


foto 77: SALA DE AULA 3 - 1º PAVIMENTO - FORRO DANIFICADO

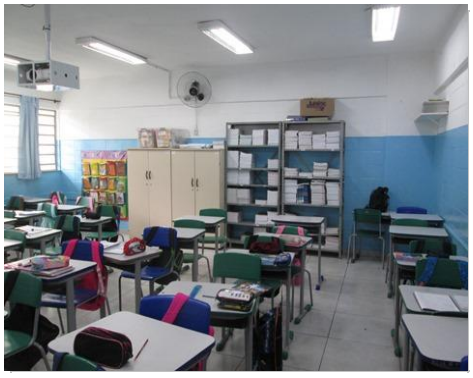


foto 78: SALA DE AULA 4 - 1º PAVIMENTO

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF PROFª DIRCE GENESIO DOS SANTOS

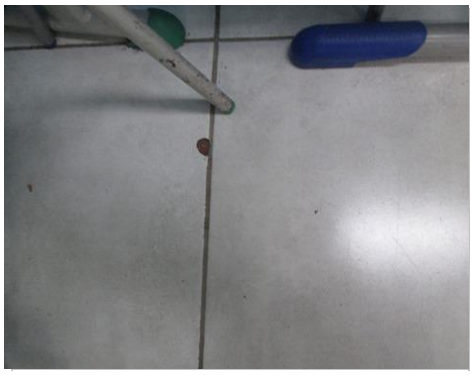


foto 79: SALA DE AULA 4 - 1º PAVIMENTO - PISO CERÂMICO DANIFICADO

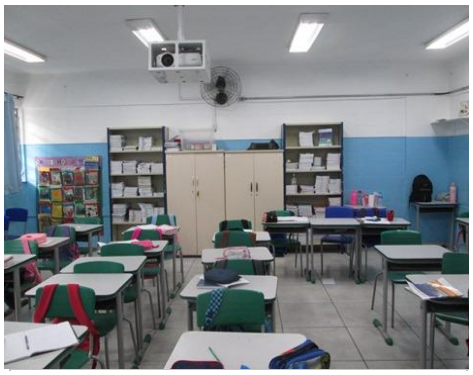


foto 80: SALA DE AULA 5 - 1º PAVIMENTO



foto 81: SALA DE AULA 5 - 1º PAVIMENTO - FISSURA NO TETO

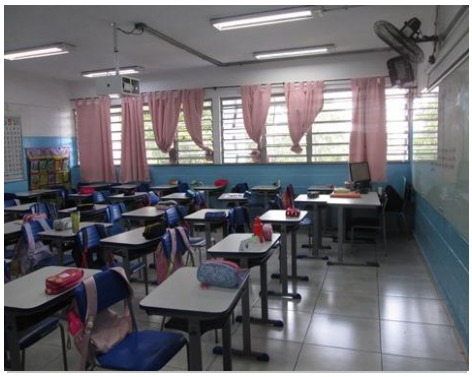


foto 82: SALA DE AULA 6 - 1º PAVIMENTO



foto 83: SALA DE AULA 6 - 1º PAVIMENTO - MANCHA DE INFILTRAÇÃO NA PAREDE



foto 84: SALA DE AULA 7 - 1º PAVIMENTO



foto 85: SALA DE AULA 7 - 1º PAVIMENTO - VIDRO QUEBRADO

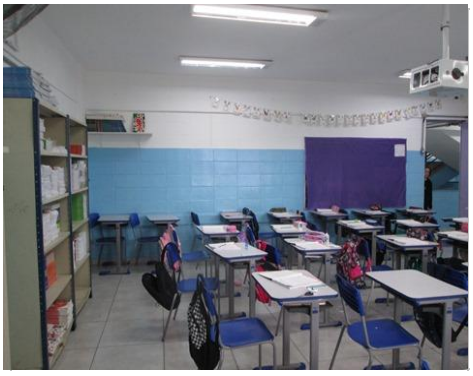


foto 86: SALA DE AULA 8 - 1º PAVIMENTO

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF PROFª DIRCE GENESIO DOS SANTOS

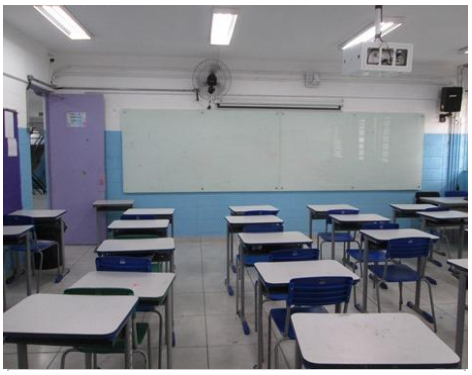


foto 87: SALA DE AULA 9 - 1º PAVIMENTO

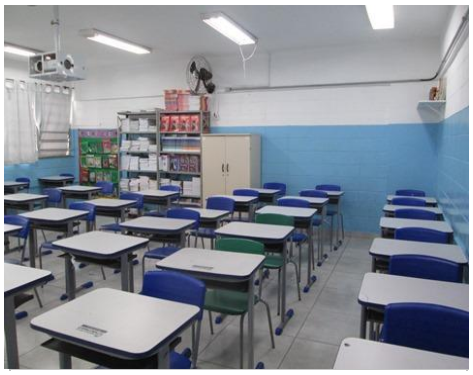


foto 88: SALA DE AULA 10 - 1º PAVIMENTO



foto 89: SALA DE AULA 10 - 1º PAVIMENTO - MANCHA DE INFILTRAÇÃO



foto 90: SANITÁRIO ALUNO PCD FEMININO - 1º PAVIMENTO



foto 91: SANITÁRIO ALUNO PCD FEMININO - 1º PAVIMENTO - RECORTE NO PISO CERÂMICO



foto 92: SANITÁRIO ALUNOS MASCULINO - 1º PAVIMENTO



foto 93: SANITÁRIO ALUNOS MASCULINO - 1º PAVIMENTO - MANCHA DE INFILTRAÇÃO NO TETO



foto 94: SANITÁRIO ALUNOS MASCULINO - 1º PAVIMENTO - AZULEJO DANIFICADO

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF PROFª DIRCE GENESIO DOS SANTOS



foto 95: SALA DAS AVE - 1º PAVIMENTO



foto 96: SALA DAS AVE - 1º PAVIMENTO - TOMADA EXTERNA COM CANALETA DE PVC



foto 97: SALA DAS AVE - 1º PAVIMENTO - MANCHA DE INFILTRAÇÃO NO FORRO



foto 98: SANITÁRIO FUNCIONÁRIOS FEMININO - 1º PAVIMENTO



foto 99: SANITÁRIO FUNCIONÁRIOS FEMININO - 1º PAVIMENTO - FISSURA NO AZULEJO



foto 100: SANITÁRIO FUNCIONÁRIO MASCULINO - 1º PAVIMENTO

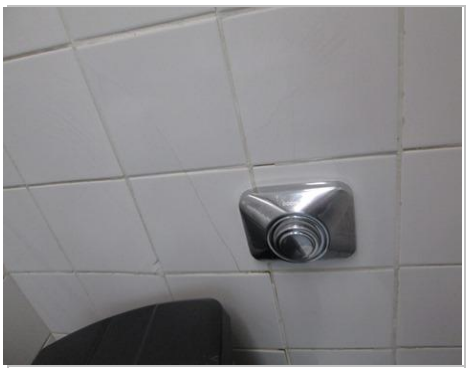


foto 101: SANITÁRIO FUNCIONÁRIO MASCULINO - 1º PAVIMENTO - FISSURA NO AZULEJO



foto 102: ESCADARIA DE ACESSO DO TÉRREO AO 1º PAVIMENTO

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF PROFª DIRCE GENESIO DOS SANTOS



foto 103: QUADRO DE ENERGIA - 1º PAVIMENTO



foto 104: QUADRO DE ENERGIA - 1º PAVIMENTO



foto 105: QUADRO DE ENERGIA - 1º PAVIMENTO

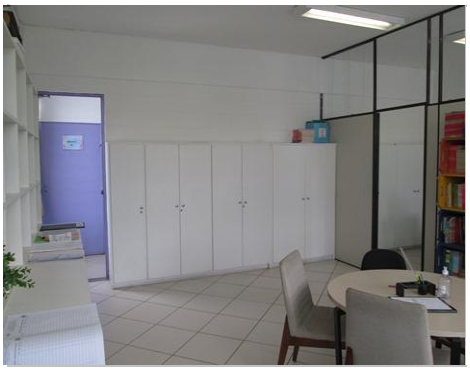


foto 106: COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 1 - 2º PAVIMENTO

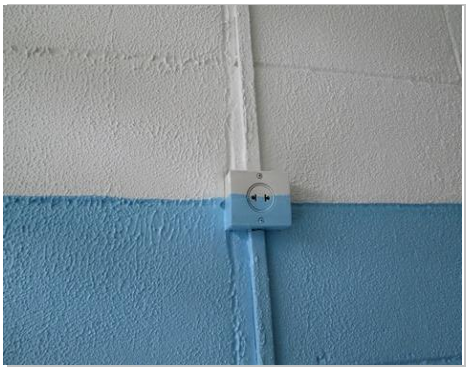


foto 107: COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 1 - 2º PAVIMENTO - TOMADA EXTERNA COM PADRÃO OBSOLETO



foto 108: COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 1 - 2º PAVIMENTO - PISO DANIFICADO



foto 109: COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 1 - 2º PAVIMENTO - TRINCA NA PAREDE



foto 110: COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 1 - 2º PAVIMENTO - MANCHA DE INFILTRAÇÃO NA PAREDE

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF PROFª DIRCE GENESIO DOS SANTOS



foto 111: COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 2 - 2º PAVIMENTO



foto 112: COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 2 - 2º PAVIMENTO - UTILIZAÇÃO DE CONECTOR NA TOMADA



foto 113: DEPÓSITO 2 - 2º PAVIMENTO



foto 114: DEPÓSITO 2 - 2º PAVIMENTO - TOMADA EXTERNA EM PVC



foto 115: DEPÓSITO 2 - 2º PAVIMENTO - MANCHA DE INFILTRAÇÃO NA PAREDE



foto 116: SALA DO GRÊMIO - 2º PAVIMENTO



foto 117: SALA DO GRÊMIO - 2º PAVIMENTO - FISSURA NA PAREDE



foto 118: SALA DO GRÊMIO - 2º PAVIMENTO - TOMADA EXTERNA COM PADRÃO OBSOLETO

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF PROFª DIRCE GENESIO DOS SANTOS



foto 119: MATERIAL PEDAGÓGICO - 2º PAVIMENTO



foto 120: MATERIAL PEDAGÓGICO - 2º PAVIMENTO - UTILIZAÇÃO DE ADAPTADOR NA TOMADA



foto 121: MATERIAL PEDAGÓGICO - 2º PAVIMENTO - MANCHA DE INFILTRAÇÃO NO TETO



foto 122: MATERIAL PEDAGÓGICO - 2º PAVIMENTO - FISSURA NA PAREDE

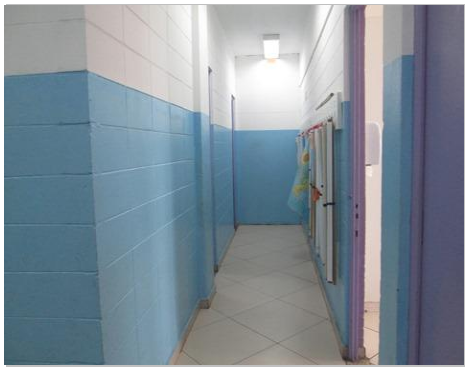


foto 123: CIRCULAÇÃO 4 - 2º PAVIMENTO

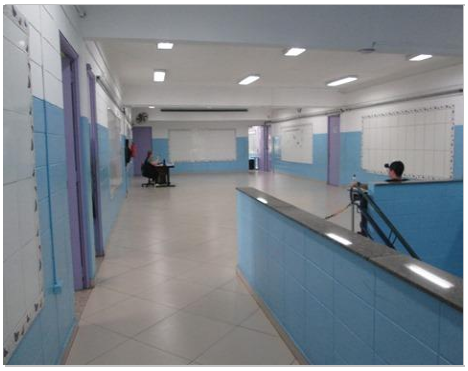


foto 124: CIRCULAÇÃO 4 - 2º PAVIMENTO

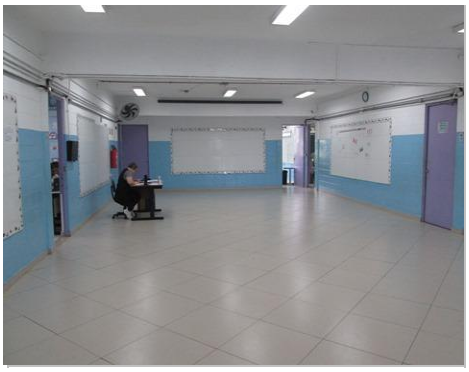


foto 125: CIRCULAÇÃO 4 - 2º PAVIMENTO



foto 126: CIRCULAÇÃO 4 - 2º PAVIMENTO

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF PROFª DIRCE GENESIO DOS SANTOS



foto 127: CIRCULAÇÃO 4 - 2º PAVIMENTO - TOMADA EXTERNA COM CANALETA DE PVC

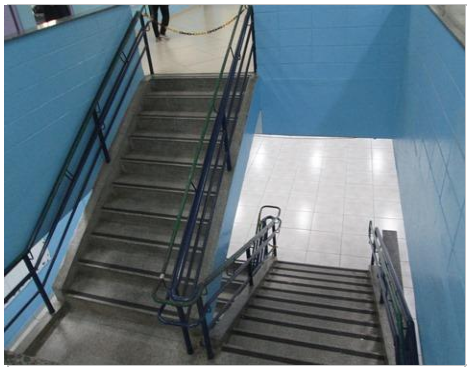


foto 128: CIRCULAÇÃO 4 - 2º PAVIMENTO - ESCADARIA DE ACESSO DO 1º PAVIMENTO AO 2º PAVIMENTO



foto 129: CIRCULAÇÃO 4 - 2º PAVIMENTO - AZULEJO DANIFICADO



foto 130: SALA DOS PROFESSORES - 2º PAVIMENTO



foto 131: SALA DOS PROFESSORES - 2º PAVIMENTO - TOMADA EXTERNA COM PADRÃO OBSOLETO



foto 132: SALA DOS PROFESSORES - MANCHA DE INFILTRAÇÃO NA PAREDE



foto 133: VARANDA GRÊMIO - 2º PAVIMENTO



foto 134: VARANDA GRÊMIO - 2º PAVIMENTO - MANCHA DE INFILTRAÇÃO NO TETO

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF PROFª DIRCE GENESIO DOS SANTOS



foto 135: VARANDA SALA DE AULA 16 - 2º PAVIMENTO - SEM BANCADAS



foto 136: VARANDA COORDENAÇÃO - 2º PAVIMENTO



foto 137: VARANDA SALA DE AULA 11 - 2º PAVIMENTO



foto 138: VARANDA SALA DE AULA 11 - 2º PAVIMENTO - MANCHA DE INFILTRAÇÃO NA PAREDE



foto 139: VARANDA SALA DE AULA 12 - 2º PAVIMENTO



foto 140: VARANDA SALA DE AULA 12 - 2º PAVIMENTO - INFILTRAÇÃO NA LAJE E PAREDE



foto 141: VARANDA SALA DE AULA 12 - 2º PAVIMENTO - BANCADA DANIFICADA



foto 142: VARANDA SALA DOS PROFESSORES - 2º PAVIMENTO

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF PROFª DIRCE GENESIO DOS SANTOS



foto 143: VARANDA SALA DOS PROFESSORES - 2º PAVIMENTO - TUBO DE AP DANIFICADO



foto 144: SALA DE AULA 11 - 2º PAVIMENTO



foto 145: SALA DE AULA 11 - 2º PAVIMENTO - VIDRO QUEBRADO



foto 146: SALA DE AULA 11 - 2º PAVIMENTO - TOMADA COM PADRÃO OBSOLETO



foto 147: SALA DE AULA 12 - 2º PAVIMENTO



foto 148: SALA DE AULA 12 - 2º PAVIMENTO - TOMADA COM PADRÃO OBSOLETO



foto 149: SALA DE AULA 12 - 2º PAVIMENTO - PISO DANIFICADO



foto 150: SALA DE AULA 13 - 2º PAVIMENTO

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF PROFª DIRCE GENESIO DOS SANTOS



foto 151: SALA DE AULA 13 - 2º PAVIMENTO - UTILIZAÇÃO DE ADAPTADOR NA TOMADA



foto 152: SALA DE AULA 13 - 2º PAVIMENTO - MANCHA DE INFILTRAÇÃO NO TETO

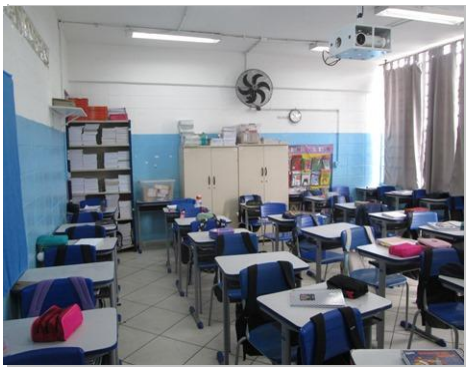


foto 153: SALA DE AULA 14 - 2º PAVIMENTO



foto 154: SALA DE AULA 14 - 2º PAVIMENTO - UTILIZAÇÃO DE ELETRODUTOS



foto 155: SALA DE AULA 14 - 2º PAVIMENTO - TOMADA EXTERNA COM CANALETA DE PVC

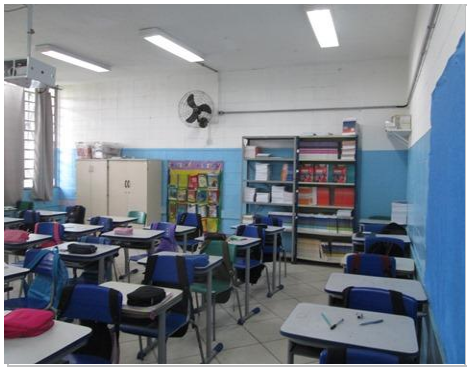


foto 156: SALA DE AULA 15 - 2º PAVIMENTO



foto 157: SALA DE AULA 15 - 2º PAVIMENTO - REVESTIMENTO PRÓXIMO A PORTA DANIFICADO

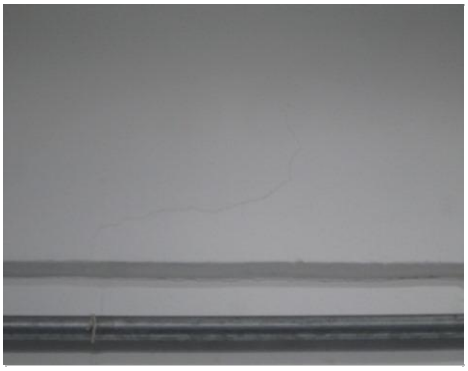


foto 158: SALA DE AULA 15 - 2º PAVIMENTO - FISSURA NA PAREDE

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF PROFª DIRCE GENESIO DOS SANTOS

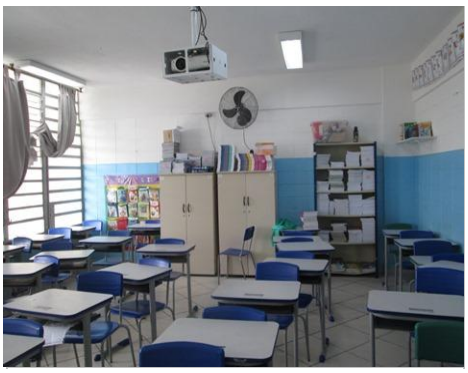


foto 159: SALA DE AULA 16 - 2º PAVIMENTO

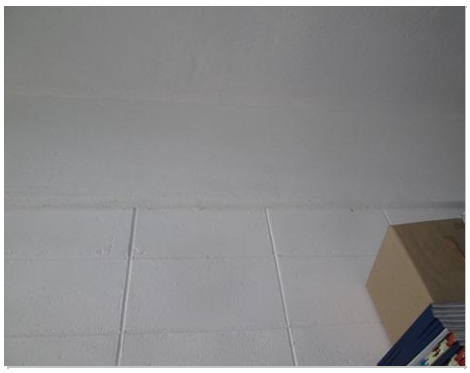


foto 160: SALA DE AULA 16 - 2º PAVIMENTO -FISSURA NA PAREDE



foto 161: SALA DE AULA 16 - 2º PAVIMENTO - TOMADA COM PADRÃO OBSOLETO



foto 162: SALA DE AULA 16 - 2º PAVIMENTO - FIAÇÃO EXPOSTA



foto 163: LABORATÓRIO DE EDUCAÇÃO DIGITAL - 2º PAVIMENTO

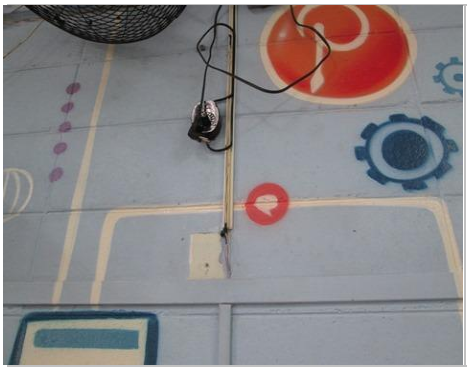


foto 164: LABORATÓRIO DE EDUCAÇÃO DIGITAL - 2º PAVIMENTO - FIAÇÃO EXPOSTA, FALTA CANALETA



foto 165: LABORATÓRIO DE EDUCAÇÃO DIGITAL - 2º PAVIMENTO - FURO NA ALVENARIA



foto 166: LABORATÓRIO DE EDUCAÇÃO DIGITAL - 2º PAVIMENTO - FISSURA NA PAREDE E UTILIZAÇÃO DE TOMADA EXTERNA

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF PROFª DIRCE GENESIO DOS SANTOS



foto 167: SALA DE LEITURA - 2º PAVIMENTO



foto 168: SALA DE LEITURA - 2º PAVIMENTO - FISSURA NA PAREDE



foto 169: SANITÁRIO ALUNOS PCD UNISSEX - 2º PAVIMENTO



foto 170: SANITÁRIO FUNCIONÁRIOS MASCULINO - 2º PAVIMENTO



foto 171: SANITÁRIO FUNCIONÁRIOS MASCULINO - 2º PAVIMENTO - FISSURA NO AZULEJO



foto 172: SANITÁRIO FUNCIONÁRIOS MASCULINO - 2º PAVIMENTO - ESPELHO DANIFICADO



foto 173: SANITÁRIO ALUNO FEMININO 1 - 2º PAVIMENTO

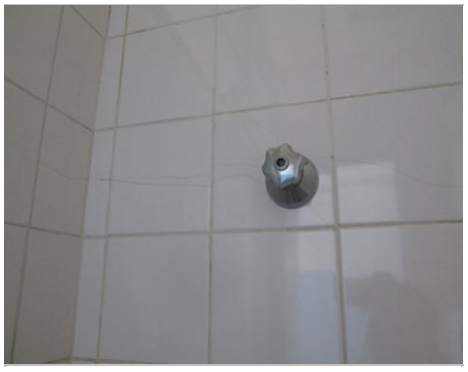


foto 174: SANITÁRIO ALUNO FEMININO 1 - 2º PAVIMENTO - FISSURA NA PAREDE

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF PROFª DIRCE GENESIO DOS SANTOS



foto 175: SANITÁRIO ALUNOS MASCULINO - 2º PAVIMENTO



foto 176: SANITÁRIO ALUNOS MASCULINO - 2º PAVIMENTO



foto 177: SANITÁRIO ALUNOS MASCULINO - 2º PAVIMENTO - MANCHA DE INFILTRAÇÃO NO TETO



foto 178: SANITÁRIO ALUNO FEMININO 2 - 2º PAVIMENTO



foto 179: SANITÁRIO ALUNO FEMININO 2 - 2º PAVIMENTO - MANCHA DE INFILTRAÇÃO NO TETO



foto 180: ELEVADOR - UTILIZAÇÃO DE FITA ADESIVA PARA FIXAR O FECHAMENTO DO ELEVADOR



foto 181: QUADRO DE ENERGIA - 2º PAVIMENTO



foto 182: QUADRO DE ENERGIA - 2º PAVIMENTO

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEF PROFª DIRCE GENESIO DOS SANTOS



foto 183: QUADRO DE ENERGIA - 2º PAVIMENTO



foto 184: QUADRO DE ENERGIA - 2º PAVIMENTO



foto 185: IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA



foto 186: FACHADA FRONTAL



foto 187: FACHADA FUNDOS

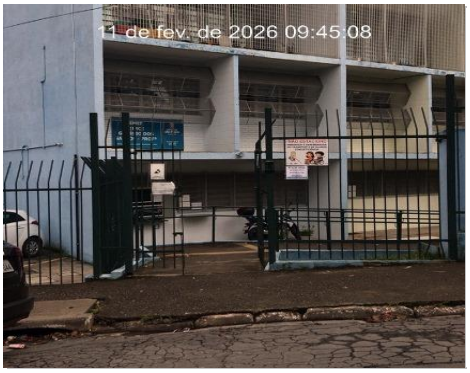


foto 188: ACESSO DA ADMINISTRAÇÃO



foto 189: ACESSO DOS ALUNOS



foto 190: ACESSO DOS ALUNOS, NÃO TEM ACESSIBILIDADE

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF PROFª DIRCE GENESIO DOS SANTOS



foto 191: ACESSO COBERTO DA QUADRA



foto 192: QUADRA COBERTA



foto 193: A MAIORIA DOS PILARES SE ENCONTRAM ENFERRUJADOS



foto 194: QUADRA DESCOBERTA



foto 195: TRINCA NO PISO DA QUADRA



foto 196: ALAMBRADO DA QUADRA COM FERRUGEM



foto 197: ARQUIBANCADA SEM DEGRAU INTERMEDIÁRIO E SEM ACESSIBILIDADE



foto 198: ESTADO DA ARQUIBANCADA

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF PROFª DIRCE GENESIO DOS SANTOS



foto 199: SPDA



foto 200: CANALETA DAS ÁGUAS PLUVIAIS SEM GRELHA



foto 201: RESERVATÓRIO DE ÁGUA COM SINAIS DE VAZAMENTO



foto 202: PORTA DE ACESSO A BOMBAS BEM DANIFICADO
