CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL

Dados Gerais

Nome da Unidade:	EMEF THEREZA MACIEL DE PAULA, PROFA		
Sequencial (U.E):	67	**Código da Unidade:**	19216

Endereço da Escola

Logradouro, número e complemento (se houver)	Rua Jorge Carlos de Almeida, 66

Descrição do Imóvel

Tipo de Construção (técnica construtiva predominante)	Alvenaria estrutural	Padrão:	11. EMEF 20 SALAS OLIVAL COSTA	Nº de Pavimentos	3

Implantação

Área do Terreno (m²)	3.440,00					Área Edificada/ Construída (m²)	2.434,41
Área Pavimentada (m²)	2.000,00					Área Verde / Permeável (m²)	645,00
Área da projeção do(s) edifício(s) (m²)	1.140,00			Bloco salas	1.140,00	Quadra	426,80 quadra coberta no corpo do edifício

Abastecimento

Água							
Forma de abastecimento (rede pública, poço artesiano, sem abastecimento etc.): rede pública							
Quantidade de reservatório de água	não disponível						
Capacidade por reservatório (L)	não disponível	Constatação		Não Disponível	Projeto	NÃO	
Gás							
Encanado (Sim ou Não)		Botijão de Gás (Sim ou Não)				Quantidade de Botijões de Gás	6
Energia Elétrica							
Aparelho Ar condicionado (Sim ou Não)	SIM					Quantidade:	6
Possui fonte de energia complementar (Sim ou Não)?	NÃO					Qual (por ex. Painel Solar ou outro)?	-
Possui Gerador de Energia? (Sim ou Não)?	NÃO					Capacidade:	0
Esgoto							
Rede Pública (Sim ou Não)	SIM					Fossa Séptica (Sim ou Não)	NÃO
Caixa de Gordura (Sim ou Não)	SIM					Caixa de Passagem (Sim ou Não)	SIM

Informações sobre Prevenção de Incêndios (AVCB e SPDA)

Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro (Sim ou Não)	NÃO	Nº	N/A						
Extintor	SIM		16						
Hidrante	SIM		4						
Sinalização Emergência	SIM		6						
Iluminação Emergência	SIM		4						
Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) (Sim ou Não)	PARCIAL	Nº	Total (Sim ou N	PARCIAL	Parcial (Sim ou Não)	PARCIAL			

Acessibilidade

Elevador (Sim ou Não)	SIM			Quantidade:	1	Quant. Ativos/Funcionais:	1	
Plataforma Elevatória (Sim ou Não)	NÃO			Quantidade:	0	Quant. Ativos/Funcionais:	0	
Rampa de Acesso a Unidade (Sim ou Não)	SIM			Rampa de Acesso a outros espaços necessários (Sim ou Não)			SIM	
Tipo de sinalização	PARCIAL	Sonora (Sim ou Não)	NÃO	Visual (Sim ou Não)	SIM	Tátil (Sim ou Não)	PARCIAL	
Selo de Acessibilidade (Sim ou Não)	NÃO		Nº	-				
Vaga de estacionamento para deficientes (Sim ou Não)	NÃO			Quantidade:	0			

CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL										
Ambientes da Escola										
Administrativo e Apoio/Serviços										
Ambiente	Comprimento (m)	Largura (m)	Pé Direito (m)	Área (m^2)	Tipo de Construção	Revestimento de Piso	Revestimento de Parede	Possui Forro? Se sim, qual tipo?	Nível de Comprometimento do Ambiente	Observações
Circulação 1º pav	64,61	13,58	3,10	237,28	Alvenaria Estrutural	Granilite	Pintura	Laje	**2**	Fissura na parede e piso, escorrimento, infiltração. Foto 43, 160
Guichê	5,45	2,61	3,10	14,22	Alvenaria Estrutural	Granilite	Pintura	Laje	**2**	Infiltração. Foto 13,14,15
Arquivo	4,08	3,60	3,10	14,69	Alvenaria Estrutural	Granilite	Pintura	Laje	**2**	Infiltração. Foto 15
Sala de Recursos	4,08	3,30	3,10	13,46	Alvenaria Estrutural	Granilite	Pintura	Laje	**2**	Fissura na parede. Foto 18
Depósito	2,92	1,57	2,50	4,58	Alvenaria Estrutural	Granilite	Pintura	Gesso	**2**	Fissura no gesso, mancha de bolor. Foto 33
Vestiário	1,90	1,57	2,50	2,98	Alvenaria Estrutural	Granilite	Pintura	Laje	**2**	Mancha de bolor. Foto 36
Circulação 02	4,95	2,50	2,50	10,31	Alvenaria Estrutural	Granilite	Pintura	Gesso	**2**	Fissura no gesso
Sala dos Professores	7,35	7,05	3,10	51,82	Alvenaria Estrutural	Granilite	Pintura	Laje	**2**	Desgaste na pintura. Foto 56
Sala de Leitura	10,30	4,10	3,10	42,23	Alvenaria Estrutural	Granilite	Pintura	Laje	**0**	
Informática	8,30	6,35	3,10	52,71	Alvenaria Estrutural	Granilite	Pintura	Laje	**2**	Fissura na parede e piso. Foto 92
Laboratório de Ciências	8,30	7,35	3,10	61,01	Alvenaria Estrutural	Granilite	Pintura	Laje	**2**	Fissura na parede. Foto 100
Sala de Apoio	5,34	3,34	3,10	17,84	Alvenaria Estrutural	Granilite	Pintura	Laje	**0**	
Sala de Multiuso	4,06	3,76	3,10	15,27	Alvenaria Estrutural	Granilite	Pintura	Laje	**0**	
Circulação 03	3,76	1,12	3,10	4,21	Alvenaria Estrutural	Granilite	Pintura	Laje	**0**	
Circulação 04	3,17	2,22	2,50	7,04	Alvenaria Estrutural	Granilite	Pintura	Laje	**0**	
Direção	3,40	3,34	2,50	11,36	Alvenaria Estrutural	Granilite	Pintura	Gesso	**0**	
Assistente de Direção	3,76	3,40	2,50	12,78	Alvenaria Estrutural	Granilite	Pintura	Gesso	**0**	
Secretaria	7,35	5,23	3,10	38,44	Alvenaria Estrutural	Granilite	Pintura	Laje	**2**	Fissura no piso. 124
Copa Secretaria	2,63	1,57	3,10	4,13	Alvenaria Estrutural	Granilite	Pintura	Laje	**0**	
Escada 2º pav	7,14	6,48	3,00	46,27	Alvenaria Estrutural	Granilite	Pintura	Laje	**2**	Descamação, escorrimento, fissura no piso e parede, infiltração. Foto 152
Depósito 02	5,10	3,50	3,00	12,31	Alvenaria Estrutural	Granilite	Pintura	Laje	**0**	
Circulação - 2º Pavimento	50,19	3,30	3,10	165,63	Alvenaria Estrutural	Granilite	Pintura	Laje	**2**	Infiltração, descamação, fissura no piso. Foto 156
Circulação Banheiro - 2º Pavimento	3,15	2,22	2,50	6,99	Alvenaria Estrutural	Granilite	Pintura	Laje	**0**	
Refeitório	17,70	10,27	3,10	181,78	Alvenaria Estrutural	Granilite	Pintura	Laje	**2**	Escorrimento, infiltração, fissura no piso. Foto 208
Cozinha	7,35	7,14	2,50	41,16	Alvenaria Estrutural	Cerâmico	Azulejo	Gesso	**2**	Fissura no azulejo. Foto 215

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL										
Despensa	5,44	1,73	2,50	9,41	Alvenaria Estrutural	Cerâmico	Azulejo	Gesso	**0**	
Escada Quadra	6,48	3,47	3,10	22,49	Alvenaria Estrutural	Granilite	Pintura	Laje	**2**	Infiltração. Foto 247
Quadra Poliesportiva	24,25	17,60	7,40	426,80	Alvenaria Estrutural	Concreto	Grade	Telha	**2**	Furo na telha, fissura no piso. Foto 255
Depósito 1 - Quadra	6,34	3,48	3,10	22,06	Alvenaria Estrutural	Concreto	Pintura	Telha	**0**	
Depósito 2 - Quadra	6,58	1,56	3,10	10,26	Alvenaria Estrutural	Concreto	Pintura	Telha	**0**	
Circulação - Quadra	23,30	17,72	7,40	302,37	Alvenaria Estrutural	Concreto	Pintura	Telha	**0**	
Circulação 2 - Quadra	17,72	4,60	3,10	69,40	Alvenaria Estrutural	Concreto	Pintura	Telha	**0**	

CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL

CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL

Salas de Aula

Ambiente	Comprimento (m)	Largura (m)	Pé Direito (m)	Área (m²)	Tipo de Construção	Revestimento de Piso	Revestimento de Parede	Possui Forro? Se sim, qual tipo?	Nível de Comprometimento do Ambiente	Observações
Sala de Aula 1 - 2º pav	7,35	6,98	3,10	51,30	Alvenaria Estrutural	Granilite	Pintura	Laje	2	Escorrimento, infiltração. Foto 166
Sala de Aula 2 - 2º pav	7,35	7,05	3,10	51,82	Alvenaria Estrutural	Granilite	Pintura	Gesso	2	Corrosão na esquadria, infiltração no gesso. Foto 169
Sala de Aula 3 - 2º pav	7,35	7,05	3,10	51,82	Alvenaria Estrutural	Granilite	Pintura	Laje	0	
Sala de Aula 4 - 2º pav	7,35	6,90	3,10	50,72	Alvenaria Estrutural	Granilite	Pintura	Laje	2	Infiltração. Foto 176
Sala de Aula 5 - 2º pav	7,35	7,05	3,10	51,82	Alvenaria Estrutural	Granilite	Pintura	Laje	2	Infiltração. Foto 179
Sala de Aula 6 - 2º pav	7,35	6,90	3,10	50,72	Alvenaria Estrutural	Granilite	Pintura	Gesso	2	Corrosão na esquadria, infiltração no gesso. Foto 182
Sala de Aula 7 - 2º pav	7,35	7,05	3,10	51,82	Alvenaria Estrutural	Granilite	Pintura	Laje	2	Infiltração, fissura na parede. Foto 183
Sala de Aula 8 - 2º pav	7,35	6,98	3,10	51,30	Alvenaria Estrutural	Granilite	Pintura	Laje	0	
Sala de Aula 9 - 2º pav	7,35	7,05	3,10	51,82	Alvenaria Estrutural	Granilite	Pintura	Laje	2	Infiltração. Foto 188
Sala de Aula 10 - 2º pav	7,35	7,14	3,10	52,48	Alvenaria Estrutural	Granilite	Pintura	Laje	2	Infiltração. Foto 189
Sala de Aula 11 - 2º pav	7,35	7,05	3,10	51,82	Alvenaria Estrutural	Granilite	Pintura	Laje	2	Infiltração. Foto 198
Sala de Aula 12 - 1º pav	7,35	7,05	3,10	51,82	Alvenaria Estrutural	Granilite	Pintura	Laje	0	
Sala de Aula 13 - 1º pav	7,35	7,05	3,10	51,82	Alvenaria Estrutural	Granilite	Pintura	Laje	0	
Sala de Aula 14 - 1º pav	7,35	7,05	3,10	51,82	Alvenaria Estrutural	Granilite	Pintura	Laje	0	
Sala de Aula 15 - 1º pav	7,35	7,05	3,10	51,82	Alvenaria Estrutural	Granilite	Pintura	Laje	2	Descamação. Foto 110
Sala de Aula 16 - 1º pav	7,35	7,05	3,10	51,82	Alvenaria Estrutural	Granilite	Pintura	Laje	0	
Sala de Aula 17 - 1º pav	7,35	7,05	3,10	51,82	Alvenaria Estrutural	Granilite	Pintura	Laje	0	
Sala de Aula 18 - 1º pav	7,35	7,05	3,10	51,82	Alvenaria Estrutural	Granilite	Pintura	Laje	0	
Sala de Aula 19 - 1º pav	7,35	7,14	3,10	52,48	Alvenaria Estrutural	Granilite	Pintura	Laje	2	Corrosão na janela, fissura na laje. Foto 82
Sala de Aula 20 - 1º pav	7,35	7,14	3,10	52,48	Alvenaria Estrutural				0	

Sanitários										**Informações Complementares**		
Ambiente	Comprimento (m)	Largura (m)	Pé Direito (m)	Área (m²)	Revestimento de Piso	Revestimento de Parede	Possui Forro? Se sim, qual tipo?	Observações	Nível de Comprometimento do Ambiente	Quant. Vasos Sanitários	Quant. Cubas e trocadores	Quant. Chuveiros
Banheiro PCD Feminino 1 - 1º pav	2,21	1,61	2,50	3,56	Cerâmico	Azulejo	Gesso	Infiltração. Foto 76	2	1	1	
Banheiro Feminino 1 - 1º pav	2,76	2,00	2,50	5,00	Cerâmico	Azulejo	Gesso	Fissura no gesso. Foto 48	2	1	2	
Lavanderia	3,60	2,82	2,50	9,30	Cerâmico	Azulejo	Gesso	Mancha de bolor. Foto 40	2			
Trocador	2,68	2,10	2,50	5,63	Cerâmico	Azulejo	Gesso	Fissura na parede	2	1	2	
Banheiro PCD Masculino 1 - 1º pav	2,19	1,61	2,50	3,53	Cerâmico	Azulejo	Gesso	Destacamento. Foto 52	2	1	1	
Banheiro PCD Masculino 2 - 1º pav	2,28	1,65	2,50	3,76	Cerâmico	Azulejo	Gesso	Fissura na parede, infiltração. Foto 66	2		1	

CAIXA

FICHA 1 - LEVANTAMENTO CADASTRAL												
Banheiro Masculino 2 - 1º pav	5,06	3,47	2,50	15,88	Cerâmico	Azulejo	Gesso	Infiltração. Foto 22	**2**	5	4	
Banheiro Feminino 2 - 1º pav	5,06	3,47	2,50	15,88	Cerâmico	Azulejo	Gesso	Infiltração	**2**	5	5	
Banheiro PCD Feminino 2 - 1º pav	2,28	1,65	2,50	3,76	Cerâmico	Azulejo	Gesso		**0**	1	1	
Banheiro PCD Feminino - 2º pav	2,28	1,63	2,50	3,72	Cerâmico	Azulejo	Gesso		**0**	1	1	1
Banheiro Feminino - 2º pav	5,06	3,47	2,50	17,56	Cerâmico	Azulejo	Gesso	Escorrimento, mancha de bolor, infiltração. Foto 225	**2**	5	5	
Banheiro Masculino - 2º pav	5,06	3,47	2,50	17,56	Cerâmico	Azulejo	Gesso	Infiltração. Foto 231	**2**	5	4	
Banheiro PCD Masc - 2º pav	2,28	1,63	2,50	3,72	Cerâmico	Azulejo	Gesso	Infiltração. Foto 235	**2**	1	1	1
Banheiro PCD Feminino - Quadra	1,89	1,77	3,10	3,35	Cerâmico	Azulejo	Telha		**0**	1	1	
Banheiro Feminino - Quadra	6,74	1,77	3,10	11,93	Cerâmico	Azulejo	Telha		**0**	4	5	
Banheiro Masculino - Quadra	6,74	1,77	3,10	11,93	Cerâmico	Azulejo	Telha		**0**	4	5	
Banheiro PCD Masculino - Quadra	1,91	1,77	3,10	3,38	Cerâmico	Azulejo	Telha		**0**	1	1	

Informações Adicionais

Ambiente	Necessário adequar ou implantar? (SIM / NÃO / NÃO SE APLICA)	Informações Complementares							Observações
Fechamento do lote (muro, cerca, gradil, vegetação)	SIM	Muro		Área (m²)	169,40	Gradil	Área (m²)	585,20	Gradil e muro com falha na pintura (destacamento da pintura)
Estacionamento(s)	SIM	Área (m²)	250						Necessário demarcar as vagas e destinar local de vaga pra cadeirante, atendendo os requisitos de acessibilidade da NBR 9050.
Playground (Sim ou Não)	NÃO	Área (m²)							
Tanque de Areia (Sim ou Não)	NÃO	Área Cúbica (m³)		0,00					
Calçadas (Sim ou Não?)	SIM								Ausência de sinalização e acessibilidade na calçada
Serralherias (Portões, travas e outros)	NÃO								
Alarmes e sensores (Sim ou Não?)	NÃO								
Câmeras de segurança (Sim ou Não?)	NÃO								
Rede de gás na testada? (Sim ou Não)	NÃO								

Observações Gerais:	***O imóvel contém três unidades escolares no mesmo prédio (CEI MARIA APARECIDA NASCIMENTO/EMEI PAULA CRISTINA RODRIGUES/EMEF THEREZA MACIEL DE PAULA)** **A edificação não possui Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB). É composta predominantemente por salas e ambientes administrativos. Durante a vistoria, constatou-se que alguns ambientes apresentam fissuras no forro de gesso, bem como acentuado desgaste no piso e na pintura das paredes, indicando a necessidade de manutenção corretiva. Verificou-se, ainda, não conformidade quanto às condições de acessibilidade, uma vez que o banheiro destinado a Pessoas com Deficiência (PCD) não atende aos requisitos normativos vigentes.**

FICHA 4 - DIAGNÓSTICO DE ASPECTOS DE INFRAESTRUTURA PREDIAL DAS UNIDADES ESCOLARES			
Item	**Descrição dos Itens Avaliados**	**Necessidade de Intervenção**	**Observações**
1. Infraestrutura da Escola			
Condições das fundações, pilares, vigas, lajes, cobertura, estruturas metálicas, paredes, esquadrias e pisos			
1.1	Fundações: verificar se há rachaduras, trincas, fissuras, desplacamentos ou quaisquer sinais de falhas na fundação que possam comprometer a estabilidade do prédio	NÃO	
1.2	Pilares: verificar se há rachaduras, trincas, fissuras, desplacamentos ou quaisquer sinais de falhas nos pilares que possam comprometer a estabilidade do prédio	NÃO	
1.3	Vigas: verificar se há rachaduras, trincas, fissuras, desplacamentos ou quaisquer sinais de falhas nas vigas que possam comprometer a estabilidade do prédio	NÃO	
1.4	Lajes: verificar se há rachaduras, trincas, fissuras, desplacamentos ou quaisquer sinais de falhas nas lajes que possam comprometer a estabilidade do prédio	SIM	Necessário realizar reparo em infiltrações na laje
1.5	Cobertura: verificar se há sinais de infiltração, vazamentos, telhas soltas ou outras falhas que possam causar danos à estrutura da escola	SIM	Necessário realizar a troca das telhas, por termoacústica para solução de problemas de infiltrações
1.6	Estruturas metálicas: verificar se há sinais de problemas nas estruturas metálicas, como corrosão ou deformação	NÃO	
1.7	Paredes: verificar se há sinais de problemas nas paredes, como rachaduras, infiltrações ou umidade excessiva	SIM	Necessário realizar reparo e repintura nas paredes
1.8	Esquadrias: verificar se há problemas nas esquadrias, tais como falta de peças, corrosão, vidros quebrados e dificuldade de manuseio	SIM	Necessário realizar troca das esquadrias com corrosão
1.9	Pisos: verificar se há sinais de problemas nos pisos, como desníveis, rachaduras ou solturas de revestimento	SIM	Necessário realizar o reparo nas fissuras do piso
2. Instalações Elétricas e Hidráulicas			
Condições das instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias			
2.1	Instalações elétricas: verificar se as instalações elétricas estão em conformidade com as normas de segurança, se há fios expostos, equipamentos com defeito ou outros problemas que possam representar risco de incêndio ou choque elétrico. verificar também se o quadro de energia está em bom estado e se as tomadas e interruptores estão funcionando corretamente	NÃO	
2.2	Instalações hidráulicas: verificar se as instalações hidráulicas estão em bom estado, sem vazamentos, rachaduras ou outros problemas que possam prejudicar o funcionamento do sistema. verificar também se as torneiras, registros e outros componentes estão em bom estado e se o sistema de esgoto está funcionando corretamente	NÃO	
2.3	Instalações sanitárias: verificar se as instalações sanitárias estão em bom estado, sem vazamentos, rachaduras ou outros problemas que possam prejudicar o funcionamento do sistema. verificar também se as louças sanitárias, como vasos e pias, estão em bom estado e se os ralos estão desobstruídos	NÃO	
2.4	Reservatórios de água: verificar se os reservatórios de água estão em bom estado, sem vazamentos ou outros problemas que possam prejudicar o funcionament do sistema de abastecimento	NÃO	

FICHA 4 - DIAGNÓSTICO DE ASPECTOS DE INFRAESTRUTURA PREDIAL DAS UNIDADES ESCOLARES			
Item	**Descrição dos Itens Avaliados**	**Necessidade de Intervenção**	**Observações**
3. Acessibilidade			
Condições de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida			
3.1	Rampas de acesso: verificar se há rampas de acesso em bom estado e com inclinação adequada	SIM	Adequar conforme NBR 9050
3.2	Elevadores: verificar se há elevadores em bom estado e se estão em conformidade com as normas de acessibilidade	NÃO	
3.3	Banheiros adaptados: verificar se há banheiros adaptados em bom estado e se estão em conformidade com as normas de acessibilidade	SIM	Adequar conforme NBR 9050
4. Condições de Habitabilidade			
Condições de ventilação e iluminação natural e artificial e conforto térmico dos ambientes			
4.1	Condições gerais de habitabilidade e conforto térmico por setor (salas de aulas, outros ambientes pedagógicos, ambientes administrativos, cozinha e refeitório, etc.)	NÃO	Recomenda-se implantar climatização nos ambientes da edificação
5. Áreas Externas/Paisagismo			
Condições de adequabilidade das áreas externas da escola			
5.1	Condições Gerais do Paisagismo na Unidade Educacional	NÃO	
5.2	Drenagem: verificar se a drenagem da área externa da escola está funcionando corretamente, evitando acúmulo de água em dias de chuva	NÃO	
5.3	Pintura externa: verificar se a pintura externa da escola está em bom estado, sem descascamentos ou sinais de desgaste	SIM	Realizar o reparo e repintura da fachada.

Profissional Responsável
Nome: Matheus Noronha Mendonça
Cargo/função: Engenheiro Civil
CREA/CAU: 5070897203

Responsável pela validação CAIXA
Nome: Decio de Souza Espindola
Cargo/função: Engenheiro Civil
CREA/CAU: 5062158870-SP

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEF THEREZA MACIEL DE PAULA, PROFA

1 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Cód. Unidade	
19216	EMEF THEREZA MACIEL DE PAULA, PROFA



Foto 01: Identificação



Foto 02: Área de Serviço



Foto 03: Circulação 1° Piso

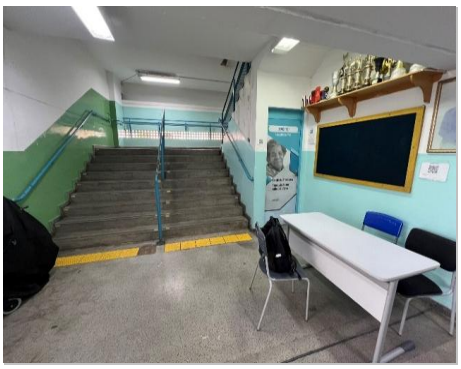


Foto 04: Circulação 1° Piso



Foto 05: Circulação 1° Piso



Foto 06: Circulação 1° Piso

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF THEREZA MACIEL DE PAULA, PROFA




Foto 07: Guichê de Atendimento



Foto 08: Guichê de Atendimento



Foto 09: Guichê de Atendimento



Foto 10: Guichê de Atendimento



Foto 11: Guichê de Atendimento



Foto 12: Arquivo



Foto 13: Arquivo



Foto 14: Arquivo

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF THEREZA MACIEL DE PAULA, PROFA



Foto 15: Guichê de Atendimento



Foto 16: Recursos SRM



Foto 17: Recursos SRM



Foto 18: Recursos SRM

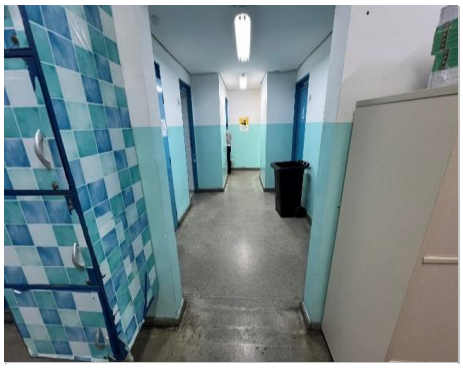


Foto 19: Circulação 1° Piso



Foto 20: Banheiro Masculino 1° Piso



Foto 21: Banheiro Masculino 1° Piso



Foto 22: Banheiro Masculino 1° Piso

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF THEREZA MACIEL DE PAULA, PROFA



Foto 23: Banheiro Masculino 1° Piso



Foto 24: Banheiro Masculino 1° Piso



Foto 25: Banheiro Masculino 1° Piso

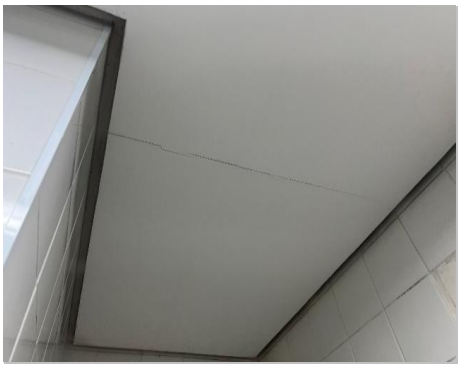


Foto 26: Banheiro Masculino 1° Piso



Foto 27: Banheiro Masculino 1° Piso



Foto 28: Banheiro Masculino 1° Piso

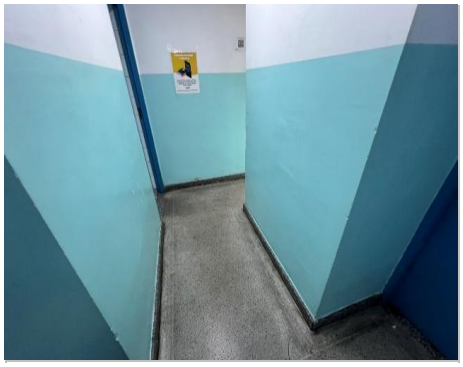


Foto 29: Circulação 1° Piso



Foto 30: Circulação 1° Piso



Foto 31: Depósito



Foto 32: Depósito



Foto 33: Depósito



Foto 34: Vestiário



Foto 35: Vestiário



Foto 36: Vestiário



Foto 37: Lavanderia

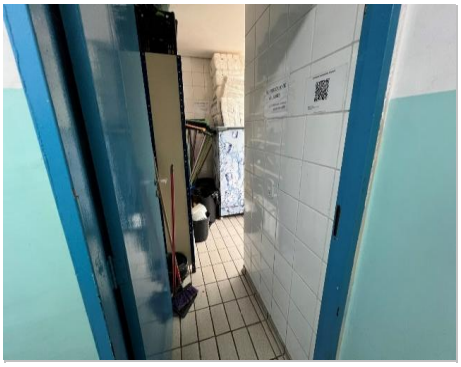


Foto 38: Lavanderia

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF THEREZA MACIEL DE PAULA, PROFA



Foto 39: Lavanderia



Foto 40: Lavanderia

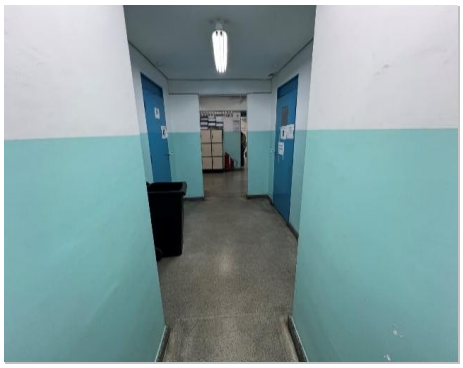


Foto 41: Circulação 1° Piso

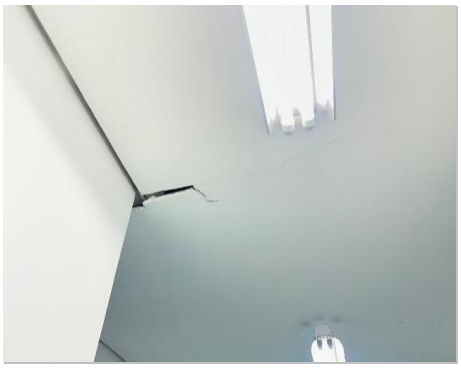


Foto 42: Circulação 1° Piso



Foto 43: Circulação 1° Piso



Foto 44: Circulação 1° Piso



Foto 45: Banheiro Feminino 1° Piso



Foto 46: Banheiro Feminino 1° Piso

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF THEREZA MACIEL DE PAULA, PROFA



Foto 47: Banheiro Feminino 1° Piso

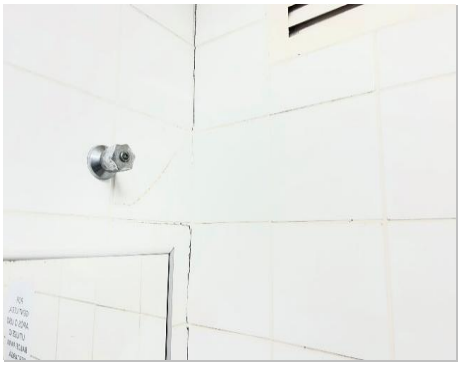


Foto 48: Banheiro Feminino 1° Piso



Foto 49: Banheiro Feminino 1° Piso
Fissura no Revestimento da Parede



Foto 50: Banheiro PCD 1° Piso



Foto 51: Banheiro PCD 1° Piso



Foto 52: Banheiro PCD 1° Piso



Foto 53: Sala de Professores

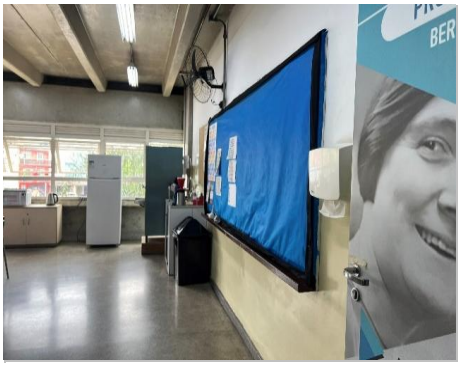


Foto 54: Sala de Professores

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF THEREZA MACIEL DE PAULA, PROFA




Foto 55: Sala de Professores



Foto 56: Sala de Professores



Foto 57: Sala 12

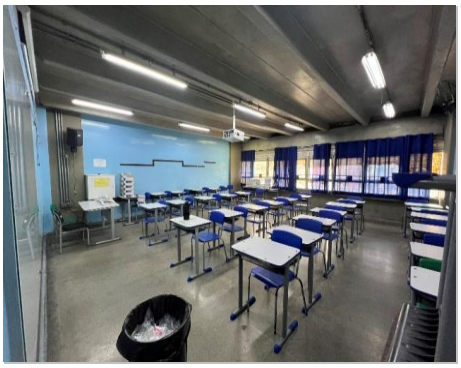


Foto 58: Sala 12



Foto 59: Sala 14



Foto 60: Sala 14



Foto 61: Sala 16

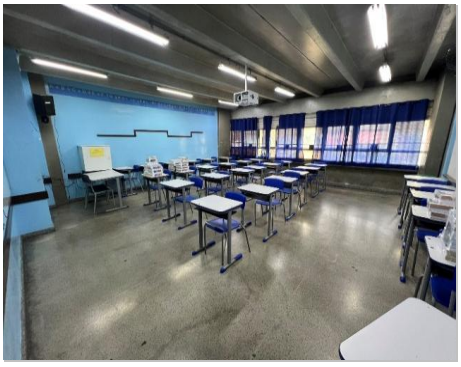


Foto 62: Sala 16

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF THEREZA MACIEL DE PAULA, PROFA



Foto 63: Circulação 1° Piso



Foto 64: Banheiro PCD 1° Piso

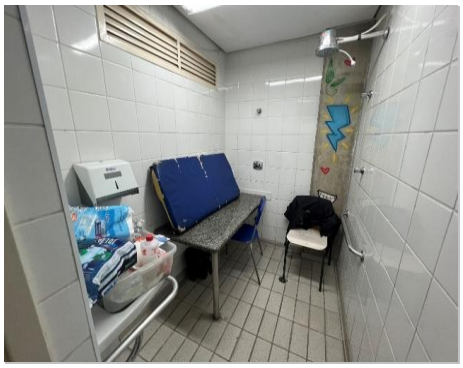


Foto 65: Banheiro PCD 1° Piso



Foto 66: Banheiro PCD 1° Piso
Fissura no Revestimento da Parede

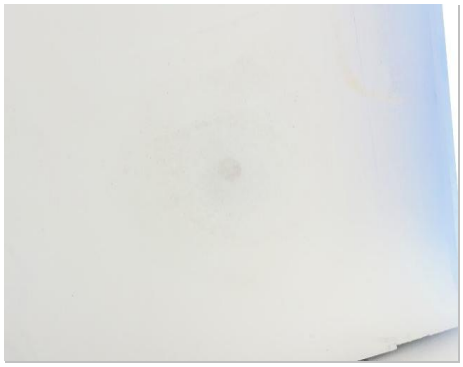


Foto 67: Banheiro PCD 1° Piso



Foto 68: Banheiro Masculino 1° Piso

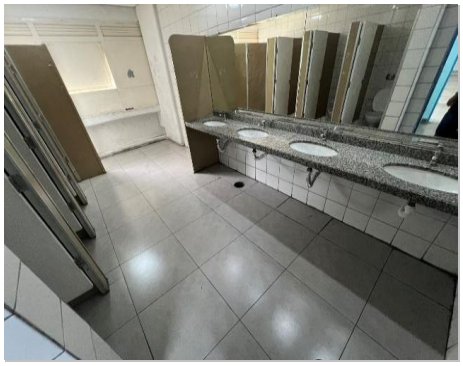


Foto 69: Banheiro Masculino 1° Piso

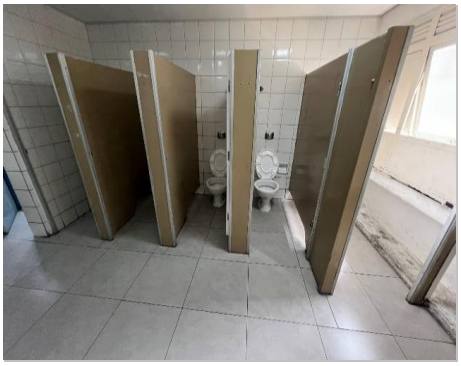


Foto 70: Banheiro Masculino 1° Piso

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF THEREZA MACIEL DE PAULA, PROFA



Foto 71: Banheiro Masculino 1° Piso
Oxidação Causada por Umidade



Foto 72: Banheiro Masculino 1° Piso
Umidade de Infiltração



Foto 73: Banheiro Feminino 1° Piso



Foto 74: Banheiro Feminino 1° Piso



Foto 75: Banheiro Feminino 1° Piso



Foto 76: Banheiro Feminino 1° Piso
Umidade de Infiltração



Foto 77: Banheiro Feminino 1° Piso

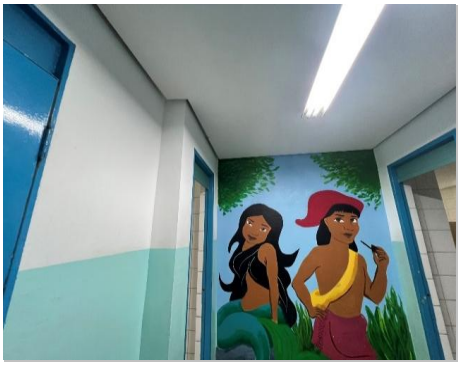


Foto 78: Banheiro Feminino 1° Piso

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEF THEREZA MACIEL DE PAULA, PROFA



Foto 79: Banheiro Feminino 1° Piso



Foto 80: Sala 19

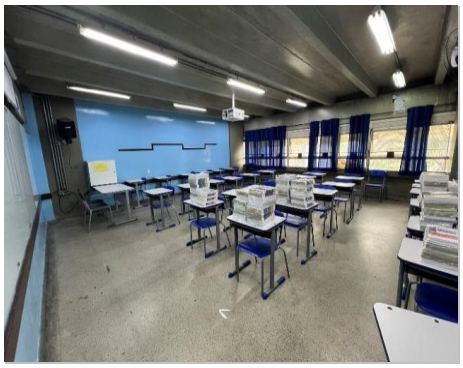


Foto 81: Sala 19



Foto 82: Sala 19
Umidade de Infiltração



Foto 83: Sala 19
Umidade de Infiltração



Foto 84: Sala 19
Umidade de Infiltração



Foto 85: Leitura

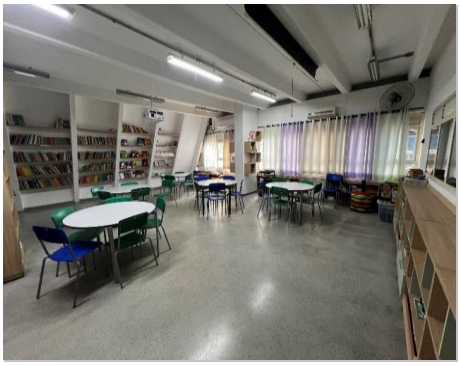


Foto 86: Leitura

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF THEREZA MACIEL DE PAULA, PROFA



Foto 87: Leitura



Foto 88: Leitura



Foto 89: Informática

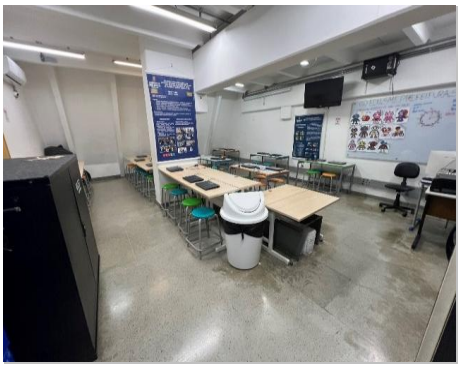


Foto 90: Informática



Foto 91: Informática

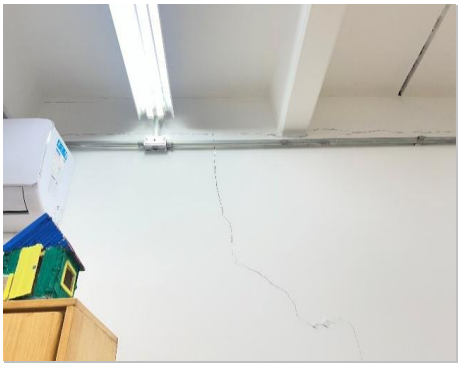


Foto 92: Informática



Foto 93: Informática
Fissura no Piso



Foto 94: Informática

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF THEREZA MACIEL DE PAULA, PROFA



Foto 95: Informática



Foto 96: Informática



Foto 97: Informática



Foto 98: Laboratório de Ciências



Foto 99: Laboratório de Ciências



Foto 100: Laboratório de Ciências



Foto 101: Laboratório de Ciências



Foto 102: Sala 20

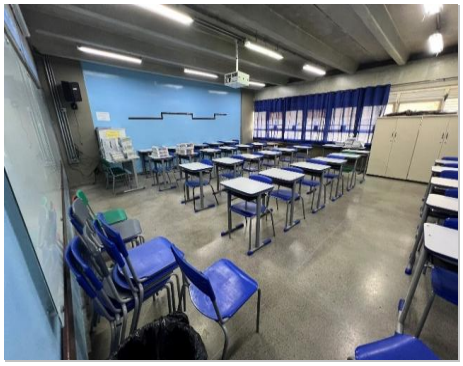


Foto 103: Sala 20



Foto 104: Sala 18

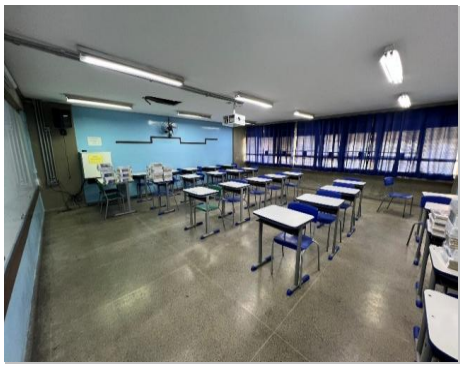


Foto 105: Sala 18



Foto 106: Sala 17

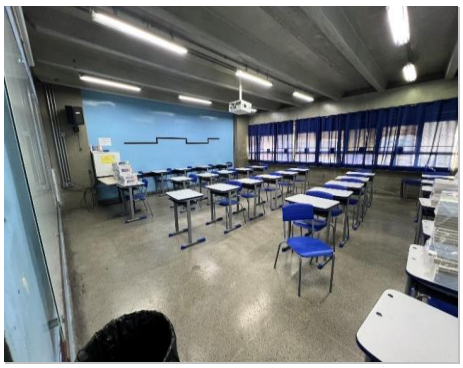


Foto 107: Sala 17



Foto 108: Sala 15

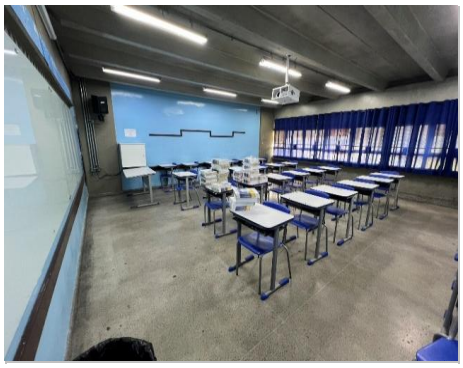


Foto 109: Sala 15



Foto 110: Sala 15
Descamação da Pintura

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEF THEREZA MACIEL DE PAULA, PROFA



Foto 111: Sala 13

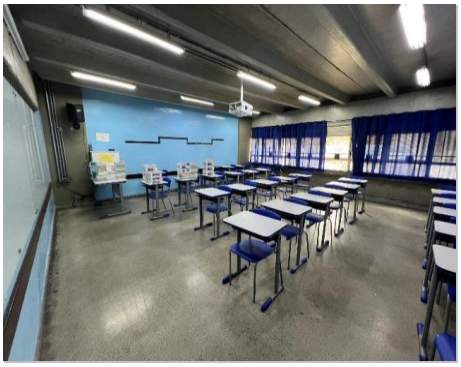


Foto 112: Sala 13



Foto 113: Apoio

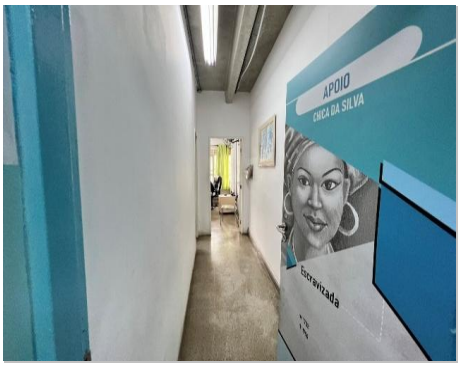


Foto 114: Apoio



Foto 115: Apoio



Foto 116: Apoio

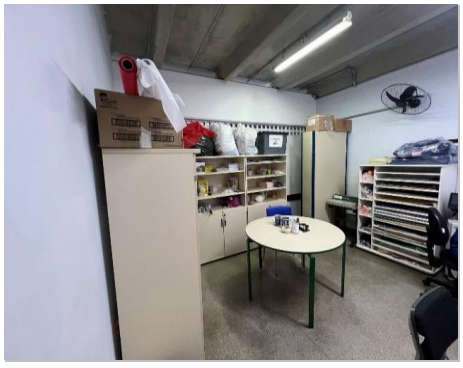


Foto 117: Apoio



Foto 118: Diretória

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF THEREZA MACIEL DE PAULA, PROFA



Foto 119: Diretória



Foto 120: Diretória



Foto 121: Secretária

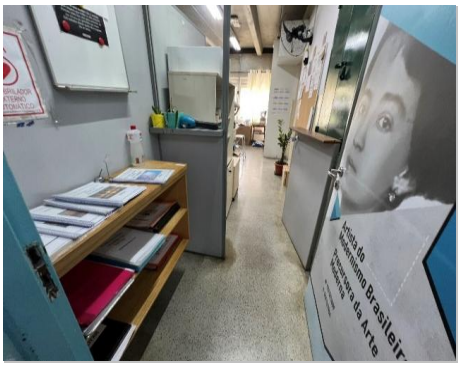


Foto 122: Secretária

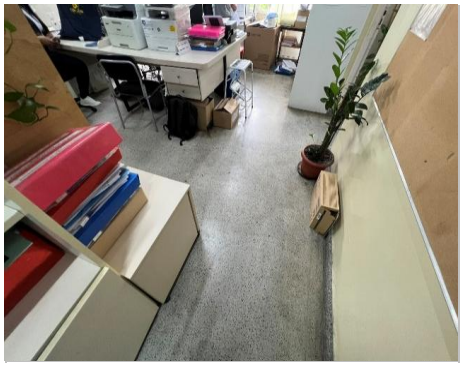


Foto 123: Secretária



Foto 124: Secretária
Fissura no Piso

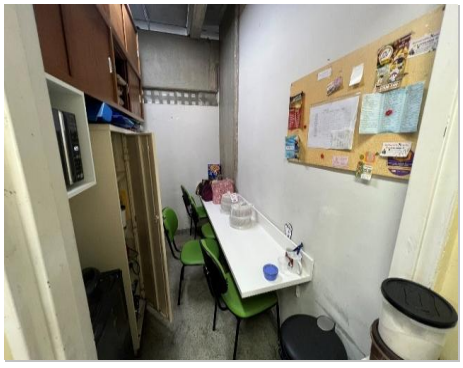


Foto 125: Secretária



Foto 126: Secretária

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF THEREZA MACIEL DE PAULA, PROFA



Foto 127: Secretária



Foto 128: Secretária
Fissura na Parede



Foto 129: Circulação 1° Pavimento
Umida de Infiltração



Foto 130: Circulação 1° Pavimento



Foto 131: Circulação 1° Pavimento



Foto 132: Circulação 1° Pavimento

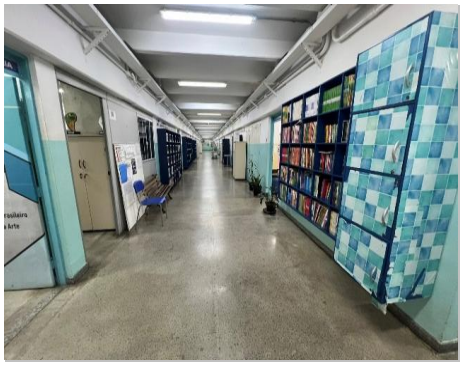


Foto 133: Circulação 1° Pavimento

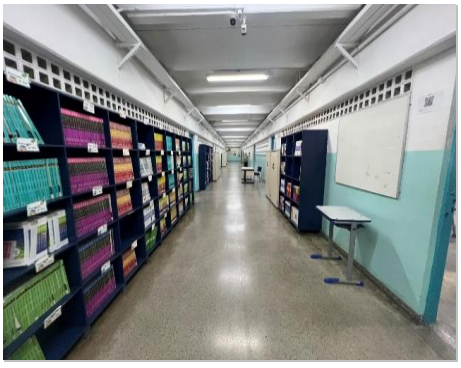


Foto 134: Circulação 1° Pavimento

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
EMEF THEREZA MACIEL DE PAULA, PROFA



Foto 135: Circulação 1° Pavimento
Fissura no Piso

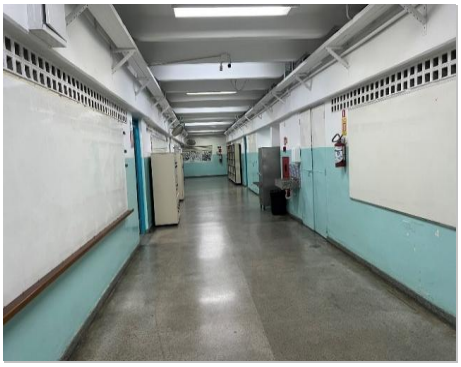


Foto 136: Circulação 1° Pavimento



Foto 137: Circulação 1° Pavimento



Foto 138: Vista Geral Bebedouro 1° Pav.



Foto 139: Circulação 1° Pavimento



Foto 140: Vista Geral Bebedouro 1° Pav.



Foto 141: Circulação 1° Pavimento

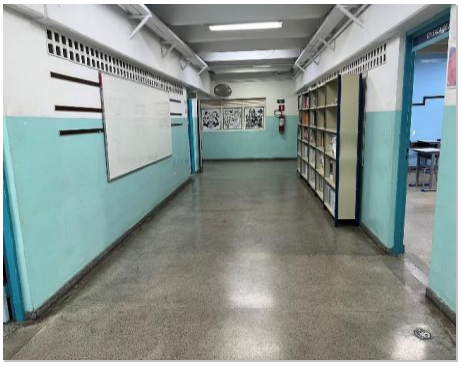


Foto 142: Circulação 1° Pavimento



Foto 143: Circulação 1° Pavimento

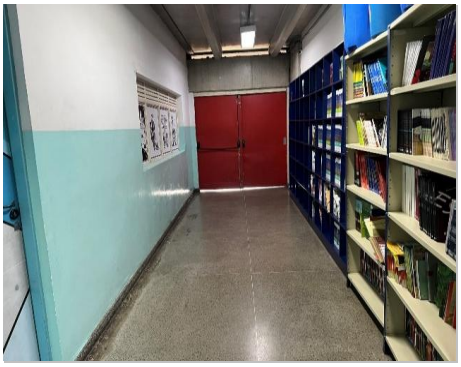


Foto 144: Circulação 1° Pavimento



Foto 145: Circulação 1° Pavimento

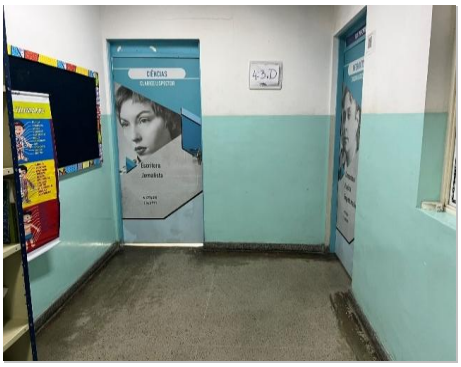


Foto 146: Circulação 1° Pavimento



Foto 147: Circulação 1° Pavimento
Fissura no Piso



Foto 148: Circulação 1° Pavimento
Fissura na Parede




Foto 149: Depósito



Foto 150: Vista Geral Escada Avesso 1° Pav.
Descamação da Pintura

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF THEREZA MACIEL DE PAULA, PROFA

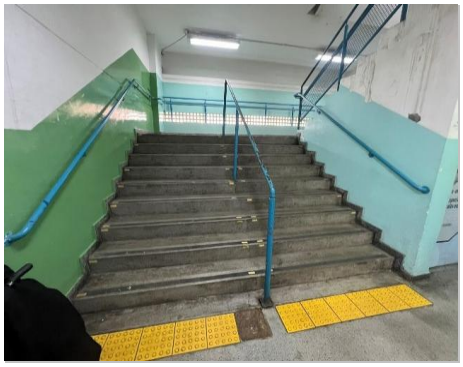


Foto 151: Vista Geral Escada Avesso 1° Pav.



Foto 152: Vista Geral Escada Avesso 1° Pav.
Descamação da Pintura

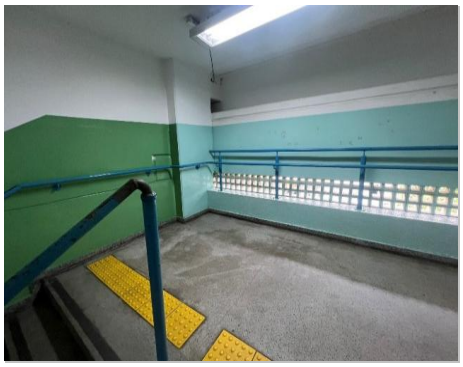


Foto 153: Vista Geral Escada Avesso 1° Pav.

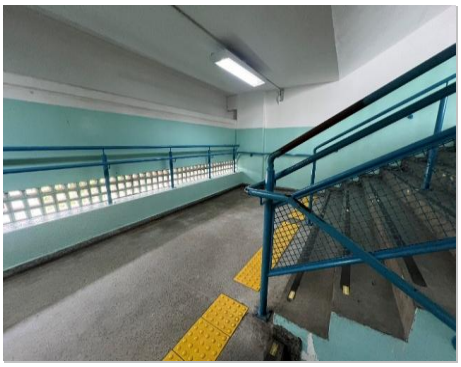


Foto 154: Vista Geral Escada Avesso 1° Pav.



Foto 155: Circulação 1° Pavimento
Fissura no Piso



Foto 156: Circulação 1° Pavimento
Umidade de Infiltração



Foto 157: Circulação 1° Pavimento
Umidade de Infiltração



Foto 158: Circulação 1° Pavimento

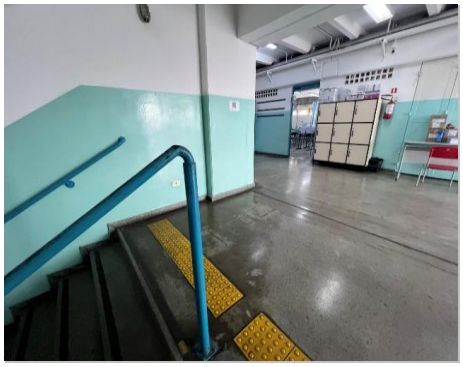


Foto 159: Circulação 1° Pavimento



Foto 160: Circulação 1° Pavimento
Umidade de Infiltração



Foto 161: Circulação 1° Pavimento
Umidade de Infiltração



Foto 162: Circulação 1° Pavimento



Foto 163: Sala 01



Foto 164: Sala 02



Foto 165: Sala 02



Foto 166: Sala 02
Umidade de Infiltração




Foto 167: Sala 02

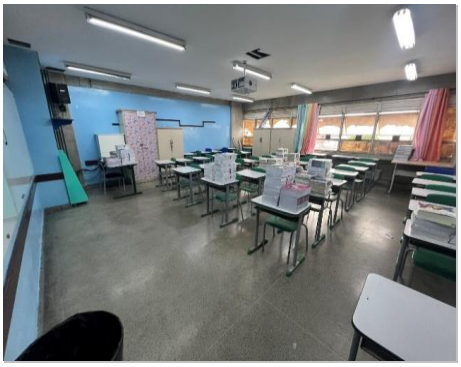


Foto 168: Sala 03



Foto 169: Sala 03
Umidade de Infiltração



Foto 170: Sala 03
Umidade de Infiltração



Foto 171: Sala 03

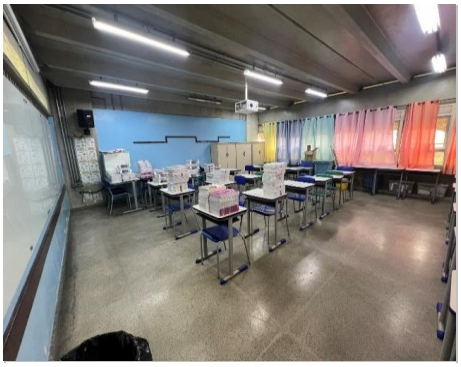


Foto 172: Sala 04



Foto 173: Sala 04
Umidade de Infiltração

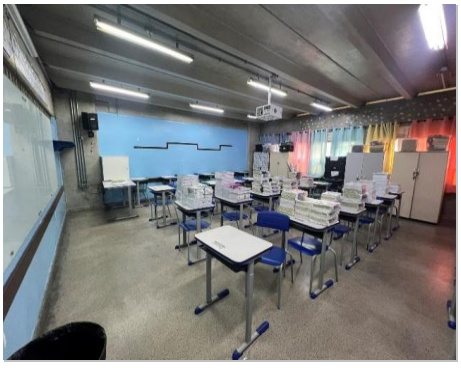


Foto 174: Sala 05

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF THEREZA MACIEL DE PAULA, PROFA



Foto 175: Sala 05
Umidade de Infiltração



Foto 176: Sala 05
Umidade de Infiltração



Foto 177: Sala 05

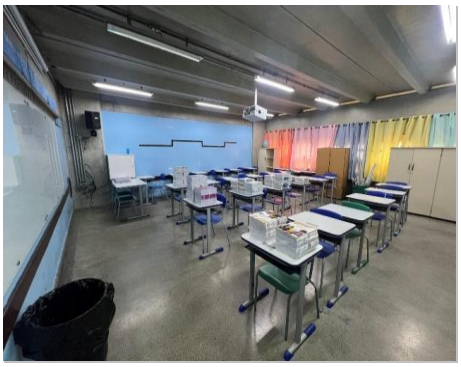


Foto 178: Sala 06



Foto 179: Sala 06
Umidade de Infiltração



Foto 180: Sala 06



Foto 181: Sala 07



Foto 182: Sala 07



Foto 183: Sala 07
Umidade de Infiltração



Foto 184: Sala 07

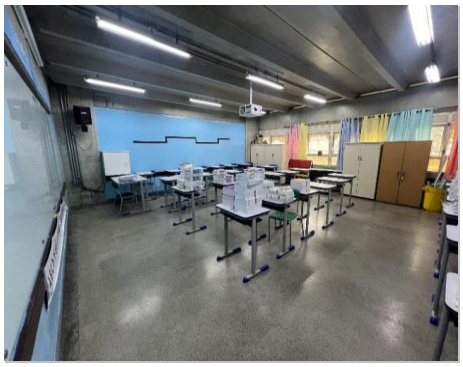


Foto 185: Sala 09



Foto 186: Sala 09
Umidade de Infiltração



Foto 187: Sala 09
Umidade de Infiltração



Foto 188: Sala 09
Umidade de Infiltração



Foto 189: Sala 09
Umidade de Infiltração



Foto 190: Sala 09

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF THEREZA MACIEL DE PAULA, PROFA



Foto 191: Sala 09

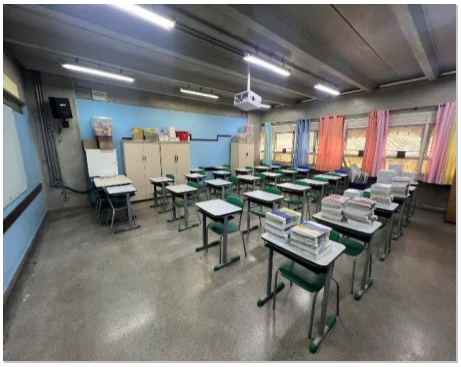


Foto 192: Sala 11



Foto 193: Sala 11
Umidade de Infiltração



Foto 194: Sala 11
Umidade de Infiltração



Foto 195: Sala 11



Foto 196: Sala 11

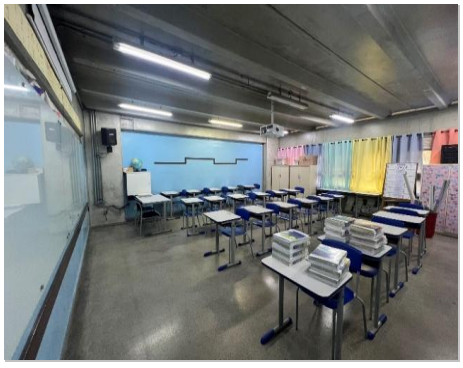


Foto 197: Sala 10



Foto 198: Sala 10
Umidade de Infiltração

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF THEREZA MACIEL DE PAULA, PROFA



Foto 199: Sala 10
Umidade de Infiltração



Foto 200: Sala 10

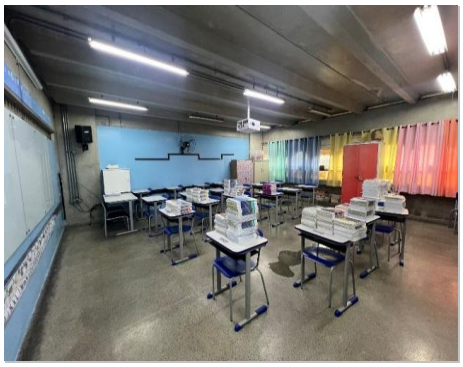


Foto 201: Sala 08



Foto 202: Sala 08
Umidade de Infiltração



Foto 203: Sala 08
Umidade de Infiltração



Foto 204: Sala 08

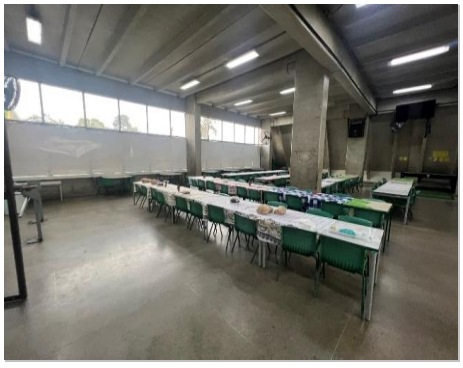


Foto 205: Refeitório

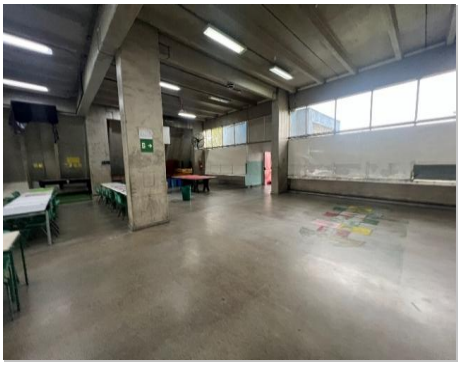


Foto 206: Refeitório

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF THEREZA MACIEL DE PAULA, PROFA



Foto 207: Refeitório
Umidade de Infiltração



Foto 208: Refeitório
Umidade de Infiltração



Foto 209: Refeitório
Fissura no Piso

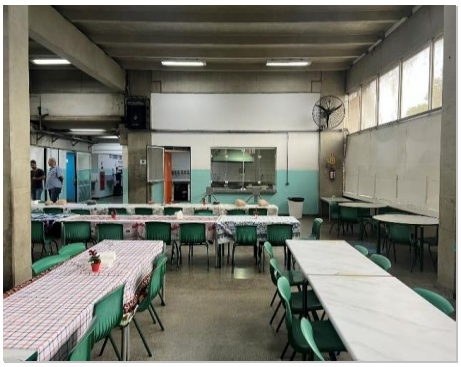


Foto 210: Refeitório

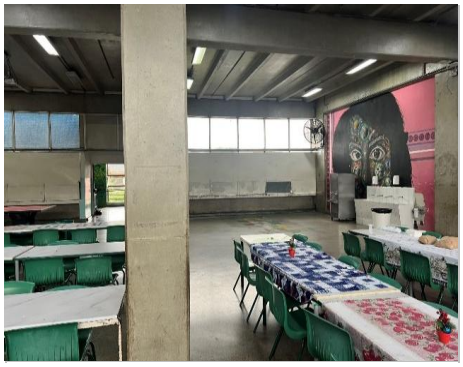


Foto 211: Refeitório



Foto 212: Cozinha



Foto 213: Cozinha



Foto 214: Despensa



Foto 215: Despensa
Fissura no Revestimento da Parede



Foto 216: Despensa



Foto 217: Vista Geral Bebedouro 2°Pav.



Foto 218: Vista Geral Bebedouro 2°Pav.



Foto 219: Circulação Pavimento 2° Pav.
Umidade de Infiltração

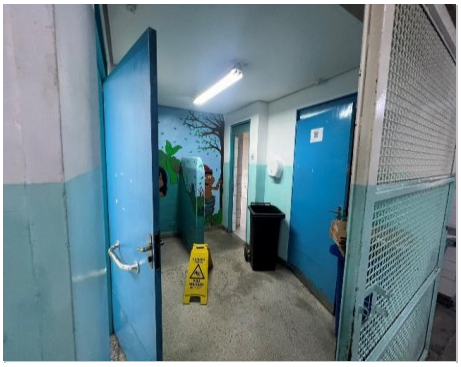


Foto 220: Banheiro PCD 2° Pav.



Foto 221: Banheiro PCD 2° Pav.



Foto 222: Banheiro Feminino 2° Pav.

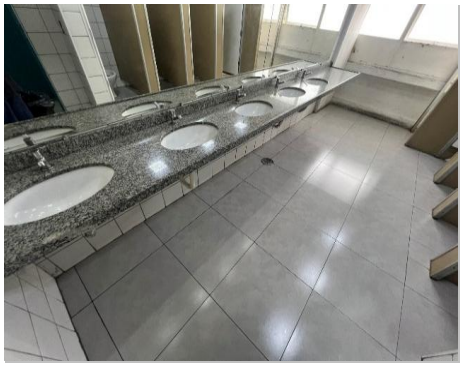


Foto 223: Banheiro Feminino 2° Pav.



Foto 224: Banheiro Feminino 2° Pav.



Foto 225: Banheiro Feminino 2° Pav.



Foto 226: Banheiro Feminino 2° Pav.



Foto 227: Banheiro Feminino 2° Pav.
Umidade de Infiltração



Foto 228: Banheiro Masculino 2° Pav.



Foto 229: Banheiro Masculino 2° Pav.



Foto 230: Banheiro Masculino 2° Pav.



Foto 231: Banheiro Masculino 2° Pav. Umidade de Infiltração



Foto 232: Banheiro Masculino 2° Pav. Umidade de Infiltração



Foto 233: Banheiro PCD 2° Pav.



Foto 234: Banheiro PCD 2° Pav.



Foto 235: Circulação Pavimento 2° Pav.



Foto 236: Circulação Pavimento 2° Pav.



Foto 237: Circulação Pavimento 2° Pav.



Foto 238: Circulação Pavimento 2° Pav.



Foto 239: Circulação Pavimento 2° Pav.



Foto 240: Circulação Pavimento 2° Pav.
Fissura no Piso



Foto 241: Circulação Pavimento 2° Pav.



Foto 242: Circulação Pavimento 2° Pav.



Foto 243: Circulação Pavimento 2° Pav.



Foto 244: Circulação Pavimento 2° Pav.

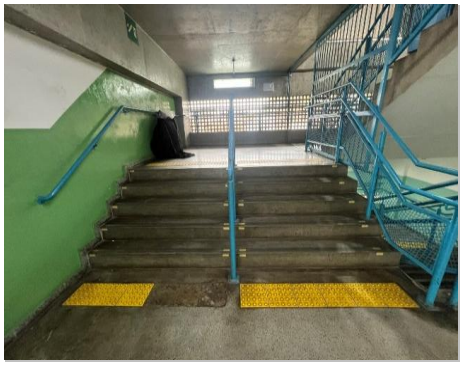


Foto 245: Vista da Escada Acesso a Quadra




Foto 246: Vista da Escada Acesso a Quadra
Umidade de Infiltração

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF THEREZA MACIEL DE PAULA, PROFA



Foto 247: Vista da Escada Acesso a Quadra Umidade de Infiltração

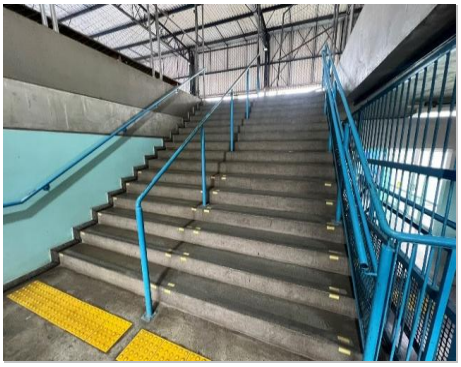

ada de Ace Vista da Escada Acesso a Quadra



Foto 249: Vista Geral Quadra Pol.



Foto 250: Vista Geral Quadra Pol.



Foto 251: Vista Telhado da Quadra



Foto 252: Vista Telhado da Quadra



Foto 253: Elevador Quadra

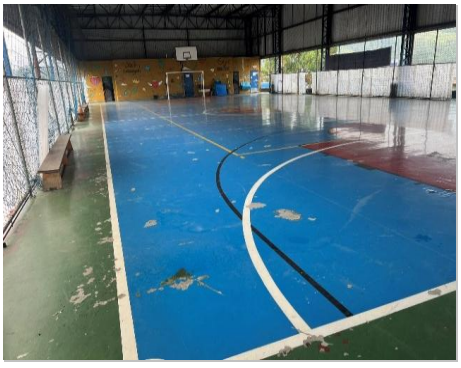


Foto 254: Vista Geral Quadra Pol.



Foto 255: Vista Geral Quadra Pol.



Foto 256: Vista Geral Quadra Pol.
Fissura no Piso



Foto 257: Vista Geral Quadra Pol.



Foto 258: Banheiro PCD Quadra



Foto 259: Banheiro PCD Quadra



Foto 260: Banheiro Fem. Quadra



Foto 261: Banheiro Fem. Quadra



Foto 262: Banheiro Fem. Quadra

ANEXO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

EMEF THEREZA MACIEL DE PAULA, PROFA



Foto 263: Banheiro Fem. Quadra



Foto 264: Banheiro Fem. Quadra



Foto 265: Banheiro Fem. Quadra



Foto 266: Vista Geral do Bebedouro Quadra



Foto 267: Banheiro Masculino Quadra



Foto 268: Banheiro Masculino Quadra



Foto 269: Banheiro Masculino Quadra



Foto 270: Banheiro PCD Quadra
